


臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 494 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 1 月 6 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 2 點 00 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.1.6 第 494 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 05 分

111年01月06日第494次協調會議-參與視訊人員

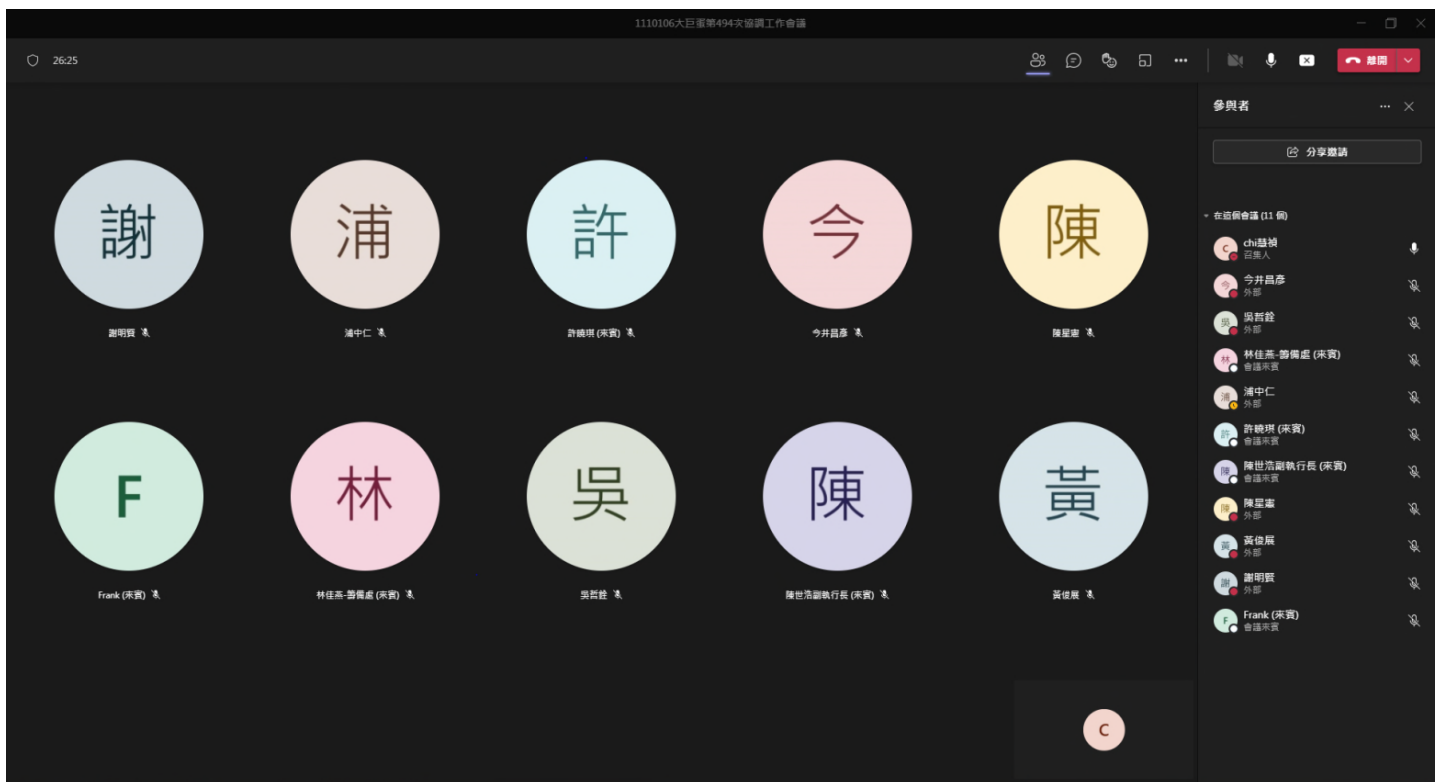

全名	使用者動作	時間戳記
chi 慧禎	已加入	2022/1/6 下午 1:54:41
謝明賢	已加入	2022/1/6 下午 1:57:08
浦中仁	已加入	2022/1/6 下午 1:57:29
許曉琪 (來賓)	已加入	2022/1/6 下午 1:59:26
今井昌彦	已加入	2022/1/6 下午 1:59:31
陳世浩副執行長 (來賓)	已加入	2022/1/6 下午 1:59:44
陳星憲	已加入	2022/1/6 下午 1:59:53
Frank (來賓)	已加入	2022/1/6 下午 2:00:15
林佳燕-籌備處 (來賓)	已加入	2022/1/6 下午 2:01:26
吳哲銓	已加入	2022/1/6 下午 2:02:37
黃俊展	已加入	2022/1/6 下午 2:20:00
黃俊展	已離開	2022/1/6 下午 2:41:43

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年1月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>110/12/23 會議</p> <p>1. 光復南路第二階段路型：外側排水系統持續系統，該階段預計延至 111/1 底完成，該部分請遠雄公司控管於農曆前完成，並於下周會議說明尚未完成工作項目。菸廠路路證 12/22~12/29 核准。光復南路地下引道階段仍持續延遲中，請遠雄公司加速工進。</p> <p>110/12/30 會議</p> <p>2. 光復南路第二階段路型：外側排水系統持續施工，該階段預計延至 111/1 底完成，請遠雄公司於下周會議派該區域負責人員說明施作進度(排水系統施作時程及松菸廠施作時程)。光復南路地下引道階段仍持續延遲中，請遠雄公司加速工進。</p> <p>3. 依與新工處協調忠孝東路施作時間，請遠雄公司務必於 1/15 前完成施作，包含人行動線調整。</p> <p>111/1/6 會議</p> <p>4. 光復南路第二階段路型：外側排水系統持續施工，預計農曆年期完成。菸廠路配合文創展演及新工處路證管制，預計 1/6 繼續開始施作，1/16 前完成第一階段施作。</p> <p>5. 提醒遠雄公司第三階段路型調整對於民眾車行動線影響較大，建議盡量於農曆春節假期中加速趕工，使影響民眾車行動線時程縮短。</p> <p>6. 依與新工處協調忠孝東路施作時間，請遠雄公司務必於 1/15 前完成施作。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>110/12/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 12/20 完成公共藝術鑑價。下周請遠雄公司說明後續相關期程。</p> <p>110/12/30 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示甲案公共藝術評選及議價結果將提送文化局確認，乙案及丙案廠商甄選預計 1/7 上網公告。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 1 月 7 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>111/1/6 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示乙案及丙案廠商甄選預計 1/10 上網公告。預計 1/21 提送甲案甄選報告書至文化局，請遠雄公司確認提送報告書相關內容，以加速行政作業時間。</p>				
三	屋頂板折射	遠雄	<p>110/12/9 會議、110/12/16 會議、110/12/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示目前與環球廠商辦理簽約事宜，已於工地召開施工討論會議，預計 12 月底前開始施作。</p> <p>110/12/30 會議、111/1/6 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示目前與環球廠商辦理簽約事宜，已要求廠商於 1/10 前進場施作，預計 5 月底完成。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>110/12/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示現場主要施作伸縮縫填縫劑塗佈 8%，高架安裝進度維持 85.3%。管線架高施工計畫於 12/7 提送至一工處審查，環片修補施工計畫預計下周掛件提送至一工處審查，監造計畫預計 12/24 提供電子檔給一工處，預計 12/30 前正式行文提送。請遠雄公司加速行政審查程序，控管於年底完成審查。</p> <p>110/12/30 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示現場主要施作高架安裝進度 88.6%，伸縮縫填縫劑塗佈維持 8%。監造計畫公司用印中，預計下周提送至一工處；環片施工計畫修正後送定稿版，預計 1 月中提送。</p> <p>111/1/6 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示現場主要施作高架安裝進度 97.2%，伸縮縫填縫劑塗佈 100%。監造計畫於 12/30 提送至依工處；環片施工計畫修正後送定稿版，預計 1 月中提送。目前正與捷運公司辦理台車租借中。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p>110/12/23 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年1月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>1. 遠雄公司表示目前性能防災變更程序台灣建築中心 12/15 來文要求須補充說明體育館地下 1 層為避難層乙節已於 12/17 掛件補充資料納入評估書內，目前台灣建築中心尚未確定後續行政程序；消防署已正式發文需提送相關實測煙控模擬計畫。</p> <p>2. 申請門牌事宜已與主管機關確認申請使照時無須檢附，惟於取得使照前須完成申請。若五大管線竣工申報查驗需要有門牌資料，請遠雄公司自行控管相關申請進度，避免影響取得使用執照期程。</p> <p>3. 目前工程進度說明(12/17~12/23)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：完成率 80%，捷運廣場(12/10~12/25)，光復南路外鋪面預定 12/11RC。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 50%，C 區地坪貼磚(11/10~12/10)，旅辦介面至 12/31，忠孝東路側 F 區及 G 區至 12/31。</p> <p>(3) DM272 松菸文創園區景觀工程：完成率 22%，預定完成時間延後至 111/1/20。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：外側排水系統持續系統，該階段預計延至 111/1 底完成，該部分請遠雄公司控管於農曆前完成。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 82%，預定完成時間延後至 111/1/31 完成。</p> <p>(6) DM050 商場輕隔間工程：完成 75%，，預定完成時間延後至 110/12/31 完成。</p> <p>(7) 機電相關出工人數近期不穩定，JV130 地下室消防灑水配管延至 111/2/24 完成，DMF120 巨蛋 1F~4F 平面撒水配管延至 111/1/28 完成。</p> <p>110/12/30 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示目前性能防災變更程序台灣建築中心 12/15 來文要求須補充說明體育館地下 1 層為避難層乙節已於 12/17 掛件補充資料納入評估書內，目前建築中心轉委員確認中，最慢委員於 1/7 前回覆，確認後再行提送營建署評</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年1月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>定。因受性能防災變更程序時程延後，建照四變及使用執照取得時間將延後取得。</p> <p>5. 目前工程進度說明(12/23~12/30)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：完成率 80%，捷運廣場(12/10~111/1/15)，第二階段結構施工(111/2/10~2/28)。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 52%，巨蛋東側 C 區及北側至 111/1/20。忠孝東路側 F 區及 G 區至 111/1/15。</p> <p>(3) DM272 松菸文創園區景觀工程：完成率 22%，預定完成時間延後至 111/1/20。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：外側排水系統持續系統，該階段預計延至 111/1 底完成，該部分請遠雄公司控管於農曆前完成。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 84%，預定完成時間延後至 111/1/31 完成。</p> <p>(6) DM050 商場輕隔間工程：完成 77%，預定完成時間延後至 111/1/31 完成。</p> <p>(7) 目前於日本放水槍測試皆已完成，預計 1/18 運回至基隆港。</p> <p>(8) 有關通力手扶梯使用大陸進貨鋼索部分，請遠雄公司於開始施作時通知籌備處及並說明相關使用範圍。</p> <p>(9) 至 110.12.30 巨蛋棟 87%、商場棟 84%、影城棟 75%、辦公棟 95%、旅館棟 92%、道路為 71%、景觀 78%。</p> <p>111/12/6 會議</p> <p>6. 遠雄公司表示目前性能防災變更程序於台灣建築中心辦理中，各委員意見已於 1/6 回復，3 位委員有意見，後續待收訖建築中心意見後再提送說明。因受性能防災變更程序時程延後，建照四變及使用執照取得時間將延後取得。</p> <p>7. 目前工程進度說明(12/31~1/6)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：已於 111/1/3 完成公設鑑定，預計農曆年前出鑑定報告</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年1月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>書。農曆年後開始辦理調解書。</p> <p>(2) DM280 景觀結構工程：完成率 80%，施工動線處結構施工 111/2/10~2/25。</p> <p>(3) DM272 景觀地磚工程：完成率 55%，巨蛋東側 C 區及北側至 111/1/20。忠孝東路側 F 區及 G 區至 111/1/15。</p> <p>(4) DM272 松菸文創園區景觀工程：完成率 25%，預定完成時間延後至 111/1/20。</p> <p>(5) KF220 光復南路第二階段路型：外側排水系統持續施工，該階段預計延至 111/1 底完成，該部分請遠雄公司控管於農曆前完成。</p> <p>(6) SP040 商場輕隔間工程：完成 87%，預定完成時間延後至 111/1/31 完成。</p> <p>(7) DM050 商場輕隔間工程：完成 78%，預定完成時間延後至 111/1/31 完成。</p> <p>(8) 目前於日本放水槍測試皆已完成，預計 1/18 運回至基隆港。</p> <p>(9) 有關通力手扶梯使用大陸進貨鋼索部分，請遠雄公司於開始施作時通知籌備處及並說明相關使用範圍。</p>				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p>110/12/16 會議、110/12/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示目前修正投資計畫書仍預計 111 年 1 月中提送；試營運計畫會以試營運建議書方式提送。</p> <p>110/12/30 會議、111/1/6 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示目前修正投資計畫書預計 111 年 1 月底提送；試營運計畫會以試營運建議書方式提送，預計 2 月底提送。</p>				
