


# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 550 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 02 月 16 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到簿
- 七、會議結論：112.02.16 第 550 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 58 分

# 112年2月16日第550次協調會議-參與視訊人員

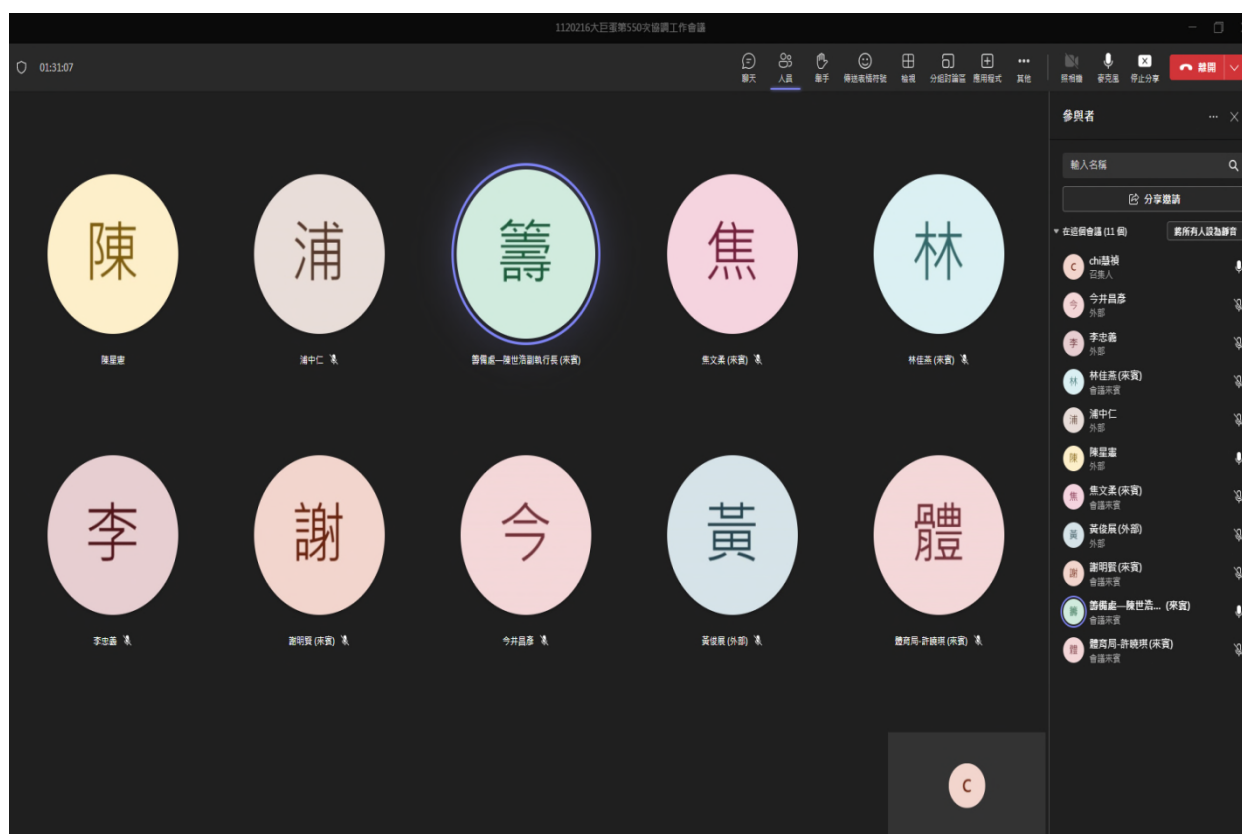

姓名	首次加入	上次離開
chi 慧禎	23/2/16 下午 2:27:52	
籌備處-陳世浩副執行長 (來賓)	23/2/16 下午 2:27:52	23/2/16 下午 3:58:16
謝明賢	23/2/16 下午 2:30:03	23/2/16 下午 3:58:21
林佳燕 (來賓)	23/2/16 下午 2:29:27	
體育局-許曉琪	23/2/16 下午 2:27:52	23/2/16 下午 3:58:26
焦文柔 (來賓)	23/2/16 下午 2:28:15	
陳星憲	23/2/16 下午 2:32:12	23/2/16 下午 3:58:17
今井昌彦	23/2/16 下午 2:30:39	23/2/16 下午 3:58:20
浦中仁	23/2/16 下午 2:27:52	23/2/16 下午 3:58:26
黃俊展	23/2/16 下午 2:31:32	
今井昌彦	23/2/16 下午 2:30:39	23/2/16 下午 3:58:20
李忠義	23/2/16 下午 2:29:45	23/2/16 下午 3:58:20
吳哲銓	23/2/16 下午 2:34:31	23/2/16 下午 3:11:19

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年02月17日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>112/2/2 會議</b></p> <p>1. 光復南路型改善：第五階段已完成，預計 2/10 進行第六階段 AC 鋪設及畫線。穿越管部分預計於燈會結束後再行繼續施作。</p> <p><b>112/2/9 會議</b></p> <p>2. 光復南路型改善：第六階段 AC 鋪設及畫線待燈會結束後再行施作，穿越管施作部分預計燈會結束後 2 周內完成。</p> <p><b>112/2/16 會議</b></p> <p>3. 光復南路型改善：第六階段 AC 鋪設預計 2/25~2/26 鋪設，穿越管預計 2/20 後開始施作。有關後續穿越管完成範圍是否可重新銑鋪，請再與新工處確認。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p><b>112/1/18 會議、112/2/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 2/6 廠商進場施作，將先施作北側範圍，預計 112 年 6 月底完成。</p> <p><b>112/2/9 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示與大林組於 2/9 完成協議簽訂，已通知施作廠商可進場施作。請於下周會議說明預定施作進度期程。</p> <p><b>112/2/16 會議</b></p> <p>3. 大林組表示廠商預計 3/1 開始進場從北側開始施作，預計 5 月底完成北側，7 月底完成全部施作範圍。提醒相關前置作業及安全措施請全面確認。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>112/2/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示至 1/28 工進如下，1/22~28 農曆春節無工單，目前預計 2 月份上部環片全部完成。</p> <p>(1)前置作業：鋼環片錨定片安裝完成 129 環、鋼支保錨定片安裝完成 53 環。</p> <p>(2)安裝作業：鋼環片上部安裝完成 93 環、鋼支保上部安裝完成 49 環。</p> <p>(3)鎖固校正：鋼環片錨定片完成 129 環、鋼環片上部環片完成 93 環、鋼支保</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 02 月 17 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>上部環片完成 49 環。</p> <p><b>112/2/9 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示至 2/4 工進如下</p> <p>(1)前置作業：鋼環片錨定片安裝完成 129 環、鋼支保錨定片安裝完成 53 環、鋼環片錨定片被填完成 129 環、鋼支保錨定片被填完成 48 環。</p> <p>(2)安裝作業：鋼環片上部安裝完成 108 環、鋼支保上部安裝完成 49 環。</p> <p>(3)鎖固校正：鋼環片錨定片完成 129 環、鋼環片上部環片完成 108 環、鋼支保上部環片完成 49 環。</p> <p><b>112/2/16 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示至 2/11 工進如下</p> <p>(1)前置作業：鋼環片錨定片安裝完成 129 環、鋼支保錨定片安裝完成 53 環、鋼環片錨定片被填完成 129 環、鋼支保錨定片被填完成 53 環。</p> <p>(2)安裝作業：鋼環片上部安裝完成 120 環、鋼支保上部安裝完成 49 環。</p> <p>(3)鎖固校正：鋼環片錨定片完成 129 環、鋼環片上部環片完成 120 環、鋼支保上部環片完成 49 環。</p>				
<b>四</b>	工程進度表	遠雄	<p><b>112/2/2 會議</b></p> <p>1. 排煙測試審查：遠雄公司表示預計 2 月份開始進行巨蛋棟室內測試，3 月份進行戶外測試。</p> <p>2. 建照 4 變：已於 112/1/30 取得核准。請遠雄公司盡速完成後續相關五管變更審查。</p> <p>3. 目前工程進度說明(01/19~02/2)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：第五階段已完成，預計 2/10 進行第六階段 AC 鋪設及畫線。穿越管部分預計於燈會結束後再行繼續施作。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/2/28 完成。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 90%，器具部分預計於 112/3/15 全部完</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 02 月 17 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>成。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：配合動線圍籬地磚修改。</p> <p>(5) 每周進度表部分請將已完成項目反白，未完成項目反黃標示；請針對第 4 次變更需施作項目列出項目管控；另 MS020 及 MS040 請說明分階段竣工及使用執照範圍及控管時程。</p> <p><b>112/2/9 會議</b></p> <p>4. 排煙測試審查：遠雄公司表示實驗室測試項目已完成，2 月份開始進行巨蛋棟室內測試，3 月份進行戶外測試。</p> <p>5. 消防 4 變：預計 3 月中掛件審查，該部分影響第一階段掛件使照程序，請遠雄公司務必加速辦理。</p> <p>6. 性能 5 變：該部分主要為影響第二階段及第三階段使用執照掛件，遠雄公司目前預計 2 月中掛件審查。</p> <p>7. 分區使照：第一階段為 P 停車場、D 巨蛋、M 商場地上一、二層及地下層、B 辦公室 H 旅館 C 影城地上一層及地下層；第二階段為 M 商場地上三層至屋頂層；第三階段為 B 辦公室、H 旅館、C 影城地上二層至屋頂層；第四階段台電變電站。</p> <p>8. 由於目前工進已趨於竣工階段，為利掌控進度，請遠雄公司於下周三前將預定竣工及分期取得使用執照之期程，提具施工要徑及重要工項之管控里程碑進度表。</p> <p>9. 目前工程進度說明(02/3~02/9)：</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/2/28 完成。</p> <p>(7) 人工草皮：人工草皮本周已進場，配合煙控模擬測試完成後，再開始施作。</p> <p>(8) 南藝文廣場 ST-499 樓梯勘驗，預計 2/13 確認無後開始辦理相關勘驗文件程序。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 02 月 17 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p><b>112/2/16 會議</b></p> <p>10. 消防 4 變：預計 3 月中掛件審查，該部分影響第一階段掛件使照程序，請遠雄公司務必加速辦理。</p> <p>11. 目前工程進度說明(02/10~02/16)：</p> <p>(1) 人工草皮：人工草皮本周已進場，配合煙控模擬測試完成後，再開始施作。此部分請確認是否須於掛件使照前完成。</p> <p>(2) DM280 景觀結構工程：捷運廣場行人動線轉換後，進行剩餘結構體施作。此部分請遠雄公司加速辦理，須於使照掛件前完成。</p> <p>(3) 下沉式廣場煙控模擬區域，請整合機電、土建及煙控模擬執行進度，以利控管。</p> <p>(4) 使照取得前要徑工項進度表建議修正內容：請將影響申請使用執照施工項目整併納入；球場人工草皮施作時間是否可再提前；排煙性能現場試驗建議將室內巨蛋及下沉廣場試驗時間分別呈現、煙控試驗報告製作時程是否可再提前。</p> <p>12. 請遠雄巨蛋公司及大林組加緊督促廠商趕辦工程，以符能 4 月竣工及辦理使照掛件。</p>				
五	2023 燈會配合事項	遠雄	<p><b>112/1/7 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計農曆年前完成配合燈會動線圍籬修改及地磚修繕收尾。</p> <p>2. 預計 1/7 下午辦理燈會動線會勘，請遠雄公司協助相關人員出席會勘。</p> <p><b>112/1/12 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計農曆年前完成配合燈會動線圍籬修改及地磚修繕收尾。</p> <p><b>112/2/2 會議、112/2/9 會議、112/2/16 會議</b></p> <p>4. 因燈會處理事件都較為緊急，請遠雄公司再麻煩協助盡速回覆及辦理。</p>				
