


臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 481 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 10 月 7 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 2 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：110.10.7 第 481 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 15 分

110年10月7日第481次協調會議-參與視訊人員

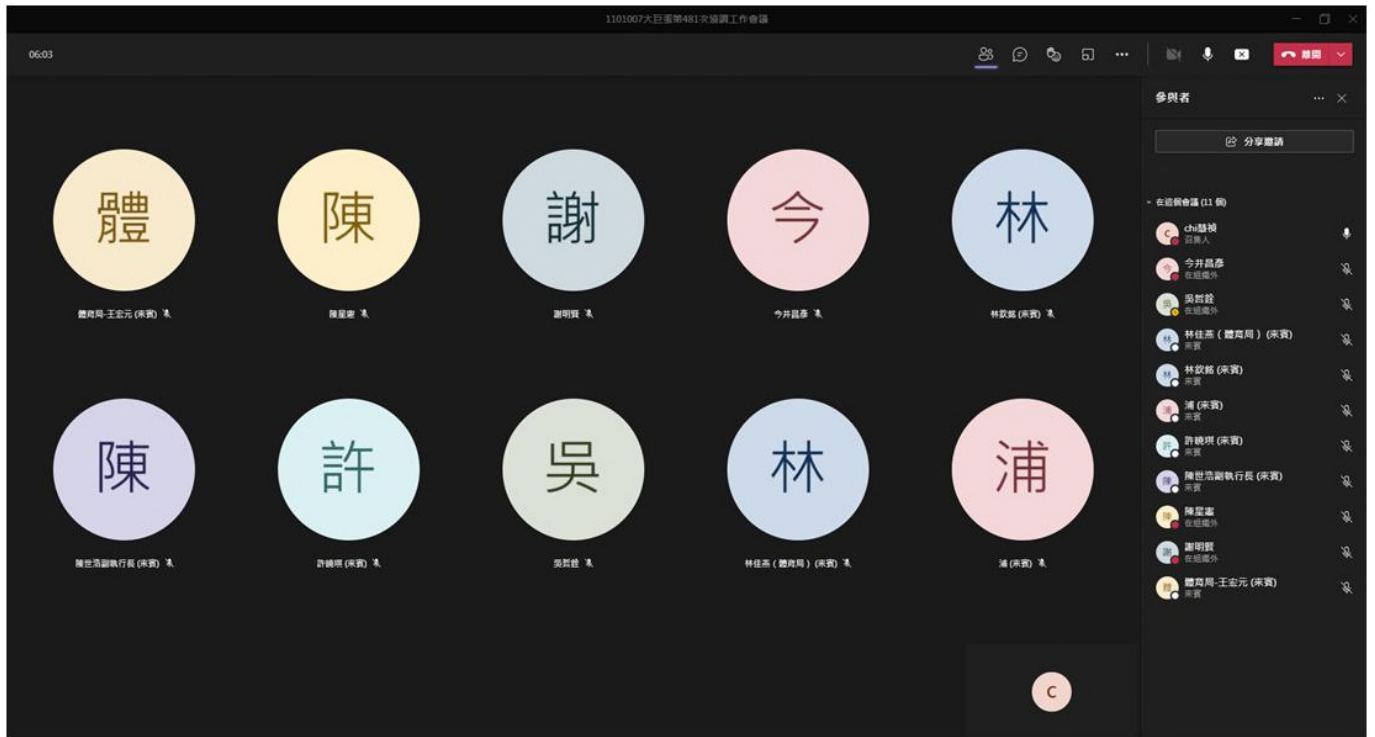

全名	使用者動作	時間戳記	
chi 慧禎	已加入	2021/10/7 下午 2:25:06	
體育局-王宏元 (來賓)	已加入	2021/10/7 下午 2:26:09	
陳星憲	已加入	2021/10/7 下午 2:26:19	
謝明賢	已加入	2021/10/7 下午 2:26:39	
今井昌彥	已加入	2021/10/7 下午 2:27:25	
林欽銘 (來賓)	已加入	2021/10/7 下午 2:28:02	
陳世浩副執行長 (來賓)	已加入	2021/10/7 下午 2:28:09	
陳世浩副執行長 (來賓)	已離開	2021/10/7 下午 2:41:52	
許曉琪 (來賓)	已加入	2021/10/7 下午 2:30:10	
吳哲銓	已加入	2021/10/7 下午 2:30:23	
林佳燕 (體育局) (來賓)	已加入	2021/10/7 下午 2:30:50	
浦 (來賓)	已加入	2021/10/7 下午 2:31:01	
陳世浩副執行長 (來賓)	已加入	2021/10/7 下午 2:41:24	

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年10月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>110/9/23 會議</p> <p>1. 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島 9/17 既有臨時 RC 結構打除，9/21 快慢分隔島下方邊溝延伸。(3)臨時人行通道改道：持續進行人行道地面順平及臨時照明等作業。</p> <p>110/9/30 會議</p> <p>2. 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島 9/26 快慢分隔島邊溝鋼筋綁紮、9/28RC。</p> <p>3. 有關光復南路地下引道及車行斜坡道區段工程，請遠雄公司確認若調整相關工項順序，可縮短之工期，且應該是在原交通維持計畫核定之工期內，待確認調整工項順序效益後，再協請籌備處召開會勘會議。</p> <p>4. 遠雄公司表示光復南路臨時通道不斷電系統已於 9/16 完成。</p> <p>110/10/7 會議</p> <p>5. 光復南路第二階段路型：(1)內側邊溝 10/5PC、10/6 放樣及鋼筋綁紮。</p> <p>6. 有關光復南路地下引道及車行斜坡道區段工程，請遠雄公司在確認於廠路增加範圍需要施作時程，若依第三階段及第四階段時程施作會影響總工期，請再盡速提出，再協請籌備處召開會勘會議。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>110/9/23 會議</p> <p>1. 於 9/23 辦理評選會議，由華麗邏輯藝術團隊獲勝。</p> <p>110/9/30 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示已於 9/23 完成評選會議，目前公司內部確認中。</p> <p>110/10/7 會議</p> <p>3. 已與得標藝術團隊召開討論會議，仍有部分須配合工地現況及裝修時程須調整，預計 10 月底召開鑑價會議。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年10月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	屋頂板折射	遠雄	<p>110/9/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計 9/27 辦理遴選，並邀請工研院、光復國小及體育局等單位參與評選。</p> <p>110/9/30 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示於 9/27 辦理遴選，因較適合 2 項材料部份試驗數據及技術需確認相關內容，目前公司內部討論中。請遠雄公司盡速完成確認，避免影響後續工進。</p> <p>110/10/7 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示內部討論中預計本周確認使用材料。仍請遠雄公司盡速完成確認，避免影響後續工進。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>110/9/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示 9/19~9/22 已進場施作環片裂縫修補，後續 9/23 及 9/24 因工單未核准無法下軌，9/25 工單已核准後續接續進場施工。第三階段修復計畫定稿本由於一工處尚未收迄函文，故捷運局尚未回覆備查函文。</p> <p>110/9/30 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示目前持續進場施作環片裂縫修補。第三階段修復計畫定稿版一工處已收訖簽核中。施工計畫預計本周先行提供捷運公司審查，待確認後再正式提送。</p> <p>3. 請遠雄公司盡速提供整個預定進場修補項目及預訂時程。</p> <p>110/10/7 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示目前持續進場施作環片裂縫修補，預計全案捷運隧道修補於 11/8 完成；施工計畫預計提送監造單位審查，後續由一工處複核。</p> <p>5. 該項目於歷次會議多次提醒遠雄公司加速辦理，依目前修補進度恐影響取得使用執照期程，請遠雄公司務必加速進度避免影響取得使用執照延後。</p>				
五	工程進度表	遠雄	110/9/23 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年10月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>1. 遠雄公司表示建照4變目前建管會辦相關單位中，高鐵及捷運局已回文無意見，文化局尚未回覆。變更性能防災審查評定書營建署審查中。環境影響評估差異已於8/27掛件，目前尚未收迄後續辦理程序。</p> <p>2. 目前工程進度說明(9/17~9/23)：</p> <p>(1) KF290 影城與商場區景觀鋪面工程：交維第二階段施工範圍內景觀結構體完成60%、商場西側厚磚鋪設進度10%。</p> <p>(2) KF280 影城與商場區植栽及排水工程：9/18回植完成25株、9/22接續OP車道回植。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島9/17既有臨時RC結構打除，9/21快慢分隔島下方邊溝延伸。(3)臨時人行通道改道：持續進行人行道地面順平及臨時照明等作業。</p> <p>110/9/30 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示建照4變目前建管會辦單位高鐵、捷運局及文化局已回文無意見，目前待環保局及變更性能審查評定確認後即可進行書審。變更性能防災審查評定書營建署已發文至建管處確認避難層認定一事。環境影響評估差異已於8/27掛件，目前尚未收迄後續辦理程序。</p> <p>4. 目前工程進度說明(9/24~9/30)：</p> <p>(1) KF290 影城與商場區景觀鋪面工程：交維第二階段施工範圍內景觀結構體完成61%、商場西側厚磚鋪設進度15%。</p> <p>(2) KF280 影城與商場區植栽及排水工程：OP車道9/24回植完成，9/25-9/26松菸區整地。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島9/26快慢分隔島邊溝鋼筋綁紮、9/28RC。(3)臨時人行通道改道：持續進行人行道地面順平及臨時照明等作業。</p> <p>(4) 遠雄公司表示球場座椅部分已大致完成，剩VIP及部分須配合施工工序位</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年10月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>置尚未安裝(約 300 餘張)。</p> <p>(5) 至 110.9.30 巨蛋棟 83%、商場棟 80%、影城棟 71%、辦公棟 92%、旅館棟 89%、道路為 58%、景觀 54%。</p> <p>5. 請遠雄公司下周會議說明光復南路地下引道各階段施工範圍及施工順序；工程進度表部分請增加重要裝修項目(影響取得使用執照之項目)。</p> <p>6. 有關 OP 車道範圍樹木已完成回植，請遠雄公司盡速提供相關資料，後續再由籌備處辦理會勘辦理移交。</p> <p>110/10/7 會議</p> <p>7. 遠雄公司表示建照 4 變之避難層認定部分，預計 10/14 與公會召開會議確認，預計 10/8 與建管對圖。環境影響評估差異已於 8/27 掛件，目前尚未收迄後續辦理程序。</p> <p>8. 目前工程進度說明(10/1~10/7)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：完成率 75%，施作巨蛋男廁結構、捷運廣場樓梯欄杆、鋪面結構中。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 5%。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：(1)內側邊溝 10/5PC、10/6 放樣及鋼筋綁紮。(3)臨時人行通道改道：持續進行人行道地面順平及臨時照明等作業。</p> <p>(4) 機電工程：目前無進度異常項目。請遠雄公司將灑水放水槍項目納入控管。</p> <p>(5) 土建工程：依目前預定進度部分影響使用執照掛件工項(如 RF 景觀植栽工程、巨蛋廁所裝修工程、巨蛋公共區裝修工程、巨蛋防火門工程、巨蛋鐵捲門工程)，預定完成時間似過晚，此部分請遠雄公司再與 JV 廠商檢討後再行修正。</p> <p>(6) 使照前/公部門行政審查項目：第 7 項及第 8 項請合併；第 10 項忠孝東路、光復南路、553 巷未開闢計畫道路竣工備查是否有列管請確認。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年10月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			9. 提醒遠雄公司使照前須完成相關公共設施修復證明及鄰損解列會勘，因行政程序時程較不可控，請提早辦理。				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p>110/9/2 會議</p> <p>1. 於 9/2 召開研商投資執行計畫營運收支預估資料，請遠雄公司在盡速完成修正投資計畫書。</p> <p>110/9/9 會議、110/9/16 會議、110/9/23 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示因地政分割戶調整，財務計畫需再重新調整，待完成後再行提送。</p> <p>110/9/30 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示因財務計畫仍尚在調整中，待完成後再行提送(預計 10 月份)。</p>				
