

中華民國 108 年
臺北市政府工務局
公共工程執行概況



臺北市政府工務局 編製

中華民國 109 年 3 月

說 明

- 一、本報告係應市議會第6屆第一次大會議員問政所需並按年彙編，報告內容呈現工務局所屬各工程處公共工程發包作業、執行績效概況。
- 二、本報告之資料來源為工務局所屬各工程處「108年各項工程發包及執行情形」年報表，以「工程採購」為統計標的，不含「勞務採購」。
- 三、報告中金額均指新臺幣。表內數字太長者酌予提高單位，因尾數四捨五入，故部分總數與細項間或有未能吻合情事，計算時仍以原始數據計算。
- 四、統計表中符號代表意義如下：
 - 「-」：經統計，但無數值。
 - 「0」：有數值，但數值不及半單位。
 - 「--」：無意義數值。
 - 「…」：數值不明或尚未產生資料。

目 次

壹、提要分析

一、概述	1
二、工程執行績效	7
三、工程決標月份	10

貳、統計表

表 1 公共工程發包及執行件數—按工程處分	11
表 2 公共工程發包及執行件數—按決標月分	12
表 3 公共工程已發包未開工件數—按決標月分	14
表 4 公共工程已開工未完工件數—按開工月分	14
表 5 公共工程已完工未驗收件數—按完工月分	15
表 6 公共工程已驗收未結清經費件數—按驗收月分	15
表 7 公共工程決標件數—按決標金額分	16
表 8 公共工程決標金額與底價差距	16
表 9 公共工程決標金額與底價差距比率	17
表 10 公共工程變更設計增減金額	17
表 11 公共工程變更設計增減金額與決標金額差距比率	18
表 12 公共工程待工日數	19
表 13 公共工程已開工件數—按預定完工年分	19

表 14	公共工程預定完工與實際完工日數差距	20
表 15	公共工程完工日數	21
表 16	公共工程驗收日與完工日差距	21
表 17	公共工程預算結餘金額	22
表 18	公共工程預算結餘與施工預算差距比率	22
表 19	公共工程已決算概況	23
表 20	公共工程已驗收未決算件數	23
表 21	公共工程執行績效	24
表 22	公共工程未開工明細表	25

壹、提要分析

一、概述

(一)108年工務局執行公共工程發包作業共計335件，預算規模196.8億元，決標金額176.5億元，分別較107年減少10件(-2.9%)、增加97.5億元(98.2%)及90.8億元(106%)。

108年臺北市政府工務局所屬各工程處執行公共工程發包作業¹共計335件，較107年減少10件(-2.9%)。各工程處以公園路燈工程管理處發包128件(占38.2%)為最多，其餘依序為水利工程處92件(占27.5%)、新建工程處73件(占21.8%)、大地工程處26件(占7.8%)及衛生下水道工程處16件(占4.8%)。(詳圖一、表三)


108年發包工程預算規模196.8億元為近五年次高，較107年增加97.5億元(98.2%)。各工程處預算規模以新工處152.7億元(占77.6%)最大，其餘依序為公園處17.7億元(占9%)、水利處13.3億元(占6.8%)、大地處7.5億元(占3.8%)及衛工處5.5億元(占2.8%)。平均每件工程預算金額依序為新工處2.1億元、衛工處3,447萬元、大地處2,901萬元、水利處1,445萬元及公園處1,386萬元。(詳圖二、表三)

108年發包工程決標金額176.5億元，較107年增加90.8億元(106%)，平均每件工程決標金額依序為新工處1.9億元、衛工處3,159萬元、大地處2,639萬元、水利處1,191萬元及公園處1,125萬元。決標占預算之標比²為89.7%，較107年上升3.4個百分點，其中以衛工處標比91.6%最高，其餘依序為新工處91.2%、大地處91%、水利處82.4%及公園處81.2%。(詳表一、表三)

¹ 發包工程總件數不含已決標但未開工即解約者，且以「工程採購」為統計標的，不含「勞務採購」。


² 標比=(決標金額 / 預算金額)×100%，其數值可反映發包單位對預算編列與廠商於市場競爭行為下之對價關係，標比過低可能隱含編列預算浮濫、不確實，或市場不當競爭、低價搶標。

圖一、公共工程發包件數

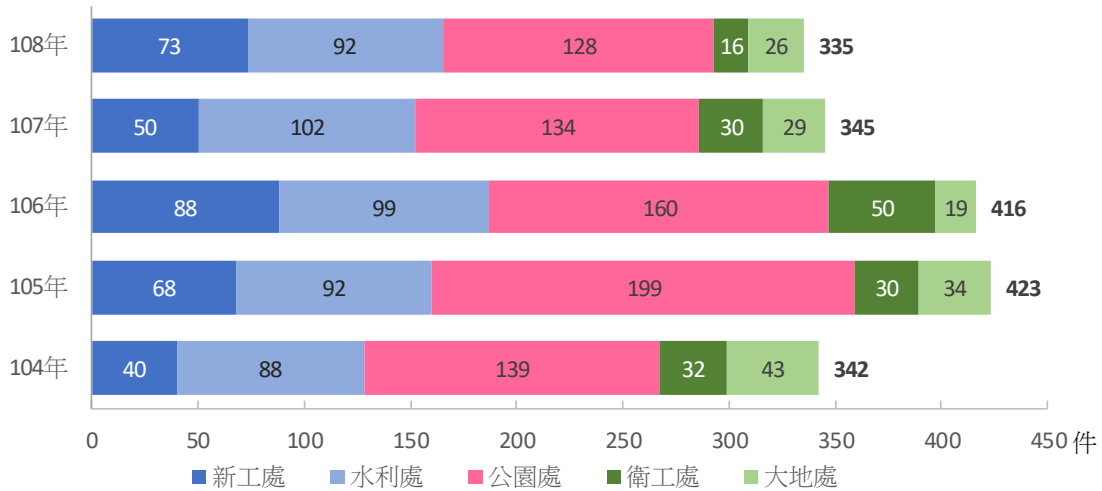

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

圖二、公共工程預算規模

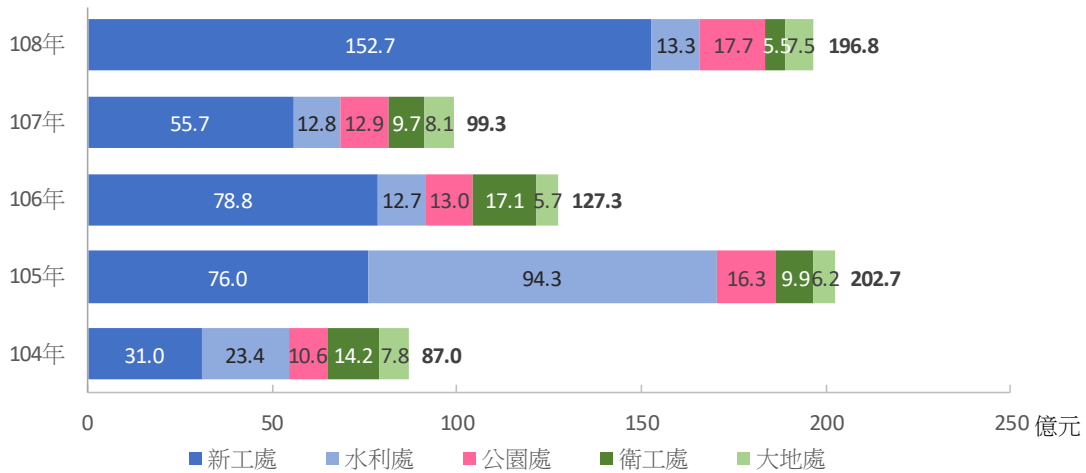

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表一、公共工程預算、決標金額與標比

工程處	108年			107年			108年較107年增減數		
	預算規模 (億)	決標金額 (億)	標比 (%)	預算規模 (億)	決標金額 (億)	標比 (%)	預算規模 (億)	決標金額 (億)	標比 (百分點)
總計	196.8	176.5	89.7	99.3	85.7	86.3	97.5	90.8	3.4
新工處	152.7	139.2	91.2	55.7	50.7	91.0	97.0	88.5	0.2
水利處	13.3	11.0	82.4	12.8	10.0	78.3	0.5	0.9	4.2
公園處	17.7	14.4	81.2	12.9	10.5	80.9	4.8	3.9	0.3
衛工處	5.5	5.1	91.6	9.7	8.5	87.6	-4.2	-3.4	4.1
大地處	7.5	6.9	91.0	8.1	5.9	73.3	-0.6	0.9	17.7

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

(二) 發包工程中有 98.2%以公開招標方式辦理，變更設計率³為 55.2%，較 107 年上升 3.3 個百分點。

就發包方式觀察，以公開招標方式辦理者 329 件(占 98.2%)為最多，限制性招標議價方式辦理計有 6 件。(詳表二)

所有工程中曾辦理變更設計者計 185 件，變更設計率為 55.2%，較 107 年上升 3.3 個百分點，平均約每 2 件發包工程有 1 件變更設計，以水利處變更設計率 71.7%為最高。(詳表二、表三)

(三) 開工率⁴94.3%，較 107 年上升 1.9 個百分點，以大地處 100%為最高。完工率⁵55.5%，較 107 年下降 0.1 個百分點，以大地處 80.8%最高。

就開工情形觀察，截至 108 年 12 月 31 日止已決標工程中，已開工施作者計 316 件，開工率 94.3%為近五年次低，較 107 年上升 1.9 個百分點，其中以大地處開工率達 100%為最高。未開工者計 19 件(占 5.7%)，分別為新工處 8 件、水利處 4 件、公園處 5 件、衛工處 2 件，其中 108 年 11 月以後決標者計 14 件，因辦理施工準備前置作業致未於年底前開工。(詳表二、表三、圖五)

就完工情形觀察，至 108 年底已完工者計 186 件，完工率 55.5%為近五年次低，較 107 年下降 0.1 個百分點，以大地處完工率 80.8%最高，其餘依序為公園處 73.4%、水利處 64.1%、衛工處 31.3%及新工處 9.6%；若排除預定跨年完工者，則衛工處及大地處完工績效皆為 100%，其餘依序為公園處 97.8%、水利處 89.4%及新工處 14.9%⁶。(詳表二、表三、圖三、圖五)

³ 變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100%。

⁴ 開工率=已開工件數/發包總件數×100%。

⁵ 完工率=已完工件數/發包總件數×100%。

⁶ 已開工工程中，預定 108 年完工者：

新工處計 47 件，其中 7 件(占 14.9%)已完工。

水利處計 66 件，其中 59 件(占 89.4%)已完工。

公園處計 91 件，其中 89 件(占 97.8%)已完工。

衛工處計 4 件，其中 4 件(占 100%)已完工。

大地處計 21 件，其中 21 件(占 100%)已完工。

已開工未完工工程計 130 件，加計未開工者 19 件，共計 149 件工程未完工（占 44.5%）。（詳表二）

表二、公共工程招標及執行概況

執行情形		104 年		105 年		106 年		107 年		108 年		108 年與 107 年比較			
		件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)	件數		百分比 (百分點)	
												增減數	增減%		
總 計		342	100.0	423	100.0	416	100.0	345	100.0	335	100.0	-10	-2.9	0.0	
招標方式	公開招標	321	93.9	397	93.9	411	98.8	338	98.0	329	98.2	-9	-2.7	0.2	
	限制性招標	議價	12	3.5	24	5.7	2	0.5	5	1.4	6	1.8	1	20.0	0.3
		比價	-	0.0	1	0.2	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	--	0.0
		公開評選	9	2.6	-	0.0	-	0.0	2	0.6	-	0.0	-2	-100.0	-0.6
	其他	-	0.0	1	0.2	3	0.7	-	0.0	-	0.0	-	--	0.0	
變更設計	無	184	53.8	218	51.5	201	48.3	166	48.1	150	44.8	-16	-9.6	-3.3	
	有	158	46.2	205	48.5	215	51.7	179	51.9	185	55.2	6	3.4	3.3	
開工情形	已開工	332	97.1	401	94.8	394	94.7	319	92.5	316	94.3	-3	-0.9	1.9	
	未開工	10	2.9	22	5.2	22	5.3	26	7.5	19	5.7	-7	-26.9	-1.9	
完工情形	已完工	193	56.4	245	57.9	227	54.6	192	55.7	186	55.5	-6	-3.1	-0.1	
	未完工	149	43.6	178	42.1	189	45.4	153	44.3	149	44.5	-4	-2.6	0.1	
驗收情形	已驗收	151	44.2	191	45.2	171	41.1	133	38.6	130	38.8	-3	-2.3	0.3	
	未驗收	191	55.8	232	54.8	245	58.9	212	61.4	205	61.2	-7	-3.3	-0.3	
決算情形	已決算	95	27.8	135	31.9	113	27.2	84	24.3	85	25.4	1	1.2	1.0	
	未決算	247	72.2	288	68.1	303	72.8	261	75.7	250	74.6	-11	-4.2	-1.0	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表三、公共工程決標及執行概況—按工程處分

108 年


工程處	發包工程		預算			決標			變更設計率 ① (%)	開工率 ② (%)	完工率 ③ (%)	驗收率 ④ (%)
	件數 (件)	結構比 (%)	金額 (億元)	結構比 (%)	平均每件工程金額 (萬元)	金額 (億元)	結構比 (%)	平均每件工程金額 (萬元)				
總 計	335	100.0	196.8	100.0	5,874	176.5	100.0	5,269	55.2	94.3	55.5	38.8
新工處	73	21.8	152.7	77.6	20,918	139.2	78.9	19,074	47.9	89.0	9.6	1.4
水利處	92	27.5	13.3	6.8	1,445	11.0	6.2	1,191	71.7	95.7	64.1	29.3
公園處	128	38.2	17.7	9.0	1,386	14.4	8.2	1,125	50.0	96.1	73.4	64.1
衛工處	16	4.8	5.5	2.8	3,447	5.1	2.9	3,159	56.3	87.5	31.3	6.3
大地處	26	7.8	7.5	3.8	2,901	6.9	3.9	2,639	42.3	100.0	80.8	73.1

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：①變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100%、②開工率=已開工件數/發包總件數×100%、

③完工率=已完工件數/發包總件數×100%、④驗收率=已驗收件數/發包總件數×100%。

圖三、當年實際完工占預定當年完工開工件數比率

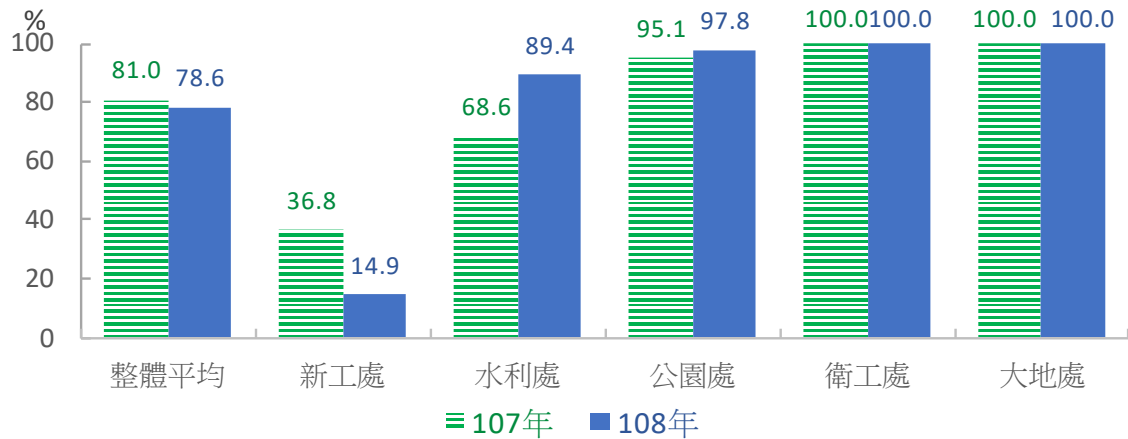

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：比率=當年完工件數/預定當年完工且已開工件數×100%。

(四) 驗收率⁷38.8%為近五年次低，較 107 年上升 0.3 個百分點。已驗收並辦理工程決算比率 25.4%，較 107 年上升 1 個百分點。

就驗收情形觀察，已完工並辦理驗收程序者計 130 件，驗收率 38.8%為近五年次低，較 107 年上升 0.3 個百分點，以大地處驗收率 73.1%最高，其餘依序為公園處 64.1%、水利處 29.3%、衛工處 6.3%及新工處 1.4%。若排除預定跨年完工者，則大地處 90.5%最高，公園處 86.8%次之，其餘為水利處 40.9%、衛工處 25%及新工處 2.1%⁸。(詳表二、表三、圖四、圖五)

已完工未驗收工程計 56 件，加計未完工者，共計 205 件未辦理驗收 (占 61.2%)。(詳表二)

就決算情形觀察，已驗收並辦理工程決算者計 85 件 (占 25.4%)，已驗收尚未辦理決算 45 件，加計未驗收者，共計 250 件未辦理工程決算 (占 74.6%)。(詳表二)

⁷ 驗收率=已驗收件數/發包總件數×100%。

⁸ 已開工工程中，預定 108 年完工者：

新工處計 47 件，其中 1 件(占 2.1%)已驗收。


水利處計 66 件，其中 27 件(占 40.9%)已驗收。

公園處計 91 件，其中 79 件(占 86.8%)已驗收。

衛工處計 4 件，其中 1 件(占 25%)已驗收。


大地處計 21 件，其中 19 件(占 90.5%)已驗收。

圖四、當年驗收占預定當年完工開工件數比率

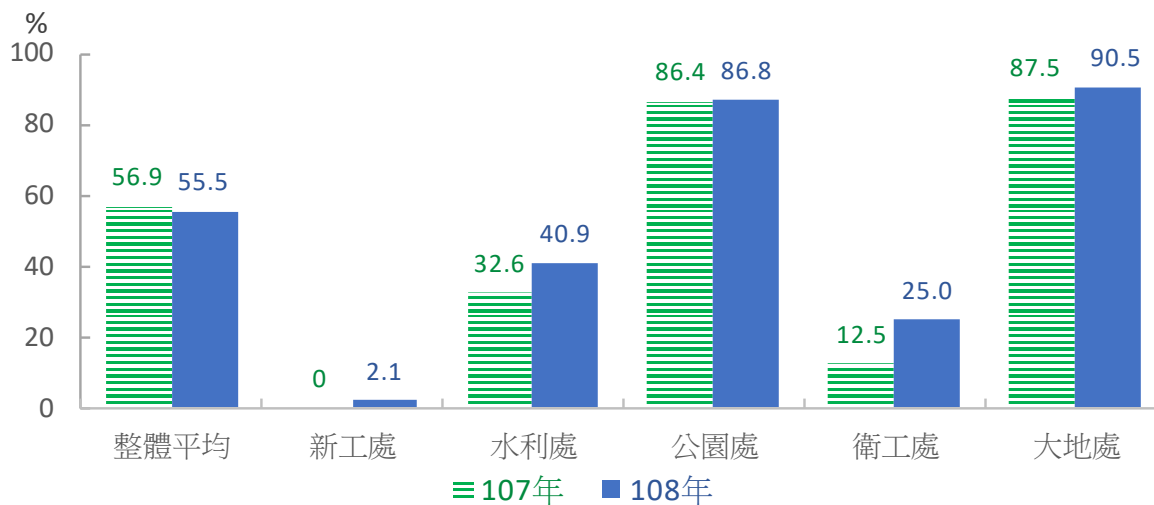

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。
 說明：比率=當年驗收件數/預定當年完工且已開工件數×100%。

圖五、公共工程執行績效變動分析

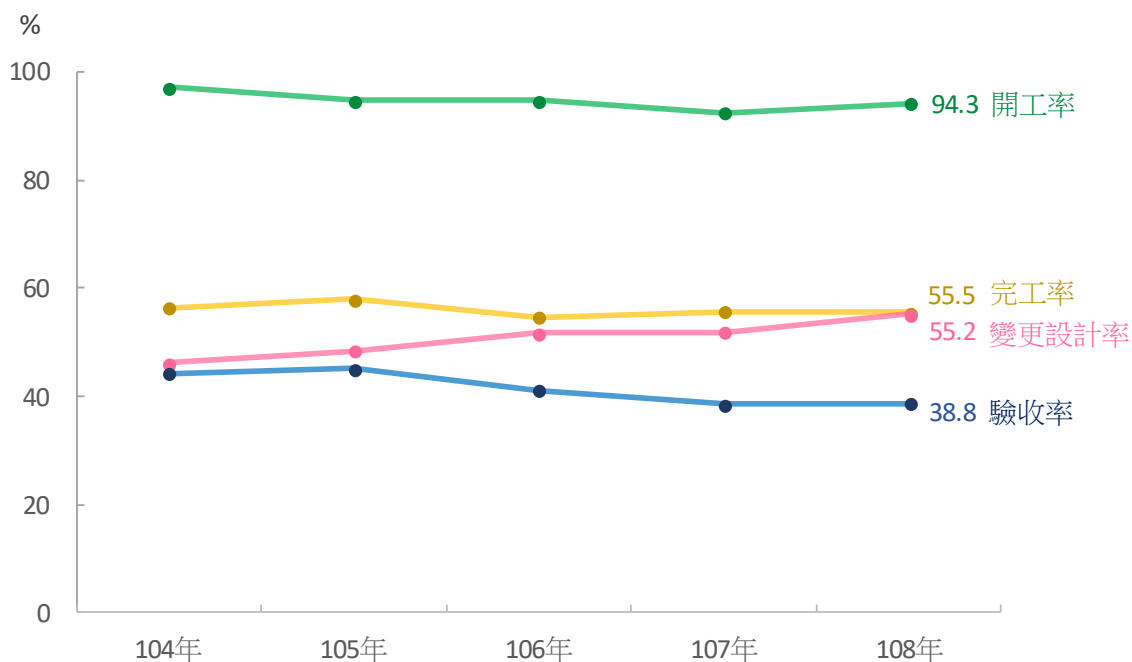

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

二、工程執行績效

公共工程執行績效分為「開工績效」、「完工績效」及「驗收績效」等 3 部分：

開工績效：以工程開工日與決標日之差距日數為待工日數表示，待工日數愈少者表示績效愈佳。

完工績效：以工程預定完工日期與實際完工日期之差距日數表示，差距愈大表示提早完工日數愈多，績效愈佳，數值為負數則為延期完工。

驗收績效：以完工後至完成驗收程序所需日數表示，驗收日數愈少表示驗收績效愈佳。

(一) 大地處開工率 100%最高，衛工處 87.5%最低。平均每件工程待工日數以大地處 24.8 日最短，水利處 72.7 日最長。

108 年工務局執行公共工程平均開工率為 94.3%，以大地處 100%最高，其餘依序為公園處 96.1%、水利處 95.7%、新工處 89%及衛工處 87.5%。(詳表三、圖六)

開工績效方面，108 年已開工工程中，平均每件工程待工日數為 51 日，以大地處 24.8 日最短，水利處 72.7 日最長。(詳圖七、圖八)

(二) 大地處完工率 80.8%最高，新工處 9.6%最低。公園處平均每件工程提早 25.5 日完工，提早最多，新工處提早 1.3 日最少。

108 年工務局執行公共工程平均完工率為 55.5%，其中大地處 80.8%、公園處 73.4%及水利處 64.1%超過整體平均值，其餘依序為衛工處 31.3%及新工處 9.6%。(詳表三、圖六)

完工績效方面，108 年已完工者中，平均每件工程提早完工日數為 18.1 日，以公園處平均提早完工 25.5 日最多，其餘依序為大地處 22.2 日、水利處 8.1 日、衛工處 2.4 日及新工處 1.3 日。（詳圖七、圖八）


若依工程性質觀察，在整建工程中，以公園處提早 23 日完工績效最佳，新建工程亦以公園處提早 38.1 日完工績效最佳。（詳表四）

（三）大地處驗收率 73.1%最高，新工處 1.4%最低。公園處平均每件工程驗收日數 20.7 日最短，新工處 106 日最長。

108 年已完工工程平均驗收率為 38.8%，以大地處驗收率 73.1%為最高，其餘依序為公園處 64.1%、水利處 29.3%、衛工處 6.3%及新工處 1.4%。（詳表三、圖六）

在驗收績效方面，平均每件工程驗收日數為 24.1 日，以公園處 20.7 日最短，其餘依序為大地處 21.8 日、水利處 32.5 日及衛工處 34 日及新工處 106 日。（詳圖七、圖八）


圖六、公共工程開工、完工及驗收情形

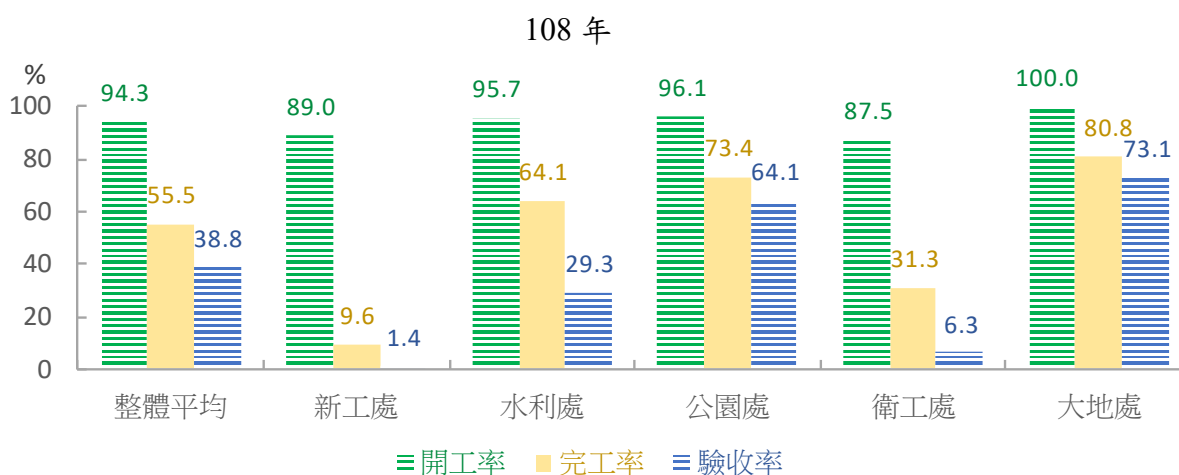

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。


圖七、公共工程執行情形－按工程處分

108年

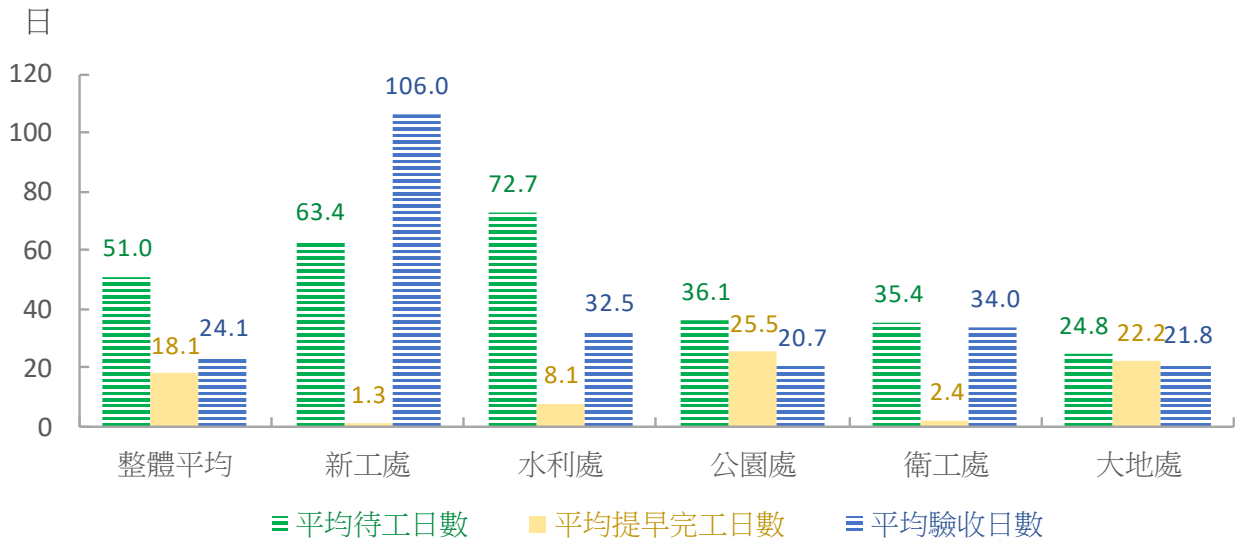

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。
 說明：平均提早完工日數為負數，係指延遲完工日數。

圖八、公共工程執行情形

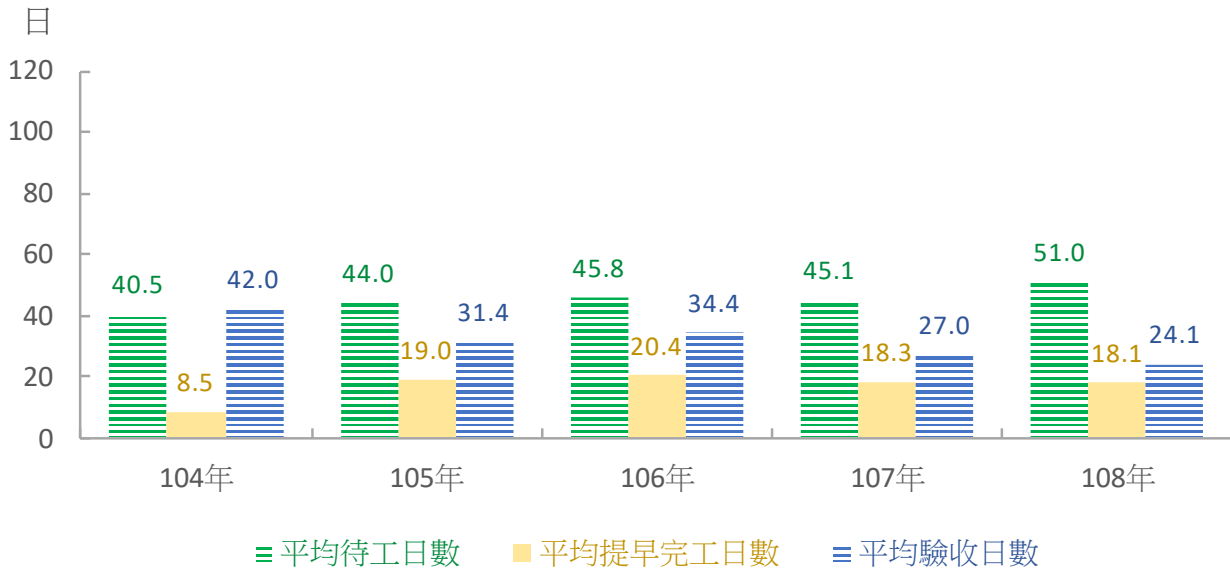

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表四、公共工程完工績效—按工程性質分

108 年

工程性質	總 計	新工處	水利處	公園處	衛工處	大地處
已完工件數(件)	186	7	59	94	5	21
預約維護工程	77	2	35	24	2	14
整建工程	99	3	24	63	2	7
新建工程	10	2	-	7	1	-
完工率(%)	55.5	9.6	64.1	73.4	31.3	80.8
預約維護工程	53.1	4.4	72.9	80.0	28.6	93.3
整建工程	63.5	21.4	54.5	76.8	33.3	70.0
新建工程	29.4	14.3	--	43.8	33.3	0.0
平均提早完工日數(日)	18.1	1.3	8.1	25.5	2.4	22.2
預約維護工程	27.4	0.5	28.4	28.4	0.0	30.8
整建工程	9.9	2.7	-21.6	23.0	6.0	5.0
新建工程	26.7	0.0	--	38.1	0.0	--

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

三、工程決標月份

335 件決標工程中，以 3 月決標 80 件(占 23.9%)最多，有 77.3% 的工程在上半年決標。

108 年決標之 335 件公共工程中，有 259 件(占 77.3%) 在上半年決標；若按決標月分析，以 3 月決標 80 件(占 23.9%) 最多，1 月決標 67 件(占 20%) 次之，10 月決標 7 件(占 2.1%) 最少。(詳統計表-表 2)

統計表

表1 公共工程發包及執行件數－按工程處分

108年

單位：件；%

執行情形		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處		
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	
總計		335	100.0	73	100.0	92	100.0	128	100.0	16	100.0	26	100.0	
發包方式	公開招標	329	98.2	68	93.2	91	98.9	128	100.0	16	100.0	26	100.0	
	限制性招標	議價	6	1.8	5	6.8	1	1.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0
		比價	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
		公開評選	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
	其他	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
變更設計	無	150	44.8	38	52.1	26	28.3	64	50.0	7	43.8	15	57.7	
	有	185	55.2	35	47.9	66	71.7	64	50.0	9	56.3	11	42.3	
開工情形	已開工	316	94.3	65	89.0	88	95.7	123	96.1	14	87.5	26	100.0	
	未開工	19	5.7	8	11.0	4	4.3	5	3.9	2	12.5	-	0.0	
完工情形	已完工	186	55.5	7	9.6	59	64.1	94	73.4	5	31.3	21	80.8	
	未完工①	149	44.5	66	90.4	33	35.9	34	26.6	11	68.8	5	19.2	
驗收情形	已驗收	130	38.8	1	1.4	27	29.3	82	64.1	1	6.3	19	73.1	
	未驗收②	205	61.2	72	98.6	65	70.7	46	35.9	15	93.8	7	26.9	
決算情形	已決算	85	25.4	-	0.0	6	6.5	77	60.2	1	6.3	1	3.8	
	未決算③	250	74.6	73	100.0	86	93.5	51	39.8	15	93.8	25	96.2	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

附註：①未完工工程中，已開工者計 130 件。

②未驗收工程中，已完工者計 56 件。

③未決算工程中，已驗收者計 45 件。

表2 公共工程發包及執行件數—按決標月分

108年

單位：件；%

執行情形		總計	1-6月 小計	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
總計	件數	335	259	67	52	80	29	18	13		
	百分比	100.0	77.3	20.0	15.5	23.9	8.7	5.4	3.9		
發包方式	公開招標	件數	329	258	66	52	80	29	18	13	
		百分比	100.0	78.4	20.1	15.8	24.3	8.8	5.5	4.0	
	限制性招標	議價	件數	6	1	1	-	-	-	-	-
			百分比	100.0	16.7	16.7	-	-	-	-	-
		比價	件數	-	-	-	-	-	-	-	-
			百分比	-	-	-	-	-	-	-	-
	公開評選	件數	-	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	-	
	其他	件數	-	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	-	
開工情形	已開工	件數	316	257	67	52	79	29	18	12	
		百分比	100.0	81.3	21.2	16.5	25.0	9.2	5.7	3.8	
	未開工	件數	19	2	-	-	1	-	-	1	
		百分比	100.0	10.5	-	-	5.3	-	-	5.3	
完工情形	已完工	件數	186	173	56	36	51	16	11	3	
		百分比	100.0	93.0	30.1	19.4	27.4	8.6	5.9	1.6	
	未完工	件數	149	86	11	16	29	13	7	10	
		百分比	100.0	57.7	7.4	10.7	19.5	8.7	4.7	6.7	
驗收情形	已驗收	件數	130	128	47	34	33	7	7	-	
		百分比	100.0	98.5	36.2	26.2	25.4	5.4	5.4	-	
	未驗收	件數	205	131	20	18	47	22	11	13	
		百分比	100.0	63.9	9.8	8.8	22.9	10.7	5.4	6.3	
決算情形	已決算	件數	85	84	36	26	16	5	1	-	
		百分比	100.0	98.8	42.4	30.6	18.8	5.9	1.2	-	
	未決算	件數	250	175	31	26	64	24	17	13	
		百分比	100.0	70.0	12.4	10.4	25.6	9.6	6.8	5.2	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表2 公共工程發包及執行件數—按決標月分（續）

108年

單位：件；%

執行情形		7-12月 小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
總計	件數	76	23	18	9	7	9	10	
	百分比	22.7	6.9	5.4	2.7	2.1	2.7	3.0	
發包方式	公開招標	件數	71	21	16	9	7	9	
		百分比	21.6	6.4	4.9	2.7	2.1	2.7	
	限制性招標	議價	件數	5	2	2	-	-	1
			百分比	83.3	33.3	33.3	-	-	16.7
		比價	件數	-	-	-	-	-	-
			百分比	-	-	-	-	-	-
	公開評選	件數	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	
	其他	件數	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	
開工情形	已開工	件數	59	22	17	9	6	5	
		百分比	18.7	7.0	5.4	2.8	1.9	1.6	
	未開工	件數	17	1	1	-	1	4	
		百分比	89.5	5.3	5.3	-	5.3	21.1	
完工情形	已完工	件數	13	8	1	1	2	1	
		百分比	7.0	4.3	0.5	0.5	1.1	0.5	
	未完工	件數	63	15	17	8	5	8	
		百分比	42.3	10.1	11.4	5.4	3.4	5.4	
驗收情形	已驗收	件數	2	1	-	1	-	-	
		百分比	1.5	0.8	-	0.8	-	-	
	未驗收	件數	74	22	18	8	7	9	
		百分比	36.1	10.7	8.8	3.9	3.4	4.4	
決算情形	已決算	件數	1	1	-	-	-	-	
		百分比	1.2	1.2	-	-	-	-	
	未決算	件數	75	22	18	9	7	9	
		百分比	30.0	8.8	7.2	3.6	2.8	3.6	

表3 公共工程已發包未開工件數—按決標月分

108年

單位：件；%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	19	100.0	8	100.0	4	100.0	5	100.0	2	100.0	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	1	5.3	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	1	5.3	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-
7月	1	5.3	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-
8月	1	5.3	-	-	-	-	-	-	1	50.0	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	1	5.3	1	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	4	21.1	2	25.0	1	25.0	1	20.0	-	-	-	-
12月	10	52.6	5	62.5	1	25.0	4	80.0	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表4 公共工程已開工未完工件數—按開工月分

108年

單位：件；%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	130	100.0	58	100.0	29	100.0	29	100.0	9	100.0	5	100.0
1月	1	0.8	-	-	-	-	1	3.4	-	-	-	-
2月	5	3.8	-	-	-	-	5	17.2	-	-	-	-
3月	4	3.1	1	1.7	-	-	2	6.9	1	11.1	-	-
4月	28	21.5	24	41.4	1	3.4	2	6.9	-	-	1	20.0
5月	14	10.8	11	19.0	-	-	2	6.9	-	-	1	20.0
6月	14	10.8	7	12.1	1	3.4	-	-	5	55.6	1	20.0
7月	12	9.2	3	5.2	4	13.8	2	6.9	3	33.3	-	-
8月	10	7.7	-	-	3	10.3	7	24.1	-	-	-	-
9月	9	6.9	4	6.9	3	10.3	2	6.9	-	-	-	-
10月	15	11.5	3	5.2	10	34.5	1	3.4	-	-	1	20.0
11月	9	6.9	1	1.7	7	24.1	1	3.4	-	-	-	-
12月	9	6.9	4	6.9	-	-	4	13.8	-	-	1	20.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表5 公共工程已完工未驗收件數—按完工月分

108年

單位：件，%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	56	100.0	6	100.0	32	100.0	12	100.0	4	100.0	2	100.0
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	1	1.8	1	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	2	3.6	1	16.7	1	3.1	-	-	-	-	-	-
11月	6	10.7	1	16.7	3	9.4	2	16.7	-	-	-	-
12月	47	83.9	3	50.0	28	87.5	10	83.3	4	100.0	2	100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表6 公共工程已驗收未結清經費件數—按驗收月分

108年

單位：件，%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	45	100.0	1	100.0	21	100.0	5	100.0	-	-	18	100.0
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	1	2.2	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	4	8.9	-	-	4	19.0	-	-	-	-	-	-
9月	2	4.4	-	-	1	4.8	-	-	-	-	1	5.6
10月	1	2.2	-	-	1	4.8	-	-	-	-	-	-
11月	7	15.6	-	-	6	28.6	1	20.0	-	-	-	-
12月	30	66.7	-	-	9	42.9	4	80.0	-	-	17	94.4

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表7 公共工程決標件數—按決標金額分

108年

單位：件；%

決標金額	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	335	100.0	73	100.0	92	100.0	128	100.0	16	100.0	26	100.0
100萬元以下	14	4.2	2	2.7	8	8.7	4	3.1	-	-	-	-
100-500萬元	91	27.2	8	11.0	42	45.7	40	31.3	-	-	1	3.8
500-1,000萬元	89	26.6	12	16.4	20	21.7	51	39.8	2	12.5	4	15.4
1,000-5,000萬元	107	31.9	29	39.7	19	20.7	27	21.1	12	75.0	20	76.9
5,000萬-1億元	14	4.2	6	8.2	1	1.1	6	4.7	1	6.3	-	-
1億元以上	20	6.0	16	21.9	2	2.2	-	-	1	6.3	1	3.8

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表8 公共工程決標金額與底價差距

108年

單位：件；%

差距金額	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	335	100.0	73	100.0	92	100.0	128	100.0	16	100.0	26	100.0
超底價決標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0元	82	24.5	7	9.6	23	25.0	33	25.8	-	-	19	73.1
10萬元以下	57	17.0	14	19.2	16	17.4	24	18.8	-	-	3	11.5
10-50萬元	37	11.0	9	12.3	14	15.2	11	8.6	2	12.5	1	3.8
50-100萬元	44	13.1	8	11.0	12	13.0	21	16.4	2	12.5	1	3.8
100-500萬元	95	28.4	23	31.5	24	26.1	36	28.1	10	62.5	2	7.7
500-1,000萬元	13	3.9	7	9.6	2	2.2	3	2.3	1	6.3	-	-
1,000-5,000萬元	7	2.1	5	6.8	1	1.1	-	-	1	6.3	-	-
5,000萬元以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為決標金額與底價相同。

表9 公共工程決標金額與底價差距比率

108年

單位：件；%

金額差距比率		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計		335	100.0	73	100.0	92	100.0	128	100.0	16	100.0	26	100.0
超底價決標	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	超過底價20%以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	超過底價10%-20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	超過底價小於10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
與底價相同決標		82	24.5	7	9.6	23	25.0	33	25.8	-	-	19	73.1
低於底價決標	小計	253	75.5	66	90.4	69	75.0	95	74.2	16	100.0	7	26.9
	低於底價10%	126	37.6	41	56.2	26	28.3	41	32.0	12	75.0	6	23.1
	低於底價10%-20%	61	18.2	15	20.5	22	23.9	23	18.0	1	6.3	-	-
	低於底價20%-30%	42	12.5	9	12.3	16	17.4	13	10.2	3	18.8	1	3.8
	低於底價30%-40%	15	4.5	1	1.4	3	3.3	11	8.6	-	-	-	-
	低於底價40%-50%	8	2.4	-	-	1	1.1	7	5.5	-	-	-	-
低於底價50%以上		1	0.3	-	-	1	1.1	-	-	-	-	-	-
最低決標與底價比率(%)		47.2		66.8		47.2		53.4		73.0		79.7	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表10 公共工程變更設計增減金額

108年

單位：件；%

增減金額		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計		185	100.0	35	100.0	66	100.0	64	100.0	9	100.0	11	100.0
0元		20	10.8	6	17.1	10	15.2	-	-	3	33.3	1	9.1
追加工程經費	小計	145	78.4	24	68.6	50	75.8	57	89.1	6	66.7	8	72.7
	10萬元以下	8	4.3	-	-	1	1.5	7	10.9	-	-	-	-
	10-50萬元	29	15.7	-	-	13	19.7	15	23.4	1	11.1	-	-
	50-100萬元	23	12.4	-	-	10	15.2	11	17.2	1	11.1	1	9.1
	100-500萬元	55	29.7	12	34.3	18	27.3	19	29.7	2	22.2	4	36.4
	500-1,000萬元	20	10.8	6	17.1	5	7.6	5	7.8	1	11.1	3	27.3
	1,000-5,000萬元	9	4.9	5	14.3	3	4.5	-	-	1	11.1	-	-
5,000萬元以上		1	0.5	1	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-
追減工程經費		20	10.8	5	14.3	6	9.1	7	10.9	-	-	2	18.2

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為雖有變更設計但無追加減工程經費。

表11 公共工程變更設計增減金額與決標金額差距比率

108年

單位：件；%

金額差距比率		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計		185	100.0	35	100.0	66	100.0	64	100.0	9	100.0	11	100.0
追加 工程 經費	合計	145	78.4	24	68.6	50	75.8	57	89.1	6	66.7	8	72.7
	增加50%以上	38	20.5	7	20.0	19	28.8	10	15.6	1	11.1	1	9.1
	增加40%~50%	8	4.3	2	5.7	2	3.0	3	4.7	-	-	1	9.1
	增加30%~40%	10	5.4	2	5.7	3	4.5	4	6.3	1	11.1	-	-
	增加20%~30%	15	8.1	3	8.6	3	4.5	5	7.8	2	22.2	2	18.2
	增加10%~20%	28	15.1	6	17.1	9	13.6	12	18.8	-	-	1	9.1
	增加10%以內	46	24.9	4	11.4	14	21.2	23	35.9	2	22.2	3	27.3
無追加減經費		20	10.8	6	17.1	10	15.2	-	-	3	33.3	1	9.1
追減 工程 經費	合計	20	10.8	5	14.3	6	9.1	7	10.9	-	-	2	18.2
	追減10%以內	10	5.4	3	8.6	-	-	5	7.8	-	-	2	18.2
	追減10%~20%	3	1.6	1	2.9	1	1.5	1	1.6	-	-	-	-
	追減20%~30%	2	1.1	1	2.9	-	-	1	1.6	-	-	-	-
	追減30%~40%	1	0.5	-	-	1	1.5	-	-	-	-	-	-
	追減40%~50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
追減50%以上		4	2.2	-	-	4	6.1	-	-	-	-	-	-
增加經費占決標金額 比率最大者(%)		325.5		153.8		325.5		192.8		92.0		89.6	
追減經費占決標金額 比率最大者(%)		-103.1		-24.9		-103.1		-21.8		-		-7.1	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表12 公共工程待工日數

108年

單位：件；%

待工日數	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	316	100.0	65	100.0	88	100.0	123	100.0	14	100.0	26	100.0
0日	2	0.6	-	-	1	1.1	1	0.8	-	-	-	-
1-14日	19	6.0	3	4.6	2	2.3	9	7.3	-	-	5	19.2
15-29日	85	26.9	1	1.5	9	10.2	55	44.7	6	42.9	14	53.8
30-44日	67	21.2	16	24.6	15	17.0	30	24.4	1	7.1	5	19.2
45-59日	49	15.5	16	24.6	18	20.5	7	5.7	7	50.0	1	3.8
60-74日	38	12.0	10	15.4	16	18.2	11	8.9	-	-	1	3.8
75-89日	28	8.9	10	15.4	13	14.8	5	4.1	-	-	-	-
90日以上	28	8.9	9	13.8	14	15.9	5	4.1	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.待工日數為工程決標與開工日期之差距日數。

2.「0日」為決標當日即開工之工程。

3.其他為因應緊急需要先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

4.最大差距日數為 225 日，待工超過100日以上者計 26 件。

5.已決標未開工者計 19 件。

表13 公共工程已開工件數－按預定完工年分

108年

單位：件；%

完工年	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	316	100.0	65	100.0	88	100.0	123	100.0	14	100.0	26	100.0
108年完工	229	72.5	47	72.3	66	75.0	91	74.0	4	28.6	21	80.8
109年完工	75	23.7	7	10.8	22	25.0	32	26.0	10	71.4	4	15.4
110年完工	4	1.3	3	4.6	-	-	-	-	-	-	1	3.8
111年完工	5	1.6	5	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-
112年完工	3	0.9	3	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表14 公共工程預定完工與實際完工日數差距

108年

單位：件；%

差距日數		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計		186	100.0	7	100.0	59	100.0	94	100.0	5	100.0	21	100.0
提早完工日數	合計	136	73.1	3	42.9	34	57.6	79	84.0	2	40.0	18	85.7
	180日以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150-179日	3	1.6	-	-	1	1.7	2	2.1	-	-	-	-
	120-149日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90-119日	4	2.2	-	-	2	3.4	2	2.1	-	-	-	-
	60-89日	7	3.8	-	-	3	5.1	2	2.1	-	-	2	9.5
	30-59日	38	20.4	-	-	2	3.4	33	35.1	-	-	3	14.3
	1-29日	84	45.2	3	42.9	26	44.1	40	42.6	2	40.0	13	61.9
0日		29	15.6	4	57.1	12	20.3	8	8.5	3	60.0	2	9.5
延遲完工日數	合計	21	11.3	-	-	13	22.0	7	7.4	-	-	1	4.8
	1-29日	12	6.5	-	-	6	10.2	5	5.3	-	-	1	4.8
	30-59日	7	3.8	-	-	5	8.5	2	2.1	-	-	-	-
	60-89日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90-119日	1	0.5	-	-	1	1.7	-	-	-	-	-	-
	120-149日	1	0.5	-	-	1	1.7	-	-	-	-	-	-
	150-179日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180日以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提早完工最多日數(日)		169		6		169		168		8		74	
延遲完工最多日數(日)		129		0		129		53		0		2	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0日為預定完工日當日完工者。

表15 公共工程完工日數

108年

單位：件；%

完工日數	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	186	100.0	7	100.0	59	100.0	94	100.0	5	100.0	21	100.0
0-59日	13	7.0	2	28.6	4	6.8	7	7.4	-	-	-	-
60-119日	34	18.3	2	28.6	18	30.5	13	13.8	-	-	1	4.8
120-179日	24	12.9	1	14.3	16	27.1	4	4.3	1	20.0	2	9.5
180-239日	41	22.0	2	28.6	12	20.3	11	11.7	2	40.0	14	66.7
240-299日	69	37.1	-	-	9	15.3	54	57.4	2	40.0	4	19.0
300-359日	5	2.7	-	-	-	-	5	5.3	-	-	-	-
360日以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表16 公共工程驗收日與完工日差距

108年

單位：件；%

差距日數	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	130	100.0	1	100.0	27	100.0	82	100.0	1	100.0	19	100.0
0日	4	3.1	-	-	-	-	4	4.9	-	-	-	-
1-14日	42	32.3	-	-	8	29.6	29	35.4	-	-	5	26.3
15-29日	47	36.2	-	-	5	18.5	33	40.2	-	-	9	47.4
30-44日	21	16.2	-	-	8	29.6	8	9.8	1	100.0	4	21.1
45-59日	11	8.5	-	-	3	11.1	7	8.5	-	-	1	5.3
60-74日	3	2.3	-	-	2	7.4	1	1.2	-	-	-	-
75-89日	1	0.8	-	-	1	3.7	-	-	-	-	-	-
90日以上	1	0.8	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
完成驗收需要最多日數(日)	106		106		88		71		34		48	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.「0日」為工程完工日即完成驗收程序者。

2.最大差距日數為106日，差距超過100日以上者計有1件。

3.已完工未驗收者計56件。

表17 公共工程預算結餘金額

108年

單位：件；%

結餘金額	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	85	100.0	-	-	6	100.0	77	100.0	1	100.0	1	100.0
無經費結餘	1	1.2	-	-	1	16.7	-	-	-	-	-	-
10萬元以下	15	17.6	-	-	2	33.3	13	16.9	-	-	-	-
10-50萬元	30	35.3	-	-	1	16.7	29	37.7	-	-	-	-
50-100萬元	21	24.7	-	-	1	16.7	20	26.0	-	-	-	-
100-500萬元	18	21.2	-	-	1	16.7	15	19.5	1	100.0	1	100.0
500-1,000萬元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,000-5,000萬元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,000萬元以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工程經費剩餘最多金額(萬元)	345		-		105		345		100		218	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表18 公共工程預算結餘與施工預算差距比率

108年

單位：件；%

金額差距比率	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	85	100.0	-	-	6	100.0	77	100.0	1	100.0	1	100.0
無預算結餘	1	1.2	-	-	1	16.7	-	-	-	-	-	-
結餘10%以下	56	65.9	-	-	3	50.0	52	67.5	1	100.0	-	-
結餘10%~20%	13	15.3	-	-	-	-	12	15.6	-	-	1	100.0
結餘20%~30%	4	4.7	-	-	1	16.7	3	3.9	-	-	-	-
結餘30%~40%	3	3.5	-	-	-	-	3	3.9	-	-	-	-
結餘40%~50%	1	1.2	-	-	-	-	1	1.3	-	-	-	-
結餘50%~60%	3	3.5	-	-	1	16.7	2	2.6	-	-	-	-
結餘60%以上	4	4.7	-	-	-	-	4	5.2	-	-	-	-
預算結餘最多之比率(%)	88.8		-		53.7		88.8		6.3		12.6	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表19 公共工程已決算概況

108年

項目別	總計	新建 工程處	水利 工程處	公園路燈 工程管理處	衛生下水道 工程處	大地 工程處
已驗收已決算件數(件)	85	-	6	77	1	1
變更設計工程件數(件)	40	-	4	35	-	1
變更設計件數占已決算件數 比率(%)	47.1	-	66.7	45.5	-	100.0
施工預算數(萬元)	72,031	-	1,598	67,114	1,589	1,729
決標金額(萬元)	53,450	-	1,081	49,816	1,023	1,530
決標金額占預算比率(%)	74.2	-	67.6	74.2	64.4	88.5
工程決算金額(萬元)	66,235	-	1,382	61,853	1,489	1,511
工程決算金額占預算比率(%)	92.0	-	86.5	92.2	93.7	87.4
預算結餘金額(萬元)	5,796	-	216	5,261	100	218
預算結餘占預算金額比率(%)	8.0	-	13.5	7.8	6.3	12.6

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：已驗收未決算者計 45 件。

表20 公共工程已驗收未決算件數

108年

單位：件

驗收日距年底日數	總計	新建 工程處	水利 工程處	公園路燈 工程管理處	衛生下水道 工程處	大地 工程處
總計	45	1	21	5	-	18
0-14日	24	-	9	3	-	12
15-29日	6	-	-	1	-	5
30-44日	4	-	3	1	-	-
45-59日	3	-	3	-	-	-
60-74日	1	-	1	-	-	-
75-89日	-	-	-	-	-	-
90-104日	1	-	-	-	-	1
105-119日	1	-	1	-	-	-
120日以上	5	1	4	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表21 公共工程執行績效

108年

單位	總計	新建工程處	水利工程處	公園路燈工程管理處	衛生下水道工程處	大地工程處
工程發包件數(件) ①	335	73	92	128	16	26
預約維護	145	45	48	30	7	15
109年開工	-	-	-	-	-	-
整建工程	156	14	44	82	6	10
新建工程	34	14	-	16	3	1
已開工件數(件) ②	316	65	88	123	14	26
預約維護	142	43	47	30	7	15
109年開工	-	-	-	-	-	-
整建工程	145	11	41	79	4	10
新建工程	29	11	-	14	3	1
開工績效						
開工率(%) ③=②/①	94.3	89.0	95.7	96.1	87.5	100.0
預約維護	97.9	95.6	97.9	100.0	100.0	100.0
整建工程	92.9	78.6	93.2	96.3	66.7	100.0
新建工程	85.3	78.6	--	87.5	100.0	100.0
平均待工日數(日)	51.0	63.4	72.7	36.1	35.4	24.8
預約維護	58.9	53.1	93.8	36.5	25.9	26.2
整建工程	40.4	75.3	48.5	33.6	42.8	20.9
新建工程	65.2	91.6	--	49.7	47.7	44.0
完工績效						
已完工件數(件) ④	186	7	59	94	5	21
預約維護	77	2	35	24	2	14
整建工程	99	3	24	63	2	7
新建工程	10	2	-	7	1	-
完工率(%) ⑤=④/②	55.5	9.6	64.1	73.4	31.3	80.8
預約維護	53.1	4.4	72.9	80.0	28.6	93.3
整建工程	63.5	21.4	54.5	76.8	33.3	70.0
新建工程	29.4	14.3	--	43.8	33.3	-
平均提早完工日數(日)	18.1	1.3	8.1	25.5	2.4	22.2
預約維護	27.4	0.5	28.4	28.4	-	30.8
整建工程	9.9	2.7	-21.6	23.0	6.0	5.0
新建工程	26.7	-	--	38.1	-	--
驗收績效						
已驗收件數(件) ⑥	130	1	27	82	1	19
預約維護	51	-	15	23	-	13
整建工程	75	1	12	56	-	6
新建工程	4	-	-	3	1	-
驗收率(%) ⑦=⑥/②	38.8	1.4	29.3	64.1	6.3	73.1
預約維護	35.2	-	31.3	76.7	-	86.7
整建工程	48.1	7.1	27.3	68.3	-	60.0
新建工程	11.8	-	--	18.8	33.3	-
平均驗收日數(日)	24.1	106.0	32.5	20.7	34.0	21.8
預約維護	17.5	--	20.6	12.6	--	22.7
整建工程	27.6	106.0	47.4	22.8	--	20.0
新建工程	41.5	--	--	44.0	34.0	--

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表22 公共工程未開工明細表

108年

序號	發包單位	合約編號	施工預算 (萬元)	底價金額 (萬元)	決標金額 (萬元)	決標日期	發包工程名稱
總計		--	105,765	98,258	96,259	--	--
1	新工處	108085	45,447	42,100	42,099	108.10.31	建成綜合大樓改建工程
2	新工處	108086	1,532	1,381	1,162	108.11.06	金山南路2段30巷及杭州南路2段25巷道路拓寬工程
3	新工處	108087	1,235	1,081	947	108.11.06	莊敬路325巷道路拓寬工程
4	新工處	108092	764	650	616	108.12.20	知行路292巷4弄、2弄及其連接道路新築暨拓寬工程
5	新工處	108093	1,925	1,727	1,562	108.12.23	興德路66巷道路拓寬工程
6	新工處	108094	538	420	393	108.12.20	萬隆東營區社會福利設施用地新建工程-植栽移植工程
7	新工處	108095	591	557	557	108.12.25	臺北市建安國民小學藝術教學綜合大樓新建工程(零星工程)
8	新工處	108096	1,094	977	858	108.12.27	信安街15巷(六張犁營區A街廓北側)道路新築工程
9	水利處	108069	135	110	96	108.03.05	108年度淡水河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(新店溪華中橋至萬板大橋段)
10	水利處	108166	16,120	15,173	15,172	108.06.26	民生及士林抽水站抽水機組更新工程

表22 公共工程未開工明細表

108年

序號	發包單位	合約編號	施工預算 (萬元)	底價金額 (萬元)	決標金額 (萬元)	決標日期	發包工程名稱
11	水利處	108242	2,234	2,124	2,124	108.11.20	雨水下水道結構修補工程(芝山、故宮集水區)
12	水利處	108247	2,706	1,990	939	108.12.23	臺北市大安區瑞安段一小段234等地號地上物拆除工程
13	公園處	G-108-09-108159	2,876	2,633	2,633	108.11.25	七虎、七星等公園改善工程
14	公園處	G-108-09-108163	4,439	4,130	4,130	108.12.13	興昌區民活動中心新建工程
15	公園處	G-108-09-108164	3,926	3,718	3,718	108.12.20	108年青年、大安森林公園兒童遊戲場改善工程
16	公園處	G-108-09-108165	8,096	7,608	7,608	108.12.23	北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)公4，公5公園(二期)及綠6綠地新建工程
17	公園處	G-108-09-108166	6,555	6,328	6,328	108.12.25	天母公園改善工程
18	衛工處	S10824108018	4,295	4,295	4,165	108.07.17	臺北市污水下水道主、次幹管管渠延壽統包工程(第1期)
19	衛工處	S10824108022	1,256	1,256	1,153	108.08.06	迪化污水處理廠附設休閒運動公園遊樂設施改善統包工程

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：108年已發包未開工工程計有 19 件，其中新工處 8 件，水利處 4 件，公園處 5 件，衛工處 2 件，大地處 0 件。
