

中華民國 109 年
臺北市政府工務局
公共工程執行概況



臺北市政府工務局 編製

中華民國 110 年 3 月

說 明

- 一、本報告係應市議會第6屆第一次大會議員問政所需並按年彙編，報告內容呈現工務局所屬各工程處公共工程發包作業、執行績效概況。
- 二、本報告之資料來源為工務局所屬各工程處「109年各項工程發包及執行情形」年報表，以工程採購為統計標的，不含勞務採購。
- 三、報告中金額均指新臺幣。表內數字太長者酌予提高單位，因尾數四捨五入，故部分總數與細項間或有未能吻合情事，計算時仍以原始數據計算。
- 四、統計表中符號代表意義如下：
 - 「-」：無數值或數值無統計。
 - 「0」：數值不及半單位。
 - 「--」：數值無意義。
 - 「…」：數值尚未發布。

目 次

壹、提要分析

一、概述	1
二、工程執行績效	7
三、工程決標月份	10

貳、統計表

表 1 公共工程發包及執行件數－按工程處分	11
表 2 公共工程發包及執行件數－按決標月分	12
表 3 公共工程已發包未開工件數－按決標月分	14
表 4 公共工程已開工未完工件數－按開工月分	14
表 5 公共工程已完工未驗收件數－按完工月分	15
表 6 公共工程已驗收未結清經費件數－按驗收月分	15
表 7 公共工程決標件數－按決標金額分	16
表 8 公共工程決標金額與底價差距	16
表 9 公共工程決標金額與底價差距比率	17
表 10 公共工程變更設計增減金額	17
表 11 公共工程變更設計增減金額與決標金額差距比率	18
表 12 公共工程待工日數	19
表 13 公共工程已開工件數－按預定完工年分	19

表 14	公共工程預定完工與實際完工日數差距	20
表 15	公共工程完工日數	21
表 16	公共工程驗收日與完工日差距	21
表 17	公共工程預算結餘金額	22
表 18	公共工程預算結餘與施工預算差距比率	22
表 19	公共工程已決算概況	23
表 20	公共工程已驗收未決算件數	23
表 21	公共工程執行績效	24
表 22	公共工程未開工明細表	25

壹、提要分析

一、概述

(一)109年工務局執行公共工程發包作業共計313件，預算規模154.8億元，決標金額143.2億元，分別較108年減少22件(-6.6%)、減少42億元(-21.3%)及33.3億元(-18.9%)。

109年臺北市政府工務局所屬各工程處執行公共工程發包作業¹共計313件，較108年減少22件(-6.6%)。各工程處以公園路燈工程管理處發包133件(占42.5%)為最多，其餘依序為水利工程處84件(占26.8%)、新建工程處51件(占16.3%)、衛生下水道工程處23件(占7.3%)及大地工程處22件(占7%)。(詳圖一、表三)


109年發包工程預算規模154.8億元為近五年第三高，較108年減少42億元(-21.3%)。各工程處預算規模以新工處69.9億元(占45.1%)最大，其餘依序為衛工處45.5億元(占29.4%)、水利處19.4億元(占12.5%)、公園處14.1億元(占9.1%)及大地處6億元(占3.9%)。平均每件工程預算金額依序為衛工處2億元、新工處1.4億元、大地處2,711萬元、水利處2,311萬元及公園處1,057萬元。(詳圖二、表三)

109年發包工程決標金額143.2億元，較108年減少33.3億元(-18.9%)，平均每件工程決標金額依序為衛工處1.9億元、新工處1.3億元、大地處2,571萬元、水利處2,102萬元及公園處879萬元。決標占預算之標比²為92.5%，較108年上升2.8個百分點，其中以大地處標比94.8%最高，其餘依序為衛工處94.3%、新工處93.4%、水利處91%及公園處83.2%。(詳表一、表三)

¹ 發包工程總件數不含已決標但未開工即解約者，且以「工程採購」為統計標的，不含「勞務採購」。


² 標比=(決標金額 / 預算金額)×100%，其數值可反映發包單位對預算編列與廠商於市場競爭行為下之對價關係，標比過低可能隱含編列預算浮濫、不確實，或市場不當競爭、低價搶標。

圖一、公共工程發包件數

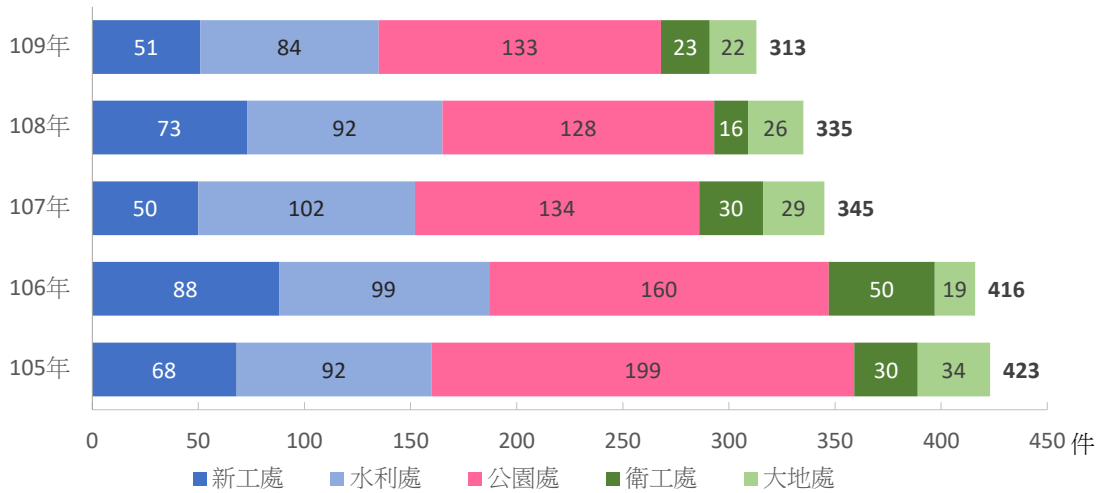

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

圖二、公共工程預算規模

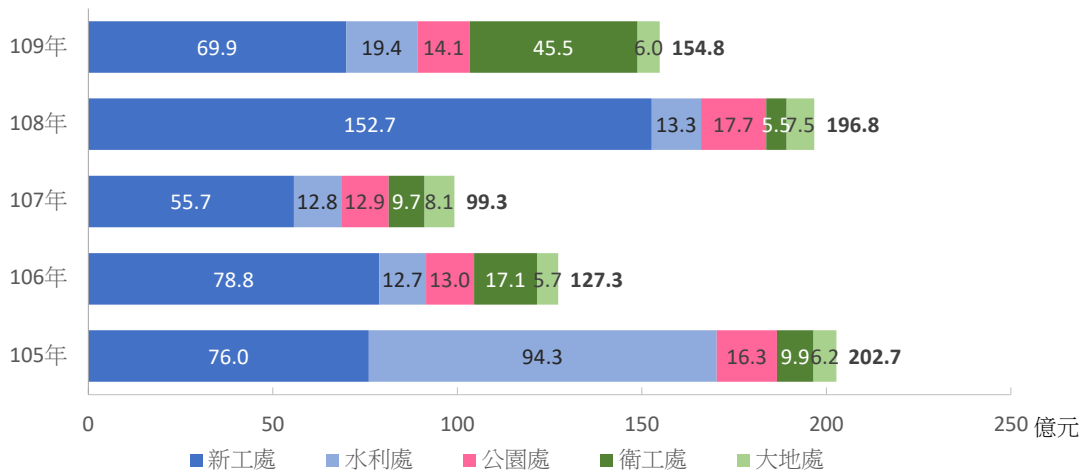

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表一、公共工程預算、決標金額與標比

工程處	109年			108年			109年較108年增減數		
	預算規模 (億)	決標金額 (億)	標比 (%)	預算規模 (億)	決標金額 (億)	標比 (%)	預算規模 (億)	決標金額 (億)	標比 (百分點)
總計	154.8	143.2	92.5	196.8	176.5	89.7	-42.0	-33.3	2.8
新工處	69.9	65.3	93.4	152.7	139.2	91.2	-82.8	-73.9	2.3
水利處	19.4	17.7	91.0	13.3	11.0	82.4	6.1	6.7	8.5
公園處	14.1	11.7	83.2	17.7	14.4	81.2	-3.7	-2.7	2.0
衛工處	45.5	42.9	94.3	5.5	5.1	91.6	40.0	37.8	2.7
大地處	6.0	5.7	94.8	7.5	6.9	91.0	-1.6	-1.2	3.8

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

(二) 發包工程中有 98.7%以公開招標方式辦理，變更設計率³為 49.2%，較 108 年下降 6 個百分點。

就發包方式觀察，以公開招標方式辦理者 309 件(占 98.7%)為最多，限制性招標議價方式辦理計有 4 件。(詳表二)

所有工程中曾辦理變更設計者計 154 件，變更設計率為 49.2%，較 108 年下降 6 個百分點，平均約每 2 件發包工程有 1 件變更設計，以水利處變更設計率 59.5%為最高。(詳表二、表三)

(三) 開工率⁴89.8%，較 108 年下降 4.6 個百分點，以公園處 96.2%為最高。完工率⁵50.5%，較 108 年下降 5 個百分點，以大地處 72.7%最高。

就開工情形觀察，截至 109 年 12 月 31 日止已決標工程中，已開工施作者計 281 件，開工率 89.8%為近五年最低，較 108 年下降 4.6 個百分點，其中以公園處開工率達 96.2%為最高。未開工者計 32 件(占 10.2%)，分別為新工處 9 件、水利處 14 件、公園處 5 件、衛工處 3 件及大地處 1 件，皆屬於預定跨年完工(14 件)或災害搶修等預約維護(18 件)工程。(詳表二、表三、圖五)

就完工情形觀察，至 109 年底已完工者計 158 件，完工率 50.5%為近五年最低，較 108 年下降 5 個百分點，以大地處完工率 72.7%最高，其餘依序為公園處 69.9%、水利處 34.5%、衛工處 30.4%及新工處 25.5%；若排除預定跨年完工及預約維護者，則公園處、衛工處及大地處皆為 100%，其餘依序為水利處 83.3%及新工處 81.3%⁶。(詳表二、表三、圖三、圖五)

已開工未完工工程計 123 件，加計未開工者 32 件，共計 155 件工程未完工(占 49.5%)。(詳表二)

³ 變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100%。

⁴ 開工率=已開工件數/發包總件數×100%。

⁵ 完工率=已完工件數/發包總件數×100%。

⁶ 已開工非預約維護工程中，預定 109 年完工者：
新工處計 16 件，其中 13 件(占 81.3%)已完工。
水利處計 12 件，其中 10 件(占 83.3%)已完工。
公園處計 64 件，其中 64 件(占 100%)已完工。
衛工處計 4 件，其中 4 件(占 100%)已完工。
大地處計 5 件，其中 5 件(占 100%)已完工。

表二、公共工程招標及執行概況

執行情形		105年		106年		107年		108年		109年		109年與108年比較			
		件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)	件數		百分比 (百分點)	
												增減數	增減%		
總計		423	100.0	416	100.0	345	100.0	335	100.0	313	100.0	-22	-6.6	0.0	
招標方式	公開招標	397	93.9	411	98.8	338	98.0	329	98.2	309	98.7	-20	-6.1	0.5	
	限制性招標	議價	24	5.7	2	0.5	5	1.4	6	1.8	4	1.3	-2	-33.3	-0.5
		比價	1	0.2	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	--	0.0
		公開評選	-	0.0	-	0.0	2	0.6	-	0.0	-	0.0	-	--	0.0
	其他	1	0.2	3	0.7	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	--	0.0	
變更設計	無	218	51.5	201	48.3	166	48.1	150	44.8	159	50.8	9	6.0	6.0	
	有	205	48.5	215	51.7	179	51.9	185	55.2	154	49.2	-31	-16.8	-6.0	
開工情形	已開工	401	94.8	394	94.7	319	92.5	316	94.3	281	89.8	-35	-11.1	-4.6	
	未開工	22	5.2	22	5.3	26	7.5	19	5.7	32	10.2	13	68.4	4.6	
完工情形	已完工	245	57.9	227	54.6	192	55.7	186	55.5	158	50.5	-28	-15.1	-5.0	
	未完工	178	42.1	189	45.4	153	44.3	149	44.5	155	49.5	6	4.0	5.0	
驗收情形	已驗收	191	45.2	171	41.1	133	38.6	130	38.8	108	34.5	-22	-16.9	-4.3	
	未驗收	232	54.8	245	58.9	212	61.4	205	61.2	205	65.5	0	0.0	4.3	
決算情形	已決算	135	31.9	113	27.2	84	24.3	85	25.4	59	18.8	-26	-30.6	-6.5	
	未決算	288	68.1	303	72.8	261	75.7	250	74.6	254	81.2	4	1.6	6.5	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表三、公共工程決標及執行概況—按工程處分

109年


工程處	發包工程		預算			決標			變更設計率 ① (%)	開工率 ② (%)	完工率 ③ (%)	驗收率 ④ (%)
	件數 (件)	結構比 (%)	金額 (億元)	結構比 (%)	平均每件 工程金額 (萬元)	金額 (億元)	結構比 (%)	平均每件 工程金額 (萬元)				
總計	313	100.0	154.8	100.0	4,946	143.2	100.0	4,575	49.2	89.8	50.5	34.5
新工處	51	16.3	69.9	45.1	13,702	65.3	45.6	12,803	29.4	82.4	25.5	7.8
水利處	84	26.8	19.4	12.5	2,311	17.7	12.3	2,102	59.5	83.3	34.5	17.9
公園處	133	42.5	14.1	9.1	1,057	11.7	8.2	879	51.9	96.2	69.9	54.9
衛工處	23	7.3	45.5	29.4	19,778	42.9	30.0	18,652	56.5	87.0	30.4	13.0
大地處	22	7.0	6.0	3.9	2,711	5.7	3.9	2,571	31.8	95.5	72.7	59.1

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：①變更設計率=變更設計件數/發包總件數×100%、②開工率=已開工件數/發包總件數×100%、

③完工率=已完工件數/發包總件數×100%、④驗收率=已驗收件數/發包總件數×100%。

圖三、當年實際完工占預定當年完工開工件數比率

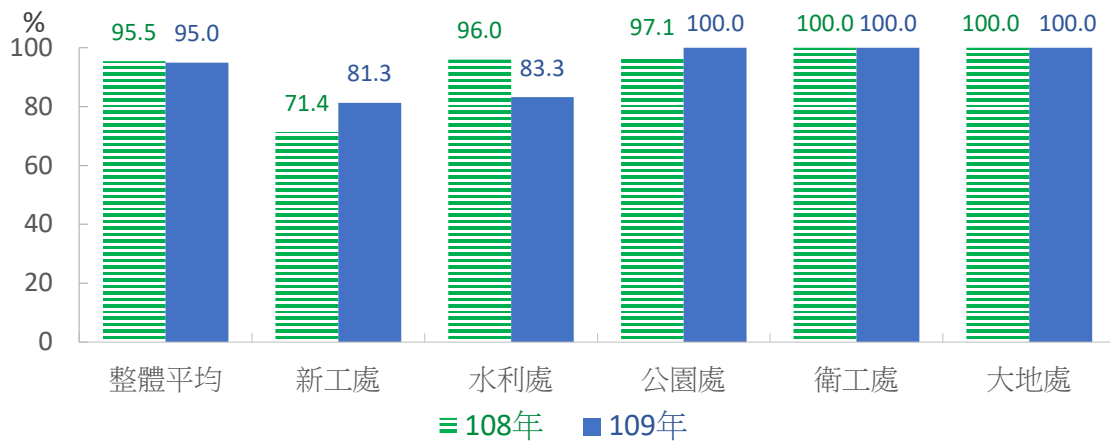

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. 比率=當年完工件數/預定當年完工且已開工件數×100%。

2. 不包含預約維護工程。

(四) 驗收率⁷34.5%，較 108 年下降 4.3 個百分點。已驗收並辦理工程決算比率 18.8%，較 108 年下降 6.5 個百分點。

就驗收情形觀察，已完工並辦理驗收程序者計 108 件，驗收率 34.5%為近五年最低，較 108 年下降 4.3 個百分點，以大地處驗收率 59.1%最高，其餘依序為公園處 54.9%、水利處 17.9%、衛工處 13%及新工處 7.8%。若排除預定跨年完工及預約維護者，則大地處 80%最高，公園處 76.6%次之，其餘依序為衛工處 75%、水利處 58.3%及新工處 25%⁸。(詳表二、表三、圖四、圖五)


已完工未驗收工程計 50 件，加計未完工者，共計 205 件未辦理驗收 (占 65.5%)。(詳表二)

就決算情形觀察，已驗收並辦理工程決算者計 59 件 (占 18.8%)，已驗收尚未辦理決算 49 件，加計未驗收者，共計 254 件未辦理工程決算 (占 81.2%)。(詳表二)

⁷ 驗收率=已驗收件數/發包總件數×100%。

⁸ 已開工非預約維護工程中，預定 109 年完工者：
 新工處計 16 件，其中 4 件(占 25%)已驗收。
 水利處計 12 件，其中 7 件(占 58.3%)已驗收。
 公園處計 64 件，其中 49 件(占 76.6%)已驗收。
 衛工處計 4 件，其中 3 件(占 75%)已驗收。
 大地處計 5 件，其中 4 件(占 80%)已驗收。

圖四、當年驗收占預定當年完工開工件數比率

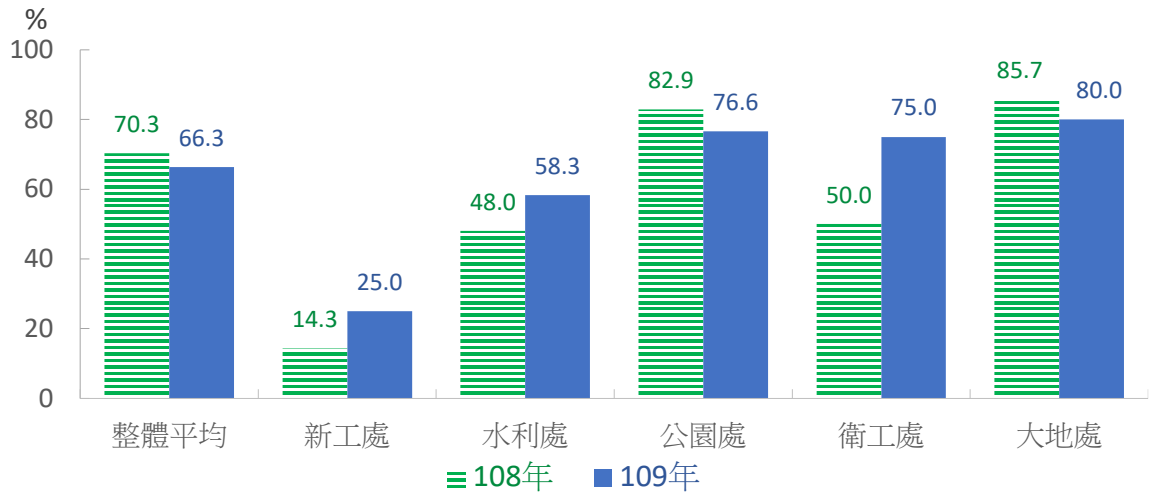


資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. 比率=當年驗收件數/預定當年完工且已開工件數×100%。

2. 不包含預約維護工程。

圖五、公共工程執行績效變動分析

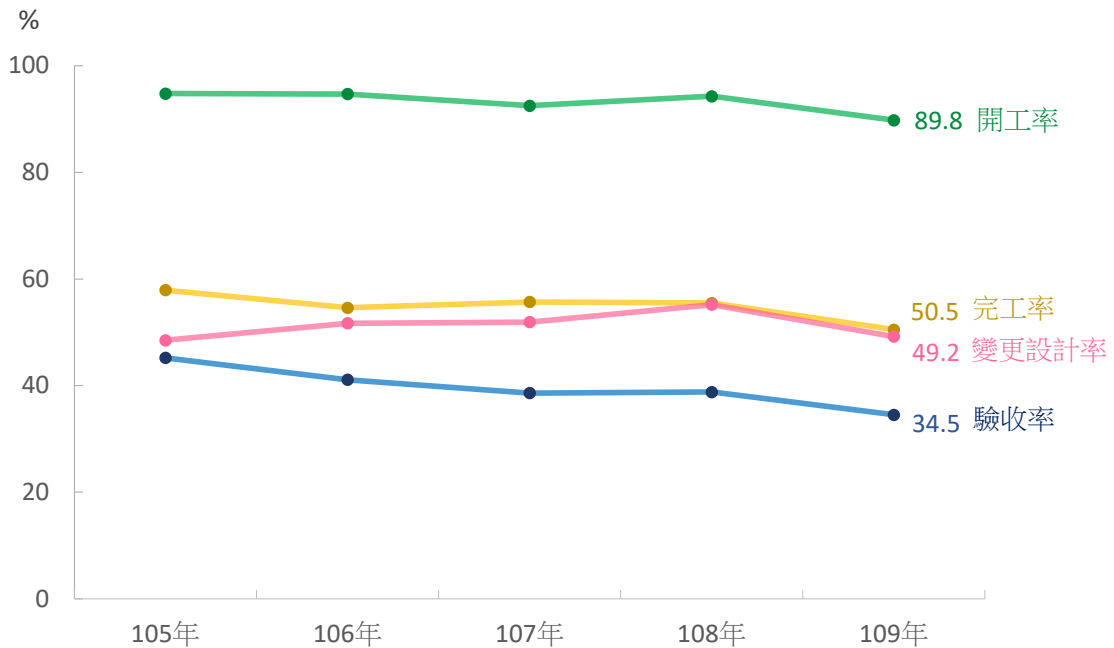

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

二、工程執行績效

公共工程執行績效分為「開工績效」、「完工績效」及「驗收績效」等 3 部分：

開工績效：以工程開工日與決標日之差距日數為待工日數表示，待工日數愈少者表示績效愈佳。

完工績效：以工程預定完工日期與實際完工日期之差距日數表示，差距愈大表示提早完工日數愈多，績效愈佳，數值為負數則為延期完工。

驗收績效：以完工後至完成驗收程序所需日數表示，驗收日數愈少表示驗收績效愈佳。

(一) 公園處開工率 96.2%最高，新工處 82.4%最低。平均每件工程待工日數以大地處 35.2 日最短，水利處 63.8 日最長。

109 年工務局執行公共工程平均開工率為 89.8%，以公園處 96.2%最高，其餘依序為大地處 95.5%、衛工處 87%、水利處 83.3%及新工處 82.4%。(詳表三、圖六)

開工績效方面，109 年已開工工程中，平均每件工程待工日數為 47 日，以大地處 35.2 日最短，水利處 63.8 日最長。(詳圖七、圖八)

(二) 大地處完工率 72.7%最高，新工處 25.5%最低。公園處平均每件工程提早 29.3 日完工，提早最多，新工處提早 0.8 日最少。

109 年工務局執行公共工程平均完工率為 50.5%，其中大地處 72.7%及公園處 69.9%超過整體平均值，其餘依序為水利處 34.5%、衛工處 30.4%及新工處 25.5%。(詳表三、圖六)

完工績效方面，109 年已完工者中，平均每件工程提早完工日數為 20.6 日，以公園處平均提早完工 29.3 日最多，其餘依序為大地處 16.4 日、水利處 8.1 日、衛工處 2.7 日及新工處 0.8 日。（詳圖七、圖八）


若依工程性質觀察，在整建工程中，以公園處提早 17.4 日完工績效最佳，新建工程亦以公園處提早 22.5 日完工績效最佳。（詳表四）

（三）大地處驗收率 59.1%最高，新工處 7.8%最低。大地處平均每件工程驗收日數 21.3 日最短，新工處 55 日最長。

109 年已完工工程平均驗收率為 34.5%，以大地處驗收率 59.1%為最高，其餘依序為公園處 54.9%、水利處 17.9%、衛工處 13%及新工處 7.8%。（詳表三、圖六）


在驗收績效方面，平均每件工程驗收日數為 24.4 日，以大地處 21.3 日最短，其餘依序為公園處 21.9 日、衛工處 24 日及水利處 31.1 日及新工處 55 日。（詳圖七、圖八）

圖六、公共工程開工、完工及驗收情形

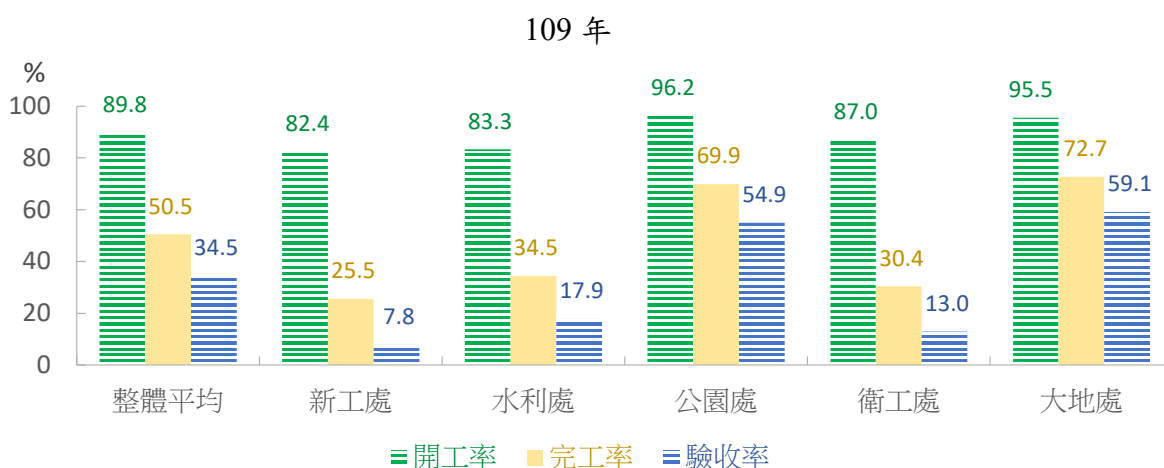


資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

圖七、公共工程執行情形－按工程處分

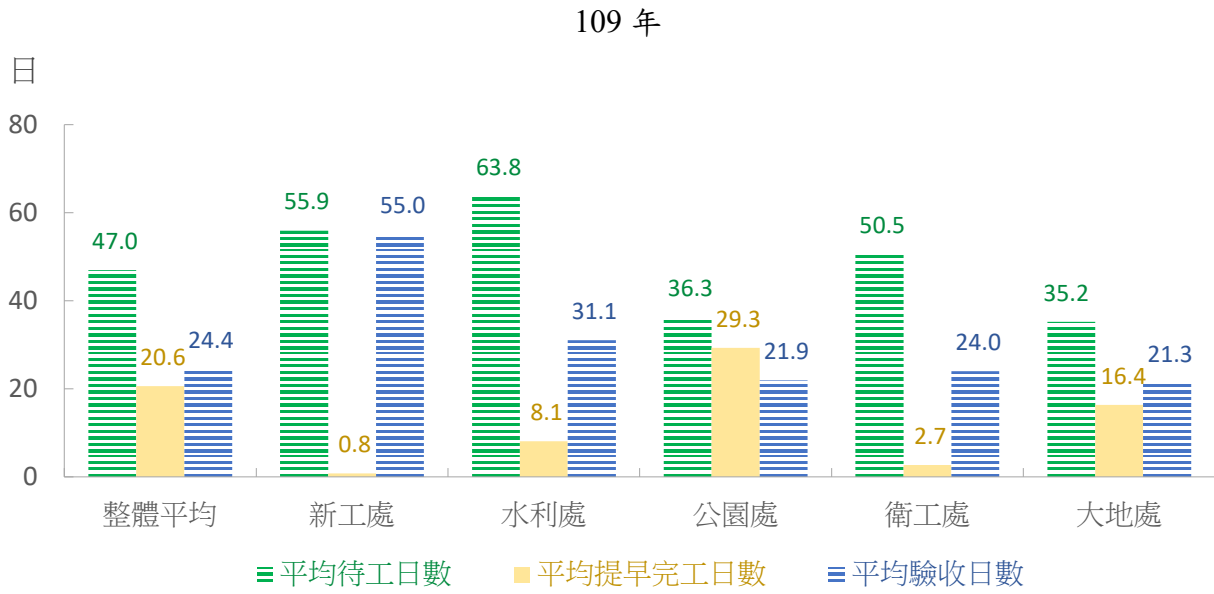

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

圖八、公共工程執行情形

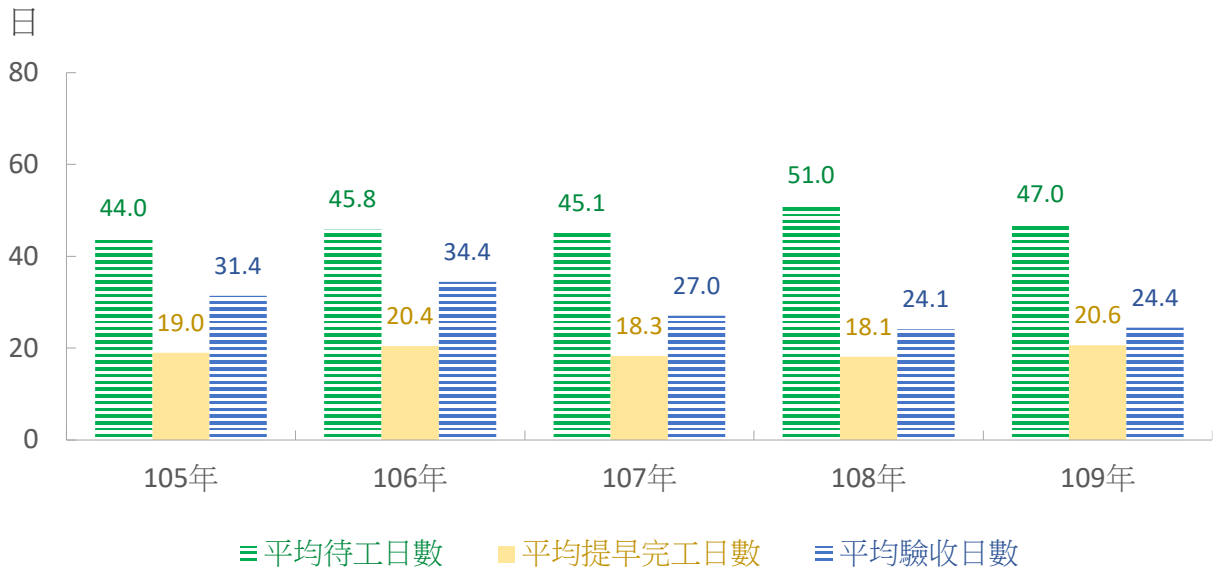

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表四、公共工程完工績效—按工程性質分

109 年

工程性質	總計	新工處	水利處	公園處	衛工處	大地處
已完工件數(件)	158	13	29	93	7	16
預約維護工程	58	-	19	27	3	9
整建工程	96	13	10	64	4	5
新建工程	4	-	-	2	-	2
完工率(%)	50.5	25.5	34.5	69.9	30.4	72.7
預約維護工程	45.0	-	35.2	71.1	33.3	81.8
整建工程	63.2	65.0	37.0	71.9	50.0	62.5
新建工程	12.5	-	-	33.3	-	66.7
平均提早完工日數(日)	20.6	0.8	8.1	29.3	2.7	16.4
預約維護工程	35.5	--	15.6	58.0	-	21.6
整建工程	11.8	0.8	-6.1	17.4	4.8	10.6
新建工程	15.3	--	--	22.5	--	8.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

三、工程決標月份

313 件決標工程中，以 1 月決標 65 件(占 20.8%)最多，有 78.3% 的工程在上半年決標。

109 年決標之 313 件公共工程中，有 245 件(占 78.3%) 在上半年決標；若按決標月分析，以 1 月決標 65 件(占 20.8%) 最多，3 月決標 54 件(占 17.3%) 次之，9 到 11 月每月各決標 7 件(占 2.2%) 最少。(詳統計表-表 2)

統計表

表1 公共工程發包及執行件數－按工程處分

109年

單位：件；%

執行情形		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計		313	100.0	51	100.0	84	100.0	133	100.0	23	100.0	22	100.0
發包方式	公開招標	309	98.7	48	94.1	83	98.8	133	100.0	23	100.0	22	100.0
	限制性招標	議價	4	1.3	3	5.9	1	1.2	-	-	-	-	-
		比價	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		公開評選	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
變更設計	無	159	50.8	36	70.6	34	40.5	64	48.1	10	43.5	15	68.2
	有	154	49.2	15	29.4	50	59.5	69	51.9	13	56.5	7	31.8
開工情形	已開工	281	89.8	42	82.4	70	83.3	128	96.2	20	87.0	21	95.5
	未開工	32	10.2	9	17.6	14	16.7	5	3.8	3	13.0	1	4.5
完工情形	已完工	158	50.5	13	25.5	29	34.5	93	69.9	7	30.4	16	72.7
	未完工①	155	49.5	38	74.5	55	65.5	40	30.1	16	69.6	6	27.3
驗收情形	已驗收	108	34.5	4	7.8	15	17.9	73	54.9	3	13.0	13	59.1
	未驗收②	205	65.5	47	92.2	69	82.1	60	45.1	20	87.0	9	40.9
決算情形	已決算	59	18.8	2	3.9	2	2.4	53	39.8	-	-	2	9.1
	未決算③	254	81.2	49	96.1	82	97.6	80	60.2	23	100.0	20	90.9

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

附註：①未完工工程中，已開工者計 123 件。

②未驗收工程中，已完工者計 50 件。

③未決算工程中，已驗收者計 49 件。

表2 公共工程發包及執行件數－按決標月分

109年

單位：件；%

執行情形		總計	1-6月 小計	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
總計	件數	313	245	65	50	54	38	21	17		
	百分比	100.0	78.3	20.8	16.0	17.3	12.1	6.7	5.4		
發包方式	公開招標	件數	309	242	65	49	54	38	19	17	
		百分比	100.0	78.3	21.0	15.9	17.5	12.3	6.1	5.5	
	限制性招標	議價	件數	4	3	-	1	-	-	2	-
			百分比	100.0	75.0	-	25.0	-	-	50.0	-
		比價	件數	-	-	-	-	-	-	-	-
			百分比	-	-	-	-	-	-	-	-
	公開評選	件數	-	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	-	
	其他	件數	-	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	-	
開工情形	已開工	件數	281	232	65	48	50	36	16	17	
		百分比	100.0	82.6	23.1	17.1	17.8	12.8	5.7	6.0	
	未開工	件數	32	13	-	2	4	2	5	-	
		百分比	100.0	40.6	-	6.3	12.5	6.3	15.6	-	
完工情形	已完工	件數	158	148	40	27	42	24	7	8	
		百分比	100.0	93.7	25.3	17.1	26.6	15.2	4.4	5.1	
	未完工	件數	155	97	25	23	12	14	14	9	
		百分比	100.0	62.6	16.1	14.8	7.7	9.0	9.0	5.8	
驗收情形	已驗收	件數	108	103	28	19	36	14	3	3	
		百分比	100.0	95.4	25.9	17.6	33.3	13.0	2.8	2.8	
	未驗收	件數	205	142	37	31	18	24	18	14	
		百分比	100.0	69.3	18.0	15.1	8.8	11.7	8.8	6.8	
決算情形	已決算	件數	59	57	13	12	22	8	1	1	
		百分比	100.0	96.6	22.0	20.3	37.3	13.6	1.7	1.7	
	未決算	件數	254	188	52	38	32	30	20	16	
		百分比	100.0	74.0	20.5	15.0	12.6	11.8	7.9	6.3	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表2 公共工程發包及執行件數—按決標月分（續）

109年

單位：件；%

執行情形		7-12月 小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
總計	件數	68	20	15	7	7	7	12		
	百分比	21.7	6.4	4.8	2.2	2.2	2.2	3.8		
發包方式	公開招標	件數	67	20	15	7	7	7	11	
		百分比	21.7	6.5	4.9	2.3	2.3	2.3	3.6	
	限制性招標	議價	件數	1	-	-	-	-	-	1
			百分比	25.0	-	-	-	-	-	25.0
		比價	件數	-	-	-	-	-	-	-
			百分比	-	-	-	-	-	-	-
	公開評選	件數	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	
	其他	件數	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	
開工情形	已開工	件數	49	20	13	6	7	2	1	
		百分比	17.4	7.1	4.6	2.1	2.5	0.7	0.4	
	未開工	件數	19	-	2	1	-	5	11	
		百分比	59.4	-	6.3	3.1	-	15.6	34.4	
完工情形	已完工	件數	10	6	3	-	1	-	-	
		百分比	6.3	3.8	1.9	-	0.6	-	-	
	未完工	件數	58	14	12	7	6	7	12	
		百分比	37.4	9.0	7.7	4.5	3.9	4.5	7.7	
驗收情形	已驗收	件數	5	2	3	-	-	-	-	
		百分比	4.6	1.9	2.8	-	-	-	-	
	未驗收	件數	63	18	12	7	7	7	12	
		百分比	30.7	8.8	5.9	3.4	3.4	3.4	5.9	
決算情形	已決算	件數	2	1	1	-	-	-	-	
		百分比	3.4	1.7	1.7	-	-	-	-	
	未決算	件數	66	19	14	7	7	7	12	
		百分比	26.0	7.5	5.5	2.8	2.8	2.8	4.7	

表3 公共工程已發包未開工件數—按決標月分

109年

單位：件；%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	32	100.0	9	100.0	14	100.0	5	100.0	3	100.0	1	100.0
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	2	6.3	-	-	2	14.3	-	-	-	-	-	-
3月	4	12.5	-	-	1	7.1	3	60.0	-	-	-	-
4月	2	6.3	-	-	1	7.1	1	20.0	-	-	-	-
5月	5	15.6	2	22.2	2	14.3	1	20.0	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	2	6.3	-	-	-	-	-	-	2	66.7	-	-
9月	1	3.1	-	-	1	7.1	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	5	15.6	3	33.3	1	7.1	-	-	1	33.3	-	-
12月	11	34.4	4	44.4	6	42.9	-	-	-	-	1	100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表4 公共工程已開工未完工件數—按開工月分

109年

單位：件；%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	123	100.0	29	100.0	41	100.0	35	100.0	13	100.0	5	100.0
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	15	12.2	7	24.1	2	4.9	3	8.6	1	7.7	2	40.0
3月	18	14.6	-	-	12	29.3	5	14.3	1	7.7	-	-
4月	15	12.2	5	17.2	7	17.1	-	-	2	15.4	1	20.0
5月	4	3.3	-	-	1	2.4	2	5.7	1	7.7	-	-
6月	9	7.3	3	10.3	3	7.3	1	2.9	2	15.4	-	-
7月	7	5.7	2	6.9	2	4.9	1	2.9	2	15.4	-	-
8月	13	10.6	3	10.3	3	7.3	6	17.1	1	7.7	-	-
9月	18	14.6	4	13.8	5	12.2	6	17.1	2	15.4	1	20.0
10月	9	7.3	2	6.9	3	7.3	3	8.6	1	7.7	-	-
11月	7	5.7	2	6.9	1	2.4	4	11.4	-	-	-	-
12月	8	6.5	1	3.4	2	4.9	4	11.4	-	-	1	20.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表5 公共工程已完工未驗收件數—按完工月分

109年

單位：件，%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	50	100.0	9	100.0	14	100.0	20	100.0	4	100.0	3	100.0
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	2	4.0	2	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	1	2.0	1	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	10	20.0	3	33.3	1	7.1	4	20.0	1	25.0	1	33.3
12月	37	74.0	3	33.3	13	92.9	16	80.0	3	75.0	2	66.7

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表6 公共工程已驗收未結清經費件數—按驗收月分

109年

單位：件，%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	36	100.0	2	100.0	-	-	20	100.0	3	100.0	11	100.0
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	1	2.8	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	1	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.1
11月	4	11.1	-	-	-	-	3	15.0	1	33.3	-	-
12月	30	83.3	1	50.0	-	-	17	85.0	2	66.7	10	90.9

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表7 公共工程決標件數—按決標金額分

109年

單位：件；%

決標金額	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	313	100.0	51	100.0	84	100.0	133	100.0	23	100.0	22	100.0
100萬元以下	9	2.9	3	5.9	1	1.2	5	3.8	-	-	-	-
100-500萬元	85	27.2	10	19.6	24	28.6	49	36.8	1	4.3	1	4.5
500-1,000萬元	80	25.6	5	9.8	27	32.1	44	33.1	2	8.7	2	9.1
1,000-5,000萬元	101	32.3	12	23.5	28	33.3	35	26.3	9	39.1	17	77.3
5,000萬-1億元	17	5.4	11	21.6	1	1.2	-	-	3	13.0	2	9.1
1億元以上	21	6.7	10	19.6	3	3.6	-	-	8	34.8	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表8 公共工程決標金額與底價差距

109年

單位：件；%

差距金額	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	313	100.0	51	100.0	84	100.0	133	100.0	23	100.0	22	100.0
超底價決標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0元	122	39.0	23	45.1	31	36.9	39	29.3	9	39.1	20	90.9
10萬元以下	46	14.7	8	15.7	10	11.9	20	15.0	8	34.8	-	-
10-50萬元	50	16.0	13	25.5	10	11.9	23	17.3	2	8.7	2	9.1
50-100萬元	38	12.1	4	7.8	12	14.3	21	15.8	1	4.3	-	-
100-500萬元	55	17.6	2	3.9	21	25.0	29	21.8	3	13.0	-	-
500-1,000萬元	2	0.6	1	2.0	-	-	1	0.8	-	-	-	-
1,000-5,000萬元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,000萬元以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為決標金額與底價相同。

表9 公共工程決標金額與底價差距比率

109年

單位：件；%

金額差距比率		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計		313	100.0	51	100.0	84	100.0	133	100.0	23	100.0	22	100.0
超底價決標	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	超過底價20%以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	超過底價10%-20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	超過底價小於10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
與底價相同決標		122	39.0	23	45.1	31	36.9	39	29.3	9	39.1	20	90.9
低於底價決標	小計	191	61.0	28	54.9	53	63.1	94	70.7	14	60.9	2	9.1
	低於底價10%	103	32.9	22	43.1	30	35.7	39	29.3	10	43.5	2	9.1
	低於底價10%-20%	44	14.1	4	7.8	14	16.7	22	16.5	4	17.4	-	-
	低於底價20%-30%	29	9.3	-	-	8	9.5	21	15.8	-	-	-	-
	低於底價30%-40%	10	3.2	1	2.0	1	1.2	8	6.0	-	-	-	-
	低於底價40%-50%	3	1.0	1	2.0	-	-	2	1.5	-	-	-	-
低於底價50%以上		2	0.6	-	-	-	-	2	1.5	-	-	-	-
最低決標與底價比率(%)		49.0		56.8		68.6		49.0		82.1		98.5	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表10 公共工程變更設計增減金額

109年

單位：件；%

增減金額		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計		154	100.0	15	100.0	50	100.0	69	100.0	13	100.0	7	100.0
0元		10	6.5	-	-	7	14.0	-	-	3	23.1	-	-
追加工程經費	小計	123	79.9	15	100.0	39	78.0	56	81.2	8	61.5	5	71.4
	10萬元以下	9	5.8	2	13.3	2	4.0	4	5.8	-	-	1	14.3
	10-50萬元	16	10.4	-	-	2	4.0	12	17.4	1	7.7	1	14.3
	50-100萬元	18	11.7	1	6.7	1	2.0	15	21.7	-	-	1	14.3
	100-500萬元	55	35.7	7	46.7	18	36.0	25	36.2	3	23.1	2	28.6
	500-1,000萬元	17	11.0	3	20.0	12	24.0	-	-	2	15.4	-	-
	1,000-5,000萬元	8	5.2	2	13.3	4	8.0	-	-	2	15.4	-	-
5,000萬元以上		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
追減工程經費		21	13.6	-	-	4	8.0	13	18.8	2	15.4	2	28.6

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為雖有變更設計但無追加減工程經費。

表11 公共工程變更設計增減金額與決標金額差距比率

109年

單位：件；%

金額差距比率		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計		154	100.0	15	100.0	50	100.0	69	100.0	13	100.0	7	100.0
追加工程經費	合計	123	79.9	15	100.0	39	78.0	56	81.2	8	61.5	5	71.4
	增加50%以上	32	20.8	1	6.7	20	40.0	10	14.5	1	7.7	-	-
	增加40%~50%	4	2.6	-	-	3	6.0	1	1.4	-	-	-	-
	增加30%~40%	6	3.9	1	6.7	2	4.0	2	2.9	1	7.7	-	-
	增加20%~30%	17	11.0	2	13.3	4	8.0	10	14.5	1	7.7	-	-
	增加10%~20%	23	14.9	4	26.7	3	6.0	12	17.4	3	23.1	1	14.3
	增加10%以內	41	26.6	7	46.7	7	14.0	21	30.4	2	15.4	4	57.1
無追加減經費		10	6.5	-	-	7	14.0	-	-	3	23.1	-	-
追減工程經費	合計	21	13.6	-	-	4	8.0	13	18.8	2	15.4	2	28.6
	追減10%以內	16	10.4	-	-	3	6.0	11	15.9	1	7.7	1	14.3
	追減10%~20%	3	1.9	-	-	1	2.0	-	-	1	7.7	1	14.3
	追減20%~30%	1	0.6	-	-	-	-	1	1.4	-	-	-	-
	追減30%~40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	追減40%~50%	1	0.6	-	-	-	-	1	1.4	-	-	-	-
	追減50%以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
增加經費占決標金額比率最大者(%)		261.1		80.4		177.4		261.1		52.4		14.9	
追減經費占決標金額比率最大者(%)		-49.1		-		-12.5		-49.1		-13.4		-18.5	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表12 公共工程待工日數

109年

單位：件；%

待工日數	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	281	100.0	42	100.0	70	100.0	128	100.0	20	100.0	21	100.0
0日	1	0.4	-	-	1	1.4	-	-	-	-	-	-
1-14日	17	6.0	2	4.8	1	1.4	7	5.5	1	5.0	6	28.6
15-29日	94	33.5	8	19.0	10	14.3	62	48.4	3	15.0	11	52.4
30-44日	62	22.1	8	19.0	12	17.1	37	28.9	5	25.0	-	-
45-59日	40	14.2	4	9.5	16	22.9	12	9.4	8	40.0	-	-
60-74日	25	8.9	8	19.0	15	21.4	1	0.8	-	-	1	4.8
75-89日	14	5.0	4	9.5	7	10.0	2	1.6	1	5.0	-	-
90日以上	28	10.0	8	19.0	8	11.4	7	5.5	2	10.0	3	14.3
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.待工日數為工程決標與開工日期之差距日數。

2.「0日」為決標當日即開工之工程。

3.其他為因應緊急需要先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

4.最大差距日數為259日，待工超過100日以上者計20件。

5.已決標未開工者計32件。

表13 公共工程已開工件數—按預定完工年分

109年

單位：件；%

完工年	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	281	100.0	42	100.0	70	100.0	128	100.0	20	100.0	21	100.0
109年完工	193	68.7	28	66.7	51	72.9	93	72.7	7	35.0	14	66.7
110年完工	70	24.9	6	14.3	14	20.0	35	27.3	8	40.0	7	33.3
111年完工	10	3.6	5	11.9	4	5.7	-	-	1	5.0	-	-
112年完工	4	1.4	3	7.1	1	1.4	-	-	-	-	-	-
113年完工	4	1.4	-	-	-	-	-	-	4	20.0	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表14 公共工程預定完工與實際完工日數差距

109年

單位：件；%

差距日數		總 計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總 計		158	100.0	13	100.0	29	100.0	93	100.0	7	100.0	16	100.0
提早完工日數	合 計	95	60.1	3	23.1	10	34.5	65	69.9	3	42.9	14	87.5
	180日以上	4	2.5	-	-	-	-	4	4.3	-	-	-	-
	150-179日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120-149日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90-119日	4	2.5	-	-	1	3.4	3	3.2	-	-	-	-
	60-89日	3	1.9	-	-	-	-	3	3.2	-	-	-	-
	30-59日	33	20.9	2	15.4	5	17.2	22	23.7	-	-	4	25.0
	1-29日	51	32.3	1	7.7	4	13.8	33	35.5	3	42.9	10	62.5
0 日		50	31.6	5	38.5	13	44.8	26	28.0	4	57.1	2	12.5
延遲完工日數	合 計	13	8.2	5	38.5	6	20.7	2	2.2	-	-	-	-
	1-29日	11	7.0	4	30.8	5	17.2	2	2.2	-	-	-	-
	30-59日	2	1.3	1	7.7	1	3.4	-	-	-	-	-	-
	60-89日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90-119日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120-149日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150-179日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180日以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提早完工最多日數(日)		218		45		104		218		12		31	
延遲完工最多日數(日)		32		30		32		14		-		-	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0日為預定完工日當日完工者。

表15 公共工程完工日數

109年

單位：件；%

完工日數	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	158	100.0	13	100.0	29	100.0	93	100.0	7	100.0	16	100.0
0-59日	13	8.2	5	38.5	1	3.4	6	6.5	-	-	1	6.3
60-119日	23	14.6	3	23.1	7	24.1	10	10.8	2	28.6	1	6.3
120-179日	24	15.2	1	7.7	5	17.2	15	16.1	1	14.3	2	12.5
180-239日	27	17.1	4	30.8	4	13.8	15	16.1	1	14.3	3	18.8
240-299日	64	40.5	-	-	12	41.4	42	45.2	3	42.9	7	43.8
300-359日	7	4.4	-	-	-	-	5	5.4	-	-	2	12.5
360日以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表16 公共工程驗收日與完工日差距

109年

單位：件；%

差距日數	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	108	100.0	4	100.0	15	100.0	73	100.0	3	100.0	13	100.0
0日	2	1.9	-	-	-	-	2	2.7	-	-	-	-
1-14日	30	27.8	-	-	1	6.7	25	34.2	1	33.3	3	23.1
15-29日	44	40.7	-	-	5	33.3	30	41.1	1	33.3	8	61.5
30-44日	20	18.5	1	25.0	6	40.0	10	13.7	1	33.3	2	15.4
45-59日	6	5.6	1	25.0	2	13.3	3	4.1	-	-	-	-
60-74日	4	3.7	2	50.0	1	6.7	1	1.4	-	-	-	-
75-89日	1	0.9	-	-	-	-	1	1.4	-	-	-	-
90日以上	1	0.9	-	-	-	-	1	1.4	-	-	-	-
完成驗收需要最多日數(日)	113		66		62		113		39		32	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.「0日」為工程完工日即完成驗收程序者。

2.最大差距日數為113日，差距超過100日以上者計有1件。

3.已完工未驗收者計50件。

表17 公共工程預算結餘金額

109年

單位：件；%

結餘金額	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	59	100.0	2	100.0	2	100.0	53	100.0	-	-	2	100.0
無經費結餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10萬元以下	15	25.4	1	50.0	-	-	13	24.5	-	-	1	50.0
10-50萬元	10	16.9	-	-	-	-	9	17.0	-	-	1	50.0
50-100萬元	9	15.3	1	50.0	-	-	8	15.1	-	-	-	-
100-500萬元	25	42.4	-	-	2	100.0	23	43.4	-	-	-	-
500-1,000萬元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,000-5,000萬元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,000萬元以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工程經費剩餘最多金額(萬元)	420		67		145		420		-		11	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表18 公共工程預算結餘與施工預算差距比率

109年

單位：件；%

金額差距比率	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	59	100.0	2	100.0	2	100.0	53	100.0	-	-	2	100.0
無預算結餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結餘10%以下	23	39.0	1	50.0	-	-	20	37.7	-	-	2	100.0
結餘10%~20%	11	18.6	-	-	-	-	11	20.8	-	-	-	-
結餘20%~30%	6	10.2	1	50.0	1	50.0	4	7.5	-	-	-	-
結餘30%~40%	7	11.9	-	-	-	-	7	13.2	-	-	-	-
結餘40%~50%	1	1.7	-	-	-	-	1	1.9	-	-	-	-
結餘50%~60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結餘60%以上	11	18.6	-	-	1	50.0	10	18.9	-	-	-	-
預算結餘最多之比率(%)	99.8		27.3		96.8		99.8		-		0.4	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表19 公共工程已決算概況

109年

項目別	總計	新建 工程處	水利 工程處	公園路燈 工程管理處	衛生下水道 工程處	大地 工程處
已驗收已決算件數(件)	59	2	2	53	-	2
變更設計工程件數(件)	21	-	-	20	-	1
變更設計件數占已決算件數 比率(%)	35.6	-	-	37.7	-	50.0
施工預算數(萬元)	42,459	311	649	35,949	-	5,549
決標金額(萬元)	34,040	245	503	28,098	-	5,194
決標金額占預算比率(%)	80.2	78.8	77.4	78.2	-	93.6
工程決算金額(萬元)	35,237	240	364	29,100	-	5,533
工程決算金額占預算比率(%)	83.0	77.1	56.0	80.9	-	99.7
預算結餘金額(萬元)	7,222	71	286	6,849	-	16
預算結餘占預算金額比率(%)	17.0	22.9	44.0	19.1	-	0.3

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：已驗收未決算者計 49 件。

表20 公共工程已驗收未決算件數

109年

單位：件

驗收日距年底日數	總計	新建 工程處	水利 工程處	公園路燈 工程管理處	衛生下水道 工程處	大地 工程處
總計	49	2	13	20	3	11
0-14日	27	-	5	12	-	10
15-29日	5	-	-	3	2	-
30-44日	7	1	1	4	1	-
45-59日	2	-	1	1	-	-
60-74日	2	-	2	-	-	-
75-89日	1	-	-	-	-	1
90-104日	-	-	-	-	-	-
105-119日	3	-	3	-	-	-
120日以上	2	1	1	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表21 公共工程執行績效

109年

單位	總計	新建工程處	水利工程處	公園路燈工程管理處	衛生下水道工程處	大地工程處
工程發包件數(件) ①	313	51	84	133	23	22
預約維護	128	16	54	38	9	11
110年開工	4	-	4	-	-	-
整建工程	152	20	27	89	8	8
新建工程	33	15	3	6	6	3
已開工件數(件) ②	281	42	70	128	20	21
預約維護	110	13	46	33	7	11
110年開工	-	-	-	-	-	-
整建工程	145	20	21	89	8	7
新建工程	26	9	3	6	5	3
開工績效						
開工率(%) ③=②/①	89.8	82.4	83.3	96.2	87.0	95.5
預約維護	85.9	81.3	85.2	86.8	77.8	100.0
整建工程	95.4	100.0	77.8	100.0	100.0	87.5
新建工程	78.8	60.0	100.0	100.0	83.3	100.0
平均待工日數(日)	47.0	55.9	63.8	36.3	50.5	35.2
預約維護	45.7	28.2	67.7	31.6	29.7	27.0
整建工程	42.2	58.2	48.0	37.0	55.3	31.4
新建工程	79.0	91.0	114.3	51.8	72.0	74.0
完工績效						
已完工件數(件) ④	158	13	29	93	7	16
預約維護	58	-	19	27	3	9
整建工程	96	13	10	64	4	5
新建工程	4	-	-	2	-	2
完工率(%) ⑤=④/①	50.5	25.5	34.5	69.9	30.4	72.7
預約維護	45.0	-	35.2	71.1	33.3	81.8
整建工程	63.2	65.0	37.0	71.9	50.0	62.5
新建工程	12.5	-	-	33.3	-	66.7
平均提早完工日數(日)	20.6	0.8	8.1	29.3	2.7	16.4
預約維護	35.5	--	15.6	58.0	-	21.6
整建工程	11.8	0.8	-6.1	17.4	4.8	10.6
新建工程	15.3	--	--	22.5	--	8.0
驗收績效						
已驗收件數(件) ⑥	108	4	15	73	3	13
預約維護	40	-	8	24	-	8
整建工程	66	4	7	48	3	4
新建工程	2	-	-	1	-	1
驗收率(%) ⑦=⑥/①	34.5	7.8	17.9	54.9	13.0	59.1
預約維護	31.0	-	14.8	63.2	-	72.7
整建工程	43.4	20.0	25.9	53.9	37.5	50.0
新建工程	6.3	-	-	16.7	-	33.3
平均驗收日數(日)	24.4	55.0	31.1	21.9	24.0	21.3
預約維護	20.7	--	22.9	19.7	--	21.4
整建工程	27.0	55.0	40.6	23.3	24.0	23.0
新建工程	13.5	--	--	13.0	--	14.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表22 公共工程未開工明細表

109年

序號	發包單位	合約編號	施工預算 (萬元)	底價金額 (萬元)	決標金額 (萬元)	決標日期	發包工程名稱
總計		--	333,273	318,186	317,517	--	--
1	新工處	109028	100	96	95	109.05.15	109年度臺北市士林區鄰里道路天然災害搶修工程開口契約
2	新工處	109029	100	96	95	109.05.15	109年度臺北市北投區鄰里道路天然災害搶修工程開口契約
3	新工處	109063	697	636	543	109.11.04	大安區新生和平人行陸橋樓梯拆除暨中山區松江長安人行地下道封填工程
4	新工處	109064	3,968	3,705	3,705	109.11.11	立德路底連接捷運忠義站銜接工程
5	新工處	109065	452	405	405	109.11.17	桂林路57巷道路新築工程
6	新工處	109068	19,932	18,316	18,300	109.12.01	臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程
7	新工處	109069	35,823	34,644	34,643	109.12.07	常德街人行地下道連通工程
8	新工處	109071	318	318	318	109.12.10	臺北市大龍社區及市場重建工程(零星工程)
9	新工處	109073	776	707	658	109.12.29	樟新街63巷道路新築工程
10	水利處	109181	684	621	600	109.12.22	研究院路2段排水改善工程

表22 公共工程未開工明細表

109年

序號	發包單位	合約編號	施工預算 (萬元)	底價金額 (萬元)	決標金額 (萬元)	決標日期	發包工程名稱
11	水利處	109040	135	127	127	109.02.12	109年度災後淤土、樹木復原維護工程(基隆河右岸高速公路內湖橋上游,內溝、大溝溪及金瑞園區)
12	水利處	109042	135	127	109	109.02.12	109年度災後淤土、樹木復原預約維護工程(景美溪北新橋上游段)
13	水利處	109083	235	220	220	109.03.31	109年度基隆河成美左岸河濱公園颱風豪雨碼頭、廁所等設施撤離工程
14	水利處	109096	402	370	370	109.04.17	基隆河低水護岸整建工程(百齡左右岸、社子島地區)委託規劃設計工作
15	水利處	109116	73	70	70	109.05.15	內湖潭美街周邊環境改善工程委託規劃設計工作
16	水利處	109164	7,802	7,549	7,549	109.09.03	延平河濱公園(大稻埕碼頭至忠孝橋下)區域改善工程
17	水利處	109183	3,184	2,945	2,945	109.12.29	磺港溪壓力箱涵清疏及檢修工程
18	水利處	109121	1,845	1,558	1,558	109.05.26	北投區中和街東側側溝改善工程
19	水利處	109177	998	893	893	109.11.19	信義區西大排木棧道更新工程
20	水利處	110003	1,900	1,750	1,580	109.12.30	110年度雨水下水道預約維護工程(士林、大同區)
21	水利處	110004	1,900	1,750	1,580	109.12.30	110年度雨水下水道預約維護工程(南港、內湖區)

表22 公共工程未開工明細表

109年

序號	發包單位	合約編號	施工預算 (萬元)	底價金額 (萬元)	決標金額 (萬元)	決標日期	發包工程名稱
22	水利處	110005	1,600	1,470	1,460	109.12.30	110年度雨水下水道預約維護工程(信義區)
23	水利處	110006	1,100	1,000	949	109.12.30	110年度雨水下水道預約維護工程(文山、萬華區)
24	公園處	10904	250	250	242	109.03.04	臺北市109年度南港區預約式鄰里天然災害搶修工程
25	公園處	109A028	250	250	242	109.03.10	臺北市109年度大同區預約式鄰里天然災害搶修工程
26	公園處	G-109-12-109070	250	250	242	109.03.10	臺北市109年度中山區預約式鄰里天然災害搶修工程
27	公園處	G-109-12-109121	130	126	112	109.04.28	109年度臺北市東南區行道樹及公園綠地等天然災害搶修預約工程(機具標)
28	公園處	G-109-12-109129	130	126	126	109.05.08	109年度臺北市西北區行道樹及公園綠地等天然災害搶修預約工程(機具標)
29	衛工處	S1092410901601	13,174	12,366	12,366	109.08.19	109-111年東區分支管污水管渠設施檢視修繕及延壽統包工程
30	衛工處	S1092410901602	13,174	12,366	12,366	109.08.19	109-111年西區分支管污水管渠設施檢視修繕及延壽統包工程
31	衛工處	S10924109009	219,545	211,100	211,100	109.11.12	「民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程」統包案
32	大地處	GEO1096103	2,213	1,980	1,949	109.12.29	109年度內湖區康寧里康寧天閣社區地錨擋土牆補強工程

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：109年已發包未開工工程計有 32 件，其中新工處 9 件，水利處 14 件，公園處 5 件，衛工處 3 件，大地處 1 件。
