



中華民國 110 年

臺北市政府工務局

公共工程執行概況



臺北市政府工務局 編製 中華民國 111 年 4 月

說 明

- 一、本報告係應市議會第6屆第一次大會議員問政所需並按年彙編，報告內容呈現工務局所屬各工程處公共工程發包作業、執行績效概況。
- 二、本報告之資料來源為工務局所屬各工程處「110年各項工程發包及執行情形」年報表，以工程採購為統計標的，不含勞務採購。
- 三、報告中金額均指新臺幣。表內數字太長者酌予提高單位，因尾數四捨五入，故部分總數與細項間或有未能吻合情事，計算時仍以原始數據計算。
- 四、統計表中符號代表意義如下：
 - 「-」：無數值或數值無統計。
 - 「0」：數值不及半單位。
 - 「--」：數值無意義。
 - 「…」：數值尚未發布。

目 次

壹、提要分析

- 一、概述..... 1
- 二、工程執行績效（排除預約維護及跨年工程）..... 8

貳、統計表

- 表 1 公共工程發包及執行件數－按工程處分..... 13
- 表 2 公共工程發包及執行件數－按決標月分..... 14
- 表 3 公共工程已發包未開工件數－按決標月分..... 16
- 表 4 公共工程已開工未完工件數－按開工月分..... 16
- 表 5 公共工程已完工未驗收件數－按完工月分..... 17
- 表 6 公共工程已驗收未結清經費件數－按驗收月分..... 17
- 表 7 公共工程決標件數－按決標金額分..... 18
- 表 8 公共工程決標金額與底價差距..... 18
- 表 9 公共工程決標金額與底價差距比率..... 19
- 表 10 公共工程變更設計增減金額..... 19
- 表 11 公共工程變更設計增減金額與決標金額差距比率..... 20
- 表 12 公共工程待工日數..... 21
- 表 13 公共工程已開工件數－按預定完工年分..... 21
- 表 14 公共工程預定完工與實際完工日數差距..... 22

表 15	公共工程完工日數	23
表 16	公共工程驗收日與完工日差距	23
表 17	公共工程預算結餘金額	24
表 18	公共工程預算結餘與施工預算差距比率	24
表 19	公共工程已決算概況	25
表 20	公共工程已驗收未決算件數	25
表 21	公共工程執行績效	26
表 22	公共工程未開工明細表	27

壹、提要分析

一、概述

(一)110年工務局執行公共工程發包作業共計266件，預算金額105.8億元，決標金額93.6億元，分別較109年減少47件(-15%)、49億元(-31.7%)及49.6億元(-34.7%)。

110年臺北市政府工務局所屬各工程處執行公共工程發包作業¹共計266件，較109年減少47件(-15%)。各工程處以公園路燈工程管理處發包133件(占50%)為最多，其餘依序為水利工程處66件(占24.8%)、新建工程處50件(占18.8%)、大地工程處11件(占4.1%)及衛生下水道工程處6件(占2.3%)。(詳圖一、表一、表三)


110年發包工程預算金額105.8億元為近五年最低，較109年減少49億元(-31.7%)。各工程處預算金額以新工處69.7億元(占65.9%)最高，其餘依序為公園處15.7億元(占14.8%)、水利處13.4億元(占12.6%)、衛工處3.9億元(占3.7%)及大地處3.1億元(占3%)。平均每件工程預算金額依序為新工處1.4億元、衛工處6,456萬元、大地處2,851萬元、水利處2,027萬元及公園處1,181萬元。(詳圖二、表一、表二)

110年發包工程決標金額93.6億元，較109年減少49.6億元(-34.7%)，平均每件工程決標金額依序為新工處1.3億元、衛工處6,131萬元、大地處2,681萬元、水利處1,641萬元及公園處900萬元。決標占預算之標比²為88.4%，較109年下降4.1個百分點，其中以衛工處標比95%最高，其餘依序為大地處94.1%、新工處92%、水利處81%及公園處76.2%。(詳表一、表二)

¹ 110年決標之工程採購案件，不含勞務採購及未開工即解約者。


² 標比=(決標金額 / 預算金額)×100%，可反映發包單位對預算編列與廠商於市場競爭行為下之對價關係，標比過低可能隱含編列預算浮濫、不確實，或市場不當競爭、低價搶標。

圖一、各工程處公共工程發包件數

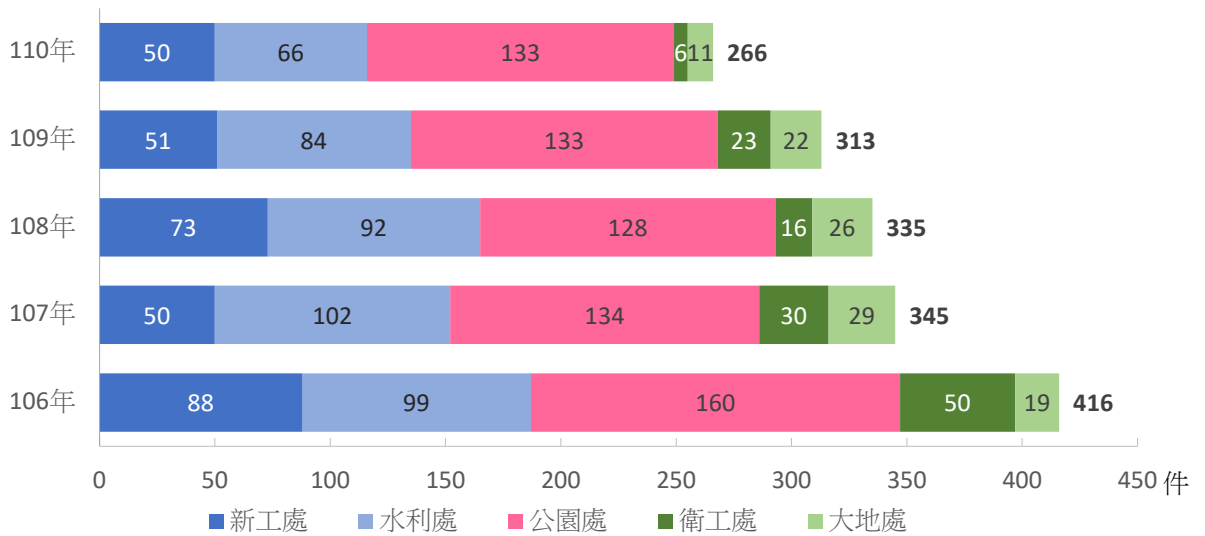

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。
 說明：包含預約維護及預定跨年完工工程。

圖二、各工程處公共工程預算金額

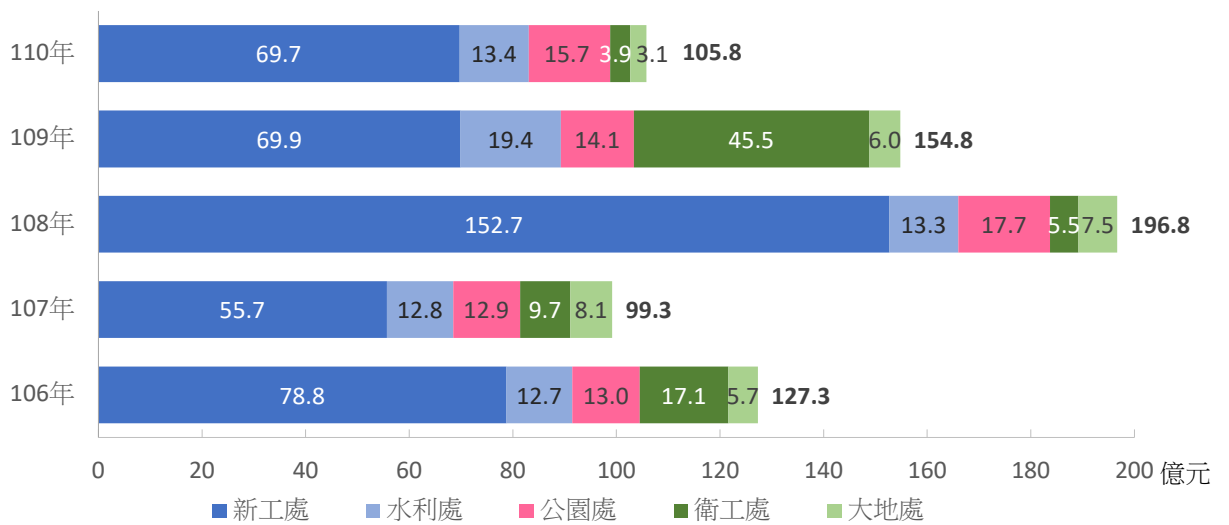

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。
 說明：包含預約維護及預定跨年完工工程。

表一、各工程處公共工程執行情形

110年

工程處	發包工程		預算			決標			變更設計率 ① (%)	開工率 ② (%)	完工率 ③ (%)	驗收率 ④ (%)
	件數	結構比	金額	結構比	平均每件工程金額	金額	結構比	平均每件工程金額				
	(件)	(%)	(億元)	(%)	(萬元)	(億元)	(%)	(萬元)				
總計	266	100.0	105.8	100.0	3,978	93.6	100.0	3,518	63.9	97.4	45.9	32.0
新工處	50	18.8	69.7	65.9	13,944	64.1	68.5	12,829	80.0	94.0	6.0	4.0
水利處	66	24.8	13.4	12.6	2,027	10.8	11.6	1,641	63.6	93.9	31.8	12.1
公園處	133	50.0	15.7	14.8	1,181	12.0	12.8	900	57.9	100.0	66.9	51.1
衛工處	6	2.3	3.9	3.7	6,456	3.7	3.9	6,131	66.7	100.0	16.7	-
大地處	11	4.1	3.1	3.0	2,851	2.9	3.2	2,681	63.6	100.0	72.7	63.6

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. ①變更設計率=變更設計件數/發包件數×100%、②開工率=已開工件數/發包件數×100%、
③完工率=已完工件數/發包件數×100%、④驗收率=已驗收件數/發包件數×100%。
2. 包含預約維護及預定跨年完工工程。

表二、各工程處公共工程預算、決標金額與標比

工程處	110年			109年			110年較109年增減數		
	預算金額 (億)	決標金額 (億)	標比 (%)	預算金額 (億)	決標金額 (億)	標比 (%)	預算金額 (億)	決標金額 (億)	標比 (百分點)
總計	105.8	93.6	88.4	154.8	143.2	92.5	-49.0	-49.6	-4.1
新工處	69.7	64.1	92.0	69.9	65.3	93.4	-0.2	-1.2	-1.4
水利處	13.4	10.8	81.0	19.4	17.7	91.0	-6.0	-6.8	-10.0
公園處	15.7	12.0	76.2	14.1	11.7	83.2	1.6	0.3	-7.0
衛工處	3.9	3.7	95.0	45.5	42.9	94.3	-41.6	-39.2	0.7
大地處	3.1	2.9	94.1	6.0	5.7	94.8	-2.8	-2.7	-0.8

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：包含預約維護及預定跨年完工工程。

表三、公共工程執行情形

執行情形	110年		109年		110年與109年比較			108年		107年		106年		
	件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)	件數		百分比 (百分點)	件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)	
					增減數	增減%								
總計	266	100.0	313	100.0	-47	-15.0	-	335	100.0	345	100.0	416	100.0	
招標方式	公開招標	261	98.1	309	98.7	-48	-15.5	-0.6	329	98.2	338	98.0	411	98.8
	限制性招標	5	1.9	4	1.3	1	25.0	0.6	6	1.8	5	1.4	2	0.5
	議價	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
	比價	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
	公開評選	-	-	-	-	-	--	-	-	-	2	0.6	-	-
其他	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	3	0.7	
變更設計	無	96	36.1	159	50.8	-63	-39.6	-14.7	150	44.8	166	48.1	201	48.3
	有	170	63.9	154	49.2	16	10.4	14.7	185	55.2	179	51.9	215	51.7
開工情形	已開工	259	97.4	281	89.8	-22	-7.8	7.6	316	94.3	319	92.5	394	94.7
	未開工	7	2.6	32	10.2	-25	-78.1	-7.6	19	5.7	26	7.5	22	5.3
完工情形	已完工	122	45.9	158	50.5	-36	-22.8	-4.6	186	55.5	192	55.7	227	54.6
	未完工	144	54.1	155	49.5	-11	-7.1	4.6	149	44.5	153	44.3	189	45.4
驗收情形	已驗收	85	32.0	108	34.5	-23	-21.3	-2.5	130	38.8	133	38.6	171	41.1
	未驗收	181	68.0	205	65.5	-24	-11.7	2.5	205	61.2	212	61.4	245	58.9
決算情形	已決算	46	17.3	59	18.8	-13	-22.0	-1.6	85	25.4	84	24.3	113	27.2
	未決算	220	82.7	254	81.2	-34	-13.4	1.6	250	74.6	261	75.7	303	72.8

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：包含預約維護及預定跨年完工工程。

(二) 發包工程中有 98.1% 以公開招標方式辦理，變更設計率³為 63.9%，較 109 年上升 14.7 個百分點。

就發包方式觀察，以公開招標方式辦理者 261 件(占 98.1%) 為最多，限制性招標議價方式辦理計有 5 件。(詳表三)

所有工程中曾辦理變更設計者計 170 件，變更設計率為 63.9%，較 109 年上升 14.7 個百分點，以新工處變更設計率 80% 為最高。(詳表一、表三)

(三) 開工率⁴97.4% 為近五年最高，較 109 年上升 7.6 個百分點。完工率⁵45.9% 為近五年最低，較 109 年下降 4.6 個百分點。

就開工情形觀察，110 年決標工程中，已開工施作者計 259

³ 變更設計率=變更設計件數/發包件數×100%。

⁴ 開工率=已開工件數/發包件數×100%。

⁵ 完工率=已完工件數/發包件數×100%。


件，開工率 97.4% 為近五年最高，較 109 年上升 7.6 個百分點，其中公園處、衛工處及大地處開工率達 100%。未開工者計 7 件（占 2.6%），分別為新工處 3 件、水利處 4 件，皆屬於次年預約維護（1 件）或預定跨年完工（6 件）工程。（詳圖三、表一、表三）

就完工情形觀察，至 110 年底已完工者計 122 件，完工率 45.9% 為近五年最低，較 109 年下降 4.6 個百分點，以大地處完工率 72.7% 最高，其餘依序為公園處 66.9%、水利處 31.8%、衛工處 16.7% 及新工處 6%。（詳圖三、表一、表三）

若排除預約維護及預定跨年完工工程，則新工處及大地處完工率皆為 100%，其餘依序為公園處 95.5%、水利處 64.3%，而衛工處 110 年發包之工程皆預定於 111 年以後完工。（詳圖四、表四）


已開工未完工工程計 137 件，加計未開工者 7 件，共計 144 件工程未完工（占 54.1%）。（詳表三）

圖三、公共工程變更設計、開工、完工、驗收比率

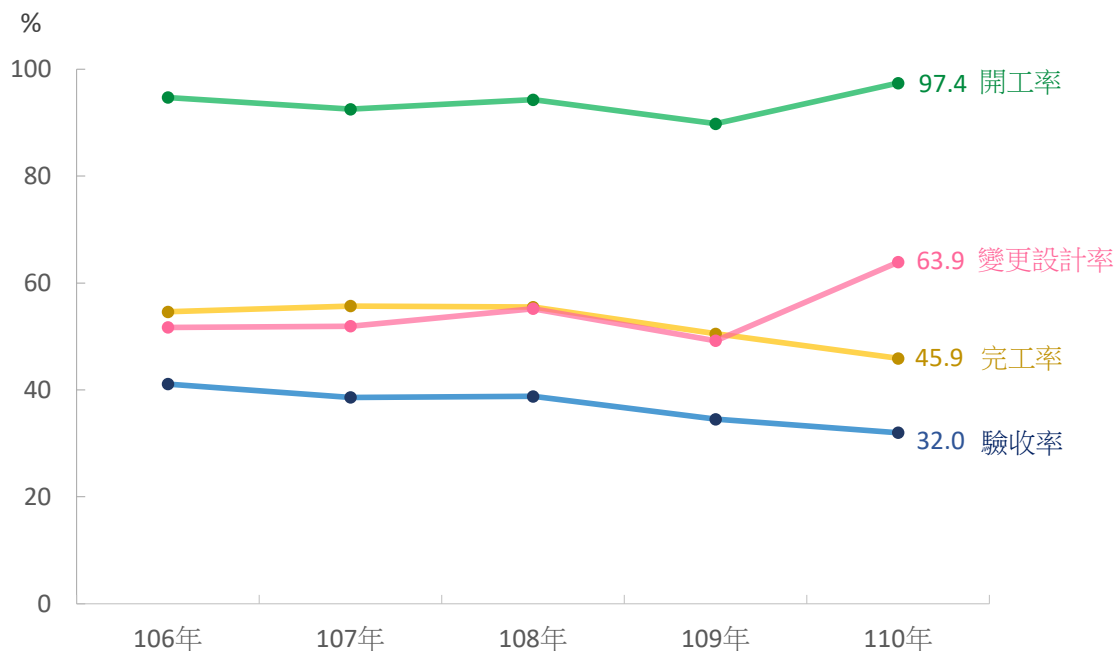

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。
說明：包含預約維護及預定跨年完工工程。

圖四、各工程處公共工程完工比率－排除預約維護及跨年工程

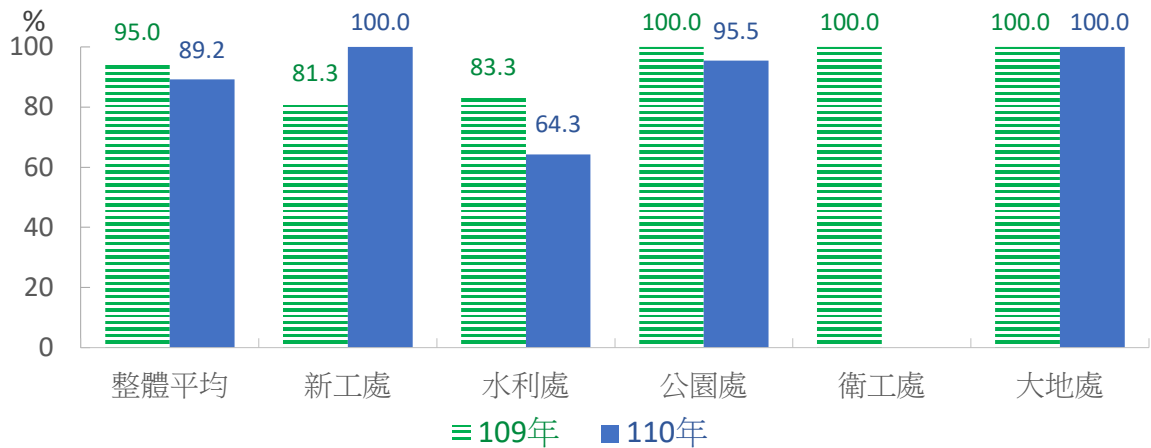

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. 比率=當年完工件數/預定當年完工且已開工件數×100%。

2. 不包含預約維護及預定跨年完工工程。

3. 衛工處 110 年發包之工程皆預定於 111 年以後完工。

表四、各工程處公共工程執行情形－排除預約維護及跨年工程

110 年

工程處	發包工程		預算			決標			變更設計率 ① (%)	開工率 ② (%)	完工率 ③ (%)	驗收率 ④ (%)
	件數 (件)	結構比 (%)	金額 (億元)	結構比 (%)	平均每件 工程金額 (萬元)	金額 (億元)	結構比 (%)	平均每件 工程金額 (萬元)				
總計	65	100.0	7.5	100.0	1,146	6.0	100.0	926	75.4	100.0	89.2	63.1
新工處	1	1.5	0.2	2.8	2,066	0.2	2.9	1,774	100.0	100.0	100.0	100.0
水利處	14	21.5	2.3	30.8	1,640	1.9	31.5	1,354	78.6	100.0	64.3	28.6
公園處	44	67.7	3.6	47.7	808	2.6	43.4	594	77.3	100.0	95.5	68.2
衛工處	-	--	-	--	--	-	--	--	--	--	--	--
大地處	6	9.2	1.4	18.7	2,319	1.3	22.1	2,221	50.0	100.0	100.0	100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. ①變更設計率=變更設計件數/發包件數×100%、②開工率=已開工件數/發包件數×100%、

③完工率=已完工件數/發包件數×100%、④驗收率=已驗收件數/發包件數×100%。

2. 不包含預約維護及預定跨年完工工程。

3. 衛工處 110 年發包之工程皆預定於 111 年以後完工。

(四) 驗收率⁶32%，較 109 年下降 2.5 個百分點。已驗收並辦理工程決算比率 17.3%，較 109 年下降 1.6 個百分點。

就驗收情形觀察，已完工並辦理驗收程序者計 85 件，驗收率 32% 為近五年最低，較 109 年下降 2.5 個百分點，以大地處驗收率 63.6% 最高，其餘依序為公園處 51.1%、水利處 12.1%、及新工處 4%，而衛工處完工工程皆為預定 111 年以後完工者提前於 110 年底完工，惟尚未驗收。(詳圖三、表一、表三)

若排除預約維護及預定跨年完工工程，則新工處及大地處驗收率皆為 100%，其餘依序為公園處 68.2% 及水利處 28.6%，而衛工處 110 年發包之工程皆預定於 111 年以後完工。(詳圖五、表四)

已完工未驗收工程計 37 件，加計未完工者，共計 181 件未辦理驗收 (占 68%)。(詳表三)

就決算情形觀察，已驗收並辦理工程決算者計 46 件 (占 17.3%)，已驗收尚未辦理決算 39 件，加計未驗收者，共計 220 件未辦理工程決算 (占 82.7%)。(詳表三)


(五) 工程決標月份

110 年決標之工程中，以 1 月決標 104 件 (占 39.1%) 最多，有 83.1% 的工程在上半年決標。

110 年決標之 266 件公共工程中，有 221 件 (占 83.1%) 在上半年決標；若按決標月分析，以 1 月決標 104 件 (占 39.1%) 最多，2 月決標 38 件 (占 14.3%) 次之，3 月決標 33 件 (占 12.4%) 為第 3。(詳統計表-表 2)

⁶ 驗收率=已驗收件數/發包件數×100%。

圖五、各工程處公共工程驗收比率－排除預約維護及跨年工程

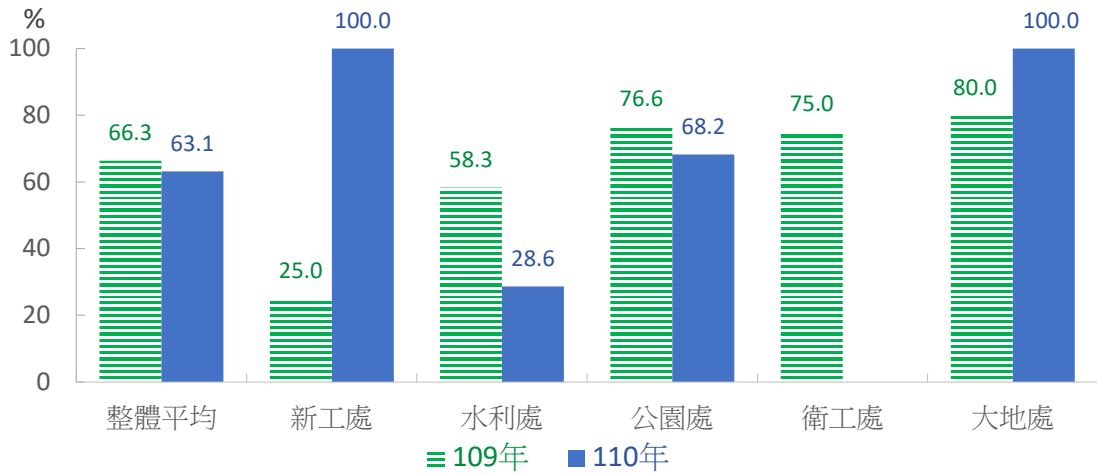

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. 比率=當年驗收件數/預定當年完工且已開工件數×100%。

2. 不包含預約維護及預定跨年完工工程。

3. 衛工處 110 年發包之工程皆預定於 111 年以後完工。

二、工程執行績效（排除預約維護及跨年工程）

110 年決標之工程中，排除預約維護及預定跨年完工者後，共計 65 件，分別為公園處 44 件、水利處 14 件，大地處 6 件及新工處 1 件，而衛工處 110 年發包之工程皆預定於 111 年以後完工，故不進行績效分析。

（一）開工績效：新工處、水利處、公園處及大地處開工率皆為 100%。平均每件工程待工日數以大地處 20.7 日最短，新工處 51 日最久。

排除預約維護及預定跨年完工工程後，110 年工務局執行公共工程開工率為 100%，新工處、水利處、公園處及大地處開工率皆為 100%。（詳圖六、表四）

110 年已開工工程中，平均每件工程待工日⁷數為 32.7 日，較 109 年縮短 6.5 日，以大地處 20.7 日最短，新工處 51 日最久。（詳圖七、圖八）

⁷ 待工日數：開工日與決標日之差距日數，日數愈少績效愈佳。

(二) 完工績效：新工處、大地處完工率皆為 100%，水利處 64.3% 低於平均值。公園處平均每件工程提早 14.8 日完工，提早最多，水利處則落後 11.2 日。

排除預約維護及預定跨年完工工程後，110 年工務局執行公共工程完工率為 89.2%，其中新工處、大地處 100% 及公園處 95.5% 超過整體平均值，水利處 64.3% 低於平均值。(詳圖六、表四)

110 年已完工工程中，平均每件提早完工日數⁸為 10.4 日，較 109 年縮短 0.6 日，以公園處平均提早 14.8 日最多，其餘依序為大地處 13.8 日、新工處 0 日，水利處則落後 11.2 日。(詳圖七、圖八)

若依工程性質觀察，在整建工程中，以公園處提早 15.4 日完工績效最佳，新建工程亦以公園處提早 3 日完工績效最佳。(詳表五)

(三) 驗收績效：新工處、大地處驗收率皆為 100%，水利處 28.6% 低於平均值。公園處平均每件完工工程驗收日數 27.3 日最短，新工處 57 日最長。

排除預約維護及預定跨年完工工程後，110 年已完工工程驗收率為 63.1%，其中新工處、大地處驗收率 100% 及公園處 68.2% 超過整體平均值，水利處 28.6% 低於平均值。(詳圖六、表四)


平均每件完工工程驗收日數⁹為 30.2 日，較 109 年增加 3.3 日，以公園處 27.3 日最短，其餘依序為大地處 36 日、水利處 37 日及新工處 57 日。(詳圖七、圖八)

⁸ 提早完工日數：預定完工日與實際完工日之差距日數，日數愈多績效愈佳。負值表示延期完工。

⁹ 驗收日數：完工日與驗收完成日之差距日數，日數愈少績效愈佳。

圖六、各工程處公共工程開工、完工及驗收比率－排除預約維護及跨年工程

110年

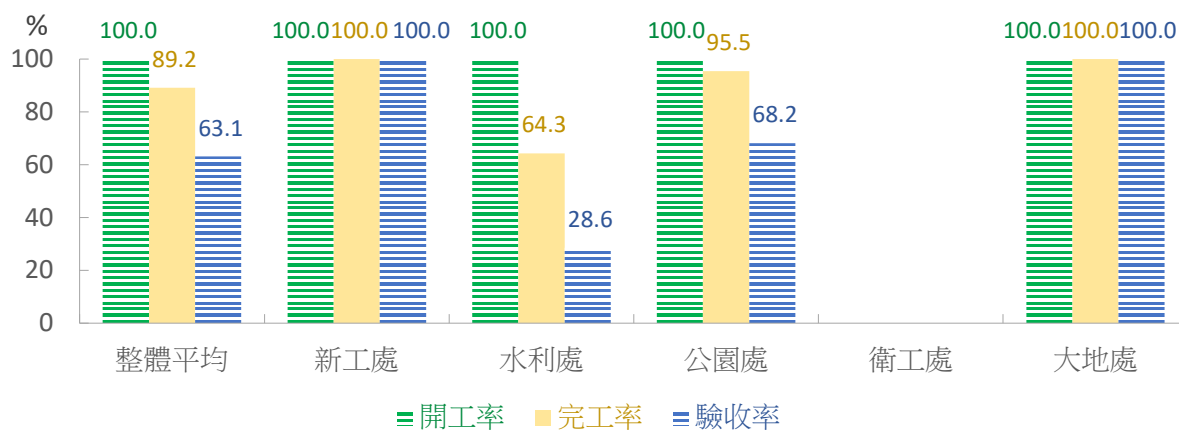


資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. 不包含預約維護及預定跨年完工工程。

2. 衛工處 110 年發包之工程皆預定於 111 年以後完工。

圖七、公共工程待工、提早完工、驗收日數－排除預約維護及跨年工程

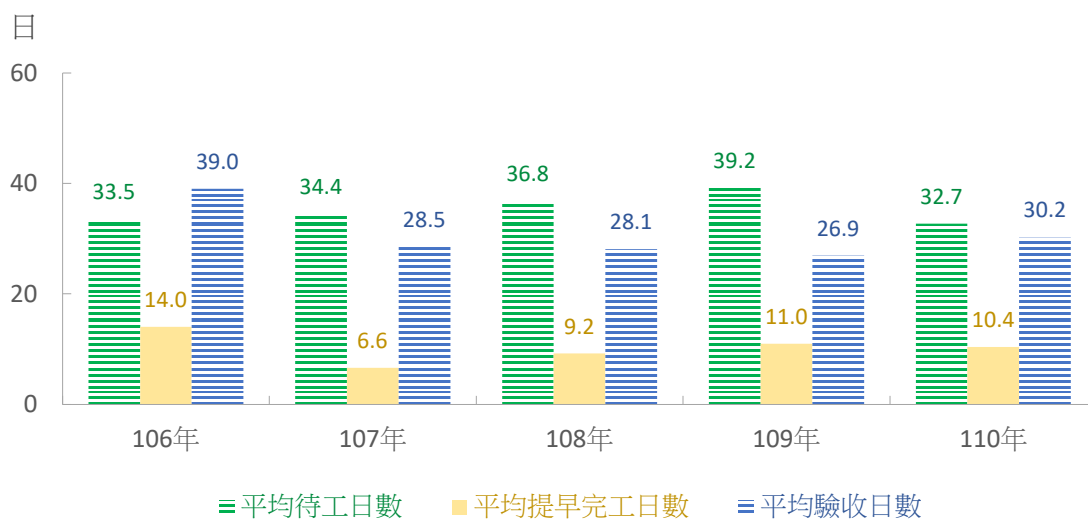


資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. 不包含預約維護及預定跨年完工工程。

2. 衛工處 110 年發包之工程皆預定於 111 年以後完工。

圖八、各工程處公共工程待工、提早完工、驗收日數－排除預約維護及跨年工程

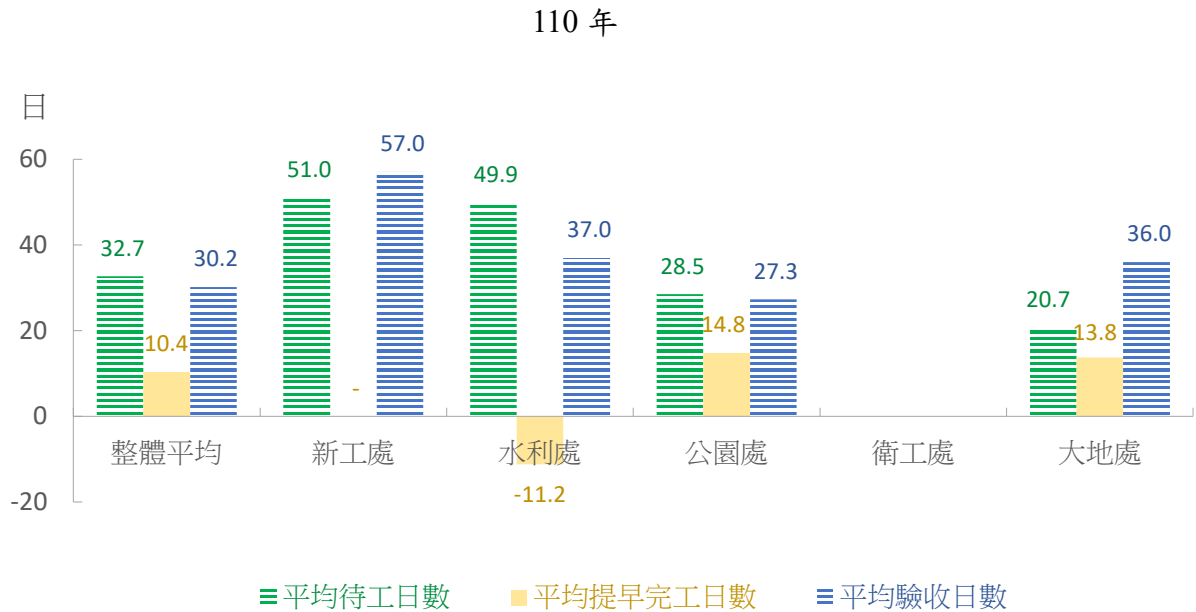

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. 不包含預約維護及預定跨年完工工程。

2. 衛工處 110 年發包之工程皆預定於 111 年以後完工。

表五、各工程處公共工程完工績效－排除預約維護及跨年工程

110 年

工程性質	總 計	新工處	水利處	公園處	衛工處	大地處
已完工件數(件)	58	1	9	42	-	6
預約維護工程	-	-	-	-	-	-
整建工程	55	1	8	40	-	6
新建工程	3	-	1	2	-	-
完工率(%)	89.2	100.0	64.3	95.5	--	100.0
預約維護工程	--	--	--	--	--	--
整建工程	90.2	100.0	66.7	95.2	--	100.0
新建工程	75.0	--	50.0	100.0	--	--
平均提早完工日數(日)	10.4	-	-11.2	14.8	--	13.8
預約維護工程	--	--	--	--	--	--
整建工程	10.8	-	-12.6	15.4	--	13.8
新建工程	2.0	--	-	3.0	--	--

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. 不包含預約維護及預定跨年完工工程。

2. 衛工處 110 年發包之工程皆預定於 111 年以後完工。

統計表

表1 公共工程發包及執行件數－按工程處分

110年

單位：件；%

執行情形		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處		
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	
總計		266	100.0	50	100.0	66	100.0	133	100.0	6	100.0	11	100.0	
發包方式	公開招標	261	98.1	50	100.0	64	97.0	130	97.7	6	100.0	11	100.0	
	限制性招標	議價	5	1.9	-	-	2	3.0	3	2.3	-	-	-	-
		比價	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		公開評選	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
變更設計	無	96	36.1	10	20.0	24	36.4	56	42.1	2	33.3	4	36.4	
	有	170	63.9	40	80.0	42	63.6	77	57.9	4	66.7	7	63.6	
開工情形	已開工	259	97.4	47	94.0	62	93.9	133	100.0	6	100.0	11	100.0	
	未開工	7	2.6	3	6.0	4	6.1	-	-	-	-	-	-	
完工情形	已完工	122	45.9	3	6.0	21	31.8	89	66.9	1	16.7	8	72.7	
	未完工①	144	54.1	47	94.0	45	68.2	44	33.1	5	83.3	3	27.3	
驗收情形	已驗收	85	32.0	2	4.0	8	12.1	68	51.1	-	-	7	63.6	
	未驗收②	181	68.0	48	96.0	58	87.9	65	48.9	6	100.0	4	36.4	
決算情形	已決算	46	17.3	1	2.0	3	4.5	42	31.6	-	-	-	-	
	未決算③	220	82.7	49	98.0	63	95.5	91	68.4	6	100.0	11	100.0	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

附註：①未完工工程中，已開工者計 137 件。

②未驗收工程中，已完工者計 37 件。

③未決算工程中，已驗收者計 39 件。

表2 公共工程發包及執行件數—按決標月分

110年

單位：件；%

執行情形		總計	1-6月 小計	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
總計	件數	266	221	104	38	33	17	15	14		
	百分比	100.0	83.1	39.1	14.3	12.4	6.4	5.6	5.3		
發包方式	公開招標	件數	261	217	104	35	33	17	15	13	
		百分比	100.0	83.1	39.8	13.4	12.6	6.5	5.7	5.0	
	限制性招標	議價	件數	5	4	-	3	-	-	-	1
			百分比	100.0	80.0	-	60.0	-	-	-	20.0
		比價	件數	-	-	-	-	-	-	-	-
			百分比	-	-	-	-	-	-	-	-
	公開評選	件數	-	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	-	
	其他	件數	-	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	-	
開工情形	已開工	件數	259	221	104	38	33	17	15	14	
		百分比	100.0	85.3	40.2	14.7	12.7	6.6	5.8	5.4	
	未開工	件數	7	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	100.0	-	-	-	-	-	-	-	
完工情形	已完工	件數	122	113	45	22	23	9	8	6	
		百分比	100.0	92.6	36.9	18.0	18.9	7.4	6.6	4.9	
	未完工	件數	144	108	59	16	10	8	7	8	
		百分比	100.0	75.0	41.0	11.1	6.9	5.6	4.9	5.6	
驗收情形	已驗收	件數	85	79	35	18	16	3	5	2	
		百分比	100.0	92.9	41.2	21.2	18.8	3.5	5.9	2.4	
	未驗收	件數	181	142	69	20	17	14	10	12	
		百分比	100.0	78.5	38.1	11.0	9.4	7.7	5.5	6.6	
決算情形	已決算	件數	46	43	23	6	9	-	4	1	
		百分比	100.0	93.5	50.0	13.0	19.6	-	8.7	2.2	
	未決算	件數	220	178	81	32	24	17	11	13	
		百分比	100.0	80.9	36.8	14.5	10.9	7.7	5.0	5.9	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表2 公共工程發包及執行件數－按決標月分（續）

110年

單位：件；%

執行情形		7-12月 小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
總計	件數	45	15	14	3	8	4	1		
	百分比	16.9	5.6	5.3	1.1	3.0	1.5	0.4		
發包方式	公開招標	件數	44	14	14	3	8	4	1	
		百分比	16.9	5.4	5.4	1.1	3.1	1.5	0.4	
	限制性招標	議價	件數	1	1	-	-	-	-	
			百分比	20.0	20.0	-	-	-	-	-
		比價	件數	-	-	-	-	-	-	-
			百分比	-	-	-	-	-	-	-
	公開評選	件數	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	
	其他	件數	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	
開工情形	已開工	件數	38	15	13	1	8	1	-	
		百分比	14.7	5.8	5.0	0.4	3.1	0.4	-	
	未開工	件數	7	-	1	2	-	3	1	
		百分比	100.0	-	14.3	28.6	-	42.9	14.3	
完工情形	已完工	件數	9	5	3	-	1	-	-	
		百分比	7.4	4.1	2.5	-	0.8	-	-	
	未完工	件數	36	10	11	3	7	4	1	
		百分比	25.0	6.9	7.6	2.1	4.9	2.8	0.7	
驗收情形	已驗收	件數	6	4	1	-	1	-	-	
		百分比	7.1	4.7	1.2	-	1.2	-	-	
	未驗收	件數	39	11	13	3	7	4	1	
		百分比	21.5	6.1	7.2	1.7	3.9	2.2	0.6	
決算情形	已決算	件數	3	2	-	-	1	-	-	
		百分比	6.5	4.3	-	-	2.2	-	-	
	未決算	件數	42	13	14	3	7	4	1	
		百分比	19.1	5.9	6.4	1.4	3.2	1.8	0.5	

表3 公共工程已發包未開工件數—按決標月分

110年

單位：件；%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	7	100.0	3	100.0	4	100.0	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	1	14.3	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	2	28.6	1	33.3	1	25.0	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	3	42.9	1	33.3	2	50.0	-	-	-	-	-	-
12月	1	14.3	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表4 公共工程已開工未完工件數—按開工月分

110年

單位：件；%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	137	100.0	44	100.0	41	100.0	44	100.0	5	100.0	3	100.0
1月	2	1.5	1	2.3	-	-	1	2.3	-	-	-	-
2月	10	7.3	-	-	-	-	10	22.7	-	-	-	-
3月	39	28.5	24	54.5	4	9.8	8	18.2	3	60.0	-	-
4月	25	18.2	12	27.3	10	24.4	2	4.5	-	-	1	33.3
5月	6	4.4	1	2.3	3	7.3	1	2.3	-	-	1	33.3
6月	8	5.8	2	4.5	1	2.4	4	9.1	-	-	1	33.3
7月	13	9.5	2	4.5	6	14.6	5	11.4	-	-	-	-
8月	9	6.6	-	-	4	9.8	5	11.4	-	-	-	-
9月	10	7.3	1	2.3	4	9.8	5	11.4	-	-	-	-
10月	4	2.9	-	-	3	7.3	1	2.3	-	-	-	-
11月	6	4.4	1	2.3	3	7.3	2	4.5	-	-	-	-
12月	5	3.6	-	-	3	7.3	-	-	2	40.0	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表5 公共工程已完工未驗收件數—按完工月分

110年

單位：件，%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	37	100.0	1	100.0	13	100.0	21	100.0	1	100.0	1	100.0
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	1	2.7	-	-	-	-	1	4.8	-	-	-	-
11月	7	18.9	-	-	1	7.7	6	28.6	-	-	-	-
12月	29	78.4	1	100.0	12	92.3	14	66.7	1	100.0	1	100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表6 公共工程已驗收未結清經費件數—按驗收月分

110年

單位：件，%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	39	100.0	1	100.0	5	100.0	26	100.0	-	-	7	100.0
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	1	2.6	-	-	-	-	1	3.8	-	-	-	-
11月	2	5.1	-	-	-	-	2	7.7	-	-	-	-
12月	36	92.3	1	100.0	5	100.0	23	88.5	-	-	7	100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表7 公共工程決標件數—按決標金額分

110年

單位：件；%

決標金額	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	266	100.0	50	100.0	66	100.0	133	100.0	6	100.0	11	100.0
100萬元以下	5	1.9	-	-	1	1.5	4	3.0	-	-	-	-
100-500萬元	63	23.7	-	-	12	18.2	51	38.3	-	-	-	-
500-1,000萬元	81	30.5	4	8.0	23	34.8	52	39.1	-	-	2	18.2
1,000-5,000萬元	94	35.3	30	60.0	28	42.4	24	18.0	4	66.7	8	72.7
5,000萬-1億元	12	4.5	9	18.0	1	1.5	1	0.8	-	-	1	9.1
1億元以上	11	4.1	7	14.0	1	1.5	1	0.8	2	33.3	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表8 公共工程決標金額與底價差距

110年

單位：件；%

差距金額	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	266	100.0	50	100.0	66	100.0	133	100.0	6	100.0	11	100.0
超底價決標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0元	69	25.9	12	24.0	30	45.5	16	12.0	-	-	11	100.0
10萬元以下	43	16.2	12	24.0	21	31.8	10	7.5	-	-	-	-
10-50萬元	31	11.7	9	18.0	4	6.1	18	13.5	-	-	-	-
50-100萬元	28	10.5	4	8.0	5	7.6	19	14.3	-	-	-	-
100-500萬元	88	33.1	12	24.0	6	9.1	65	48.9	5	83.3	-	-
500-1,000萬元	6	2.3	1	2.0	-	-	4	3.0	1	16.7	-	-
1,000-5,000萬元	1	0.4	-	-	-	-	1	0.8	-	-	-	-
5,000萬元以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為決標金額與底價相同。

表9 公共工程決標金額與底價差距比率

110年

單位：件；%

金額差距比率		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計		266	100.0	50	100.0	66	100.0	133	100.0	6	100.0	11	100.0
超底價決標	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	超過底價20%以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	超過底價10%-20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	超過底價小於10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
與底價相同決標		69	25.9	12	24.0	30	45.5	16	12.0	-	-	11	100.0
低於底價決標	小計	197	74.1	38	76.0	36	54.5	117	88.0	6	100.0	-	-
	低於底價10%	101	38.0	33	66.0	27	40.9	36	27.1	5	83.3	-	-
	低於底價10%-20%	50	18.8	5	10.0	6	9.1	38	28.6	1	16.7	-	-
	低於底價20%-30%	19	7.1	-	-	2	3.0	17	12.8	-	-	-	-
	低於底價30%-40%	12	4.5	-	-	1	1.5	11	8.3	-	-	-	-
	低於底價40%-50%	13	4.9	-	-	-	-	13	9.8	-	-	-	-
低於底價50%以上		2	0.8	-	-	-	-	2	1.5	-	-	-	-
最低決標與底價比率(%)		48.0		84.2		66.5		48.0		86.2		100.0	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表10 公共工程變更設計增減金額

110年

單位：件；%

增減金額		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計		170	100.0	40	100.0	42	100.0	77	100.0	4	100.0	7	100.0
0元		6	3.5	1	2.5	3	7.1	1	1.3	1	25.0	-	-
追加工程經費	小計	144	84.7	39	97.5	34	81.0	63	81.8	3	75.0	5	71.4
	10萬元以下	9	5.3	-	-	2	4.8	5	6.5	-	-	2	28.6
	10-50萬元	19	11.2	1	2.5	6	14.3	12	15.6	-	-	-	-
	50-100萬元	14	8.2	-	-	2	4.8	12	15.6	-	-	-	-
	100-500萬元	55	32.4	5	12.5	13	31.0	32	41.6	3	75.0	2	28.6
	500-1,000萬元	13	7.6	4	10.0	8	19.0	1	1.3	-	-	-	-
	1,000-5,000萬元	20	11.8	15	37.5	3	7.1	1	1.3	-	-	1	14.3
5,000萬元以上		14	8.2	14	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
追減工程經費		20	11.8	-	-	5	11.9	13	16.9	-	-	2	28.6

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為雖有變更設計但無追加減工程經費。

表11 公共工程變更設計增減金額與決標金額差距比率

110年

單位：件；%

金額差距比率		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計		170	100.0	40	100.0	42	100.0	77	100.0	4	100.0	7	100.0
追加 工程 經費	合計	144	84.7	39	97.5	34	81.0	63	81.8	3	75.0	5	71.4
	增加50%以上	48	28.2	28	70.0	12	28.6	8	10.4	-	-	-	-
	增加40%~50%	7	4.1	1	2.5	2	4.8	4	5.2	-	-	-	-
	增加30%~40%	13	7.6	-	-	5	11.9	7	9.1	-	-	1	14.3
	增加20%~30%	12	7.1	2	5.0	1	2.4	9	11.7	-	-	-	-
	增加10%~20%	17	10.0	5	12.5	3	7.1	8	10.4	1	25.0	-	-
	增加10%以內	47	27.6	3	7.5	11	26.2	27	35.1	2	50.0	4	57.1
無追加減經費		6	3.5	1	2.5	3	7.1	1	1.3	1	25.0	-	-
追減 工程 經費	合計	20	11.8	-	-	5	11.9	13	16.9	-	-	2	28.6
	追減10%以內	16	9.4	-	-	5	11.9	9	11.7	-	-	2	28.6
	追減10%~20%	3	1.8	-	-	-	-	3	3.9	-	-	-	-
	追減20%~30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	追減30%~40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	追減40%~50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	追減50%以上	1	0.6	-	-	-	-	1	1.3	-	-	-	-
增加經費占決標金額 比率最大者(%)		447.5		447.5		206.4		118.0		10.3		34.4	
追減經費占決標金額 比率最大者(%)		-60.0		-		-5.3		-60.0		-		-1.0	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表12 公共工程待工日數

110年

單位：件；%

待工日數	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	259	100.0	47	100.0	62	100.0	133	100.0	6	100.0	11	100.0
0日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-14日	10	3.9	1	2.1	1	1.6	4	3.0	-	-	4	36.4
15-29日	90	34.7	-	-	10	16.1	75	56.4	-	-	5	45.5
30-44日	62	23.9	4	8.5	16	25.8	36	27.1	4	66.7	2	18.2
45-59日	40	15.4	15	31.9	17	27.4	8	6.0	-	-	-	-
60-74日	30	11.6	13	27.7	12	19.4	3	2.3	2	33.3	-	-
75-89日	17	6.6	9	19.1	4	6.5	4	3.0	-	-	-	-
90日以上	10	3.9	5	10.6	2	3.2	3	2.3	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.待工日數為工程決標與開工日期之差距日數。

2.「0日」為決標當日即開工之工程。

3.其他為因應緊急需要先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前

4.最大差距日數為199日，待工超過100日以上者計9件。

5.已決標未開工者計7件。

表13 公共工程已開工件數—按預定完工年分

110年

單位：件；%

完工年	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	259	100.0	47	100.0	62	100.0	133	100.0	6	100.0	11	100.0
110年完工	157	60.6	12	25.5	45	72.6	92	69.2	1	16.7	7	63.6
111年完工	83	32.0	19	40.4	16	25.8	41	30.8	3	50.0	4	36.4
112年完工	18	6.9	15	31.9	1	1.6	-	-	2	33.3	-	-
113年完工	1	0.4	1	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
114年完工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表14 公共工程預定完工與實際完工日數差距

110年

單位：件；%

差距日數		總 計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總 計		122	100.0	3	100.0	21	100.0	89	100.0	1	100.0	8	100.0
提早完工日數	合 計	79	64.8	2	66.7	7	33.3	62	69.7	-	-	8	100.0
	180日以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150-179日	1	0.8	-	-	-	-	1	1.1	-	-	-	-
	120-149日	1	0.8	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	90-119日	5	4.1	1	33.3	-	-	4	4.5	-	-	-	-
	60-89日	5	4.1	-	-	3	14.3	2	2.2	-	-	-	-
	30-59日	23	18.9	-	-	-	-	22	24.7	-	-	1	12.5
	1-29日	44	36.1	-	-	4	19.0	33	37.1	-	-	7	87.5
0 日		33	27.0	1	33.3	9	42.9	22	24.7	1	100.0	-	-
延遲完工日數	合 計	10	8.2	-	-	5	23.8	5	5.6	-	-	-	-
	1-29日	6	4.9	-	-	3	14.3	3	3.4	-	-	-	-
	30-59日	4	3.3	-	-	2	9.5	2	2.2	-	-	-	-
	60-89日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90-119日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120-149日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150-179日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180日以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提早完工最多日數(日)		153		126		76		153		-		34	
延遲完工最多日數(日)		37		-		34		37		-		-	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說 明：0日為預定完工日當日完工者。

表15 公共工程完工日數

110年

單位：件；%

完工日數	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	122	100.0	3	100.0	21	100.0	89	100.0	1	100.0	8	100.0
0-59日	3	2.5	-	-	1	4.8	2	2.2	-	-	-	-
60-119日	14	11.5	-	-	6	28.6	8	9.0	-	-	-	-
120-179日	20	16.4	1	33.3	4	19.0	12	13.5	-	-	3	37.5
180-239日	27	22.1	1	33.3	5	23.8	17	19.1	-	-	4	50.0
240-299日	45	36.9	1	33.3	4	19.0	40	44.9	-	-	-	-
300-359日	13	10.7	-	-	1	4.8	10	11.2	1	100.0	1	12.5
360日以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表16 公共工程驗收日與完工日差距

110年

單位：件；%

差距日數	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	85	100.0	2	100.0	8	100.0	68	100.0	-	-	7	100.0
0日	1	1.2	-	-	-	-	1	1.5	-	-	-	-
1-14日	28	32.9	-	-	-	-	28	41.2	-	-	-	-
15-29日	29	34.1	-	-	2	25.0	24	35.3	-	-	3	42.9
30-44日	17	20.0	-	-	5	62.5	10	14.7	-	-	2	28.6
45-59日	7	8.2	1	50.0	1	12.5	3	4.4	-	-	2	28.6
60-74日	2	2.4	-	-	-	-	2	2.9	-	-	-	-
75-89日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90日以上	1	1.2	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
完成驗收需要最多日數(日)	96		96		46		67		-		57	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.「0日」為工程完工日即完成驗收程序者。

2.最大差距日數為96日，差距超過100日以上者計有0件。

3.已完工未驗收者計37件。

表17 公共工程預算結餘金額

110年

單位：件；%

結餘金額	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	46	100.0	1	100.0	3	100.0	42	100.0	-	-	-	-
無經費結餘	1	2.2	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10萬元以下	7	15.2	-	-	1	33.3	6	14.3	-	-	-	-
10-50萬元	4	8.7	-	-	-	-	4	9.5	-	-	-	-
50-100萬元	4	8.7	-	-	-	-	4	9.5	-	-	-	-
100-500萬元	30	65.2	-	-	2	66.7	28	66.7	-	-	-	-
500-1,000萬元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,000-5,000萬元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,000萬元以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工程經費剩餘最多金額(萬元)	428		-		210		428		-		-	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表18 公共工程預算結餘與施工預算差距比率

110年

單位：件；%

金額差距比率	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	46	100.0	1	100.0	3	100.0	42	100.0	-	-	-	-
無預算結餘	1	2.2	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
結餘10%以下	12	26.1	-	-	1	33.3	11	26.2	-	-	-	-
結餘10%~20%	2	4.3	-	-	-	-	2	4.8	-	-	-	-
結餘20%~30%	12	26.1	-	-	2	66.7	10	23.8	-	-	-	-
結餘30%~40%	7	15.2	-	-	-	-	7	16.7	-	-	-	-
結餘40%~50%	1	2.2	-	-	-	-	1	2.4	-	-	-	-
結餘50%~60%	2	4.3	-	-	-	-	2	4.8	-	-	-	-
結餘60%以上	9	19.6	-	-	-	-	9	21.4	-	-	-	-
預算結餘最多之比率(%)	98.5		-		29.4		98.5		-		-	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表19 公共工程已決算概況

110年

項目別	總計	新建 工程處	水利 工程處	公園路燈 工程管理處	衛生下水道 工程處	大地 工程處
已驗收已決算件數(件)	46	1	3	42	-	-
變更設計工程件數(件)	25	-	1	24	-	-
變更設計件數占已決算件數 比率(%)	54.3	-	33.3	57.1	-	-
施工預算數(萬元)	28,101	1,443	1,356	25,302	-	-
決標金額(萬元)	19,514	1,380	1,090	17,044	-	-
決標金額占預算比率(%)	69.4	95.6	80.4	67.4	-	-
工程決算金額(萬元)	20,763	1,443	1,022	18,298	-	-
工程決算金額占預算比率(%)	73.9	100.0	75.4	72.3	-	-
預算結餘金額(萬元)	7,338	-	333	7,004	-	-
預算結餘占預算金額比率(%)	26.1	-	24.6	27.7	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：已驗收未決算者計 39 件。

表20 公共工程已驗收未決算件數

110年

單位：件

驗收日距年底日數	總計	新建 工程處	水利 工程處	公園路燈 工程管理處	衛生下水道 工程處	大地 工程處
總計	39	1	5	26	-	7
0-14日	22	-	1	16	-	5
15-29日	13	1	3	7	-	2
30-44日	2	-	1	1	-	-
45-59日	1	-	-	1	-	-
60-74日	1	-	-	1	-	-
75-89日	-	-	-	-	-	-
90-104日	-	-	-	-	-	-
105-119日	-	-	-	-	-	-
120日以上	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表21 公共工程執行績效

110年

單位	總計	新建工程處	水利工程處	公園路燈工程管理處	衛生下水道工程處	大地工程處
工程發包件數(件) ①	266	50	66	133	6	11
預約維護	140	40	32	63	4	1
111年開工	1	-	1	-	-	-
整建工程	109	2	30	66	2	9
新建工程	17	8	4	4	-	1
已開工件數(件) ②	259	47	62	133	6	11
預約維護	139	40	31	63	4	1
111年開工	-	-	-	-	-	-
整建工程	106	2	27	66	2	9
新建工程	14	5	4	4	-	1
開工績效						
開工率(%) ③=②/①	97.4	94.0	93.9	100.0	100.0	100.0
預約維護	99.3	100.0	96.9	100.0	100.0	100.0
整建工程	97.2	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0
新建工程	82.4	62.5	100.0	100.0	--	100.0
平均待工日數(日)	44.1	69.3	50.7	33.7	51.7	20.8
預約維護	46.7	63.0	49.6	35.8	42.0	10.0
整建工程	38.1	120.0	52.0	31.3	71.0	19.9
新建工程	64.5	99.6	51.0	40.3	--	40.0
完工績效						
已完工件數(件) ④	122	3	21	89	1	8
預約維護	61	2	12	45	1	1
整建工程	58	1	8	42	-	7
新建工程	3	-	1	2	-	-
完工率(%) ⑤=④/①	45.9	6.0	31.8	66.9	16.7	72.7
預約維護	43.6	5.0	37.5	71.4	25.0	100.0
整建工程	53.2	50.0	26.7	63.6	-	77.8
新建工程	17.6	-	25.0	50.0	--	-
平均提早完工日數(日)	20.7	72.0	5.8	22.9	-	18.3
預約維護	26.7	108.0	18.6	25.8	-	29.0
整建工程	15.2	-	-12.6	20.7	--	16.7
新建工程	2.0	--	-	3.0	--	--
驗收績效						
已驗收件數(件) ⑥	85	2	8	68	-	7
預約維護	42	1	4	36	-	1
整建工程	42	1	3	32	-	6
新建工程	1	-	1	-	-	-
驗收率(%) ⑦=⑥/①	32.0	4.0	12.1	51.1	-	63.6
預約維護	30.0	2.5	12.5	57.1	-	100.0
整建工程	38.5	50.0	10.0	48.5	-	66.7
新建工程	5.9	-	25.0	-	--	-
平均驗收日數(日)	23.5	76.5	34.4	19.6	--	33.6
預約維護	17.0	96.0	31.8	13.1	--	19.0
整建工程	29.6	57.0	35.0	27.1	--	36.0
新建工程	43.0	--	43.0	--	--	--

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表22 公共工程未開工明細表

110年

序號	發包單位	合約編號	施工預算 (萬元)	底價金額 (萬元)	決標金額 (萬元)	決標日期	發包工程名稱
總計	--	--	187,157	172,078	171,950	--	--
1	新工處	110030	21,276	19,986	19,986	110.08.03	成功市場改建工程水電空調工程
2	新工處	110033	45,146	41,213	41,200	110.09.08	南港立體連通平臺及其附屬綠化設施統包工程
3	新工處	110040	116,887	107,254	107,250	110.11.02	國家生技研究園區聯外道路工程
4	水利處	110169	569	550	438	110.11.19	忠孝抽水站主油槽暨長安抽水站3號抽水機油封等附屬設備維護更新工程
5	水利處	110054-1	1,200	1,152	1,152	110.12.22	(110)雨水下水道人孔調升降緊急搶修工程(111年度續約)
6	水利處	110150	900	832	832	110.09.03	本市特色雨水人孔蓋統包工程
7	水利處	110172	1,179	1,092	1,092	110.11.29	內湖大溝溪治水園區等2項附屬設施改善工程

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：110年已發包未開工工程計有7件，其中新工處3件，水利處4件，公園處0件，衛工處0件，大地處0件。

110年臺北市工業及服務業普查

普查做得好  政策制定沒煩惱

普查期間：111年6月1日至7月31日

普查對象：臺北市從事工業及服務業之企業、場所單位



5月18日至6月30日開放網路填報
網填e起來 機會抽好禮


3不+2會 普查好放心

-  普查員**不會**洩漏受查廠商資料給任何人
-  普查員**不會**詢問與普查表無關的資料
-  普查員**不會**要您提供帳戶或存摺
-  普查員**會**佩戴普查員證
-  普查員**會**遞(寄)送致受查單位函



網路填報

smarTtaipei 智慧城市 1+7



主辦
機關

行政院主計總處

協辦
機關

臺北市政府及臺北市各區公所
