



中華民國 112 年

臺北市政府工務局 公共工程執行概況



臺北市政府工務局 編製 中華民國 113 年 3 月

說 明

- 一、本報告係應市議會第6屆第一次大會議員問政所需並按年彙編，報告內容呈現工務局所屬各工程處公共工程發包作業、執行績效概況。
- 二、本報告之資料來源為工務局所屬各工程處「112年各項工程發包及執行情形」年報表，以工程採購為統計標的，不含勞務採購。
- 三、報告中金額均指新臺幣。表內數字太長者酌予提高單位，因尾數四捨五入，故部分總數與細項間或有未能吻合情事，計算時仍以原始數據計算。
- 四、統計表中符號代表意義如下：
 - 「-」：無數值或數值無統計。
 - 「0」：數值不及半單位。
 - 「--」：數值無意義。
 - 「…」：數值尚未發布。

目 次

壹、提要分析

- 一、概述..... 1
- 二、工程執行績效（排除預約維護及跨年工程）..... 8

貳、統計表

- 表 1 公共工程發包及執行件數－按工程處分..... 13
- 表 2 公共工程發包及執行件數－按決標月分..... 14
- 表 3 公共工程已發包未開工件數－按決標月分..... 16
- 表 4 公共工程已開工未完工件數－按開工月分..... 16
- 表 5 公共工程已完工未驗收件數－按完工月分..... 17
- 表 6 公共工程已驗收未結清經費件數－按驗收月分..... 17
- 表 7 公共工程決標件數－按決標金額分..... 18
- 表 8 公共工程決標金額與底價差距..... 18
- 表 9 公共工程決標金額與底價差距比率..... 19
- 表 10 公共工程變更設計增減金額..... 19
- 表 11 公共工程變更設計增減金額與決標金額差距比率..... 20
- 表 12 公共工程待工日數..... 21
- 表 13 公共工程已開工件數－按預定完工年分..... 21
- 表 14 公共工程預定完工與實際完工日數差距..... 22

表 15	公共工程完工日數	23
表 16	公共工程驗收日與完工日差距	23
表 17	公共工程預算結餘金額	24
表 18	公共工程預算結餘與施工預算差距比率	24
表 19	公共工程已決算概況	25
表 20	公共工程已驗收未決算件數	25
表 21	公共工程執行績效	26
表 22	公共工程未開工明細表	27

壹、提要分析

一、概述

(一)112年工務局執行公共工程發包作業共計202件，預算金額154.6億元，決標金額137.6億元，分別較111年減少76件(-27.3%)、增加51.6億元(50.1%)及增加38.6億元(39.0%)。

112年臺北市政府工務局所屬各工程處執行公共工程發包作業¹共計202件，較111年減少76件(-27.3%)。各工程處以新建工程處發包69件(占34.2%)為最多，其餘依序為公園路燈工程管理處60件(占29.7%)、水利工程處50件(占24.8%)、大地工程處12件(占5.9%)及衛生下水道工程處11件(占5.4%)。(詳圖一、表一、表三)


112年發包工程預算金額154.6億元為近五年第三高，較111年增加51.6億元(50.1%)。各工程處預算金額以新工處113.4億元(占73.4%)最高，其餘依序為水利處22.3億元(占14.5%)、公園處7.8億元(占5.0%)、衛工處7.6億元(占4.9%)及大地處3.4億元(占2.2%)。平均每件工程預算金額依序為新工處1億6,440萬元、衛工處6,886萬元、水利處4,468萬元、大地處2,871萬元及公園處1,296萬元。(詳圖二、表一、表二)

112年發包工程決標金額137.6億元，較111年增加38.6億元(39.0%)，平均每件工程決標金額依序為新工處1億4,894萬元、衛工處5,648萬元、水利處3,787萬元、大地處2,658萬元及公園處1,088萬元。決標占預算之標比²為89.0%，較111年下降7.1個百分點，其中以大地處標比92.6%最高，其餘依序為新工處90.6%、水利處84.8%、公園處83.9%及衛工處82.0%。(詳表一、表二)

¹ 112年決標之工程採購案件，不含勞務採購及未開工即解約者。


² 標比=(決標金額 / 預算金額)×100%，可反映發包單位對預算編列與廠商於市場競爭行為下之對價關係，標比過低可能隱含編列預算浮濫、不確實，或市場不當競爭、低價搶標。

圖一、各工程處公共工程發包件數

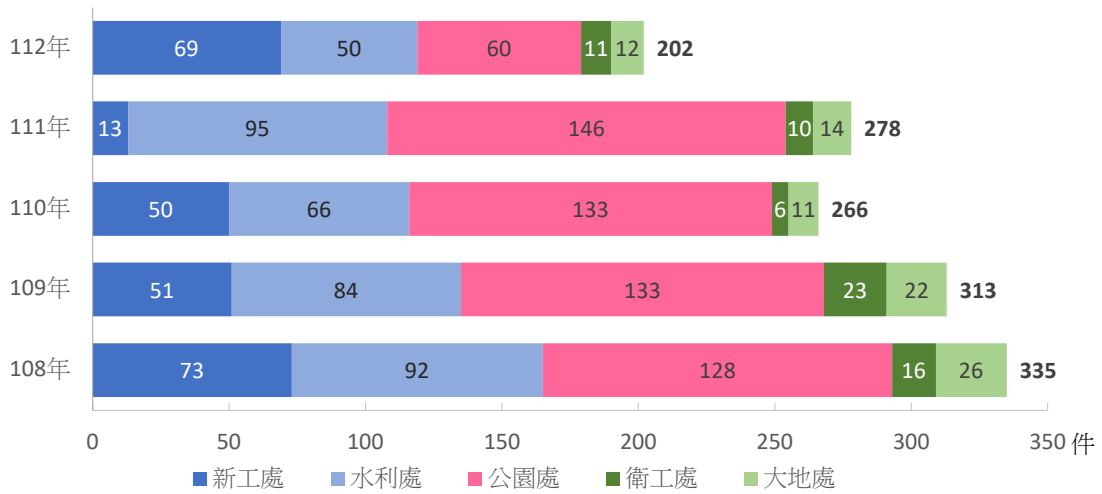

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。
 說明：包含預約維護及預定跨年完工工程。

圖二、各工程處公共工程預算金額

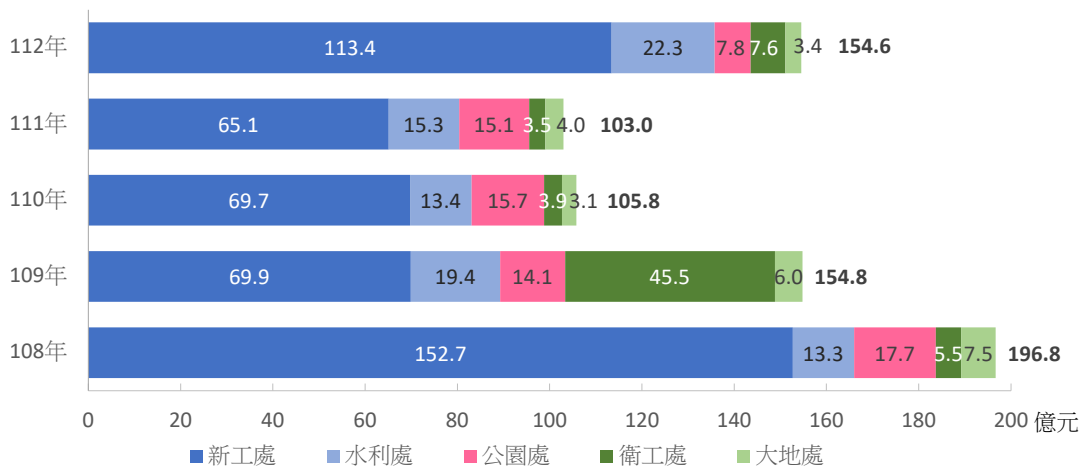

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。
 說明：包含預約維護及預定跨年完工工程。

表一、各工程處公共工程執行情形

112 年

工程處	發包工程		預算			決標			變更設計率 ① (%)	開工率 ② (%)	完工率 ③ (%)	驗收率 ④ (%)
	件數	結構比	金額	結構比	平均每件工程金額	金額	結構比	平均每件工程金額				
	(件)	(%)	(億元)	(%)	(萬元)	(億元)	(%)	(萬元)				
總計	202	100.0	154.6	100.0	7,652	137.6	100.0	6,813	69.3	95.0	36.1	20.8
新工處	69	34.2	113.4	73.4	16,440	102.8	74.7	14,894	60.9	91.3	8.7	1.4
水利處	50	24.8	22.3	14.5	4,468	18.9	13.8	3,787	68.0	92.0	28.0	6.0
公園處	60	29.7	7.8	5.0	1,296	6.5	4.7	1,088	80.0	100.0	65.0	51.7
衛工處	11	5.4	7.6	4.9	6,886	6.2	4.5	5,648	63.6	100.0	36.4	-
大地處	12	5.9	3.4	2.2	2,871	3.2	2.3	2,658	75.0	100.0	83.3	58.3

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. ①變更設計率=變更設計件數/發包件數×100%、②開工率=已開工件數/發包件數×100%、
③完工率=已完工件數/發包件數×100%、④驗收率=已驗收件數/發包件數×100%。
2. 包含預約維護及預定跨年完工工程。

表二、各工程處公共工程預算、決標金額與標比

工程處	112 年			111 年			112 年較 111 年增減數		
	預算金額 (億)	決標金額 (億)	標比 (%)	預算金額 (億)	決標金額 (億)	標比 (%)	預算金額 (億)	決標金額 (億)	標比 (百分點)
總計	154.6	137.6	89.0	103.0	99.0	96.1	51.6	38.6	-7.1
新工處	113.4	102.8	90.6	65.1	65.1	99.9	48.3	37.7	-9.3
水利處	22.3	18.9	84.8	15.3	13.6	88.8	7.1	5.4	-4.1
公園處	7.8	6.5	83.9	15.1	13.1	86.4	-7.4	-6.6	-2.5
衛工處	7.6	6.2	82.0	3.5	3.5	99.8	4.1	2.7	-17.8
大地處	3.4	3.2	92.6	4.0	3.8	95.1	-0.5	-0.6	-2.5

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：包含預約維護及預定跨年完工工程。

表三、公共工程執行情形

執行情形	112年		111年		112年與111年比較			110年		109年		108年			
	件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)	件數		百分比 (百分點)	件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)	件數 (件)	百分比 (%)		
					增減數	增減%									
總計	202	100.0	278	100.0	-76	-27.3	-	266	100.0	313	100.0	335	100.0		
招標方式	公開招標	197	97.5	275	98.9	-78	-28.4	-1.4	261	98.1	309	98.7	329	98.2	
	限制性招標	議價	5	2.5	3	1.1	2	66.7	1.4	5	1.9	4	1.3	6	1.8
		比價	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
	公開評選	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	
	其他	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	
變更設計	無	62	30.7	153	55.0	-91	-59.5	-24.3	96	36.1	159	50.8	150	44.8	
	有	140	69.3	125	45.0	15	12.0	24.3	170	63.9	154	49.2	185	55.2	
開工情形	已開工	192	95.0	199	71.6	-7	-3.5	23.5	259	97.4	281	89.8	316	94.3	
	未開工	10	5.0	79	28.4	-69	-87.3	-23.5	7	2.6	32	10.2	19	5.7	
完工情形	已完工	73	36.1	108	38.8	-35	-32.4	-2.7	122	45.9	158	50.5	186	55.5	
	未完工	129	63.9	170	61.2	-41	-24.1	2.7	144	54.1	155	49.5	149	44.5	
驗收情形	已驗收	42	20.8	77	27.7	-35	-45.5	-6.9	85	32.0	108	34.5	130	38.8	
	未驗收	160	79.2	201	72.3	-41	-20.4	6.9	181	68.0	205	65.5	205	61.2	
決算情形	已決算	30	14.9	40	14.4	-10	-25.0	0.5	46	17.3	59	18.8	85	25.4	
	未決算	172	85.1	238	85.6	-66	-27.7	-0.5	220	82.7	254	81.2	250	74.6	
	已驗收	12	5.9	37	13.3	-25	-67.6	-7.4	39	14.7	49	15.7	45	13.4	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。
說明：包含預約維護及預定跨年完工工程。

(二) 發包工程中有 97.5% 以公開招標方式辦理，變更設計率³為 69.3%，較 111 年上升 24.3 個百分點。

就發包方式觀察，以公開招標方式辦理者 197 件(占 97.5%) 為最多，限制性招標議價方式辦理計有 5 件。(詳表三)

所有工程中曾辦理變更設計者計 140 件，變更設計率為 69.3%，較 111 年上升 24.3 個百分點，以公園處變更設計率 80.0% 為最高。(詳表一、表三)

(三) 開工率⁴95.0% 為近五年次高，較 111 年上升 23.5 個百分點。完工率⁵36.1% 為近五年最低，較 111 年下降 2.7 個百分點。

³ 變更設計率=變更設計件數/發包件數×100%。

⁴ 開工率=已開工件數/發包件數×100%。

⁵ 完工率=已完工件數/發包件數×100%。


就開工情形觀察，112 年決標工程中，已開工施作者計 192 件，開工率 95.0%為近五年次高，較 111 年上升 23.5 個百分點，其中公園處、衛工處及大地處開工率達 100%。未開工者計 10 件（占 5.0%），分別為新工處 6 件及水利處 4 件，皆屬於預定跨年完工工程。（詳圖三、表一、表三）

就完工情形觀察，至 112 年底已完工者計 73 件，完工率 36.1%為近五年最低，較 111 年下降 2.7 個百分點，以大地處完工率 83.3%最高，其餘依序為公園處 65.0%、衛工處 36.4%、水利處 28.0%及新工處 8.7%。（詳圖三、表一、表三）

若排除預約維護及預定跨年完工工程，則新工處、水利處及大地處完工率皆為 100%，公園處則為 90.9%，而衛工處 112 年發包之非預約維護工程皆預定於 113 年以後完工。（詳圖四、表四）


已開工未完工工程計 119 件，加計未開工者 10 件，共計 129 件工程未完工（占 63.9%）。（詳表三）

圖三、公共工程變更設計、開工、完工、驗收比率

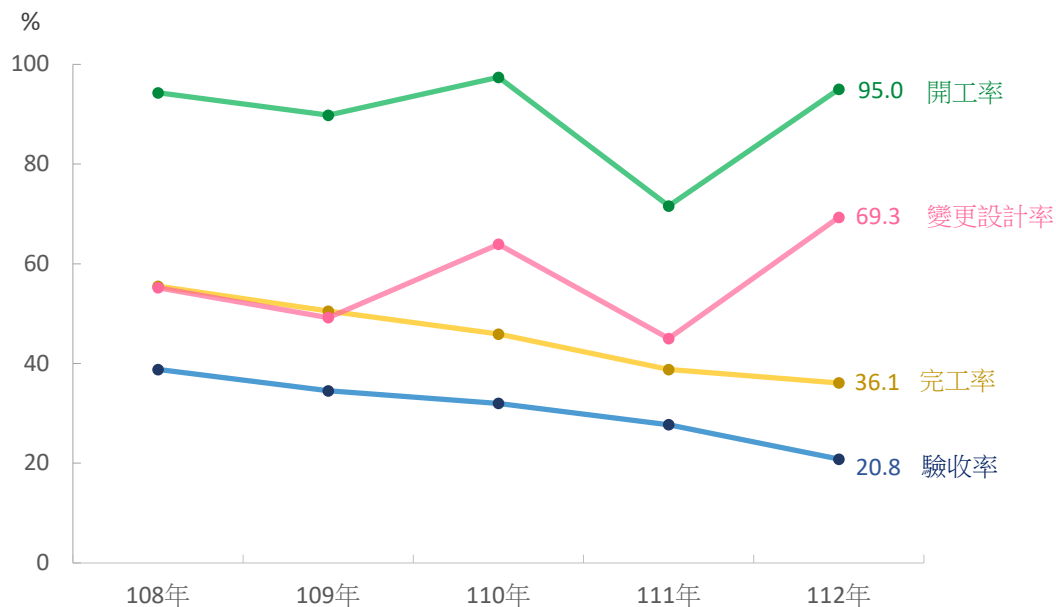

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。
 說明：包含預約維護及預定跨年完工工程。

圖四、各工程處公共工程完工比率—排除預約維護及跨年工程

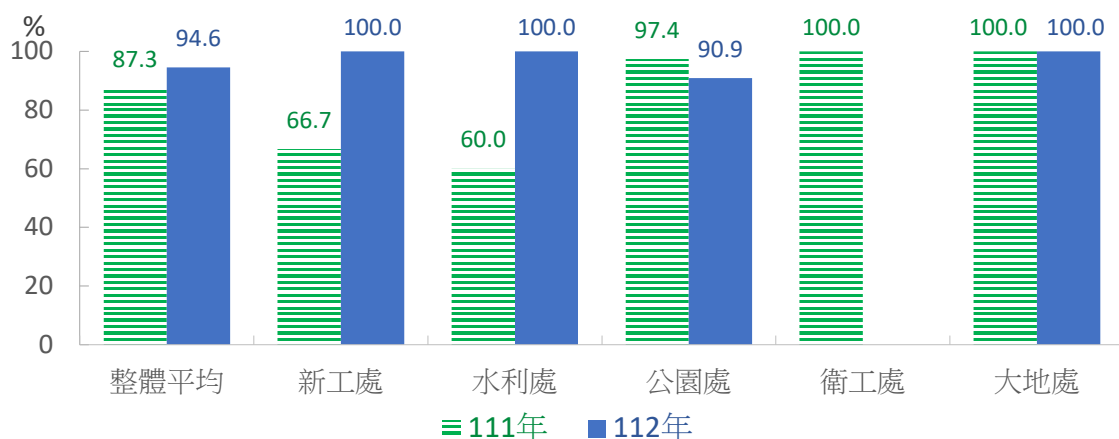

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. 比率=當年完工件數/預定當年完工且已開工件數×100%。

2. 不包含預約維護及預定跨年完工工程。

3. 衛工處 112 年發包之非預約維護工程皆預定於 113 年以後完工。

表四、各工程處公共工程執行情形—排除預約維護及跨年工程

112 年

工程處	發包工程		預算			決標			變更設計率 ① (%)	開工率 ② (%)	完工率 ③ (%)	驗收率 ④ (%)
	件數 (件)	結構比 (%)	金額 (億元)	結構比 (%)	平均每件 工程金額 (萬元)	金額 (億元)	結構比 (%)	平均每件 工程金額 (萬元)				
總計	37	100.0	4.8	100.0	1,311	4.2	100.0	1,140	75.7	100.0	94.6	59.5
新工處	4	10.8	0.5	10.3	1,246	0.5	10.8	1,138	25.0	100.0	100.0	25.0
水利處	7	18.9	0.8	16.0	1,106	0.6	14.4	867	57.1	100.0	100.0	42.9
公園處	22	59.5	2.2	45.6	1,005	1.9	43.9	841	90.9	100.0	90.9	63.6
衛工處	-	-	-	-	--	-	-	--	--	--	--	--
大地處	4	10.8	1.4	28.2	3,415	1.3	30.9	3,261	75.0	100.0	100.0	100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. ①變更設計率=變更設計件數/發包件數×100%、②開工率=已開工件數/發包件數×100%、

③完工率=已完工件數/發包件數×100%、④驗收率=已驗收件數/發包件數×100%。

2. 不包含預約維護及預定跨年完工工程。

3. 衛工處 112 年發包之非預約維護工程皆預定於 113 年以後完工。

(四) 驗收率⁶20.8%，較 111 年下降 6.9 個百分點。已驗收並辦理工程決算比率 14.9%，較 111 年上升 0.5 個百分點。

就驗收情形觀察，已完工並辦理驗收程序者計 42 件，驗收率 20.8% 為近五年最低，較 111 年下降 6.9 個百分點，以大地處驗收率 58.3% 最高，其餘依序為公園處 51.7%、水利處 6.0% 及新工處 1.4%，而衛工處完工工程皆於 112 年底完工，故尚未驗收。(詳圖三、表一、表三)

若排除預約維護及預定跨年完工工程，則大地處驗收率為 100%，其餘依序為公園處 63.6%、水利處 42.9% 及新工處 25.0%，而衛工處 112 年發包之非預約維護工程皆預定於 113 年以後完工。(詳圖五、表四)

已完工未驗收工程計 31 件，加計未完工者，共計 160 件未辦理驗收 (占 79.2%)。(詳表三)

就決算情形觀察，已驗收並辦理工程決算者計 30 件 (占 14.9%)，已驗收尚未辦理決算 12 件，加計未驗收者，共計 172 件未辦理工程決算 (占 85.1%)。(詳表三)


(五) 工程決標月份

112 年決標之工程中，以 2 月決標 52 件 (占 25.7%) 最多，有 75.2% 的工程在上半年決標。

112 年決標之 202 件公共工程中，有 152 件 (占 75.2%) 在上半年決標；若按決標月分析，以 2 月決標 52 件 (占 25.7%) 最多，1 月決標 38 件 (占 18.8%) 次之，3 月決標 34 件 (占 16.8%) 為第 3。(詳統計表-表 2)

⁶ 驗收率=已驗收件數/發包件數×100%。

圖五、各工程處公共工程驗收比率－排除預約維護及跨年工程

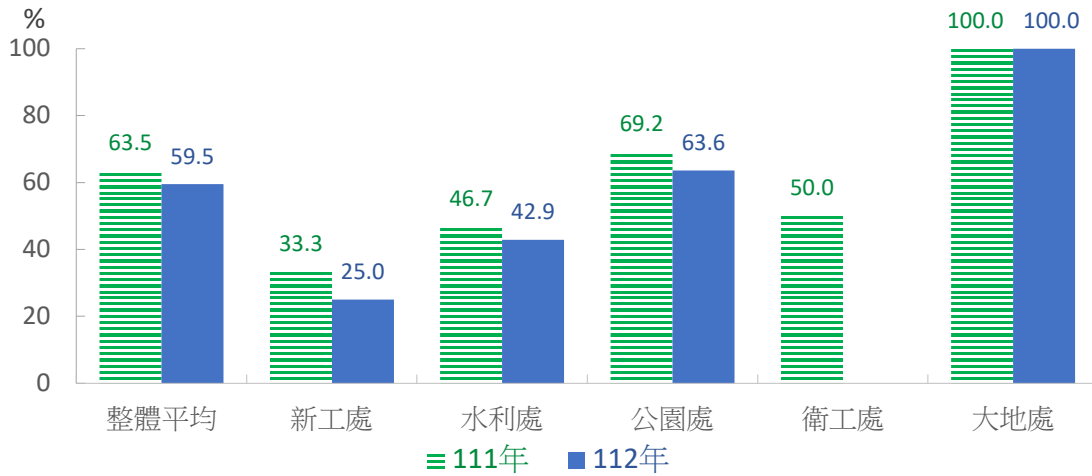

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. 比率=當年驗收件數/預定當年完工且已開工件數×100%。

2. 不包含預約維護及預定跨年完工工程。

3. 衛工處 112 年發包之非預約維護工程皆預定於 113 年以後完工。

二、工程執行績效（排除預約維護及跨年工程）

112 年決標之工程中，排除預約維護及預定跨年完工者後，共計 37 件，分別為公園處 22 件、水利處 7 件、新工處及大地處各 4 件，而衛工處 112 年發包之非預約維護工程皆預定於 113 年以後完工，故不進行績效分析。

(一) 開工績效：新工處、水利處、公園處及大地處開工率皆為 100%。平均每件工程待工日數以大地處 29.3 日最短，水利處 44.6 日最久。

排除預約維護及預定跨年完工工程後，112 年工務局執行公共工程開工率為 100%，新工處、水利處、公園處及大地處開工率皆為 100%。(詳圖六、表四)

112 年已開工工程中，平均每件工程待工日⁷數為 38.0 日，較 111 年無增減，以大地處 29.3 日最短，水利處 44.6 日最久。(詳圖七、圖八)

⁷ 待工日數：開工日與決標日之差距日數，日數愈少績效愈佳。

(二) 完工績效：新工處、水利處、大地處完工率皆為 100%，公園處則為 90.9%。公園處平均每件工程提早 12.8 日完工，提早最多，水利處則延後 31.7 日。

排除預約維護及預定跨年完工工程後，112 年工務局執行公共工程完工率為 94.6%，其中新工處、水利處、大地處 100% 超過整體平均值，公園處則為 90.9%。(詳圖六、表四)

112 年已完工工程中，平均每件提早完工日數⁸為 1.1 日，較 111 年縮短 8.0 日，以公園處平均提早 12.8 日最多，大地處 7.5 日次之，新工處及水利處則分別延後 6.8 日及 31.7 日。(詳圖七、圖八)

若依工程性質觀察，在整建工程中，以公園處提早 15.7 日完工績效最佳，新建工程則皆為延期完工。(詳表五)

(三) 驗收績效：大地處驗收率為 100%，水利處 42.9%、新工處 25.0% 低於平均值。大地處平均每件完工工程驗收日數 32.8 日最短，新工處 61.0 日最長。

排除預約維護及預定跨年完工工程後，112 年已完工工程驗收率為 59.5%，其中大地處 100%、公園處 63.6% 超過整體平均值，水利處 42.9%、新工處 25.0% 低於平均值。(詳圖六、表四)


平均每件完工工程驗收日數⁹為 37.6 日，較 111 年增加 9.7 日，以大地處 32.8 日最短，其餘依序為公園處 35.4 日、水利處 46.7 日及新工處 61.0 日。(詳圖七、圖八)

⁸ 提早完工日數：預定完工日與實際完工日之差距日數，日數愈多績效愈佳。負值表示延期完工。

⁹ 驗收日數：完工日與驗收完成日之差距日數，日數愈少績效愈佳。

圖六、各工程處公共工程開工、完工及驗收比率－排除預約維護及跨年工程

112 年

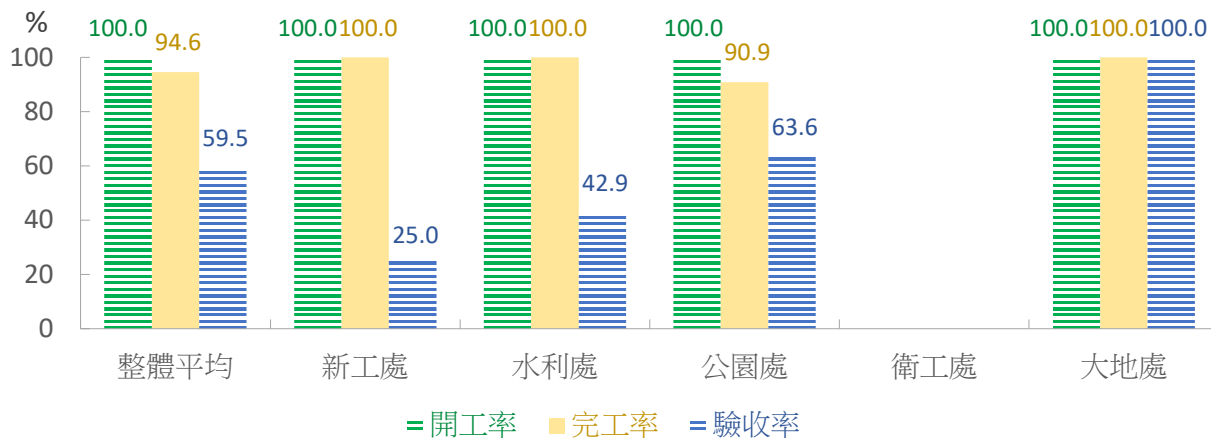


資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. 不包含預約維護及預定跨年完工工程。

2. 衛工處 112 年發包之非預約維護工程皆預定於 113 年以後完工。


圖七、公共工程待工、提早完工、驗收日數－排除預約維護及跨年工程

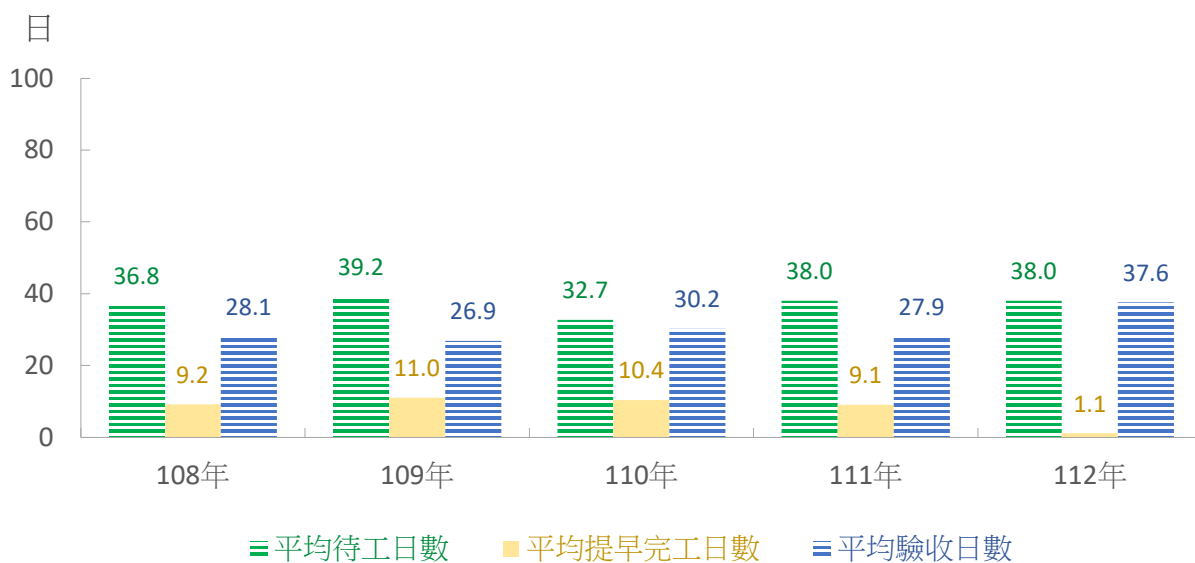

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：不包含預約維護及預定跨年完工工程。

圖八、各工程處公共工程待工、提早完工、驗收日數－排除預約維護及跨年工程

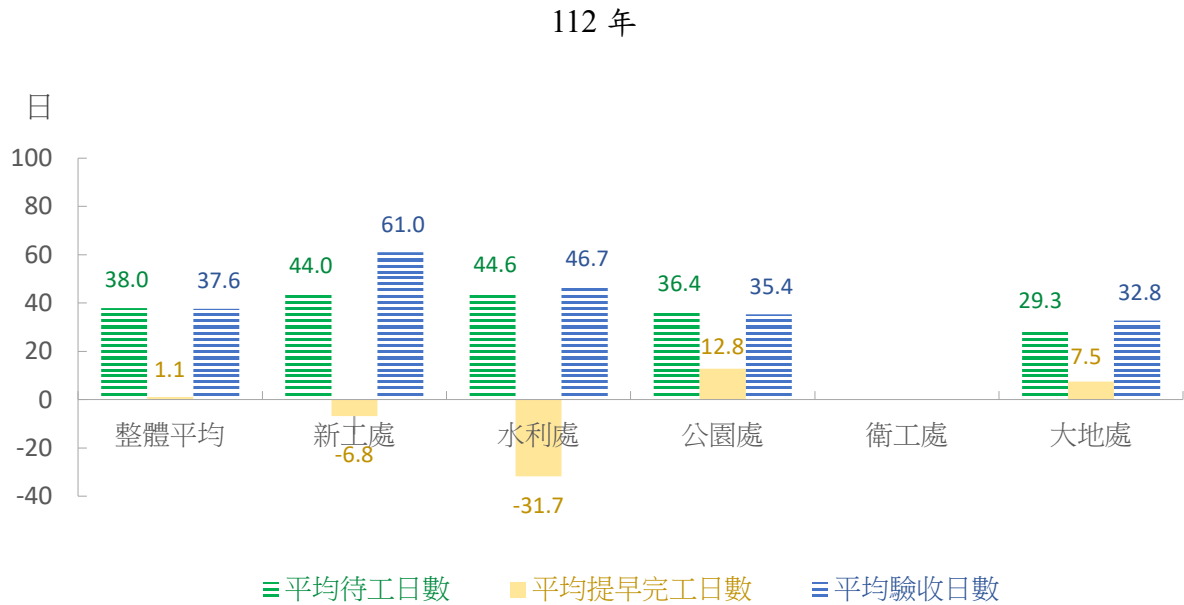

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. 不包含預約維護及預定跨年完工工程。

2. 衛工處 112 年發包之非預約維護工程皆預定於 113 年以後完工。

表五、各工程處公共工程完工績效－排除預約維護及跨年工程

112 年

工程性質	總 計	新工處	水利處	公園處	衛工處	大地處
已完工件數(件)	35	4	7	20	-	4
整建工程	32	4	6	18	-	4
新建工程	3	-	1	2	-	-
完工率(%)	94.6	100.0	100.0	90.9	--	100.0
整建工程	94.1	100.0	100.0	90.0	--	100.0
新建工程	100.0	--	100.0	100.0	--	--
平均提早完工日數(日)	1.1	-6.8	-31.7	12.8	--	7.5
整建工程	2.4	-6.8	-34.7	15.7	--	7.5
新建工程	-13.7	--	-14.0	-13.5	--	--

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1. 不包含預約維護及預定跨年完工工程。

2. 衛工處 112 年發包之非預約維護工程皆預定於 113 年以後完工。

統計表

表1 公共工程發包及執行件數－按工程處分

112年

單位：件；%

執行情形		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處		
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	
總計		202	100.0	69	100.0	50	100.0	60	100.0	11	100.0	12	100.0	
發包方式	公開招標	197	97.5	64	92.8	50	100.0	60	100.0	11	100.0	12	100.0	
	限制性招標	議價	5	2.5	5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-
		比價	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		公開評選	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
變更設計	無	62	30.7	27	39.1	16	32.0	12	20.0	4	36.4	3	25.0	
	有	140	69.3	42	60.9	34	68.0	48	80.0	7	63.6	9	75.0	
開工情形	已開工	192	95.0	63	91.3	46	92.0	60	100.0	11	100.0	12	100.0	
	未開工	10	5.0	6	8.7	4	8.0	-	-	-	-	-	-	
完工情形	已完工	73	36.1	6	8.7	14	28.0	39	65.0	4	36.4	10	83.3	
	未完工①	129	63.9	63	91.3	36	72.0	21	35.0	7	63.6	2	16.7	
驗收情形	已驗收	42	20.8	1	1.4	3	6.0	31	51.7	-	-	7	58.3	
	未驗收②	160	79.2	68	98.6	47	94.0	29	48.3	11	100.0	5	41.7	
決算情形	已決算	30	14.9	1	1.4	2	4.0	24	40.0	-	-	3	25.0	
	未決算③	172	85.1	68	98.6	48	96.0	36	60.0	11	100.0	9	75.0	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

附註：①未完工工程中，已開工者計 119 件。

②未驗收工程中，已完工者計 31 件。

③未決算工程中，已驗收者計 12 件。

表2 公共工程發包及執行件數－按決標月分

112年

單位：件；%

執行情形		總計	1-6月 小計	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
總計	件數	202	152	38	52	34	8	13	7		
	百分比	100.0	75.2	18.8	25.7	16.8	4.0	6.4	3.5		
發包方式	公開招標	件數	197	151	38	52	33	8	13	7	
		百分比	100.0	76.6	19.3	26.4	16.8	4.1	6.6	3.6	
	限制性招標	議價	件數	5	1	-	-	1	-	-	-
			百分比	100.0	20.0	-	-	20.0	-	-	-
		比價	件數	-	-	-	-	-	-	-	-
			百分比	-	-	-	-	-	-	-	-
	公開評選	件數	-	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	-	
	其他	件數	-	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	-	
開工情形	已開工	件數	192	152	38	52	34	8	13	7	
		百分比	100.0	79.2	19.8	27.1	17.7	4.2	6.8	3.6	
	未開工	件數	10	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	100.0	-	-	-	-	-	-	-	
完工情形	已完工	件數	73	64	20	16	18	2	6	2	
		百分比	100.0	87.7	27.4	21.9	24.7	2.7	8.2	2.7	
	未完工	件數	129	88	18	36	16	6	7	5	
		百分比	100.0	68.2	14.0	27.9	12.4	4.7	5.4	3.9	
驗收情形	已驗收	件數	42	39	16	11	11	-	1	-	
		百分比	100.0	92.9	38.1	26.2	26.2	-	2.4	-	
	未驗收	件數	160	113	22	41	23	8	12	7	
		百分比	100.0	70.6	13.8	25.6	14.4	5.0	7.5	4.4	
決算情形	已決算	件數	30	29	13	10	5	-	1	-	
		百分比	100.0	96.7	43.3	33.3	16.7	-	3.3	-	
	未決算	件數	172	123	25	42	29	8	12	7	
		百分比	100.0	71.5	14.5	24.4	16.9	4.7	7.0	4.1	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表2 公共工程發包及執行件數－按決標月分（續）

112年

單位：件；%

執行情形		7-12月 小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
總計	件數	50	13	12	11	4	6	4		
	百分比	24.8	6.4	5.9	5.4	2.0	3.0	2.0		
發包方式	公開招標	件數	46	12	12	11	3	4	4	
		百分比	23.4	6.1	6.1	5.6	1.5	2.0	2.0	
	限制性招標	議價	件數	4	1	-	-	1	2	-
			百分比	80.0	20.0	-	-	20.0	40.0	-
		比價	件數	-	-	-	-	-	-	-
			百分比	-	-	-	-	-	-	-
	公開評選	件數	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	
	其他	件數	-	-	-	-	-	-	-	
		百分比	-	-	-	-	-	-	-	
開工情形	已開工	件數	40	12	11	11	3	2	1	
		百分比	20.8	6.3	5.7	5.7	1.6	1.0	0.5	
	未開工	件數	10	1	1	-	1	4	3	
		百分比	100.0	10.0	10.0	-	10.0	40.0	30.0	
完工情形	已完工	件數	9	2	2	4	1	-	-	
		百分比	12.3	2.7	2.7	5.5	1.4	-	-	
	未完工	件數	41	11	10	7	3	6	4	
		百分比	31.8	8.5	7.8	5.4	2.3	4.7	3.1	
驗收情形	已驗收	件數	3	-	1	2	-	-	-	
		百分比	7.1	-	2.4	4.8	-	-	-	
	未驗收	件數	47	13	11	9	4	6	4	
		百分比	29.4	8.1	6.9	5.6	2.5	3.8	2.5	
決算情形	已決算	件數	1	-	-	1	-	-	-	
		百分比	3.3	-	-	3.3	-	-	-	
	未決算	件數	49	13	12	10	4	6	4	
		百分比	28.5	7.6	7.0	5.8	2.3	3.5	2.3	

表3 公共工程已發包未開工件數—按決標月分

112年

單位：件；%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	10	100.0	6	100.0	4	100.0	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	1	10.0	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-
8月	1	10.0	1	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	1	10.0	-	-	1	25.0	-	-	-	-	-	-
11月	4	40.0	3	50.0	1	25.0	-	-	-	-	-	-
12月	3	30.0	2	33.3	1	25.0	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表4 公共工程已開工未完工件數—按開工月分

112年

單位：件；%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	119	100.0	57	100.0	32	100.0	21	100.0	7	100.0	2	100.0
1月	1	0.8	-	-	-	-	-	-	1	14.3	-	-
2月	3	2.5	-	-	-	-	2	9.5	1	14.3	-	-
3月	32	26.9	22	38.6	4	12.5	5	23.8	1	14.3	-	-
4月	22	18.5	18	31.6	3	9.4	-	-	-	-	1	50.0
5月	8	6.7	3	5.3	-	-	4	19.0	1	14.3	-	-
6月	8	6.7	3	5.3	-	-	3	14.3	2	28.6	-	-
7月	5	4.2	3	5.3	1	3.1	1	4.8	-	-	-	-
8月	9	7.6	2	3.5	4	12.5	3	14.3	-	-	-	-
9月	10	8.4	-	-	8	25.0	1	4.8	-	-	1	50.0
10月	7	5.9	2	3.5	5	15.6	-	-	-	-	-	-
11月	9	7.6	2	3.5	4	12.5	2	9.5	1	14.3	-	-
12月	5	4.2	2	3.5	3	9.4	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表5 公共工程已完工未驗收件數—按完工月分

112年

單位：件，%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	31	100.0	5	100.0	11	100.0	8	100.0	4	100.0	3	100.0
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	5	16.1	-	-	-	-	5	62.5	-	-	-	-
12月	26	83.9	5	100.0	11	100.0	3	37.5	4	100.0	3	100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表6 公共工程已驗收未結清經費件數—按驗收月分

112年

單位：件，%

月別	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	12	100.0	-	-	1	100.0	7	100.0	-	-	4	100.0
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	1	8.3	-	-	-	-	1	14.3	-	-	-	-
12月	11	91.7	-	-	1	100.0	6	85.7	-	-	4	100.0

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表7 公共工程決標件數—按決標金額分

112年

單位：件；%

決標金額	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	202	100.0	69	100.0	50	100.0	60	100.0	11	100.0	12	100.0
100萬元以下	5	2.5	-	-	3	6.0	2	3.3	-	-	-	-
100-500萬元	23	11.4	3	4.3	5	10.0	15	25.0	-	-	-	-
500-1,000萬元	36	17.8	6	8.7	11	22.0	18	30.0	1	9.1	-	-
1,000-5,000萬元	103	51.0	33	47.8	27	54.0	24	40.0	7	63.6	12	100.0
5,000萬-1億元	19	9.4	17	24.6	1	2.0	-	-	1	9.1	-	-
1億元以上	16	7.9	10	14.5	3	6.0	1	1.7	2	18.2	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表8 公共工程決標金額與底價差距

112年

單位：件；%

差距金額	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	202	100.0	69	100.0	50	100.0	60	100.0	11	100.0	12	100.0
超底價決標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0元	69	34.2	31	44.9	22	44.0	7	11.7	-	-	9	75.0
10萬元以下	31	15.3	10	14.5	9	18.0	12	20.0	-	-	-	-
10-50萬元	27	13.4	4	5.8	9	18.0	14	23.3	-	-	-	-
50-100萬元	24	11.9	7	10.1	6	12.0	9	15.0	-	-	2	16.7
100-500萬元	40	19.8	14	20.3	3	6.0	17	28.3	5	45.5	1	8.3
500-1,000萬元	8	4.0	3	4.3	1	2.0	1	1.7	3	27.3	-	-
1,000-5,000萬元	2	1.0	-	-	-	-	-	-	2	18.2	-	-
5,000萬元以上	1	0.5	-	-	-	-	-	-	1	9.1	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為決標金額與底價相同。

表9 公共工程決標金額與底價差距比率

112年

單位：件；%

金額差距比率	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	202	100.0	69	100.0	50	100.0	60	100.0	11	100.0	12	100.0
超底價決標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超過底價20%以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超過底價10%-20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超過底價小於10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
與底價相同決標	69	34.2	31	44.9	22	44.0	7	11.7	-	-	9	75.0
低於底價決標	133	65.8	38	55.1	28	56.0	53	88.3	11	100.0	3	25.0
小計	133	65.8	38	55.1	28	56.0	53	88.3	11	100.0	3	25.0
低於底價10%	99	49.0	32	46.4	25	50.0	37	61.7	3	27.3	2	16.7
低於底價10%-20%	20	9.9	5	7.2	2	4.0	7	11.7	5	45.5	1	8.3
低於底價20%-30%	2	1.0	-	-	1	2.0	1	1.7	-	-	-	-
低於底價30%-40%	3	1.5	-	-	-	-	1	1.7	2	18.2	-	-
低於底價40%-50%	7	3.5	1	1.4	-	-	6	10.0	-	-	-	-
低於底價50%以上	2	1.0	-	-	-	-	1	1.7	1	9.1	-	-
最低決標與底價比率(%)	45.4		51.6		76.8		48.1		45.4		86.8	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表10 公共工程變更設計增減金額

112年

單位：件；%

增減金額	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	140	100.0	42	100.0	34	100.0	48	100.0	7	100.0	9	100.0
0元	4	2.9	1	2.4	2	5.9	-	-	-	-	1	11.1
追加工程經費	124	88.6	41	97.6	32	94.1	37	77.1	7	100.0	7	77.8
小計	124	88.6	41	97.6	32	94.1	37	77.1	7	100.0	7	77.8
10萬元以下	5	3.6	-	-	1	2.9	4	8.3	-	-	-	-
10-50萬元	12	8.6	1	2.4	3	8.8	6	12.5	-	-	2	22.2
50-100萬元	10	7.1	-	-	3	8.8	7	14.6	-	-	-	-
100-500萬元	50	35.7	9	21.4	15	44.1	18	37.5	4	57.1	4	44.4
500-1,000萬元	16	11.4	8	19.0	5	14.7	2	4.2	-	-	1	11.1
1,000-5,000萬元	20	14.3	14	33.3	3	8.8	-	-	3	42.9	-	-
5,000萬元以上	11	7.9	9	21.4	2	5.9	-	-	-	-	-	-
追減工程經費	12	8.6	-	-	-	-	11	22.9	-	-	1	11.1

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0元者為雖有變更設計但無追加減工程經費。

表11 公共工程變更設計增減金額與決標金額差距比率

112年

單位：件；%

金額差距比率		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計		140	100.0	42	100.0	34	100.0	48	100.0	7	100.0	9	100.0
追加工程經費	合計	124	88.6	41	97.6	32	94.1	37	77.1	7	100.0	7	77.8
	增加50%以上	23	16.4	14	33.3	6	17.6	2	4.2	1	14.3	-	-
	增加40%~50%	14	10.0	7	16.7	5	14.7	1	2.1	1	14.3	-	-
	增加30%~40%	8	5.7	3	7.1	2	5.9	2	4.2	1	14.3	-	-
	增加20%~30%	19	13.6	2	4.8	9	26.5	7	14.6	-	-	1	11.1
	增加10%~20%	25	17.9	7	16.7	5	14.7	9	18.8	2	28.6	2	22.2
	增加10%以內	35	25.0	8	19.0	5	14.7	16	33.3	2	28.6	4	44.4
無追加減經費		4	2.9	1	2.4	2	5.9	-	-	-	-	1	11.1
追減工程經費	合計	12	8.6	-	-	-	-	11	22.9	-	-	1	11.1
	追減10%以內	9	6.4	-	-	-	-	8	16.7	-	-	1	11.1
	追減10%~20%	1	0.7	-	-	-	-	1	2.1	-	-	-	-
	追減20%~30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	追減30%~40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	追減40%~50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	追減50%以上	2	1.4	-	-	-	-	2	4.2	-	-	-	-
增加經費占決標金額比率最大者(%)		305.1		188.6		305.1		98.1		100.0		23.2	
追減經費占決標金額比率最大者(%)		-294.7		-		-		-294.7		-		-0.7	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表12 公共工程待工日數

112年

單位：件；%

待工日數	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	192	100.0	63	100.0	46	100.0	60	100.0	11	100.0	12	100.0
0日	4	2.1	-	-	1	2.2	-	-	1	9.1	2	16.7
1-14日	11	5.7	11	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-
15-29日	51	26.6	13	20.6	4	8.7	26	43.3	2	18.2	6	50.0
30-44日	45	23.4	7	11.1	9	19.6	24	40.0	3	27.3	2	16.7
45-59日	32	16.7	10	15.9	18	39.1	1	1.7	1	9.1	2	16.7
60-74日	22	11.5	9	14.3	9	19.6	1	1.7	3	27.3	-	-
75-89日	13	6.8	6	9.5	2	4.3	4	6.7	1	9.1	-	-
90日以上	14	7.3	7	11.1	3	6.5	4	6.7	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.待工日數為工程決標與開工日期之差距日數。

2.「0日」為決標當日即開工之工程。

3.其他為因應緊急需要先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前

4.最大差距日數為245日，待工超過100日以上者計11件。

5.已決標未開工者計10件。

表13 公共工程已開工件數—按預定完工年分

112年

單位：件；%

完工年	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	192	100.0	63	100.0	46	100.0	60	100.0	11	100.0	12	100.0
112年完工	91	47.4	14	22.2	24	52.2	41	68.3	4	36.4	8	66.7
113年完工	84	43.8	37	58.7	19	41.3	19	31.7	5	45.5	4	33.3
114年完工	14	7.3	10	15.9	2	4.3	-	-	2	18.2	-	-
115年完工	3	1.6	2	3.2	1	2.2	-	-	-	-	-	-
116年完工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117年完工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表14 公共工程預定完工與實際完工日數差距

112年

單位：件；%

差距日數		總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計		73	100.0	6	100.0	14	100.0	39	100.0	4	100.0	10	100.0
提早完工日數	合計	45	61.6	4	66.7	4	28.6	28	71.8	-	-	9	90.0
	180日以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150-179日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120-149日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90-119日	3	4.1	1	16.7	-	-	2	5.1	-	-	-	-
	60-89日	2	2.7	-	-	-	-	2	5.1	-	-	-	-
	30-59日	12	16.4	1	16.7	-	-	8	20.5	-	-	3	30.0
	1-29日	28	38.4	2	33.3	4	28.6	16	41.0	-	-	6	60.0
0日		18	24.7	1	16.7	6	42.9	6	15.4	4	100.0	1	10.0
延遲完工日數	合計	10	13.7	1	16.7	4	28.6	5	12.8	-	-	-	-
	1-29日	7	9.6	-	-	2	14.3	5	12.8	-	-	-	-
	30-59日	1	1.4	1	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	60-89日	1	1.4	-	-	1	7.1	-	-	-	-	-	-
	90-119日	1	1.4	-	-	1	7.1	-	-	-	-	-	-
	120-149日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150-179日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180日以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提早完工最多日數(日)		112		112		2		100		-		46	
延遲完工最多日數(日)		109		48		109		29		-		-	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：0日為預定完工日當日完工者。

表15 公共工程完工日數

112年

單位：件；%

完工日數	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	73	100.0	6	100.0	14	100.0	39	100.0	4	100.0	10	100.0
0-59日	3	4.1	1	16.7	1	7.1	1	2.6	-	-	-	-
60-119日	10	13.7	2	33.3	3	21.4	5	12.8	-	-	-	-
120-179日	12	16.4	1	16.7	4	28.6	7	17.9	-	-	-	-
180-239日	17	23.3	2	33.3	4	28.6	7	17.9	-	-	4	40.0
240-299日	23	31.5	-	-	1	7.1	17	43.6	1	25.0	4	40.0
300-359日	8	11.0	-	-	1	7.1	2	5.1	3	75.0	2	20.0
360日以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表16 公共工程驗收日與完工日差距

112年

單位：件；%

差距日數	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	42	100.0	1	100.0	3	100.0	31	100.0	-	-	7	100.0
0日	2	4.8	-	-	-	-	2	6.5	-	-	-	-
1-14日	9	21.4	-	-	-	-	9	29.0	-	-	-	-
15-29日	17	40.5	-	-	-	-	13	41.9	-	-	4	57.1
30-44日	6	14.3	-	-	1	33.3	2	6.5	-	-	3	42.9
45-59日	4	9.5	-	-	2	66.7	2	6.5	-	-	-	-
60-74日	4	9.5	1	100.0	-	-	3	9.7	-	-	-	-
75-89日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90日以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
完成驗收需要最多日數(日)	73		61		56		73		-		41	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：1.「0日」為工程完工日即完成驗收程序者。

2.最大差距日數為73日，差距超過100日以上者計有0件。

3.已完工未驗收者計31件。

表17 公共工程預算結餘金額

112年

單位：件；%

結餘金額	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	30	100.0	1	100.0	2	100.0	24	100.0	-	-	3	100.0
無經費結餘	2	6.7	-	-	-	-	2	8.3	-	-	-	-
10萬元以下	15	50.0	-	-	-	-	13	54.2	-	-	2	66.7
10-50萬元	6	20.0	1	100.0	1	50.0	4	16.7	-	-	-	-
50-100萬元	5	16.7	-	-	-	-	4	16.7	-	-	1	33.3
100-500萬元	2	6.7	-	-	1	50.0	1	4.2	-	-	-	-
500-1,000萬元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,000-5,000萬元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,000萬元以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工程經費剩餘最多金額(萬元)	149		36		149		119		-		82	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表18 公共工程預算結餘與施工預算差距比率

112年

單位：件；%

金額差距比率	總計		新建工程處		水利工程處		公園路燈工程管理處		衛生下水道工程處		大地工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	30	100.0	1	100.0	2	100.0	24	100.0	-	-	3	100.0
無預算結餘	2	6.7	-	-	-	-	2	8.3	-	-	-	-
結餘10%以下	24	80.0	1	100.0	1	50.0	19	79.2	-	-	3	100.0
結餘10%~20%	3	10.0	-	-	1	50.0	2	8.3	-	-	-	-
結餘20%~30%	1	3.3	-	-	-	-	1	4.2	-	-	-	-
結餘30%~40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結餘40%~50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結餘50%~60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結餘60%以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預算結餘最多之比率(%)	25.1		6.8		16.5		25.1		-		3.3	

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表19 公共工程已決算概況

112年

項目別	總計	新建 工程處	水利 工程處	公園路燈 工程管理處	衛生下水道 工程處	大地 工程處
已驗收已決算件數(件)	30	1	2	24	-	3
變更設計工程件數(件)	20	-	1	18	-	1
變更設計件數占已決算件數 比率(%)	66.7	-	50.0	75.0	-	33.3
施工預算數(萬元)	28,268	526	1,874	20,118	-	5,750
決標金額(萬元)	22,784	495	1,570	15,266	-	5,454
決標金額占預算比率(%)	80.6	94.1	83.8	75.9	-	94.8
工程決算金額(萬元)	27,372	490	1,693	19,526	-	5,663
工程決算金額占預算比率(%)	96.8	93.2	90.3	97.1	-	98.5
預算結餘金額(萬元)	896	36	182	592	-	87
預算結餘占預算金額比率(%)	3.2	6.8	9.7	2.9	-	1.5

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：已驗收未決算者計 12 件。

表20 公共工程已驗收未決算件數

112年

單位：件

驗收日距年底日數	總計	新建 工程處	水利 工程處	公園路燈 工程管理處	衛生下水道 工程處	大地 工程處
總計	12	-	1	7	-	4
0-14日	8	-	1	3	-	4
15-29日	3	-	-	3	-	-
30-44日	1	-	-	1	-	-
45-59日	-	-	-	-	-	-
60-74日	-	-	-	-	-	-
75-89日	-	-	-	-	-	-
90-104日	-	-	-	-	-	-
105-119日	-	-	-	-	-	-
120日以上	-	-	-	-	-	-

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表21 公共工程執行績效

112年

單位	總計	新建工程處	水利工程處	公園路燈工程管理處	衛生下水道工程處	大地工程處
工程發包件數(件) ①	202	69	50	60	11	12
預約維護	99	45	18	25	7	4
113年開工	-	-	-	-	-	-
整建工程	90	18	30	31	4	7
新建工程	13	6	2	4	-	1
已開工件數(件) ②	192	63	46	60	11	12
預約維護	99	45	18	25	7	4
113年開工	-	-	-	-	-	-
整建工程	83	14	27	31	4	7
新建工程	10	4	1	4	-	1
開工績效						
開工率(%) ③=②/①	95.0	91.3	92.0	100.0	100.0	100.0
預約維護	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
整建工程	92.2	77.8	90.0	100.0	100.0	100.0
新建工程	76.9	66.7	50.0	100.0	--	100.0
平均待工日數(日)	47.1	50.7	53.7	43.1	43.6	26.8
預約維護	40.7	40.0	53.1	38.0	39.4	12.5
整建工程	48.5	58.2	54.4	42.3	51.0	32.1
新建工程	99.6	144.8	45.0	81.3	--	47.0
完工績效						
已完工件數(件) ④	73	6	14	39	4	10
預約維護	35	1	7	19	4	4
整建工程	34	5	6	18	-	5
新建工程	4	-	1	2	-	1
完工率(%) ⑤=④/②	36.1	8.7	28.0	65.0	36.4	83.3
預約維護	35.4	2.2	38.9	76.0	57.1	100.0
整建工程	37.8	27.8	20.0	58.1	-	71.4
新建工程	30.8	-	50.0	50.0	--	100.0
平均提早完工日數(日)	12.6	20.0	-15.6	20.8	-	20.4
預約維護	23.3	112.0	0.6	29.2	-	36.3
整建工程	3.4	1.6	-34.7	15.7	--	6.6
新建工程	-3.8	--	-14.0	-13.5	--	26.0
驗收績效						
已驗收件數(件) ⑥	42	1	3	31	-	7
預約維護	20	-	-	17	-	3
整建工程	20	1	3	12	-	4
新建工程	2	-	-	2	-	-
驗收率(%) ⑦=⑥/②	20.8	1.4	6.0	51.7	-	58.3
預約維護	20.2	-	-	68.0	-	75.0
整建工程	22.2	5.6	10.0	38.7	-	57.1
新建工程	15.4	-	-	50.0	--	-
平均驗收日數(日)	28.0	61.0	46.7	24.8	--	29.0
預約維護	17.4	--	--	16.2	--	24.0
整建工程	35.5	61.0	46.7	31.5	--	32.8
新建工程	58.5	--	--	58.5	--	--

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

表22 公共工程未開工明細表

112年

序號	發包單位	合約編號	施工預算 (萬元)	底價金額 (萬元)	決標金額 (萬元)	決標日期	發包工程名稱
總計		--	389,270	340,620	339,661	--	--
1	新工處	112101	6,587	6,038	6,038	112.11.16	臺北市忠孝東路3段人行環境改善工程(建國南路至復興南路)(第二標)
2	新工處	112103	8,357	7,722	7,668	112.08.31	舊環南高架(河濱一商場)耐震補強改善工程(修正後)
3	新工處	112111	91,090	76,771	76,771	112.11.13	臺北市文山區力行國民小學活動中心新建工程
4	新工處	112115	5,290	4,731	4,731	112.11.20	建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬工程
5	新工處	112116	2,620	1,800	928	112.12.28	臺北市立陽明教養院永福之家拆除工程
6	新工處	112119	235,457	206,298	206,298	112.12.29	臺北市松山區西松國民小學學生活動中心新建工程
7	水利處	112090	44	42	42	112.07.28	六分區管理中心水位警報控制盤增設工程
8	水利處	112133	2,847	2,630	2,630	112.12.26	基隆河系抽水站儲槽系統及附屬設施改善工程
9	水利處	112114	3,523	3,266	3,234	112.10.13	大安區敦化南路2段(四維路208巷至四維路170巷間)排水改善工程
10	水利處	112125	33,455	31,321	31,321	112.11.21	士林官邸北側滯洪池新建工程

資料來源：工務局各工程處提供，統計室彙整。

說明：112年已發包未開工工程計有 10 件，其中新工處 6 件，水利處 4 件，公園處 0 件，衛工處 0 件，大地處 0 件。
