



臺北市政府工務局新建工程處

「106年度道路橋梁工程」委託規劃設計技術服務案

木柵路3段102巷6弄道路新築工程

地區說明會

107.03.16

主辦單位：臺北市政府工務局新建工程處

設計單位：恆康工程顧問股份有限公司

1.


基地概況

工區位置


- 緣由：依據都市計畫道路開闢出入通路
- 位置：自木柵路3段48巷至木柵路3段102巷之間
- 施工期程：107年8月~107年11月



工區位置現況照片

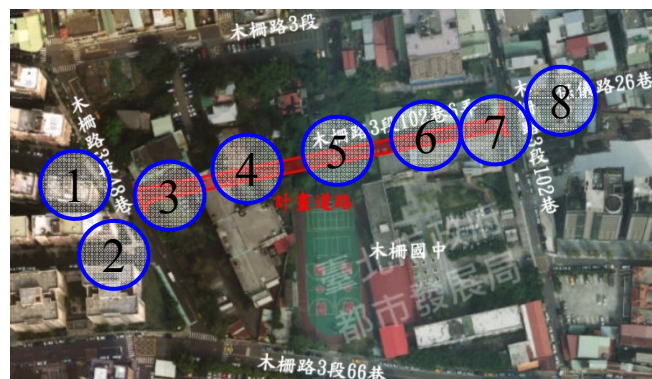

都市計畫土地使用分區



- 依據臺北市政府都市發展局都市查詢系統資料顯示，本案計畫位置為道路用地，北側為商業用地；南側則分別為住宅及文教用地。




2.

計畫道路配置方案


方案一：車道配置

- 車行道路(W=6公尺，L=199公尺)
- 道路兩側設置溝寬W=40cm排水溝，排水銜接木柵路3段48巷排水系統

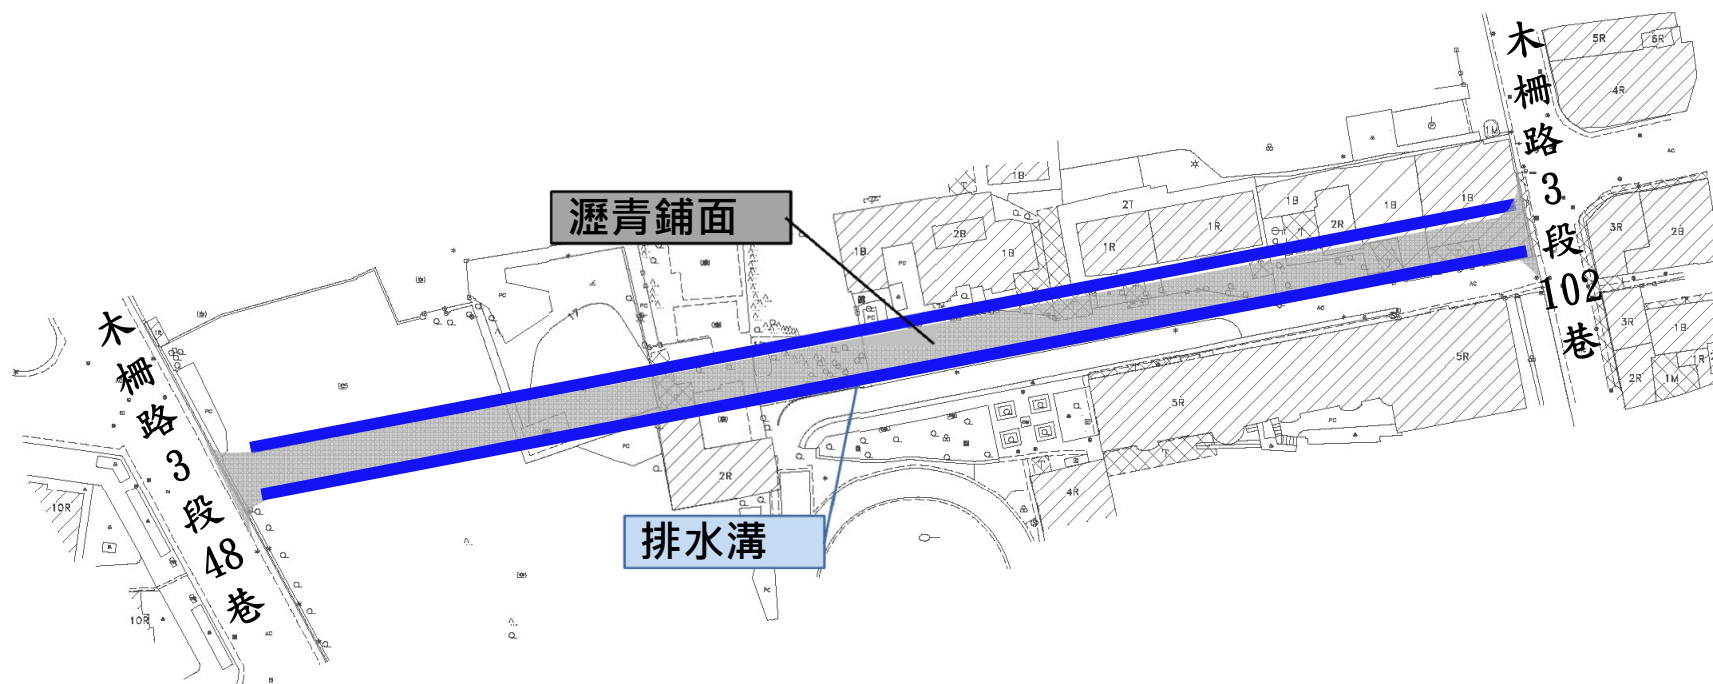

方案一：車道配置

- 單側設置路燈8座
- 鋪面採20公分瀝青混凝土，30公分路基級配

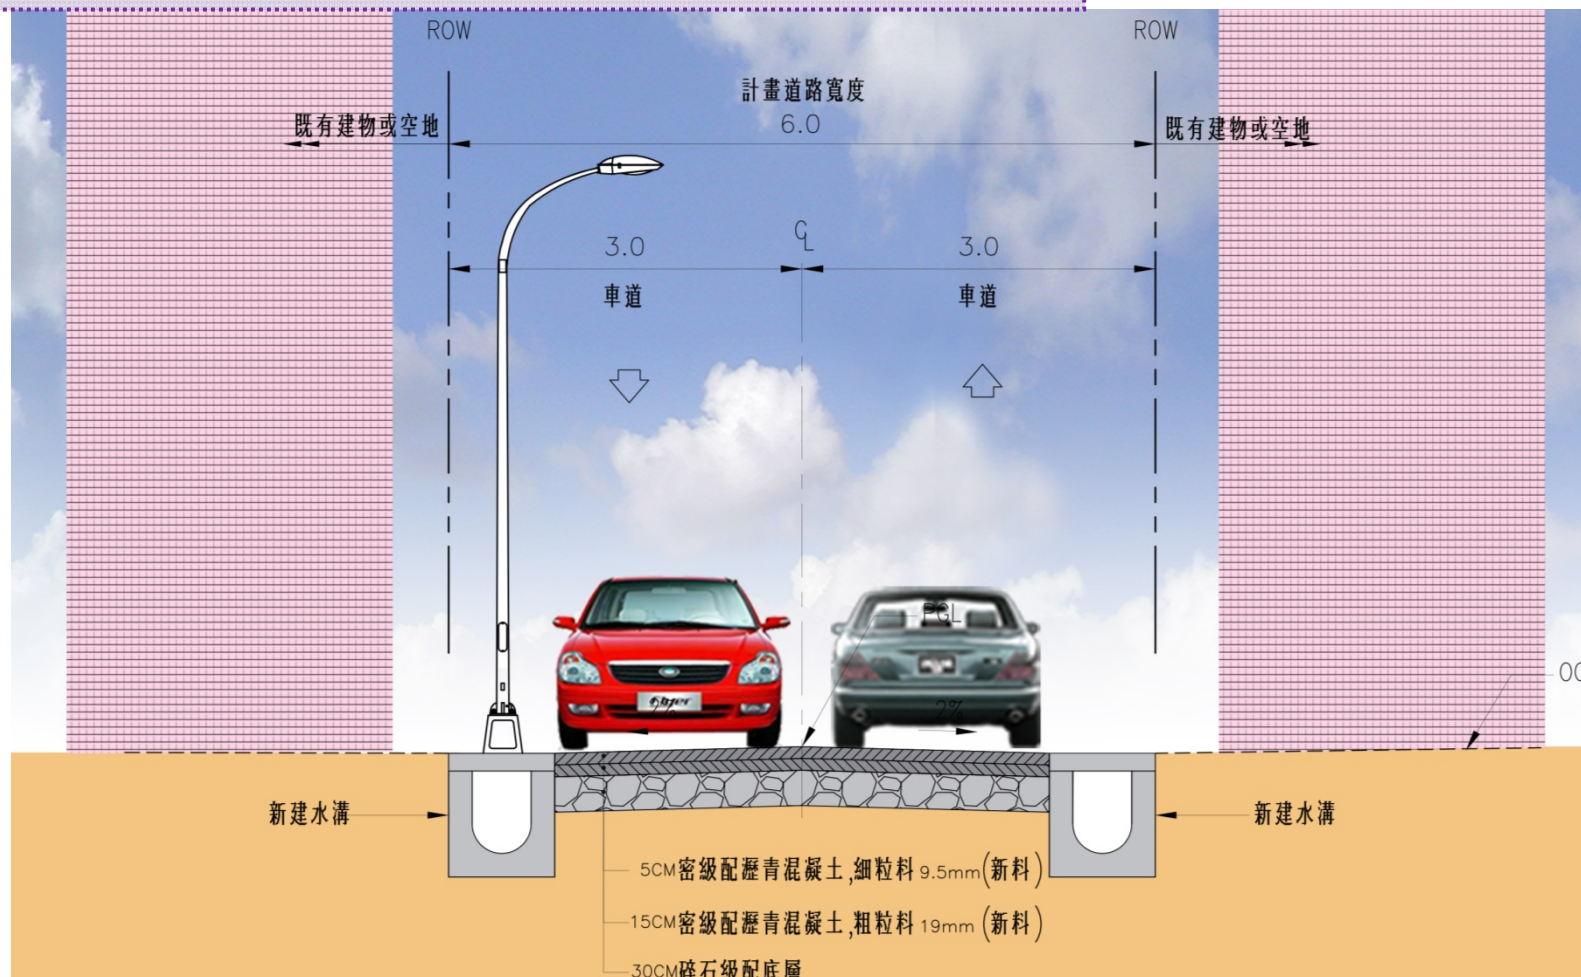

橫斷面圖

- 人行步道(W=6公尺，L=199公尺)

- 道路兩側設置溝寬 $W=40\text{cm}$ 排水溝，排水銜接木柵路3段48巷排水系統




排水溝

平面圖

方案二：人行步道配置

- 單側設置路燈8座
- 鋪面採6公分高壓混凝土磚面，17公分混凝土層


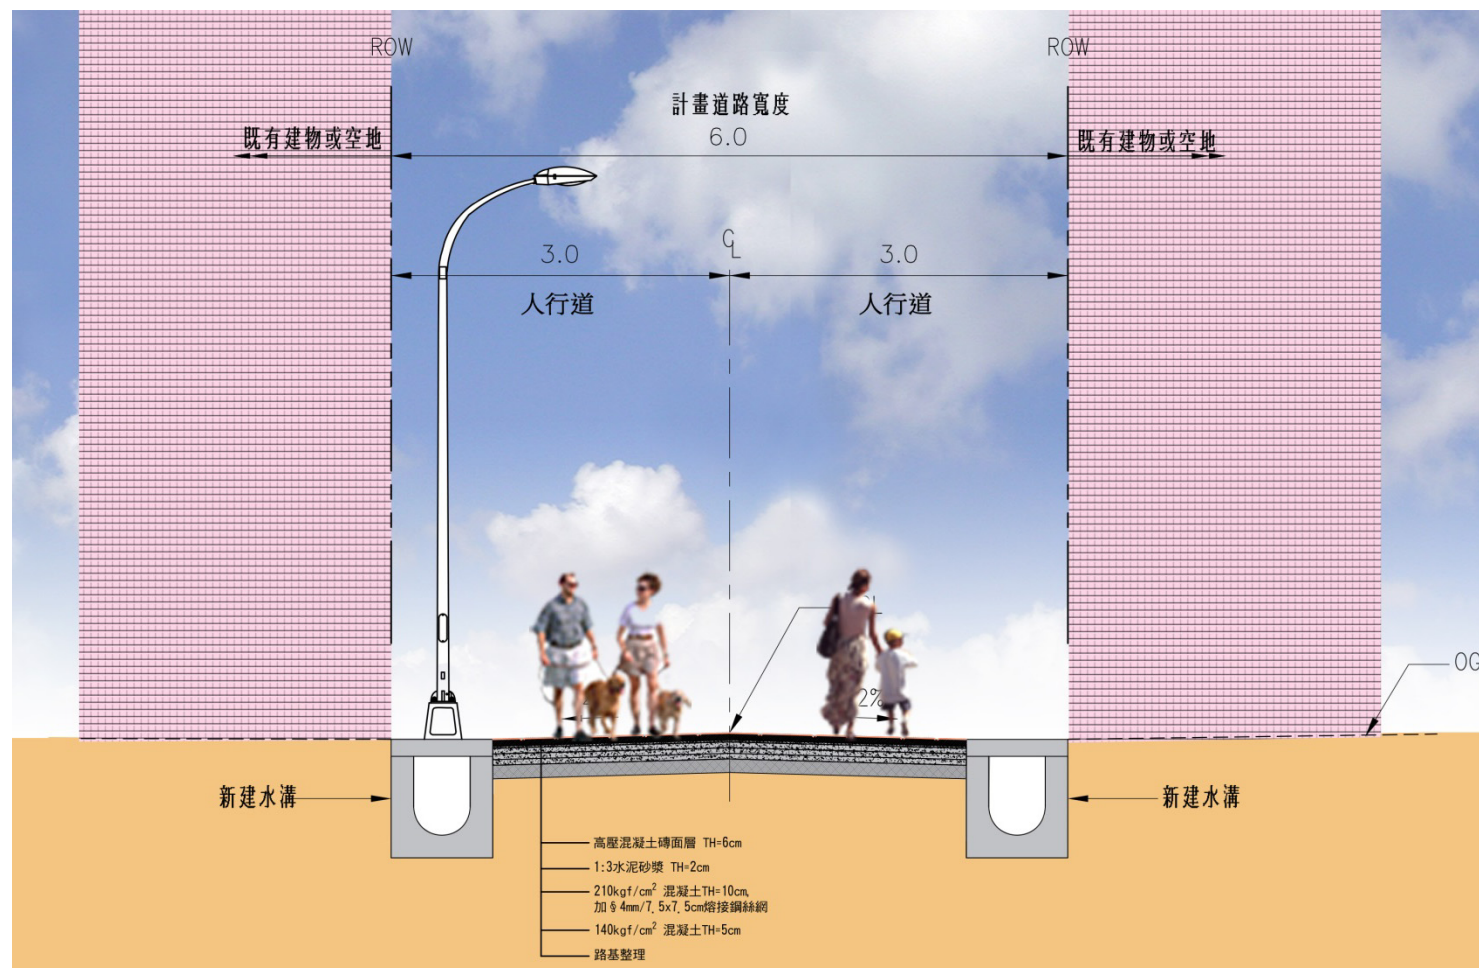


橫斷面圖

3.



設施拆移

設施拆遷

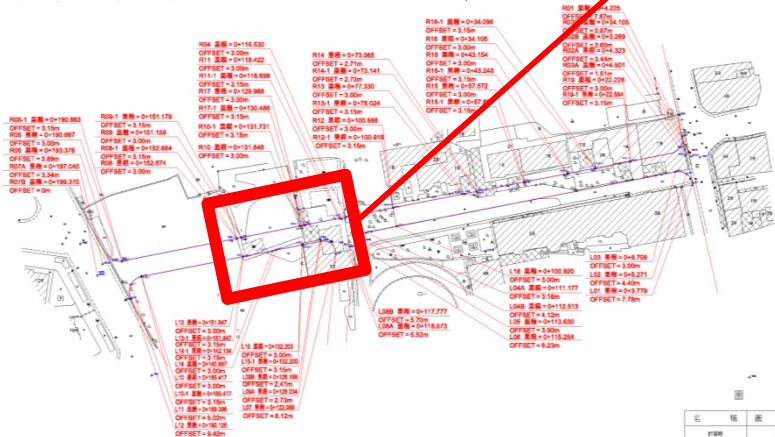
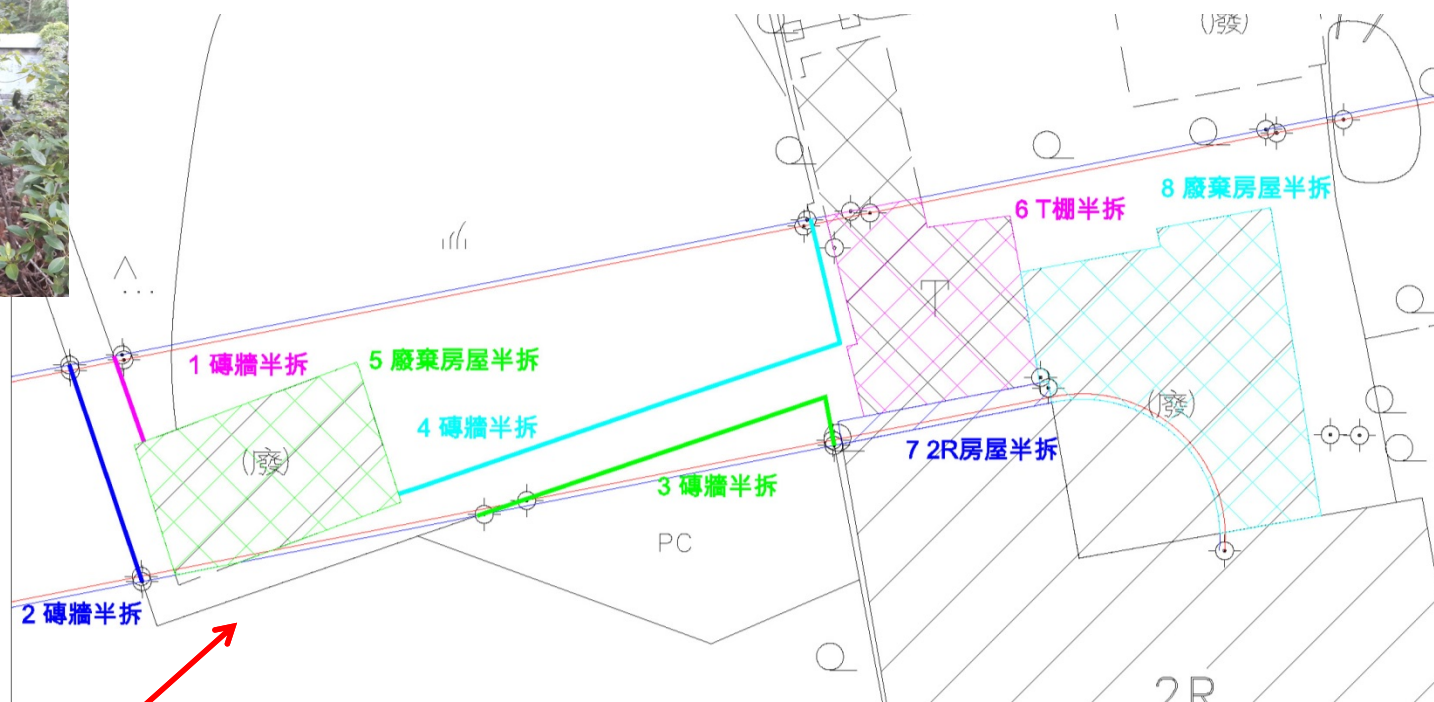





設施拆遷

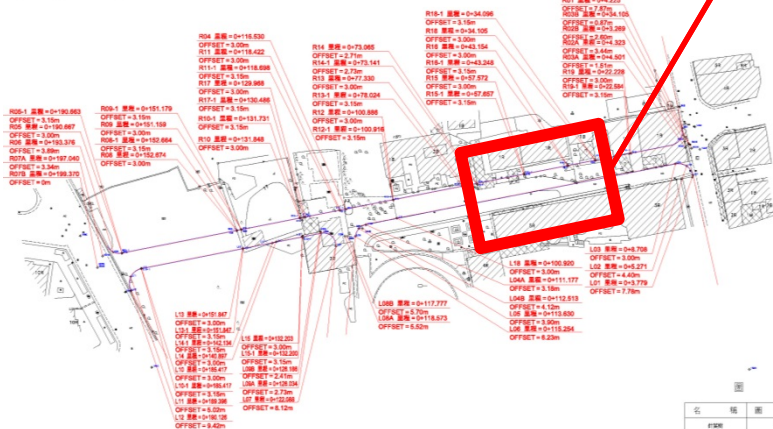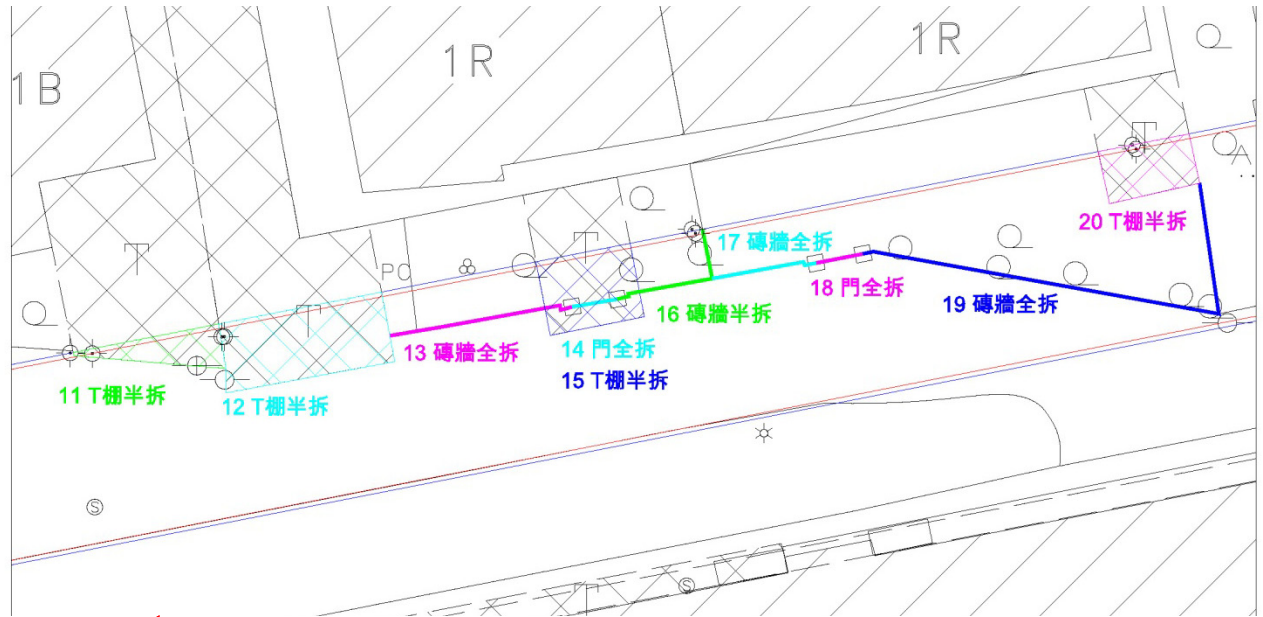

設施拆遷

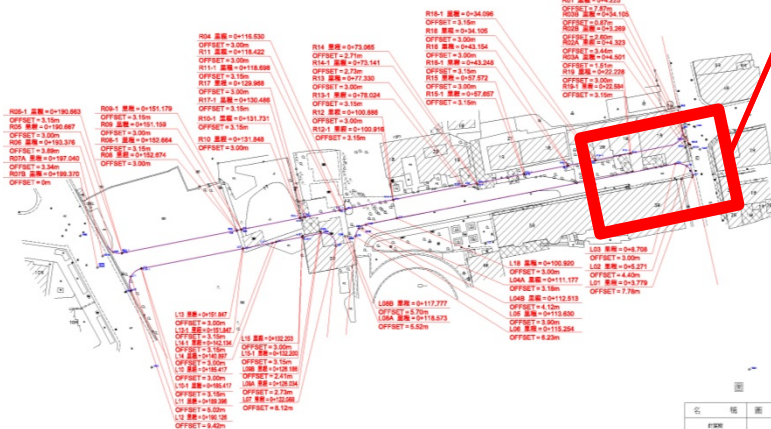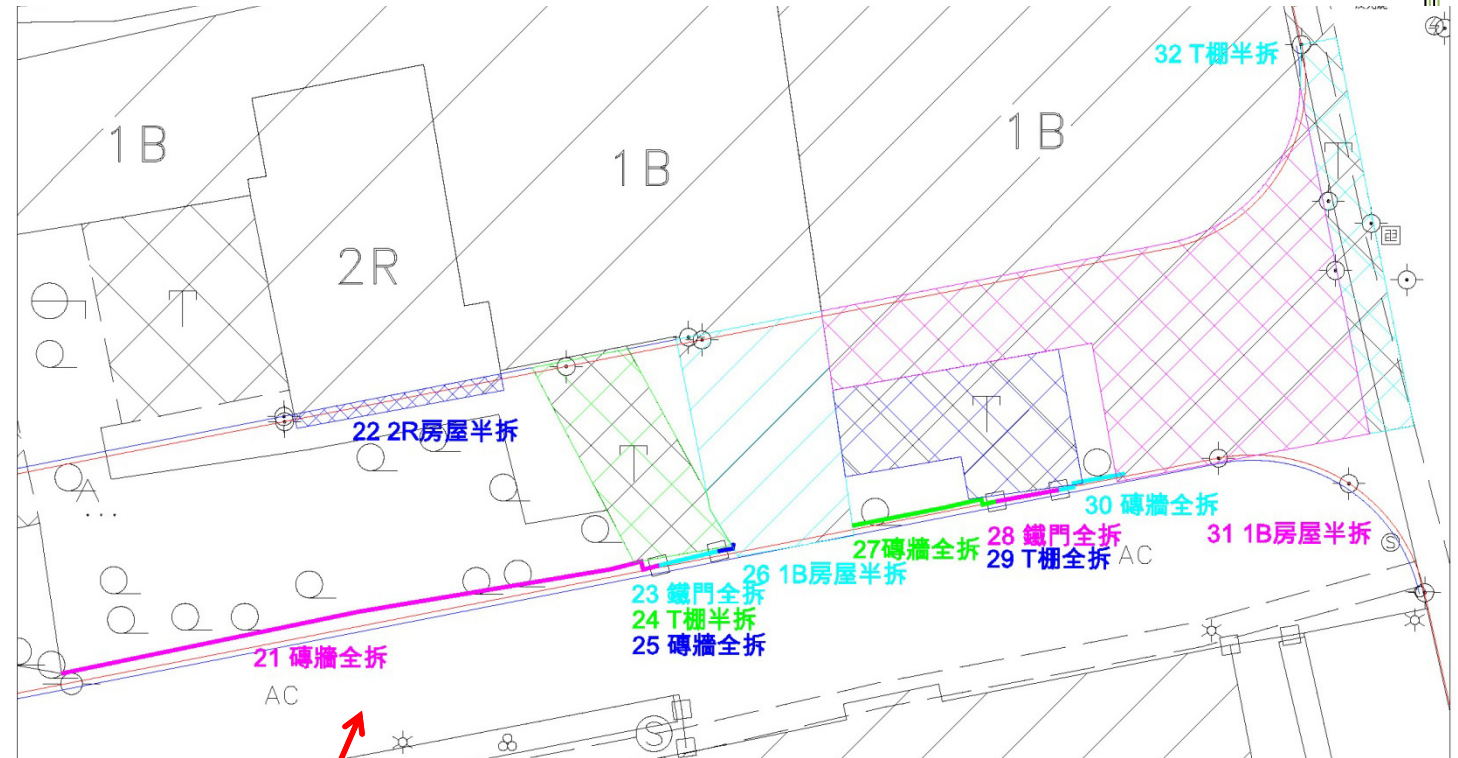


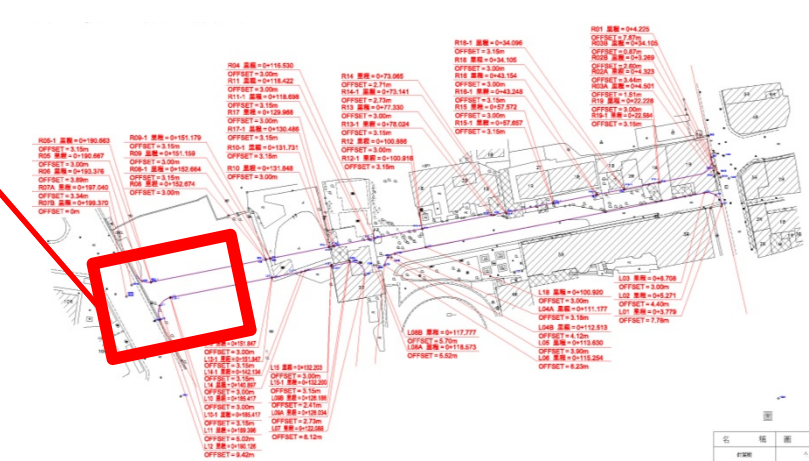

4.

預定施工工期


預定施工期程規劃



■ 主要要徑為喬木移植、整地開挖、排水設施、路燈纜線管路、路基回填、瀝青鋪面與標線劃設等施工項目，整體施工期程評估約需150個日曆天(未含發包招標作業)

木柵路3段102巷6弄道路新築工程 預定施工進度參考圖 預估工期：150日曆天						
項次	任務名稱	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月
1	佈設圍欄及交通安全設施	7				
2	喬木移植	14				
3	地坪拆除	7				
4	既有管路探挖、檢測及放樣	7				
5	路面切割及整地		25			
6	施作邊溝、RCP排水管、路燈及纜線管路			60		
7	土方作業及路基整理				14	
8	鋪設瀝青混凝土及標線劃設				10	
9	既有設施復舊及清理作業					6

備註：工期已考量勞動基準法第三十六條修正為「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。」編列為150日曆天。



簡 報 完 畢

