



捷運統計通報

(第 06 號)


臺北市政府捷運工程局

110 年 7 月 27 日

◎截至 110 年 6 月底止，捷運興建中路網信義線東延段實際進度 50.44%，較預定進度 50.43% 多 0.01 個百分點，預計 112 年底完工；萬大-中和-樹林線(第一期) 實際進度 55.82%，與預定進度同，預計 114 年底完工。

興建中捷運工程進度

110 年 6 月底

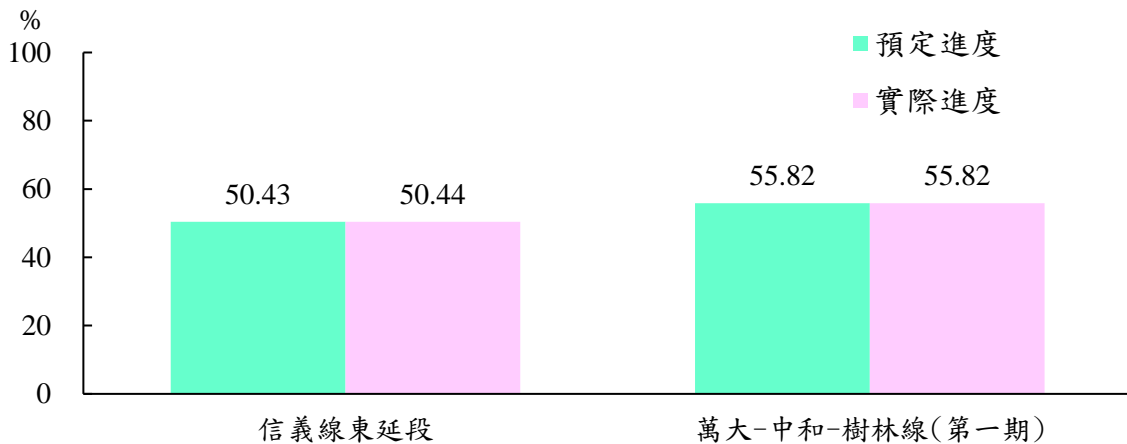

資料來源：臺北市政府捷運工程局。

◎截至 110 年 6 月底止，臺北都會區大眾捷運系統土地開發作業計核定 88 個基地，其中已完工(取得使照)62 個，施工中(取得建照)2 個，設計中(簽訂投資契約書)6 個，徵求投資人或前置作業中 18 個。

臺北都會區土地開發基地各階段辦理情形

110 年 6 月底

總計：88 個基地



資料來源：臺北市政府捷運工程局。
