



捷運統計通報

(第 10 號)

臺北市政府捷運工程局

111 年 7 月 25 日

◎截至 111 年 6 月底止，捷運興建中路網信義線東延段實際進度 59.81%，與預定進度同，較上年同期增加 9.37 個百分點；萬大-中和-樹林線(第一期)實際進度 61.80%，與預定進度同，較上年同期增加 5.98 個百分點。

興建中捷運工程進度

單位：%

年/月底別	信義線東延段		萬大-中和-樹林線(第一期)	
	預定進度	實際進度	預定進度	實際進度
110 年 6 月底	50.43	50.44	55.82	55.82
111 年 6 月底	59.81	59.81	61.80	61.80
111 年 6 月底 較上年同期 增加百分點		9.37		5.98


資料來源：臺北市政府捷運工程局。

◎截至 111 年 6 月底止，臺北都會區大眾捷運系統用地土地開發作業計核定 87 基地，其中已完工(取得使照) 63 基地，占 72.41%，未完工 24 基地，占 27.59%。

臺北都會區大眾捷運系統用地土地開發作業辦理情形

111 年 6 月底

總計：87 基地

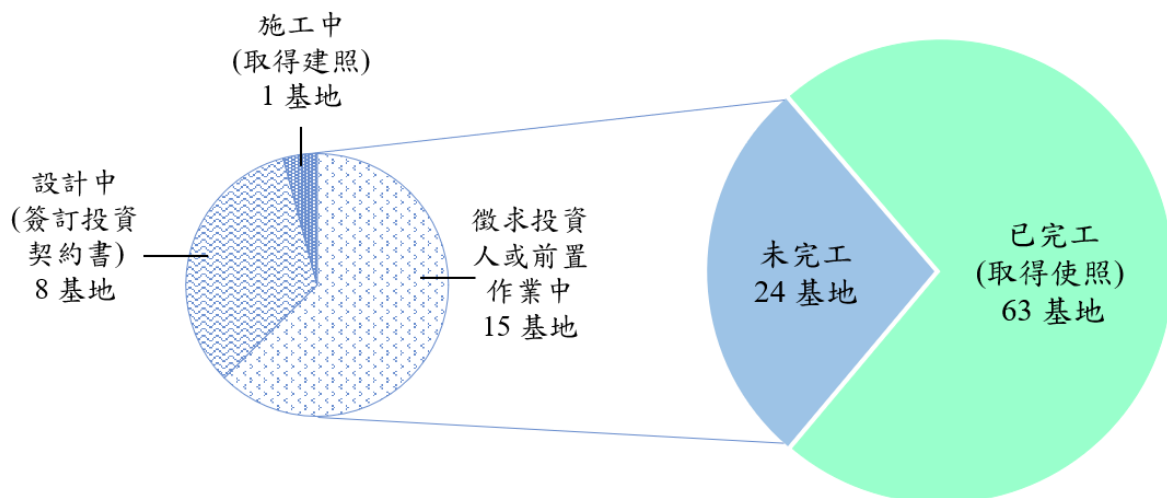

資料來源：臺北市政府捷運工程局。
