



# 捷運統計通報

(第 14 號)

臺北市政府捷運工程局

112 年 7 月 31 日

◎截至 112 年 6 月底止，捷運興建中路網計有信義線東延段、萬大-中和-樹林線(第一期)、環狀線北環段及南環段、萬大-中和-樹林線(第二期)等 4 項工程，在建里程長度 44.86 公里，預計興建 41 座車站、2 座機廠及 1 段尾軌；實際工程進度除萬大-中和-樹林線(第一期)與預定進度相同外，其餘 3 項工程略微落後。

## 興建中捷運工程現況

112 年 6 月底

項目別	信義線東延段	萬大-中和-樹林線(第一期工程)	環狀線北環段及南環段	萬大-中和-樹林線(第二期工程)
長度 (公里)	1.4	9.5	北環段：14.93 南環段：5.73	13.3
場站數	1 座地下車站及供營運調度使用之尾軌	9 座地下車站及 1 座機廠	北環段：12 座地下車站及 1 座機廠 南環段：6 座地下車站	2 座地下車站及 11 座高架車站
預定工程進度 (%)	76.08	67.61	27.64	18.08
實際工程進度 (%)	71.51	67.61	27.07	17.10


資料來源：臺北市政府捷運工程局。

◎截至 112 年 6 月底止，臺北都會區大眾捷運系統土地開發作業計核定 87 個基地，其中已完工(取得使照)63 個，施工中(取得建照)5 個，設計中(簽訂投資契約書)6 個，徵求投資人或前置作業中 13 個。

## 臺北都會區土地開發基地各階段辦理情形

112 年 6 月底

總計：87 個基地

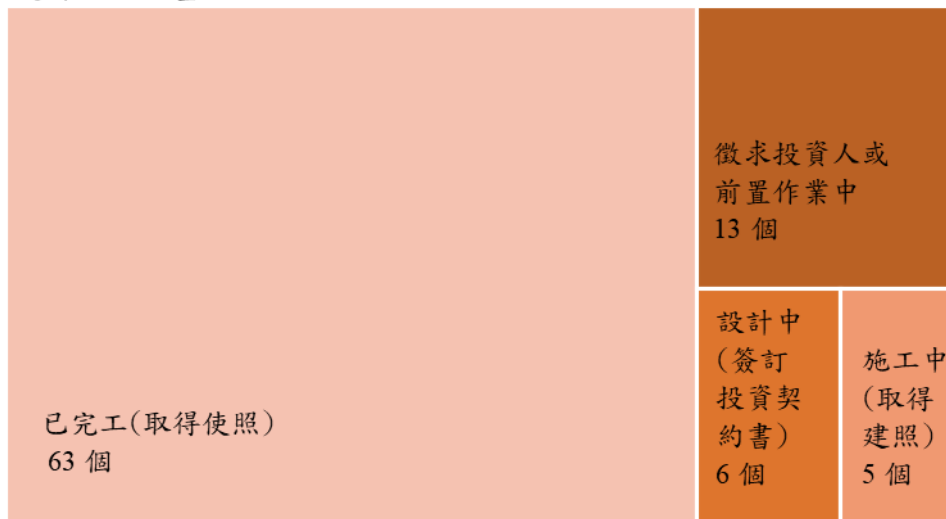

資料來源：臺北市政府捷運工程局。
