

# 統計運用分析報告

臺北市公共工程執行概況分析報告  
(94 年度)



中華民國九十五年五月  
工務局統計室

## 目 錄

一、	概述.....	1
二、	執行情形.....	2
三、	按月別分析.....	4
四、	底價訂定.....	6
五、	決標情形.....	7
六、	變更設計.....	9
七、	開工情形.....	
	11	
八、	完工情形.....	
	12	
九、	工程驗收.....	
	14	
十、	工程執行績效.....	
	17	
十一、	工程結算.....	18

十二、	得標廠商分析.....	21
十三、	歷年比較.....	21
十四、	非公共工程類統計.....	22
十五、	附錄.....	23

# 臺北市政府工務局公共工程執行概況分析報

## 告

94 年度


工務局統計室

### 一、概述：

民國 94 年臺北市政府工務局（以下簡稱工務局）執行公共工程設計、發包工程共計 515 件，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有 489 件占 94.95%，以「限制性招標議價」辦理發包者有 21 件占 4.08%，以「限制性招標公開評選」方式辦理發包者有 3 件占 0.58%，以「限制性招標比價」方式辦理發包者有 1 件占 0.19%，另以「其他」方式發包者有 1 件；在所有發包工程件數中，於施工中辦理變更設計者有 77 件占 14.95%；至 94 年 12 月 31 日止已發包工程中，已開工實際施作者有 467 件占 90.68%，另有 48 件占 9.32% 的工程，因各種因素而尚未開工；在 515 件發包工程中，於年底已完工者計有 317 件占 61.55%，而未完工者有 198 件占 38.45%；完工工程並辦理驗收者計有 213 件，占總工程件數的 41.36%，未驗收者計有 104 件（含未完工的工程共計 302 件占 58.64%）；已驗收並辦理工程結算者計有 188 件，占總工程件數的 36.50%，尚未辦理結算的工程計有 25 件（含未完工及未驗收的工程計 327 件占 63.50%）。（詳如表 1 及圖 1）


### 二、公共工程執行情形：

在工務局執行的公共工程 515 件中，工務局所屬養護工程處（以下簡稱養工處）總計執行 155 件公共工程發包，其中以「公開招

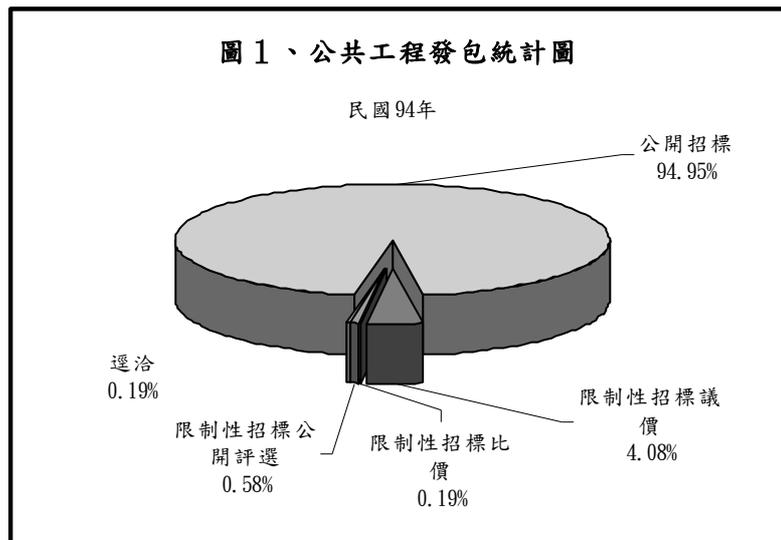


標」方式辦理發包者計有 152 件，占該處發包工程的 98.06%，以「限制性招標議價」、「限制性招標比價」及「限制性招標公開評選」方式辦理者各有 1 件，分別占 0.65%；新建工程處（以下簡稱新工處）總計執行 37 件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有 26 件占 70.27% 為最多，以「限制性招標議價」方式辦理者計有 9 件占 24.32%，以「限制性招標公開評選」方式辦理者計有 1 件占 2.70%，另以「其他」方式發包者有 1 件；衛生下水道工程處（以下簡稱衛工處）總計執行 56 件公共工程發包，則全部以「公開招標」方式辦理發包；公園路燈工程管理處（以下簡稱公園處）總計執行 267 件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有 255 件，占該處發包工程的 95.51% 為最多，以「限制性招標議價」方式辦理者計有 11 件占 4.12%，以「限制性招標公開評選」方式辦理者計有 1 件占 0.37%。94 年公共工程發包以「公開招標」方式辦理的比率，以衛工處為最多，達 100%，而以新工處的 70.27% 為最低，以「限制性招標議價」方式辦理的比率，則以新工處的 24.32% 為最高，而以養工處的 0.65% 為最低，以「限制性招標比價」方式辦理的比率只有養工處的 1 件占 0.65%，以「限制性招標公開評選」方式辦理的比率，則為養工處、新工處及公園處各只有 1 件。在 77 件施工中辦理變更工程設計者中，以公園處的 53 件為最多，其次為養工處的 18 件為次，最少者為新工處及衛工處各僅有 3 件。如以變更設計占該處公共工程發包件數的比率來看，則以公園處有 19.85% 的工程有變更設計為最多，其次為養工處有 11.61% 的工程有變更設計，最少者為衛工處僅有 5.36% 的工程有變更設計的情形。截至 94 年底止工務局執行的公共工程中，已決標發包且已開工施作者共計有 467 件，占總工程件數的 90.68%，但尚未開工者共計 48 件，其中以公園處之 24 件為最多，其次為養工處有 11 件，最少為新工處有 6 件。已開工的公共工程件數中，截至 94 年底止已完工者有 317 件占總工程件數之 61.55%，未完工者有 150 件（含未開工件數計有 198 件）。其中以養工處有 59 件工程已開工但未完工為最多，其次為衛工處有 41 件，公園處亦有 34 件的工程未完工，最少者為新工處有 16 件工程已開工但至年底則尚未完工。公共工程已完工者並完成驗收程序者計有 213 件，占總工程件數的 41.36%，但尚有 104 件尚未完成驗收程序或未驗收（含未開工及未完工件數總計有 302 件），其中以養工處之 54 件為最多，其次為公園處有 38 件，最少者為衛工處有 4 件已經完工但尚未完成驗收程序的公共工程；在完成驗收程序的 213 件公共工程中，已辦理完成經費結算者共計 188 件，尚有 25 件工程尚未辦理經費結清作業，其中以養工處有 24 件工程未結清經費者為最多，另新工處亦有 1 件已驗收但尚未結清的工程；衛工處及公園

處本年度無已辦完驗收程序而未結清經費的工程。(詳如表 1 及圖 2、圖 3)

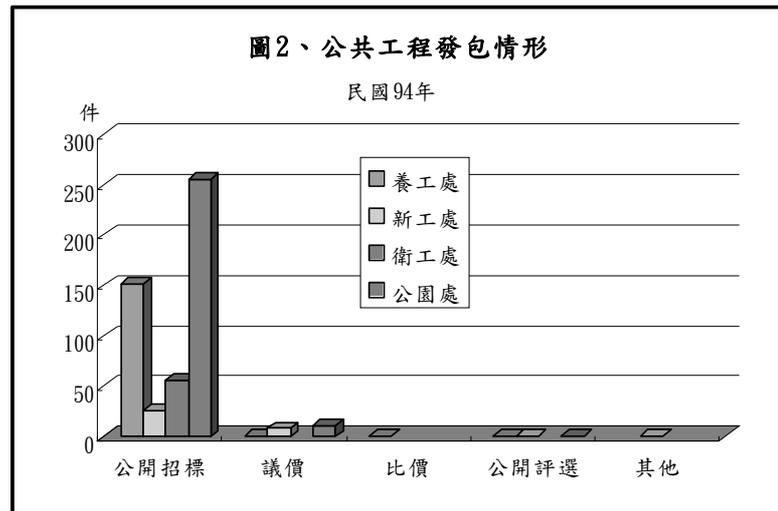



附註：議價、比價及公開評選均為限制性招標方式之簡稱。

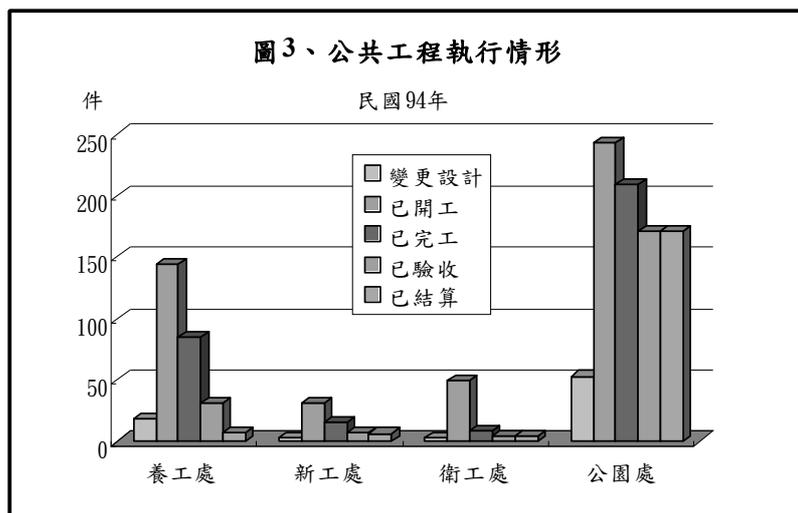

### 三、按月別分析：

本市各項公共工程執行情形如以月份分析，公共工程的發包以 3 月份執行發包 97 件為最多，占 18.83%，其次為 4 月份及 5 月份各

有 50 件工程發包占 9.71%，最少者為 7 月份及 12 月份發包件數為 28 件各占 5.44%。各月份公共工程已決標且已開工者亦以 3 月份的 95 件為最多，占 20.34%，其次為 4 月份的 50 件占 10.71%，開工最少者仍為 12 月份的 4 件僅占 0.86%；相對的，公共工程已決標但至年底尚未開工者，以 12 月份共有 24 件為最多，占全部已決標發包尚未開工工程件數之 50.00%，其次為 11 月份，有 7 件工程尚未開工占 14.58%，其於 10 月份（6 件）、5 月份（5 件）及 3 月份、6 月份、9 月份（各 2 件）均有已發包但尚未開工的工程。各月份完工的公共工程件數以 3 月份的 82 件為最多，占完工總件數的 25.87%，其次為 4 月份的 44 件占 13.88% 及 2 月份的 41 件占 12.93%，其他各月份完工件數均在 40 件以下，最少者為 12 月份，僅有 2 件工程完工。本年度發包的各項公共工程中，如以開工月份分析已開工者，至年底尚未完工者計有 150 件，其中以 11 月份有 26 件為最多，占未完工工程的 17.33%，其次為 12 月份有 24 件占 16.00%，最少者為 5 月份有 2 件已開工但至年底尚未完工，占 1.33%（詳如表 4）。本年度發包的各項公共工程中已完工者有 317 件，其中有 213 件完成驗收程序，其中又以 3 月份的 50 件占 23.47% 為最多，其次為 4 月份的 32 件占 15.02% 及 2 月份的 31 件占 14.55%，其他各月份均在 30 件以下，尤以 12 月份尚無工程完成驗收為最少；其他尚有 104 件尚未完成驗收程序或未驗收，如以已完工月份分析來看，其中以 12 月份有 92 件公共工程已完工而未驗收為最多，其次為 11 月份有 9 件未驗收，另 8 月份及 9 月份各有 2 件及 1 件尚未驗收，其餘各月份均無已完工而未驗收的工程（詳如表 5）。在已驗收的工程中並已辦理完成經費結算者共計 188 件，其中以 3 月份的 41 件占 21.81% 為最多，其次為 1 月份、2 月份及 4 月份亦都有 20 件以上的工程完成經費結算，除 12 月份無完成結算者外，最少者為 11 月份只有 1 件工程完成經費結算；已驗收但尚未辦理經費結算者共計 25 件，如以驗收月份分析，其中以 12 月份的 12 件占未驗收總件數的 48.00% 為最多，其次為 11 月份有 10 件占 40.00%，另 7 月份及 10 月份各有 2 件及 1 件未辦理結清工程款，其他各月份則均無未辦理結清工程款者。（詳如表 2、表 3、表 4、表 5、表 6 及圖 4、圖 5）

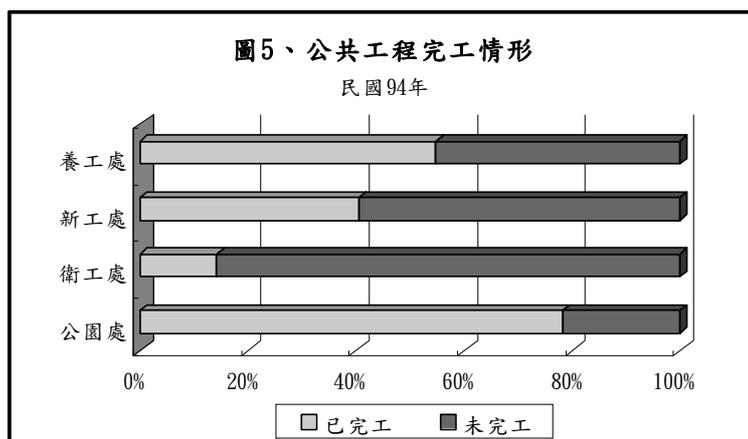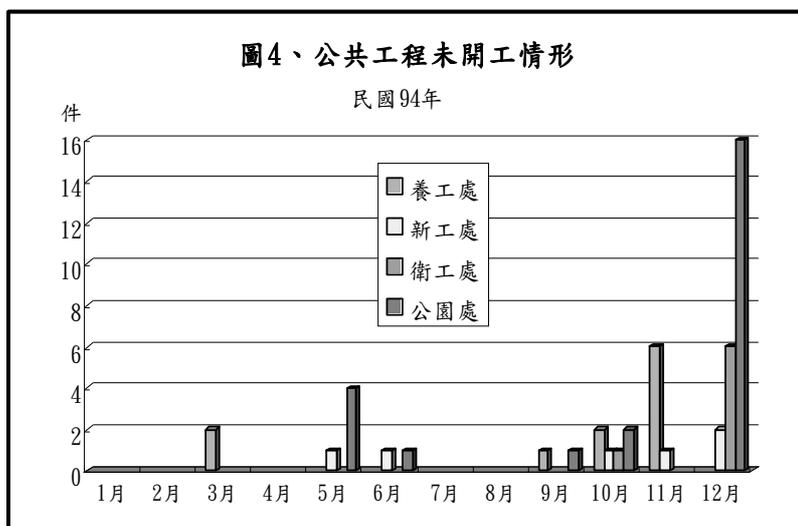

#### 四、底價訂定：

94年度本府公共工程發包的515件中，底價的訂定以「100-500萬元」的240件為最多，其次為「100萬元以下」的78件，二者合計318件占總發包件數的61.75%，再次為「1,000-5,000萬元」的有75件，另有19件的公共工程因各種因素而未訂底價。以工程發包方式分析，「公開招標」的底價訂定以「100-500萬元」有237件為最多，「限制性招標議價」的底價訂定以「100萬元以下」有14件為最多，「限制性招標比價」只有1件，底價訂定為「100-500萬元」，「限制性招標公開評選」的底價訂定亦以「未定底價」有2件為最多。以各工程


處分析，養工處發包的 155 件公共工程中，底價訂定在「500-1,000 萬元」有 52 件為最多，其中「公開招標」有 51 件。另底價訂定在「100-500 萬元」者有 45 件，「1,000-5,000 萬元」者有 41 件，其餘各種底價之訂定均在 10 件以下。新工處發包的 37 件公共工程底價以「未訂底價」有 15 件為最多，各種發包方式的「公開招標」中底價之訂定以「未定底價」有 14 件為最多，其次為底價訂定在「100-500 萬元」者有 5 件；「限制性招標議價」中底價訂定以「100 萬元以下」有 4 件為最多，其他各種招標方式及底價訂定組距之件數均在 2 件以下。衛工處發包工程 56 件均以「公開招標」方式開標，其底價訂定以「1,000-5,000 萬元」有 27 件為最多，其次為「5,000-1 億元以上」者有 14 件，其他各種底價訂定組距件數，均在 10 件以下。公園處發包的 267 件工程中，底價訂定亦以「100-500 萬元」有 182 件為最多，各種發包方式中「公開招標」之底價訂定亦以「100-500 萬元」有 180 件為最多，其次為底價訂定在「100 萬元以下」者有 59 件；「限制性招標議價」以底價「100 萬元以下」有 9 件為最多，「限制性招標公開評選」計有 1 件，其底價訂定為「未定底價」。（詳如表 7）

## 五、決標情形：


94 年度工務局暨所屬工程處執行公共工程其決標金額以在「100-500 萬元」者為最多，有 247 件占總工程件數的 47.96%，決標金額在「100 萬元以下」者有 95 件占 18.45% 為其次，決標金額在「1,000-5,000 萬元」者有 65 件占 12.62%，決標金額在「500-1,000 萬元」者有 64 件占 12.43%，決標金額在「5,000 萬-1 億元」者有 24 件占 4.66%，決標金額在「1 億元以上」者為最少，有 20 件占 3.88%。各工程處中，養工處發包的公共工程共計 155 件中，其決標金額以「100-500 萬元」者為最多，有 61 件，占該處發包工程件數的 39.35%，最少者為「100 萬元以下」者有 4 件；新工處發包的公共工程共計 37 件中，其決標金額在「1 億元以上」者為最多有 10 件，占該處發包工程件數的 27.03%，最少者為決標金額在「500-1,000 萬元」及「5,000 萬-1 億元」者各有 3 件；衛工處發包的公共工程共計 56 件中，其決標金額以「1,000-5,000 萬元」者為最多有 24 件，占該處發包工程件數的 42.86%，最少者為「100 萬元以下」者只有 1 件；公園處發包的公共工程共計 267 件中，其決標金額在「100-500 萬元」者為最多有 172 件，占該處發包工程件數的 64.42%，最少者為「1,000-5,000 萬元」者只有 4 件，該處發包公共工程並無「5,000 萬元以上」的工程決標案件。（詳如表 8 及圖 6）

圖6、公共工程決標件數--按決標金額分

民國94年

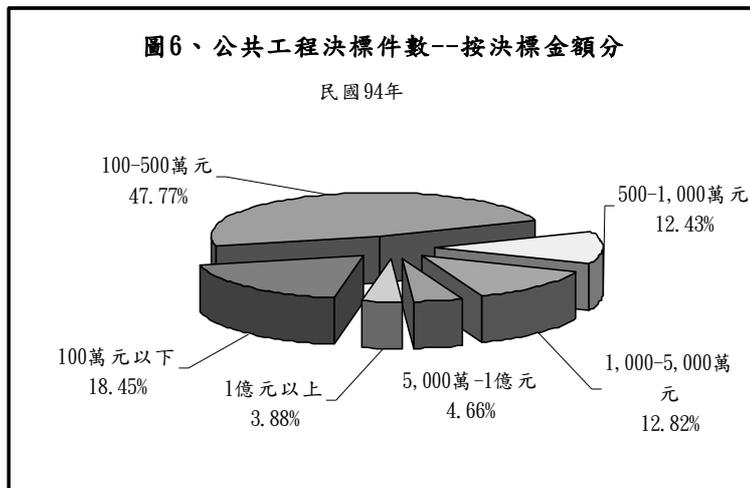

在 515 件工務局發包的公共工程中，未訂底價者（有 19 件）及併同其他工程發包者（有 10 件），在本分析統計範圍中，以其施工預算金額視同底價金額。其決標金額與工程底價差額以在「10-50 萬元」者為最多，計有 149 件占決標總件數的 28.93%，其次為決標金額與工程底價差額在「10 萬元以下」者，共計有 103 件，占決標總件數的 20.00%，差額在「100-500 萬元」者計有 93 件占 18.06%，差額在「50-100 萬元」者有 64 件占 12.43%，決標金額與工程底價無差額者（即決標價格與底價相同者，以「0 元」表示）者有 57 件占 11.07%，差額在「500-1,000 萬元」者有 19 件占 3.69%，差額在「1,000-5,000 萬元」者有 2 件占 0.39%，差額在「5,000 萬元以上」者為最少只有 1 件，另有 27 件公共工程以超底價決標，占 5.24%，

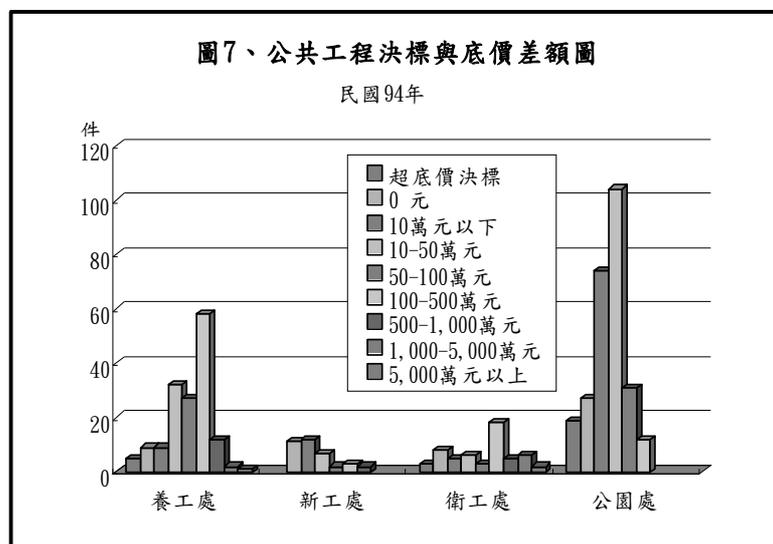


但其決標金額均未超過施工預算金額。各工程處中，除養工處有 3 件決標金額與工程底價差額在「1,000 萬元以上」的發包工程外，其餘的新工處、衛工處及公園處均無決標金額與工程底價差額在「1,000 萬元以上」的發包工程；另養工處發包工程的決標金額與工程底價差額以「100-500 萬元」者為最多，有 58 件占該處發包工程總件數的 37.42%，而差額在「5,000 萬元以上」者為最少有 1 件；新工處以決標金額與工程底價差額在「10 萬元以下」者為最多，有 12 件占該處發包工程件數的 32.43%，決標金額與工程底價差額在「50-100 萬元」者及「500-1,000 萬元」者為最少各僅有 2 件；衛工處以決標金額與工程底價差額在「100-500 萬元」者為最多，計有 20 件占該處發包工程件數的 35.71%，以超底價決標者最少，僅有 3 件。公園處以決標金額與工程底價差額在「10-50 萬元」者為最多，達 104 件占該處發包工程件數的 38.95%，決標金額與工程底價差額在「100-500 萬元」者最少，有 12 件，但該處有 19 件工程以超過底價決標，為各工

程處最多者。(詳如表 9 及圖 7)

## 六、變更設計：

本年度本府公共工程於工程發包後因各種因素而變更工程設計者計有 77 件，占全部發包工程總件數的 14.95%，其中以公園處變更設計 53 件為最多，占變更設計總件數的 68.83%，其次為養工處的 18 件占 23.38%，另新工處及衛工處各有 3 件辦理變更設計；如以變更設計的種類及金額分析，則以追加工程款在「10-50 萬元」者為最多，有 30 件占總變更設計件數的 38.96%，其次為變更設計追加金額為「10 萬元以下」者有 24 件占 31.17%，最少者為追加工程金額為「1,000-5,000 萬元」者及雖有變更設計但「無追加金額」(即「0 元」)者各僅有 1 件；本年度公共工程因變更設計而追減工程金額者有 14 件，占 18.18%，本年度無追加工程金額在「5,000 萬元以上」者。以各工程處追加(減)金額來看，養工處變更設計共有 18 件，其中以追加工程款在「10-50 萬元」者有 6 件，占該處變更工程總件數的 33.33% 為最多，其次為變更設計而追減工程金額者有 5 件占 27.78%，最少者為追加工程金額為「10 萬元以下」者及「50-100 萬元」者，各有 2 件。新工處變更設計共有 3 件，為追加工程款在「10-50 萬元」者、「1,000-5,000 萬元」者及「追減工程」者各有 1 件，各占 33.33%。衛工處變更設計亦有 3 件，為追加工程款在「10 萬元以下」者有 2 件及雖有變更設計但無追加減工程金額者有 1 件，該處無變更設計而「追減工程金額」者。公園處變更設計共有 53 件，該處公共工程因變更設計但「追減工程款」者有 8 件，在追加工程款中以「10-50 萬元」者有 23 件，占該處總變更設計工程件數的 43.40% 為最多，其次為變更設計追加金額為「10 萬元以下」者有 20 件占 37.74%，最少者為追加工程金額為「50-100 萬元」者及「100-500 萬元」者，各僅有 1 件。(詳如表 10 及圖 8)

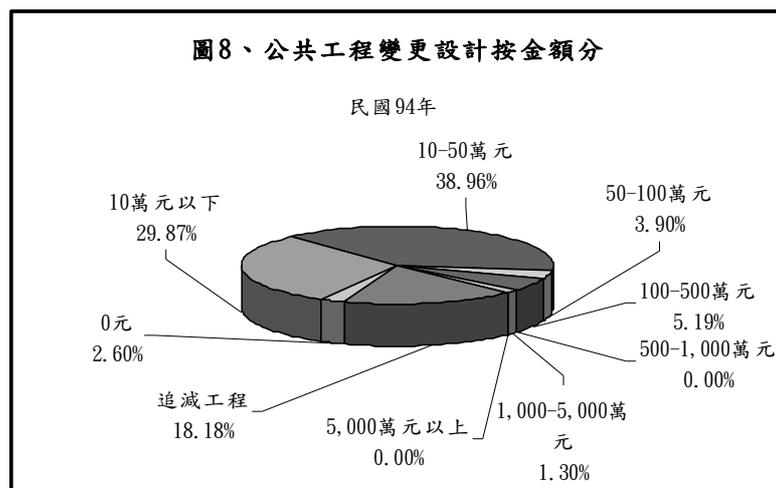


## 七、開工情形：

94 年度本府工務局發包的公共工程中，至 12 月底止已開工實際施作者共計 467 件，如以開工日期與決標日期計算各工程待工工期日數，則可發現待工工期以「15 日以內」者為最多，有 193 件，占開工總件數的 41.33%，其次為「15-30 日」的待工期有 86 件占 18.42%，最少者為「0 日」（即決標日即開工）僅有 4 件，另為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前者，以「其他」表示者計有 6 件，惟待工工期在「90 日以上」者亦有 36 件，占開工總件數的 7.71%，值得注意。各工程待工工期在「30 日以內」者共計有 283 件，占開工總件數的 60.61%。


以各工程處分析來看，其中以公園處之績效為最高，該處有 166 件工程的待工工期在「15 日以內」，占該處已開工總件數 243 件的 68.31%，其次為待工工期在「15-30 日」者有 40 件，占 16.46%，該處各工程待工工期在「30 日以內」者共計有 208 件，占該處開工總件數的 85.59%，另該處有 6 件工程待工工期為「其他」。其次為衛工處，該處 49 件開工工程中有 21 件於決標後「30-45 日」開工，占 42.86% 為最多，其次為「15-30 日」的待工工期有 17 件占 34.69%，；該處各工程待工工期在「30 日以內」者共計有 28 件，占該處開工總件數的 57.14%。養工處方面，則以待工工期在「15-30 日」者有 26 件為最多，占該處總開工件數的 18.06% 為最多，其次為待工工期在「90 日以上」者有 25 件，占 17.36%，最少者為待工工期在「0 日」有 1 件。新工處方面，待工工期在「90 日以上」者有 8 件，占該處總開工件數的 25.81% 為最多，其次為待工工期在「15 日以內」者及「30-45 日」者各有 6 件，分別占 19.35%，最少者為待工工期在「45-60 日」者有 2 件占 6.45%。（詳如表 11 及圖 9）

12 月底仍未開工的決標工程有 48 件，其中有 2 件為「已解約」的工程。

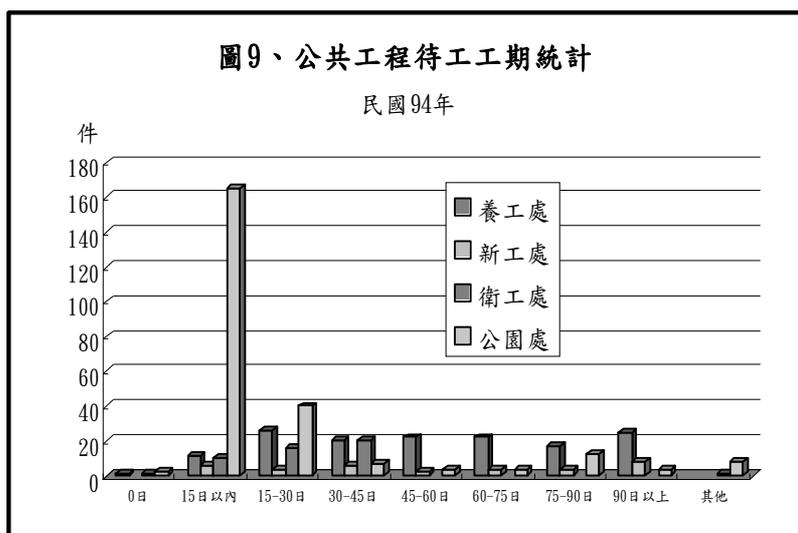

## 八、完工情形：

94年度本府工務局發包的公共工程，截至12月底止已完工者共計317件，如以完工日期與開工日期計算各工程工期日數，則可發現工期以「60-120日」者為最多，共計83件占總完工工程件數的26.18%，其次為「240-300日」者，計有61件占19.24%，二者合計144件，占完工總件數的45.43%，最少者為「300-360日」，有25件占7.89%。工務局所屬各工程處中，養工處工程完工工期日數以「60-120日」者為最多有25件，占該處完工工程件數85件的29.41%，其次為「240-300日」者計有20件占23.53%，最少者為「60日以內」完工者，有7件。新工處工程完工工期日數以「60日以內」完工者為最多有9件，占該處完工工程件數15件的60.00%，其次為「60-120日」者計有4件占26.67%，最少者為「120-180日」者有2件，該處無工期超過「180日以上」完工的公共工程。衛工處工程完工工期日數以「60-120日」者為最多有4件，占該處完工工程件數8件的50.00%，該處無工期超過「300日以上」完工的公共工程。公園處工程完工工期日數以「60-120日」者為最多有50件，占該處完工工程件數209件的23.92%，其次為「60日以內」者計有41件占19.62%，最少者為「180-240日」者有23件占11.00%，但該處完工工期日數在「300-360日」者亦有25件，為其他各處之冠。（詳如表12及圖10）

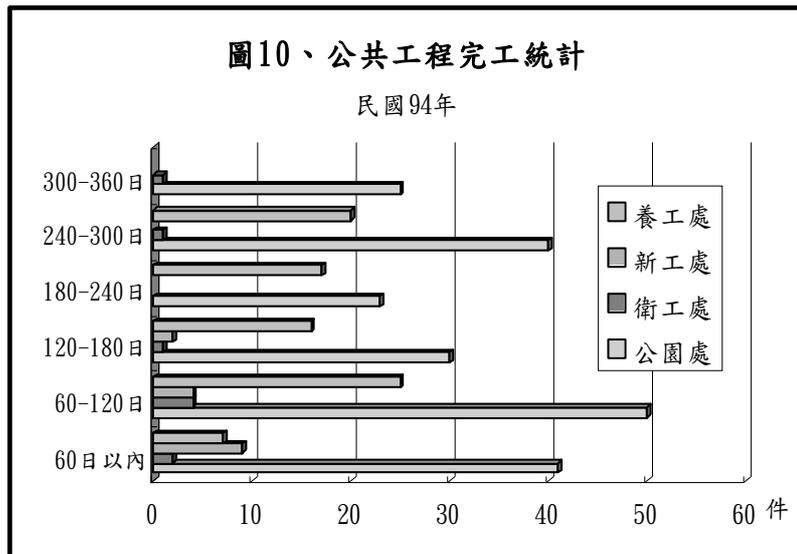

94年度本府515件發包的公共工程中，預定於94年完工者有321件，占總發包工程件數的62.33%，預定於95年完工者有115件占22.33%，預定於96年（含）以後完工者計有42件占8.16%，但另有37件公共工程雖已發包，但因尚未開工，以致無法預定完工期程。以各工程處分析，養工處預定於94年完工的公共工程有87件，占該處155件發包工程的56.13%為最多；新工處以預定95年度完工者有17件為最多，占該處發包工程37件的45.95%；衛工處則以預定96年度（含）以後完工者有30件為最多，占該處以發包工程56件的53.57%，公園處亦以預定於94年度完工者有211件為最多，占該處已發包工程267件的79.03%。（詳如表13）


至94年底已完工的317件公共工程中，其預定工期與實際工期相差為「0日」者（即在預定完工日當日完工者）計有140件為最多，占完工工程總件數的44.16%，提早完工者計有136件占總完工件數的42.90%，超過預定工期完工者計有41件占12.93%。以各工程處分析，養工處85件已完工的公共工程於預定完工日完工者有45件，占該處已完工件數的52.94%，提早完工者計有28件占32.94%，延遲完工者計有12件占14.12%，延遲日數均在60日以內。新工處已完工的工程有15件，其中於預定工期日完工者有9件，占該處已完工件數60.00%，提早完工及延遲完工者各有3件，延遲完工的3件工程，均為延後180日以上才完工。衛工處8件已完工的公共工程中，於預定工期完工者有1件，占12.50%，提早完工者有2件占25.00%，延遲完工者有5件占62.50%，其中有2件工程為延後180日以上才完工。公園處已完工的工程有209件，其於預定工期日

完工者有 85 件，占 40.67%，提早完工者有 103 件占 49.28%，延遲完工者有 21 件占 10.05%，其中於延後完工日數超過 180 日以上者有 2 件。


以預定完工工期與實際完工工期比較分析各工程處的績效，則以公園處約有 10% 的工程有延遲完工情形為最佳，其次為養工處有 14.12% 的工程延遲完工，衛工處則有 62.50% 的工程有延遲完工的現象為最差者。（詳如表 14）

## 九、工程驗收：

截至 94 年底本府工務局發包的公共工程，已申報完工者共計 317 件，其中已完成驗收者計有 213 件，已完工但尚未辦理驗收或正辦理驗收中者計有 104 件（含未開工及未完工者共計 302 件）。在已完成辦理驗收的公共工程中，其完工至驗收日日數分析來看，工程申報完工即完成辦理驗收者（即「0 日」）共計 2 件，占已完成驗收總件數的 0.94% 為最少，「15 日以內」完成辦理驗收者計有 53 件占 24.88% 為最多，「15-30 日」間完成辦理驗收者，共計 45 件占 21.13% 為次多，「30-45 日」完成辦理驗收者，計有 37 件占 17.37%，「45-60 日」者有 36 件占 16.90%，「60-75 日」完成辦理驗收者，有 17 件占 7.98%，「75-90 日」完成辦理驗收者，計有 15 件占 7.04%，「90 日以上」完成辦理驗收者，有 8 件占 3.76%。以各工程處分析，養工處所發包的工程申報完工後，以於「30-45 日」及「45-60 日」再完成驗收者為最多，各有 8 件，分別占該處完成驗收總件數 31 件的 25.81%，其次為「75-90 日」完成驗收者有 5 件占 16.13%，該處有 2 件工程於「90 日以上」才完成驗收者。新工處所發包的工程申報完工後，以於「45-60 日」再完成驗收者為最多，共有 3 件，占該處完成驗收總件數 7 件的 42.86%，其次為「60-75 日」再完成驗收者，計有 2 件占 28.57%，該處有 1 件工程於「90 日以上」才完成驗收者。衛工處所發包的工程申報完工後，並完成驗收程序者共計有 4 件，分別為「30-45 日」、「45-60 日」、「60-75 日」及「90 日以上」再完成驗收者均各有 1 件。公園處所發包的工程申報完工後，於「15 日以內」完成驗收者為最多共有 52 件，占該處完成驗收總件數 171 件的 30.41%，其次為「15-30 日」再完成驗收者，計有 42 件占 24.56%，最少者為「0 日」共有 2 件。另該亦有 4 件工程於「90 日以上」才辦理完成驗收程序。（詳表 15 及圖 11）

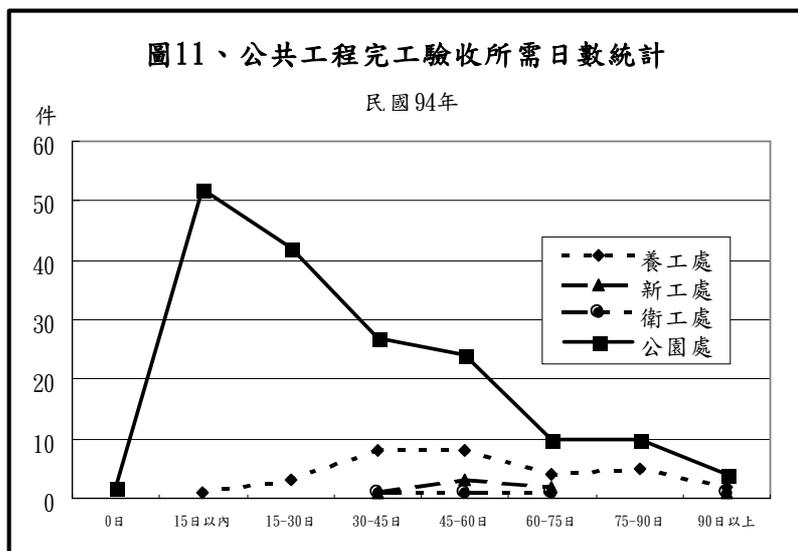

94年本府工務局所發包的各項公共工程已申報完工，但截至12月31日止仍完成未辦理驗收者尚有104件，其中以「60日以內」仍未完成辦理驗收者為最多，計有52件，占尚未完成辦理驗收總件數的50.00%，其次為「0日」未完成辦理驗收者（即12月31日申報完工）有49件占47.12%，其他以「60-120日」尚未完成驗收程序者有1件，「120-180日」尚未完成驗收程序者有2件。如以各工程處分析，養工處有54件公共工程已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的51.92%，其中以「0日」尚未完成驗收程序者為最多計有27件，占該處未驗收件數的50.00%，其次為「60日以內」尚未完成驗收程序者有25件占46.30%，其他各有1件工程在「60-120日」及「120-180日」尚未完成驗收程序。新工處尚有8件尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的7.69%，其中以「60日以內」尚未完成驗收程序有6件為最多，占該處未驗收工程數的75.00%。衛工處有4件公共工程，已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的3.85%，其均屬於「60日以內」尚未完成驗收程序者。公園處有38件公共工程，已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的36.54%，其中以「0日」尚未完成驗收程序者為最多計有21件，占該處未驗收件數的55.26%，其次為「60日以內」尚未完成驗收程序者有17件占44.74%（詳如表16及圖12）。

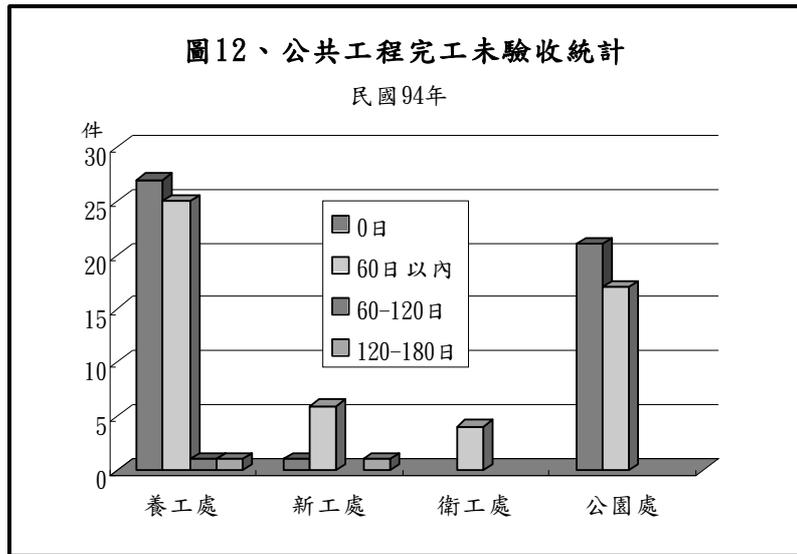

如以決標金額分析已完工但尚未完成驗收的工程，則決標金額在「100-500萬元」者的公共工程，有48件已完工但尚未辦理驗收，占全體未驗收工程件數的46.15%為最多，其次為決標金額在「500-1,000萬元」者的公共工程，有31件已完工但尚未辦理驗收，占全體未驗收工程件數的29.81%，除「一億元以上」的工程無已完工未驗收外，最少者為決標金額在「5,000-1億元」者的公共工程，已完工但尚未辦理驗收有2件。以各工程處分析，養工處54件已完工未驗收公共工程中，以在「500-1,000萬元」者為最多有28件，占該處已完工未驗收總件數的51.85%。新工處已完工未驗收公共工程中，以在「1,000-5,000萬元」者為最多有5件，占該處已完工未驗收總件數的62.50%。衛工處已完工未驗收公共工程中，以在「100-500萬元」者為最多有3件，占該處已完工未驗收總件數的75.00%。公園處已完工未驗收公共工程中，以在「100-500萬元以下」者為最多有28件，占該處已完工未驗收總件數的73.68%。（詳如表17）

公共工程已完工未驗收的104件中，如其決標金額與尚未驗收日期數交叉分析可發現，決標金額在「100-500萬元」者的已完工公共工程且在「60日以內」者尚未驗收的件數為最多，共計有26件，其次為決標金額在「100-500萬元」者，但在「0日」且尚未驗收者有22件次之。如以各工程處分析，養工處則以「500-1,000萬元」者的已完工工程，且在「0日」仍未驗收者為最多，共有16件；新工處則以「1,000-5,000萬元」者且「60日以內」仍未驗收者為最多，計有3件；衛工處則以「100-500萬元」者且在「60日以內」仍未驗收者為最多，計有3件；公園處則以「100-500萬元」者且在「60日以內」仍未驗收

者為最多，計有 15 件。（詳如表 18）


## 十、工程執行績效：

94 年度工務局所屬各工程處執行公共工程，其開工績效為平均每件工程待工日數為 32.5 日，各工程處中以公園處每件工程平均待工日數為 15.8 日為最優，其次為衛工處平均待工日數為 22.4 日，開工績效較差者為新工處的 64.5 日。在完工績效方面，平均每件工程完工日數為 155.6 日，各工程處中以新工處平均每件工程完工日數為 58.5 日為最少，其次為衛工處平均完工日數為 110.3 日，而養工處及公園處平均每件工程完工日約為 162 日。在驗收績效方面，平均每件工程驗收日數約為 36 日。各工程處中，養工處平均每件工程完工後需 52.19 日方能完成驗收程序。薪工處平均每件工程完工後需 59.29 日方能完成驗收程序。衛工處平均每件工程完工後需 62.75 日方能完成驗收程序，為各工程處完成驗收程序最耗時日的單位。公園處平均每件工程完工後僅需 31.60 日就能完成驗收程序，為各工程處中驗收績效最佳者。由表 19 可發現，養工處平均每件工程完工日數約為 162 日，但完成驗收程序確需要約 52 日，新工處平均每件工程完工日數約為 59 日，但完成驗收亦需要約 59 日，衛工處所發包的公共工程，平均每件工程完工日數約為 110 日，但完成驗收確需要約 63 日，而公園處平均每件工程完工日數雖約為 162 日，但完成驗收確只需要約 32 日即可完成。（詳如表 19）


## 十一、工程結算：

截至 94 年底各項公共工程中已完工，經驗收程序後並已結算工程款者共計 188 件（其中養工處 68 件、新工處 21 件、衛工處 37 件及公園處 62 件），其中以養工處的 68 件為最多，占已結算工程件數的 36.17%，其次為公園處的 62 件占 32.98%，最少者為新工處的 21 件已結清工程款項，占 11.17%。而工程預算結餘中以「10-50 萬元」者為最多，計有 67 件，占已結算工程總件數的 35.64% 為最多，其次為結餘「10 萬元以下」者，計有 64 件占 34.04%，最少者為預算結餘為「0 萬元」者有 2 件；另有 5 件公共工程經結算後產生預算不足現象，此 5 件公共工程分別為養工處 3 建、衛工處 1 件及公園處 1 件。本年度以結算的公共工程中，其預算結餘並無在「500 萬元以上」者。以各工程處言，養工處預算結餘以在「10 萬元以下」及「10-50 萬元」者各有 23 件為最多，分別各占該處結算件數的 33.82%，

新工處以結餘「10-50 萬元」者有 10 件，占該處結算件數的 47.62% 為最多，衛工處亦以結餘「10-50 萬元」有 13 件，占該處結算件數的 35.14% 為最多，而公園處則以結餘「10 萬元以下」者有 25 件，占該處結算件數的 40.32% 為最多。（詳如表 20 及圖 13）

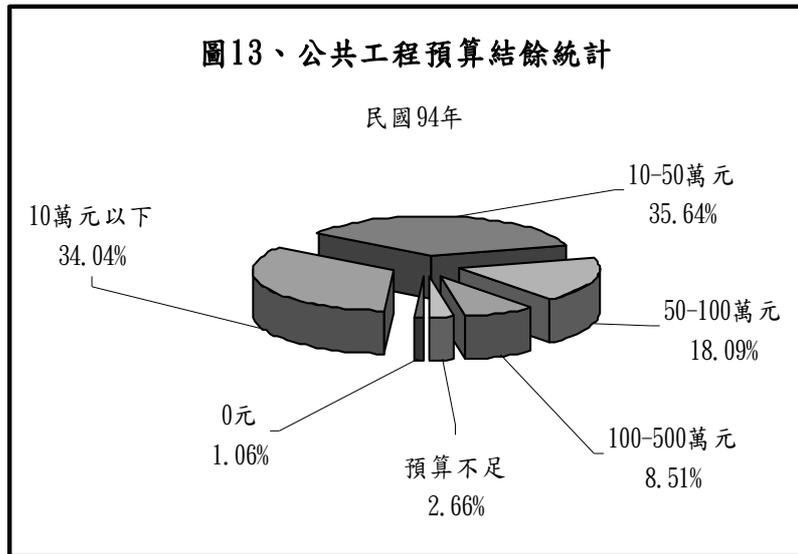

截至 94 年底臺北市政府工務局發包的公共工程中，已驗收並已結算工程款者共計 188 件，其中變更設計者有 49 件，占已結算件數之 26.06%，已辦結算工程者的施工預算數為新台幣 45,034 萬元，決標金額為 38,880 萬元，其決標金額占已辦結算工程者施工預算數的 86.33%，工程決算金額為 37,798 萬元，占已辦結算工程者施工預算金額的 83.93%，預算結餘金額為 7,236 萬元，占已辦結算工程者施工預算金額的 16.07%。以各工程處分析，養工處工程 7 件結算工程中，其決算金額為 1,758 萬元，占該處已辦結算工程者的工預算金額 1,926 萬元的 91.28%，預算結餘占已辦結算工程者施工預算數的 8.70%；新工處工程 6 件結算工程的決算金額為 669 萬元，占該處已辦結算工程者施工預算金額 849 萬元的 78.77%，預算結餘占已辦結算工程者施工預算數的 21.25%；衛工處 4 件結算工程的決算金額為 4,743 萬元，占該處已辦結算工程者施工預算金額 5,478 萬元的 86.58%，預算結餘占已辦結算工程者施工預算數的 13.43%；公園處工程 171 件結算工程的決算金額為 30,628 萬元，占該處已辦結算工程者施工預算金額 36,780 萬元的 83.27%，預算結餘占已辦結算工程者的施工預算數的 16.73%。（詳如表 21 及圖 14）

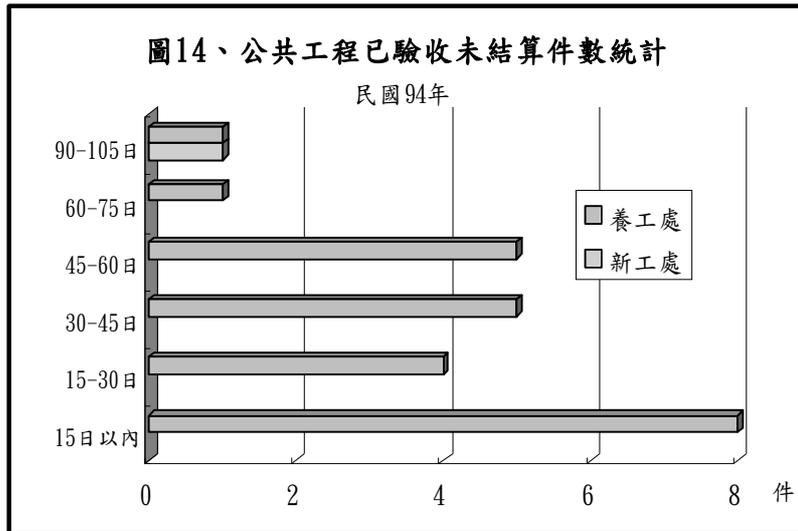

截至94年底止，臺北市公共工程已完工並完成驗收程序，但仍未辦理經費結清者共計有25件，其中以驗收後「15日以內」仍未結清工程款者有8件為最多，其次為「30-45日」及「45-60日」仍未結清工程款者，各有5件為次之，最少者為「60-75日」仍未結清工程款者僅有1件，但完成驗收後「90日以上」仍未結清工程款者仍有2件，分別為養工處及新工處各有1件。如以各工程處分析，除衛工處及公園處均無已驗收但仍未結算的工程外，以養工處的24件工程已完成驗收但仍未結清工程款者為最多，其中又以有8件工程已完成驗收但於「15日以內」仍未結清工程經費為最多。新工處只有1件工程，在「95-105日」已完成驗收但仍未結清工程款者。（詳見表22）

## 十二、得標廠商分析：

94年度臺北市政府工務局發包公共工程共計515件，總施工預算數為1,195,489萬元，核定工程底價為1,161,536萬元，總計有227家營造廠或其他工程相關廠商得標工程，其中有3家廠商各總共標得14項公共工程為最多，其次有1家廠商得標13項公共工程次之，再次亦有1家廠商標得10項公共工程，另有127家各標得1項公共工程。515件公共工程總決標工程金額為1,14,857萬元，平均每一件公共工程得標金額為2,165萬元，單項公共工程最大決標金額為107,942萬元。

## 十三、歷年比較：

94年公務局公共工程發包件數共計515件，較上年（93年）的603件減少88件，減少幅度為14.59%，施工預算數亦較上年的1,312,135萬元減少116,647萬元為1,195,489萬元，減少幅度為8.89%，最主要原因為本年度預算較上年度緊縮，以致公共工程金額亦隨之減少。上年公共工程施工預算最多的單項工程預算為86,767萬元，本年度超過上年度最高預算數的工程有2件，且最多預算金額的工程達107,942萬元，但其他各項工程施工預算則遠低於此數。上年度平均每件公共工程預算數為2,176萬元，本年度則增加至2,321萬元，較上年度增加145萬元，增加幅度達6.66%。上年度603件公共工程決標金額為1,080,653萬元，本年度則增加34,604萬元為1,114,857萬元，增加幅度為3.20%。上年度平均每件工程決標金額為1,791萬元，本年度則增加373萬元為2,165萬元，增加幅度為20.84%。上年度公共工程決標金額為施工預算數的82.33%，本年度則為預算數的93.26%，較上年度增加約10.9%。上年度工程發包後與施工預算數比較，則節約金額為231,882萬元，約佔預算數的17.67%，本年度節約金額較少為80,631萬元，約為預算金額的6.74%，較上年度減少約10.9%。

上年度工程發包後變更設計者有107件，本年度因工程件數較少以致變更設計者亦較少，減少30件為77件，但以對總工程件數的比率來看，上年度變更設計的比率為17.74%，本年度變更工程建數比率為14.95%，已較上年度為低。上年度變更設計後追加工程款為12,325萬元，約佔決標金額的1.14%，本年度變更設計後追加工程款大幅降低至3,886萬元，約佔決標金額的0.35%，無論變更設計追加工程金額或占決標金額比率，均較上年度為低，而且減少幅度頗大。

上年度公共工程完工後經驗收合格且完成工程費結清者計有197件，本年度較上年度減少9件為188件。上年度工程總決算金額為38,406萬元，本年度工程決算金額則較少，較上年度減少608萬元，僅有37,798萬元，與決標金額比較仍多出4,202萬元，增加幅度為12.51%，與上年度決標金額比較，則減少經費81萬元減少百分比為0.04%。但與施工預算比較，上年度節省經費12,764萬元，節省經費比率為24.94%，本年度預算結餘較上年度減少5,528萬元為7,236萬元，節省經費比率為16.07%，則較上年減少8.88%。（詳如表24）

#### 十四、非公共工程類：

94年度新工處提報各項公共工程發包及執行情形報表中，陳列

38 件工程為非公共工程類，將剔除於前述各項分析中，茲簡要分述如下：

38 件非公共工程類分別為技術服務類 24 件、法律訴訟案件類 8 件及架設行動變化基地台契約案件 6 件，總預算金額為 19,338 萬元，底價訂定為 18,754 萬元，決標金額為 18,651 萬元，至 94 年底止已完工 1 件，已驗收 1 件，尚無辦理結清工程款者。（詳如表 26）

另養工處有 3 件公共工程於 93 年發包，94 年度開工，預計至 95 年度完工，截至 94 年底尚無完工情形，此 3 件公共工程不列入本其分析範圍。

## 十五、附錄：

94 年度工務局主管及各工程處公共工程發包及執行情形按決標月別分別統計列示如后，詳如表 27 至表 31。

表 1、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表

94 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：件，%

區 分		總 計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道工程處		公園及路燈工程處	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
發包方式	合計	515	100.00	155	100.00	37	100.00	56	100.00	267	100.00
	公開招標	489	94.95	152	98.06	26	70.27	56	100.00	255	95.51
	限制性招標 議價	21	4.08	1	0.65	9	24.32			11	4.12
	限制性招標 比價	1	0.19	1	0.65						
	限制性招標 公開評選	3	0.58	1	0.65	1	2.70			1	0.37
	其他	1	0.19			1	2.70				
變更設計	無	438	85.05	137	88.39	34	91.89	53	94.64	214	80.15
	有	77	14.95	18	11.61	3	8.11	3	5.36	53	19.85
開工情形	已開工	467	90.68	144	92.90	31	83.78	49	87.50	243	91.01
	未開工	48	9.32	11	7.10	6	16.22	7	12.50	24	8.99
完工情形	已完工	317	61.55	85	54.84	15	40.54	8	14.29	209	78.28
	未完工	198	38.45	70	45.16	22	59.46	48	85.71	58	21.72
驗收情形	已驗收	213	41.36	31	20.00	7	18.92	4	7.14	171	64.04
	未驗收	302	58.64	124	80.00	30	81.08	52	92.86	96	35.96
結算情形	已結算	188	36.50	7	4.52	6	16.22	4	7.14	171	64.04
	未結算	327	63.50	148	95.48	31	83.78	52	92.86	96	35.96

備註：1. 未驗收及未決算件數含未完工工程件數。

2. 已開工未完工的公共工程計 150 件。

3. 已完工未驗收的公共工程計 104 件。

4. 已驗收未決算的公共工程計 25 件。

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表----按決標月別分

94 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：件、

區 分		合計	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
發包 方式	合計	數量	515	44	45	97	50	50	38	28	33	36	35	31	28
		%	100.00	8.54	8.74	18.83	9.71	9.71	7.38	5.44	6.41	6.99	6.80	6.02	5.44
	公開 招標	數量	489	42	43	95	48	46	37	28	29	33	34	27	27
		%	100.00	8.59	8.79	19.43	9.82	9.41	7.57	5.73	5.93	6.75	6.95	5.52	5.52
	限制性 招標	數量	21	1	2	2	1	3			4	3		4	1
		%	100.00	4.76	9.52	9.52	4.76	14.29			19.05	14.29		19.05	4.76
	限制性 招標	數量	1	1											
		%	100.00	100.0											
	限制性 招標公	數量	3				1	1	1						
		%	100.00				33.33	33.33	33.33						
其他	數量	1										1			
	%	100.00										100.0			
開工 情形	已開工	數量	467	44	45	95	50	45	36	28	33	34	29	24	4
		%	100.00	9.42	9.64	20.34	10.71	9.64	7.71	6.00	7.07	7.28	6.21	5.14	0.86
	未開工	數量	48			2		5	2			2	6	7	24
		%	100.00			4.17		10.42	4.17			4.17	12.50	14.58	50.00
完 工 情形	已完工	數量	317	38	41	82	44	29	23	13	14	17	10	4	2
		%	100.00	11.99	12.93	25.87	13.88	9.15	7.26	4.10	4.42	5.36	3.15	1.26	0.63
	未完工	數量	198	6	4	15	6	21	15	15	19	19	25	27	26
		%	100.00	3.03	2.02	7.58	3.03	10.61	7.58	7.58	9.60	9.60	12.63	13.64	13.13
驗 收 情形	已驗收	數量	213	27	31	50	32	24	13	7	13	10	5	1	
		%	100.00	12.68	14.55	23.47	15.02	11.27	6.10	3.29	6.10	4.69	2.35	0.47	
	未驗收	數量	302	17	14	47	18	26	25	21	20	26	30	30	28
		%	100.00	5.63	4.64	15.56	5.96	8.61	8.28	6.95	6.62	8.61	9.93	9.93	9.27
結 算 情形	已結算	數量	188	25	28	41	29	19	11	6	13	10	5	1	
		%	100.00	13.30	14.89	21.81	15.43	10.11	5.85	3.19	6.91	5.32	2.66	0.53	
	未結算	數量	327	19	17	56	21	31	27	22	20	26	30	30	28
		%	100.00	5.81	5.20	17.13	6.42	9.48	8.26	6.73	6.12	7.95	9.17	9.17	8.56

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表3、臺北市政府工務局公共工程已發包未開工統計表  
(按決標月分)

民國94年

單位：件，

%

區分	總計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道		公園及路燈	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	48	100.00	11	100.00	6	100.00	7	100.00	24	100.00
1月										
2月										
3月	2	4.17	2	18.18						
4月										
5月	5	10.42			1	16.67			4	16.67
6月	2	4.17			1	16.67			1	4.17
7月										
8月										
9月	2	4.17	1	9.09					1	4.17
10月	6	12.50	2	18.18	1	16.67	1	14.29	2	8.33
11月	7	14.58	6	54.55	1	16.67				
12月	24	50.00			2	33.33	6	85.71	16	66.67

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表4、臺北市政府工務局公共工程已開工未完工統計表  
(按開工月分)

民國94年

單位：件，

%

區分	總計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道		公園及路燈	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	150	100.00	59	100.00	16	100.00	41	100.00	34	100.00
1月										
2月	7	4.67					1	2.44	6	17.65
3月	6	4.00	2	3.39					4	11.76
4月	4	2.67	1	1.69			1	2.44	2	5.88
5月	2	1.33	1	1.69			1	2.44		
6月	12	8.00	6	10.17	1	6.25	3	7.32	2	5.88
7月	9	6.00	2	3.39			5	12.20	2	5.88
8月	19	12.67	11	18.64	3	18.75	4	9.76	1	2.94
9月	20	13.33	7	11.86	4	25.00	6	14.63	3	8.82

10月	21	14.00	9	15.25	1	6.25	5	12.20	6	17.65
11月	26	17.33	12	20.34	4	25.00	6	14.63	4	11.76
12月	24	16.00	8	13.56	3	18.75	9	21.95	4	11.76

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

**表5、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收統計表**  
(按完工月分)

民國94年

單位：件，%

區分	總計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道工程處		公園及路燈工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	104	100.00	54	100.00	8	100.00	4	100.00	38	100.00
1月										
2月										
3月										
4月										
5月										
6月										
7月										
8月	2	1.92	1	1.85	1	12.50				
9月	1	0.96	1	1.85						
10月										
11月	9	8.65	4	7.41	3	37.50	1	25.00	1	2.63
12月	92	88.46	48	88.89	4	50.00	3	75.00	37	97.37

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

**表6、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結清經費統計表**  
(按驗收月分)

民國94年

單位：件，%

區分	總計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道工程處		公園及路燈工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	25	100.00	24	100.00	1	100.00				
1月										
2月										
3月										
4月										
5月										
6月										

7月	2	8.00	1	4.17	1	100.00				
8月										
9月										
10月	1	4.00	1	4.17						
11月	10	40.00	10	41.67						
12月	12	48.00	12	50.00						

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表7、臺北市公共工程發包底價分析表

民國94年

		總計	未訂 底價	100萬 元以下	100- 500萬元	500- 1,000萬元	1,000- 5,000萬元	5,000萬 -1億元	1億元 以上
總計	小計	515	19	78	240	68	75	24	11
	公開招標	489	17	63	237	65	73	23	11
	限制性招標議價	21		14	2	2	2	1	
	限制性招標比價	1			1				
	限制性招標公開 評選	3	2			1			
	其他	1		1					
養 工 處	小計	155	1	3	45	52	41	8	5
	公開招標	152	1	2	44	51	41	8	5
	限制性招標議價	1		1					
	限制性招標比價	1			1				
	限制性招標公開 評選	1				1			
	其他								
新 工 處	小計	37	15	7	5	2	4	2	2
	公開招標	26	14	2	5		2	1	2
	限制性招標議價	9		4		2	2	1	
	限制性招標比價								
	限制性招標公開 評選	1	1						
	其他	1		1					
衛 工 處	小計	56	2		8	1	27	14	4
	公開招標	56	2		8	1	27	14	4
	限制性招標議價								
	限制性招標比價								
	限制性招標公開 評選								
	其他								
小計		267	1	68	182	13	3		
公開招標		255		59	180	13	3		

公園處	限制性招標議價	11		9	2				
	限制性招標比價								
	限制性招標公開	1	1						
	其他								

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 8、臺北市政府工務局公共工程決標件數統計表——按金額分

民國 94 年

單位：件，%

區 分	總 計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道工程處		公園及路燈工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
合 計	515	100.00	155	100.00	37	100.00	56	100.00	267	100.00
1 100 萬元以下	95	18.45	4	2.58	7	18.92	1	1.79	83	31.09
2 100-500 萬元	247	47.96	61	39.35	7	18.92	7	12.50	172	64.42
3 500-1,000 萬元	64	12.43	49	31.61	3	8.11	4	7.14	8	3.00
4 1,000-5,000 萬元	65	12.62	30	19.35	7	18.92	24	42.86	4	1.50
5 5,000 萬-1 億元	24	4.66	6	3.87	3	8.11	15	26.79		
6 1 億元以上	20	3.88	5	3.23	10	27.03	5	8.93		

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 9、臺北市政府工務局公共工程決標與底價差額統計表

民國 94 年

單位：件，%

區 分	總 計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道工程處		公園及路燈工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
合 計	515	100.00	155	100.00	37	100.00	56	100.00	267	100.00
9 超底價決標	27	5.24	5	3.23			3	5.36	19	7.12
0 0 元	57	11.07	9	5.81	11	29.73	10	17.86	27	10.11
1 10 萬元以下	103	20.00	9	5.81	12	32.43	8	14.29	74	27.72
2 10-50 萬元	149	28.93	32	20.65	7	18.92	6	10.71	104	38.95

3 50-100 萬元	64	12.43	27	17.42	2	5.41	4	7.14	31	11.61
4 100-500 萬元	93	18.06	58	37.42	3	8.11	20	35.71	12	4.49
5 500-1,000 萬元	19	3.69	12	7.74	2	5.41	5	8.93		
6 1,000-5,000 萬元	2	0.39	2	1.29						
7 5,000 萬元以上	1	0.19	1	0.65						

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 10、臺北市政府工務局公共工程變更設計件數統計表——按金額分

民國 94 年

單位：件，%

區 分		總 計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道工		公園及路燈工		
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	
合 計		77	100.00	18	100.00	3	100.00	3	100.00	53	100.00	
追 加 工 程	小計	63	81.82	13	72.22	2	66.67	3	100.00	45	84.91	
	0 元	0	1	1.30				1	33.33			
	10 萬元以下	1	24	31.17	2	11.11			2	66.67	20	37.74
	10-50 萬元	2	30	38.96	6	33.33	1	33.33			23	43.40
	50-100 萬元	3	3	3.90	2	11.11					1	1.89
	100-500 萬元	4	4	5.19	3	16.67					1	1.89
	500-1,000 萬元	5										
	1,000-5,000 萬元	6	1	1.30			1	33.33				
	5,000 萬元以上	7										
追減工程		9	14	18.18	5	27.78	1	33.33			8	15.09

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 11、臺北市政府工務局公共工程待工工期統計表

民國 94 年

單位：件，%

區 分		總 計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道工		公園及路燈工	
		件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
合 計		467	100.00	144	100.00	31	100.00	49	100.00	243	100.00
0 0 日		4	0.86	1	0.69			1	2.04	2	0.82
1 15 日以內		193	41.33	11	7.64	6	19.35	10	20.41	166	68.31
2 15-30 日		86	18.42	26	18.06	3	9.68	17	34.69	40	16.46
3 30-45 日		54	11.56	20	13.89	6	19.35	21	42.86	7	2.88

4	45-60 日	28	6.00	22	15.28	2	6.45			4	1.65
5	60-75 日	28	6.00	22	15.28	3	9.68			3	1.23
6	75-90 日	32	6.85	17	11.81	3	9.68			12	4.94
7	90 日以上	36	7.71	25	17.36	8	25.81			3	1.23
8	其他	6	1.28							6	2.47

附註：1. 待工工期為工程決標與開工日期之差距日數

2. 最大差距日數為 207 日，工期待工日數超過 200 日以上者計有 1 件，超過 100 日以上者計有 24 件。

3. 已決標未開工工程共計 48 件。

4. 其他-為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 12、臺北市政府工務局公共工程完工工期統計表

民國 94 年

單位：件，%

區 分	總 計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道工程處		公園及路燈工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總 計	317	100.00	85	100.00	15	100.00	8	100.00	209	100.00
1 60 日以內	59	18.61	7	8.24	9	60.00	2	25.00	41	19.62
2 60-120 日	83	26.18	25	29.41	4	26.67	4	50.00	50	23.92
3 120-180 日	49	15.46	16	18.82	2	13.33	1	12.50	30	14.35
4 180-240 日	40	12.62	17	20.00					23	11.00
5 240-300 日	61	19.24	20	23.53			1	12.50	40	19.14
6 300-360 日	25	7.89							25	11.96
8 其他										

附註：其他--為因應緊急需要等因素先行施工，再補辦發包作業以致完工日期在開工日期之前。

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 13、臺北市政府工務局公共工程預定完工年份統計表

民國 94 年

單位：件，%

區 分	總 計		未填年度		94 年度完工		95 年度完工		96 年度(含)以後完工	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比

總計	515	100.00	37	7.18	321	62.33	115	22.33	42	8.16
養護工程處	155	100.00	11	7.10	87	56.13	53	34.19	4	2.58
新建工程處	37	100.00	1	2.70	13	35.14	17	45.95	6	16.22
衛生下水道工程處	56	100.00	1	1.79	10	17.86	15	26.79	30	53.57
公園及路燈工程處	267	100.00	24	8.99	211	79.03	30	11.24	2	0.75

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 14、臺北市政府工務局公共工程  
預定完工與實際完工工期差額日數統計表

民國 94 年

單位：件，%

區分	總計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道		公園及路燈	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
總計	317	100.00	85	100.00	15	100.00	8	100.00	209	100.00
提早完工小計	136	42.90	28	32.94	3	20.00	2	25.00	103	49.28
1 提早 180 日以上										
2 提早 150-180 日	1	0.32							1	0.48
3 提早 120-150 日	5	1.58							5	2.39
4 提早 90-120 日	6	1.89							6	2.87
5 提早 60-90 日	14	4.42	3	3.53					11	5.26
6 提早 30-60 日	27	8.52	4	4.71					23	11.00
7 提早 30 日以內	83	26.18	21	24.71	3	20.00	2	25.00	57	27.27
8 0 日	140	44.16	45	52.94	9	60.00	1	12.50	85	40.67
延遲完工小計	41	12.93	12	14.12	3	20.00	5	62.50	21	10.05
9 30 日以內	23	7.26	10	11.76			1	12.50	12	5.74
10 30-60 日	8	2.52	2	2.35			1	12.50	5	2.39
11 60-90 日	2	0.63					1	12.50	1	0.48
12 90-120 日	1	0.32							1	0.48
13 120-150 日										
14 15-180 日										
15 180 日以上	7	2.21			3	20.00	2	25.00	2	0.96

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 15、臺北市政府工務局公共工程驗收日與完工日差距統計表

民國 94 年

單位：件，%

區分	總計	養護工程處	新建工程處	衛生下水道工程處	公園及路燈工程處

	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
合 計	213	100.00	31	100.00	7	100.00	4	100.00	171	100.00
0 0 日	2	0.94							2	1.17
1 15 日以內	53	24.88	1	3.23					52	30.41
2 15-30 日	45	21.13	3	9.68					42	24.56
3 30-45 日	37	17.37	8	25.81	1	14.29	1	25.00	27	15.79
4 45-60 日	36	16.90	8	25.81	3	42.86	1	25.00	24	14.04
5 60-75 日	17	7.98	4	12.90	2	28.57	1	25.00	10	5.85
6 75-90 日	15	7.04	5	16.13					10	5.85
7 90 日以上	8	3.76	2	6.45	1	14.29	1	25.00	4	2.34

附註：1.最大差距日數為 116 日，差距日數超過 100 日以上者計有 3 件。

2.已完工未驗收的公共工程計有 104 件。

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 16、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表（一）

單位：件，

94 年 12 月

%

區 分	總 計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道工程處		公園及路燈工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
合 計	104	100.00	54	100.00	8	100.00	4	100.00	38	100.00
0 0 日	49	47.12	27	50.00	1	12.50			21	55.26
1 60 日以內	52	50.00	25	46.30	6	75.00	4	100.00	17	44.74
2 60-120 日	1	0.96	1	1.85						
3 120-180 日	2	1.92	1	1.85	1	12.50				
4 180-240 日										
5 240-300 日										
6 300-360 日										

附註：最大差距日數為 150 日（新工處）

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 17、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表

（按決標金額及工程單位區分）

民國 94 年 12 月

單位：件，%

區 分	總 計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道工程處		公園及路燈工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
合 計	104	100.00	54	100.00	8	100.00	4	100.00	38	100.00
1 100 萬元以下	8	7.69					1	25.00	7	18.42
2 100-500 萬元	48	46.15	15	27.78	2	25.00	3	75.00	28	73.68
3 500-1,000 萬元	31	29.81	28	51.85					3	7.89
4 1,000-5,000 萬元	15	14.42	10	18.52	5	62.50				
5 5,000 萬-1 億元	2	1.92	1	1.85	1	12.50				
6 1 億元以上										

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 18、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收件數統計表

(按決標金額分)

民國 94 年

單位：件

區 分		合計	0 日 0	60 日 以 內 1	60-120 日 2	120-180 日 3	180-240 日 4
總 計	小 計	104	49	52	1	2	
	100 萬元以下	1	8	7	1		
	100-500 萬元	2	48	22	26		
	500-1,000 萬元	3	31	17	14		
	1,000-5,000 萬元	4	15	3	10	1	1
	5,000 萬-1 億元	5	2		1		1
	1 億元以上	6					
養 護 工 程 處	小 計	54	27	25	1	1	
	100 萬元以下	1					
	100-500 萬元	2	15	9	6		
	500-1,000 萬元	3	28	16	12		
	1,000-5,000 萬元	4	10	2	7	1	
	5,000 萬-1 億元	5	1				1
	1 億元以上	6					
新 建 工 程	小 計	8	1	6		1	
	100 萬元以下	1					
	100-500 萬元	2	2		2		
	500-1,000 萬元	3					
	1,000-5,000 萬元	4	5	1	3		1

程	5,000 萬-1 億元	5	1		1		
	1 億元以上	6					
衛	小 計		4		4		
生	100 萬元以下	1	1		1		
	100-500 萬元	2	3		3		
下	500-1,000 萬元	3					
	1,000-5,000 萬元	4					
水	5,000 萬-1 億元	5					
	1 億元以上	6					
道	小 計		38	21	17		
工	100 萬元以下	1	7	7			
	100-500 萬元	2	28	13	15		
程	500-1,000 萬元	3	3	1	2		
	1,000-5,000 萬元	4					
公	5,000 萬-1 億元	5					
	1 億元以上	6					
園	小 計						
路	100 萬元以下	1	7	7			
	100-500 萬元	2	28	13	15		
燈	500-1,000 萬元	3	3	1	2		
	1,000-5,000 萬元	4					
工	5,000 萬-1 億元	5					
	1 億元以上	6					
程	小 計						
處	100 萬元以下	1	7	7			
	100-500 萬元	2	28	13	15		
	500-1,000 萬元	3	3	1	2		
	1,000-5,000 萬元	4					
	5,000 萬-1 億元	5					
	1 億元以上	6					

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 19、臺北市政府工務局公共工程執行績效表

94 年 12 月 31 日

單位：件，日

單位	工 程 發 包 件 數	開工績效				完工績效				驗收績效			
		已 開 工 件 數	占總 發包 件數 %	累計開 工日數	平均 待工 日數	已 完 工 件 數	占總 發包 件數 %	累計完 工日數	平均完 工日數	已驗收 件數	占總 發包 件數 %	累計 驗收 日數	平均驗 收日數
總 計	515	467	90.68	15,188	32.52	317	61.55	49,332	155.62	213	41.36	7,687	36.09
養 護 工 程 處	155	144	92.90	8,260	57.36	85	54.84	13,736	161.60	31	20.00	1,618	52.19
新 建 工 程 處	37	31	83.78	1,998	64.45	15	40.54	878	58.53	7	18.92	415	59.29
衛 生 下 水 道 工 程 處	56	49	87.50	1,095	22.35	8	14.29	882	110.25	4	7.14	251	62.75
公 園 及 路 燈 工 程 處	267	243	91.01	3,835	15.78	209	78.28	33,836	161.89	171	64.04	5,403	31.60

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 20、臺北市政府工務局公共工程預算結餘統計表——按金額分

民國 94 年

單位：件

區 分	總 計		養護工程處		新建工程處		衛生下水道工程處		公園及路燈工程處	
	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比	件數	百分比
合計	188	100.00	68	100.00	21	100.00	37	100.00	62	100.00
0 0 元	2	1.06							2	3.23
1 10 萬元以下	64	34.04	23	33.82	7	33.33	9	24.32	25	40.32
2 10-50 萬元	67	35.64	23	33.82	10	47.62	13	35.14	21	33.87
3 50-100 萬元	34	18.09	14	20.59	2	9.52	11	29.73	7	11.29
4 100-500 萬元	16	8.51	5	7.35	2	9.52	3	8.11	6	9.68
5 500-1,000 萬元										
6 1,000-5,000 萬元										
7 5,000 萬元以上										
9 預算不足	5	2.66	3	4.41			1	2.70	1	1.61

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 21、臺北市政府工務局公共工程已驗收結算工程分析表

民國 94 年

單位：件，%

區 分	已驗收 已結算 件數 (件)	變更設 計工程 件數 (件)	變更設 計占已 結算件 數百分 比 (%)	施工預算 數(新台 幣萬元)	決標金 額(新台 幣萬元)	決標金 額占預 算百分 比 (%)	工程決 算金額 (新台 幣萬元)	工程決 算金額 占預算 百分比 (%)	預算結 餘金額 (新台 幣萬元)	預算結 餘占預 算金額 百分比 (%)
總 計	188	49	26.06	45,034	38,880	86.33	37,798	83.93	7,236	16.07
養護工程處	7	3	42.86	1,926	1,632	84.73	1,758	91.28	168	8.70
新建工程處	6	1	16.67	849	800	94.15	669	78.77	181	21.25
衛生下水道 工 程 處	4	1	25.00	5,478	5,453	99.53	4,743	86.58	735	13.43
公園及路燈 工 程 處	171	44	25.73	36,780	30,996	84.27	30,628	83.27	6,152	16.73

附註：已驗收未結算工程計 25 件。

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 22、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結算統計表

民國 94 年

單位：件

區 分	總計	15 日	15-30	30-45	45-60	60-75	75-90	90-	105-	120 日
		以內	日	日	日	日	日	105 日	120 日	以上
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
總 計	25	8	4	5	5	1		2		
養護工程處	24	8	4	5	5	1		1		
新建工程處	1							1		
衛生下水道 工 程 處										
公園及路燈 工 程 處										

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 24、最近兩年臺北市政府工務局各項公共工程發包及執行情形比較表

單位：件、萬元

項 次	年 度	93 年			94 年			94 年與 93 年比較增減		
	區 分	小計	已驗收 已決算	未驗收 未決算	小計	已驗收 已決算	未驗收 未決算	小計	已驗 收已 決算	未驗 收未 決算
1	公 共 工 程 發 包 數 量	603	197	406	515	188	327	-88	-9	-79
2	施 工 預 算 金 額	1,312,135	51,170	1,260,965	1,195,489	45,034	1,150,455	-116,647	-6,136	110,510
3	平 均 每 件 工 程 預 算 金 額	2,176	260	3,106	2,321	240	3,518	145	-20	412
4	底 價 金 額	1,193,583	41,734	1,151,849	1,161,536	38,880	1,122,656	-32,048	-2,854	29,194
5	決 標 金 額	1,080,253	34,124	1,046,129	1,114,857	33,597	1,081,261	34,604	-527	35,131
6	平 均 每 件 工	1,791	173	2,577	2,165	179	3,307	373	5	730

	程決標金額										
7	決標金額與 預算差額 7=2-5	231,882	17,046	214,836	80,631	11,437	69,194	-151,251	-5,609	145,642	-
8	決標金額與底 價比較(%) 8=5/4	90.51	81.77	90.82	95.98	86.41	96.31	5.48	4.65	5.49	
9	決標金額與預 算金額比較 (%) 9=5/2	82.33	66.69	82.96	93.26	74.60	93.99	10.93	7.92	11.02	
10	節約金額比較 10=7/2	17.67	33.31	17.04	6.74	25.40	6.01	-10.93	-7.92	-11.02	
11	件數	107	40	67	77	49	28	-30	9	-39	
12	(%) 12 =11/1	17.74	20.30	16.50	14.95	26.06	8.56	-2.79	5.76	-7.94	
13	變更 設計 增減 金額	12,325	1,016	11,308	3,886	389	3,496	-8,439	-627	-7,812	
14	占決標金 額 (%) 14 =13/5	1.14	2.98	1.08	0.35	1.16	0.32	-0.79	-1.82	-0.76	
15	工程結算金額	53,227	37,362	15,865	46,783	36,063	10,720		-1,299		
16	金額		38,406			37,798				-608	
17	與決標金 額比較 17=16-5		4,282			4,202				-81	
18	與決標金 額比較 (%) 18 =17/5		12.55			12.51				-0.04	
19	金額 19=2-16		12,764			7,236				-5,528	
20	預算 結餘 占預算金 額 (%) 20 =19/2		24.94			16.07				-8.88	

附註：1. 未訂底價以施工預算數視之，94年度共計19件，總金額為新台幣543,984萬元。

2. 已驗收未決算視同未驗收，93 年度共計 34 件、94 年度共計 25 件。

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 26、94 年度工務局所屬各工程處

非公共工程類發包及執行情形

	件數	預算數	未定底價件數	底價金額	決標金額	決標金額與底價差額
總計	38	19,333.28	15	18,754.10	18,650.99	103.11
技術服務類	24	19,218.38	11	18,639.20	18,536.09	103.11
法律訴訟類	8	114.90	4	114.90	114.90	0.00
架設行動電話基地台契約案	6	...	...	...	...	...
	已完工		已驗收		已結算	
	件數	占總件數%	件數	占總件數%	件數	占總件數%
總計	1	3.13	1	3.13	0	—
技術服務類	1	3.13	1	3.13	0	—
法律訴訟類	0	—	0	—	0	—
架設行動電話基地台契約案	...	...	...	...	...	...

附註：架設行動電話基地台契約案係電信業者向新工處承租，以架設行動電話基地臺。由電信業者付費給新工處，故無施工預算、底價金額、決標金額，亦無開工、預定完工、完工、驗收日期填列。

資料來源：工務局新建工程處

表 27、臺北市政府工務局暨所屬工程處公共工程發包及執行情形

(按決標月別分)

94 年度

單位：件、%

	發 包 方 式						變更設計	
	合計	公開招標	限制性招標			其他	有	無
			議價	比價	公開評選			
百 分 比	100.00	94.95	4.08	0.19	0.58	0.19	14.95	85.05
總 計	515	489	21	1	3	1	77	438
1 至 6 月小計	324	311	9	1	3	0	62	262
1 月	44	42	1	1	0	0	12	32
2 月	45	43	2	0	0	0	10	35
3 月	97	95	2	0	0	0	17	80
4 月	50	48	1	0	1	0	9	41
5 月	50	46	3	0	1	0	9	41
6 月	38	37	0	0	1	0	5	33
7 至 12 月小	191	178	12	0	0	1	15	176
7 月	28	28	0	0	0	0	5	23
8 月	33	29	4	0	0	0	2	31
9 月	36	33	3	0	0	0	5	31
10 月	35	34	0	0	0	1	3	32
11 月	31	27	4	0	0	0	0	31
12 月	28	27	1	0	0	0	0	28

	開工情形		完工情形		驗收情形		結算情形	
	已開工	未開工	已完工	未完工	已驗收	未驗收	已結算	未結算
百 分 比	90.68	9.32	61.55	38.45	41.36	58.64	36.50	63.50
總 計	467	48	317	198	213	302	188	327
1 至 6 月小計	315	9	257	67	177	147	153	171
1 月	44	0	38	6	27	17	25	19
2 月	45	0	41	4	31	14	28	17
3 月	95	2	82	15	50	47	41	56
4 月	50	0	44	6	32	18	29	21
5 月	45	5	29	21	24	26	19	31
6 月	36	2	23	15	13	25	11	27
7 至 12 月小	152	39	60	131	36	155	35	156
7 月	28	0	13	15	7	21	6	22
8 月	33	0	14	19	13	20	13	20
9 月	34	2	17	19	10	26	10	26
10 月	29	6	10	25	5	30	5	30

11月	24	7	4	27	1	30	1	30
12月	4	24	2	26	0	28	0	28

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 28、臺北市政府工務局養護工程處公共工程發包及執行情形

(按決標月別分)

94年度

	發包方式						變更設計	
	合計	公開招標	限制性招標			其他	有	無
			議價	比價	公開評選			
百分比	100.00	98.06	0.65	0.65	0.65	0.00	11.61	88.39
總計	155	152	1	1	1	0	18	137
1至6月小計	99	97	0	1	1	0	18	81
1月	2	1		1			2	
2月	6	6					2	4
3月	50	50					9	41
4月	12	11			1		2	10
5月	17	17					2	15
6月	12	12					1	11
7-12月小計	56	55	1	0	0	0	0	56
7月	15	15						15
8月	10	10						10
9月	14	13	1					14
10月	8	8						8
11月	9	9						9
12月	0							
	開工情形		完工情形		驗收情形		結算情形	
	已開工	未開工	已完工	未完工	已驗收	未驗收	已結算	未結算
百分比	92.90	7.10	54.84	45.16	20.00	80.00	4.52	95.48
總計	144	11	85	70	31	124	7	148
1至6月小計	97	2	75	24	29	70	6	93
1月	2		2		2			2
2月	6		6		2	4		6
3月	48	2	39	11	13	37	4	46
4月	12		11	1	4	8	1	11
5月	17		8	9	5	12		17
6月	12		9	3	3	9	1	11
7-12月小計	47	9	10	46	2	54	1	55
7月	15		5	10	1	14		15
8月	10		1	9		10		10
9月	13	1	4	10	1	13	1	13
10月	6	2		8		8		8

11月	3	6		9		9		9
12月								

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 29、臺北市政府工務局新建工程處公共工程發包及執行情形

(按決標月別分)

94 年度

	發包方式						變更設計	
	合計	公開招標	限制性招標			其他	有	無
			議價	比價	公開評選			
百分比	100.00	70.27	24.32	0.00	2.70	2.70	8.11	91.89
總計	37	26	9	0	1	1	3	34
1至6月小計	19	14	4	0	1	0	3	16
1月	4	3	1				2	2
2月	1		1					1
3月	0							
4月	4	3	1					4
5月	5	4	1					5
6月	5	4			1		1	4
7-12月小計	18	12	5	0	0	1	0	18
7月	1	1						1
8月	2	2						2
9月	4	4						4
10月	2	1				1		2
11月	6	2	4					6
12月	3	2	1					3
	開工情形		完工情形		驗收情形		結算情形	
	已開工	未開工	已完工	未完工	已驗收	未驗收	已結算	未結算
百分比	83.78	16.22	40.54	59.46	18.92	81.08	16.22	83.78
總計	31	6	15	22	7	30	6	31
1至6月小計	17	2	10	9	7	12	6	13
1月	4		3	1	2	2	2	2
2月	1		1		1			1
3月								
4月	4		2	2	2	2	2	2
5月	4	1	2	3	1	4	1	4
6月	4	1	2	3	1	4	1	4
7-12月小計	14	4	5	13	0	18	0	18
7月	1			1		1		1
8月	2			2		2		2
9月	4		3	1		4		4

10月	1	1		2		2		2
11月	5	1	1	5		6		6
12月	1	2	1	2		3		3

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

**表 30、臺北市政府工務局衛生下水道工程處公共工程發包及執行情形**

(按決標月別分)

94 年度

	發包方式						變更設計	
	合計	公開招標	限制性招標			其他	有	無
			議價	比價	公開評選			
百分比	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	94.64
總計	56	56	0	0	0	0	3	53
1至6月小計	16	16	0	0	0	0	2	14
1月	2	2						2
2月	0							
3月	0							
4月	3	3					1	2
5月	2	2						2
6月	9	9					1	8
7-12月小計	40	40	0	0	0	0	1	39
7月	3	3						3
8月	7	7						7
9月	4	4						4
10月	10	10					1	9
11月	9	9						9
12月	7	7						7
	開工情形		完工情形		驗收情形		結算情形	
	已開工	未開工	已完工	未完工	已驗收	未驗收	已結算	未結算
百分比	87.50	12.50	14.29	85.71	7.14	92.86	7.14	92.86
總計	49	7	8	48	4	52	4	52
1至6月小計	16	0	5	11	4	12	4	12
1月	2		1	1		2		2
2月								
3月								
4月	3		2	1	2	1	2	1
5月	2			2		2		2
6月	9		2	7	2	7	2	7
7-12月小計	33	7	3	37	0	40	0	40
7月	3			3		3		3

8月	7			7		7		7
9月	4			4		4		4
10月	9	1	2	8		10		10
11月	9		1	8		9		9
12月	1	6		7		7		7

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。

表 31、臺北市工務局公園路燈工程管理處公共工程發包及執行情形  
(按決標月別分)

94 年度

	發 包 方 式						變更設計	
	合計	公開招標	限制性招標			其他	有	無
			議價	比價	公開評選			
百分比	100.00	95.51	4.12	0.00	0.37	0.00	19.85	80.15
總計	267	255	11	0	1	0	53	214
1至6月小計	190	184	5	0	1	0	39	151
1月	36	36					8	28
2月	38	37	1				8	30
3月	47	45	2				8	39
4月	31	31					6	25
5月	26	23	2		1		7	19
6月	12	12					2	10
7-12月小計	77	71	6	0	0	0	14	63
7月	9	9					5	4
8月	14	10	4				2	12
9月	14	12	2				5	9
10月	15	15					2	13
11月	7	7						7
12月	18	18						18
	開工情形		完工情形		驗收情形		結算情形	
	已開工	未開工	已完工	未完工	已驗收	未驗收	已結算	未結算
百分比	91.01	8.99	78.28	21.72	64.04	35.96	64.04	35.96
總計	243	24	209	58	171	96	171	96
1至6月小計	185	5	167	23	137	53	137	53
1月	36		32	4	23	13	23	13
2月	38		34	4	28	10	28	10
3月	47		43	4	37	10	37	10
4月	31		29	2	24	7	24	7
5月	22	4	19	7	18	8	18	8
6月	11	1	10	2	7	5	7	5
7-12月小計	58	19	42	35	34	43	34	43
7月	9		8	1	6	3	6	3

8月	14		13	1	13	1	13	1
9月	13	1	10	4	9	5	9	5
10月	13	2	8	7	5	10	5	10
11月	7		2	5	1	6	1	6
12月	2	16	1	17		18		18

資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。
