



臺北市政府工務局新建工程處

「108年度道路橋梁工程」委託規劃設計技術服務案

知行路292巷4弄、2弄及其連接道路新築暨拓寬工程

地區說明會

108.07.16

主辦單位：臺北市政府工務局新建工程處

設計單位：恆康工程顧問股份有限公司



恆康工程顧問

Union Professional Group of Architects
Civil & Structural Engineering Construction Management Architecture

1.

基地概況

工區位置

- 緣由：依據都市計畫道路拓寬
- 位置：自知行路260巷至知行路292巷2弄與4弄間
- 預計開工時間：109年2月



工區位置現況照片




2.

計畫道路配置方案





道路平面

- 計畫道路 ROAD A
W=6公尺，L=51公尺
- 計畫道路 ROAD B
W=4公尺，L=46公尺
- 計畫道路 ROAD C
W=8公尺，L=53公尺
- 設置溝寬 **W=40cm** 排水溝，排水銜接知行路260巷排水系統

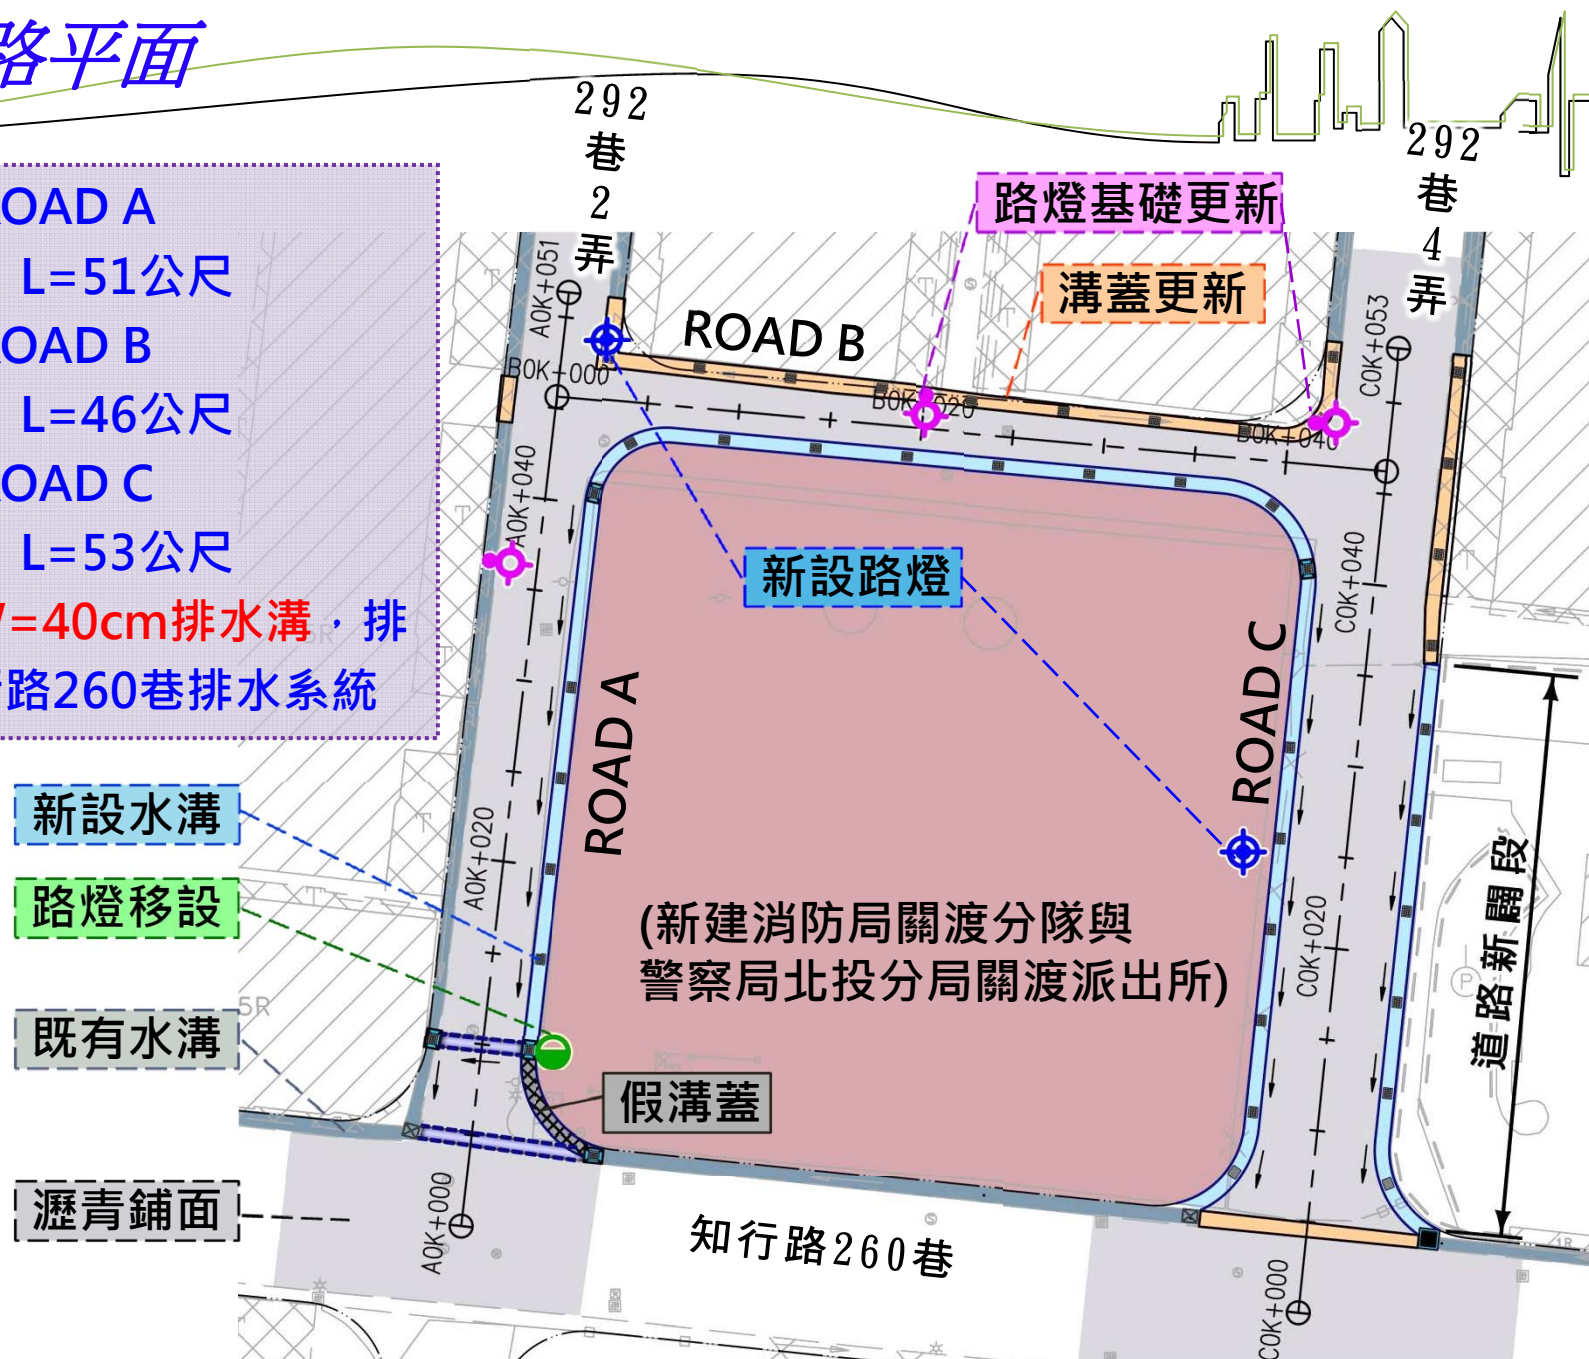


道路標準斷面-ROAD A(292巷2弄)

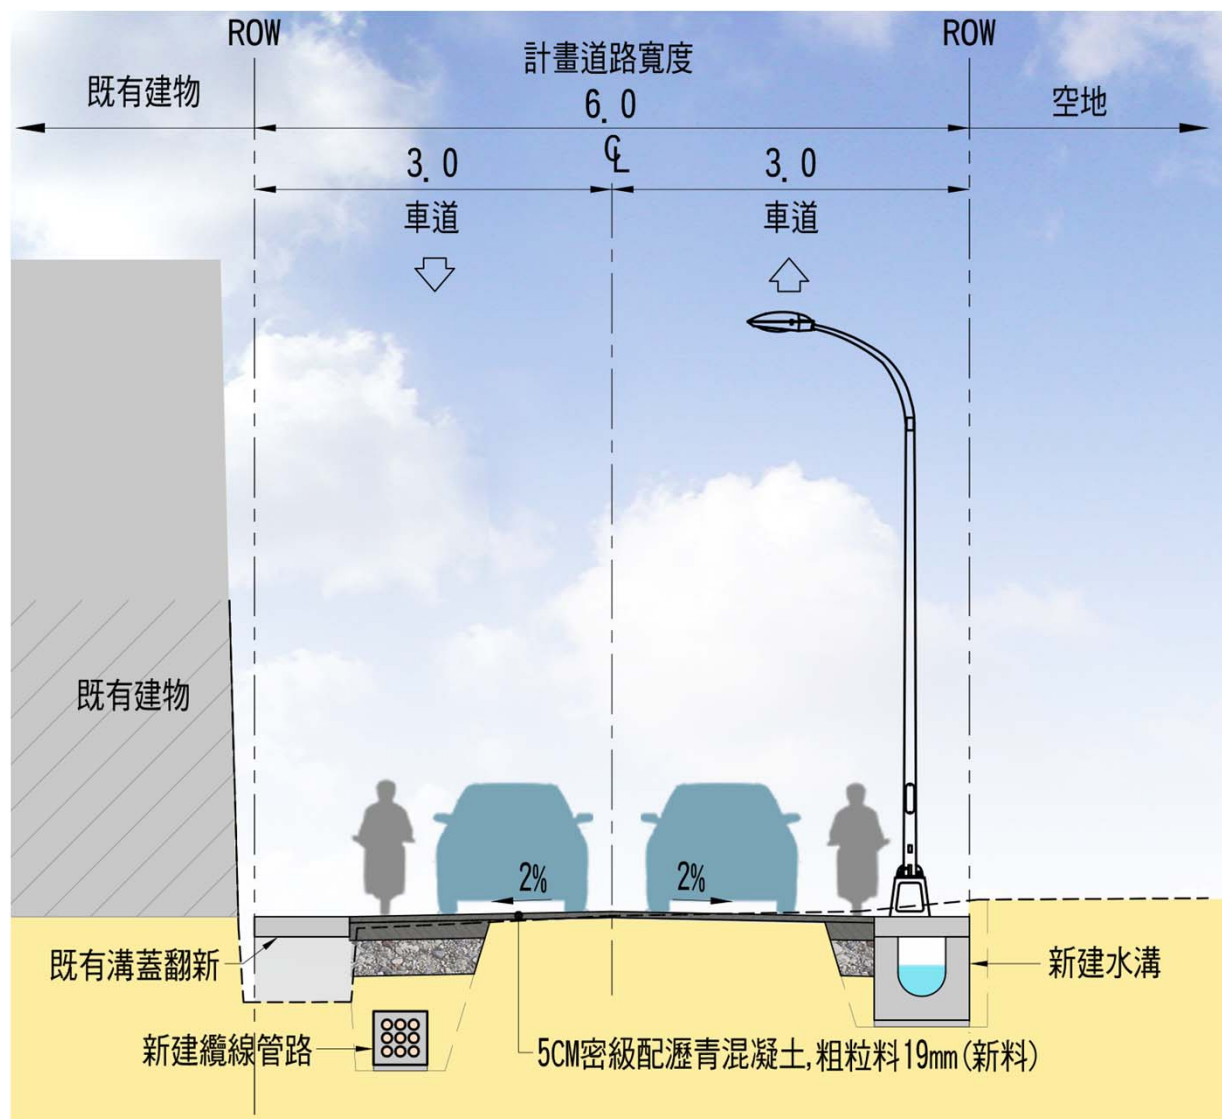

- 車道寬度拓寬至**6M**，配置雙向各1線車道
- 道路右側新設排水溝
- AC鋪面刨鋪


道路標準斷面-ROAD B (2弄~4弄連接道路)

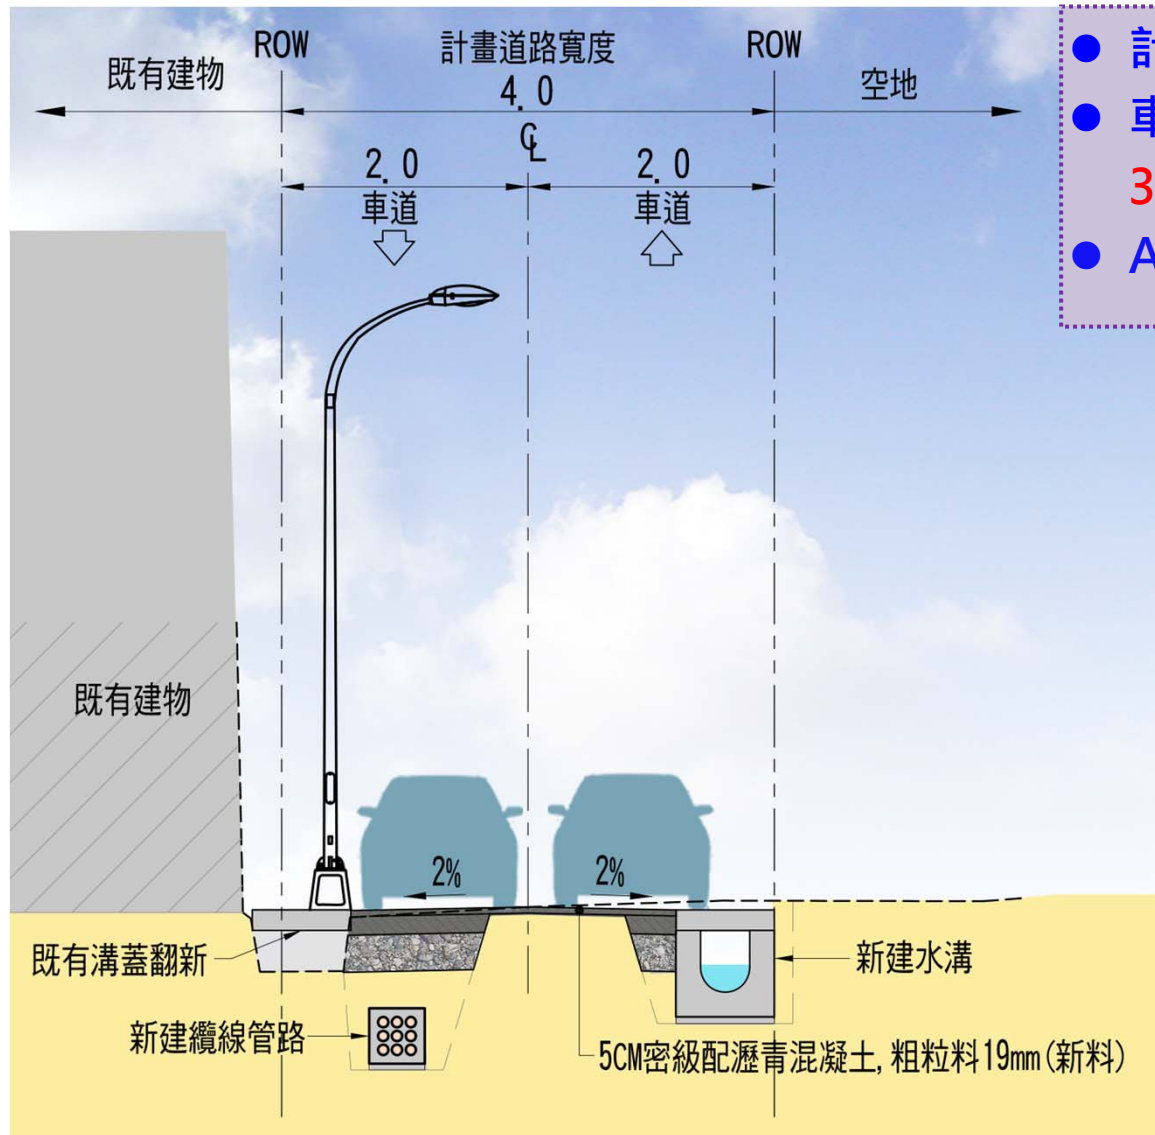

- 計畫車道寬度4M
- 車道鋪面採20公分瀝青混凝土，30公分路基級配
- AC鋪面刨鋪

道路標準斷面-ROAD C (292巷4弄)


- 新闢道路寬**8M**，配置雙向各1線車道
- 道路兩側新設排水溝
- AC鋪面刨鋪

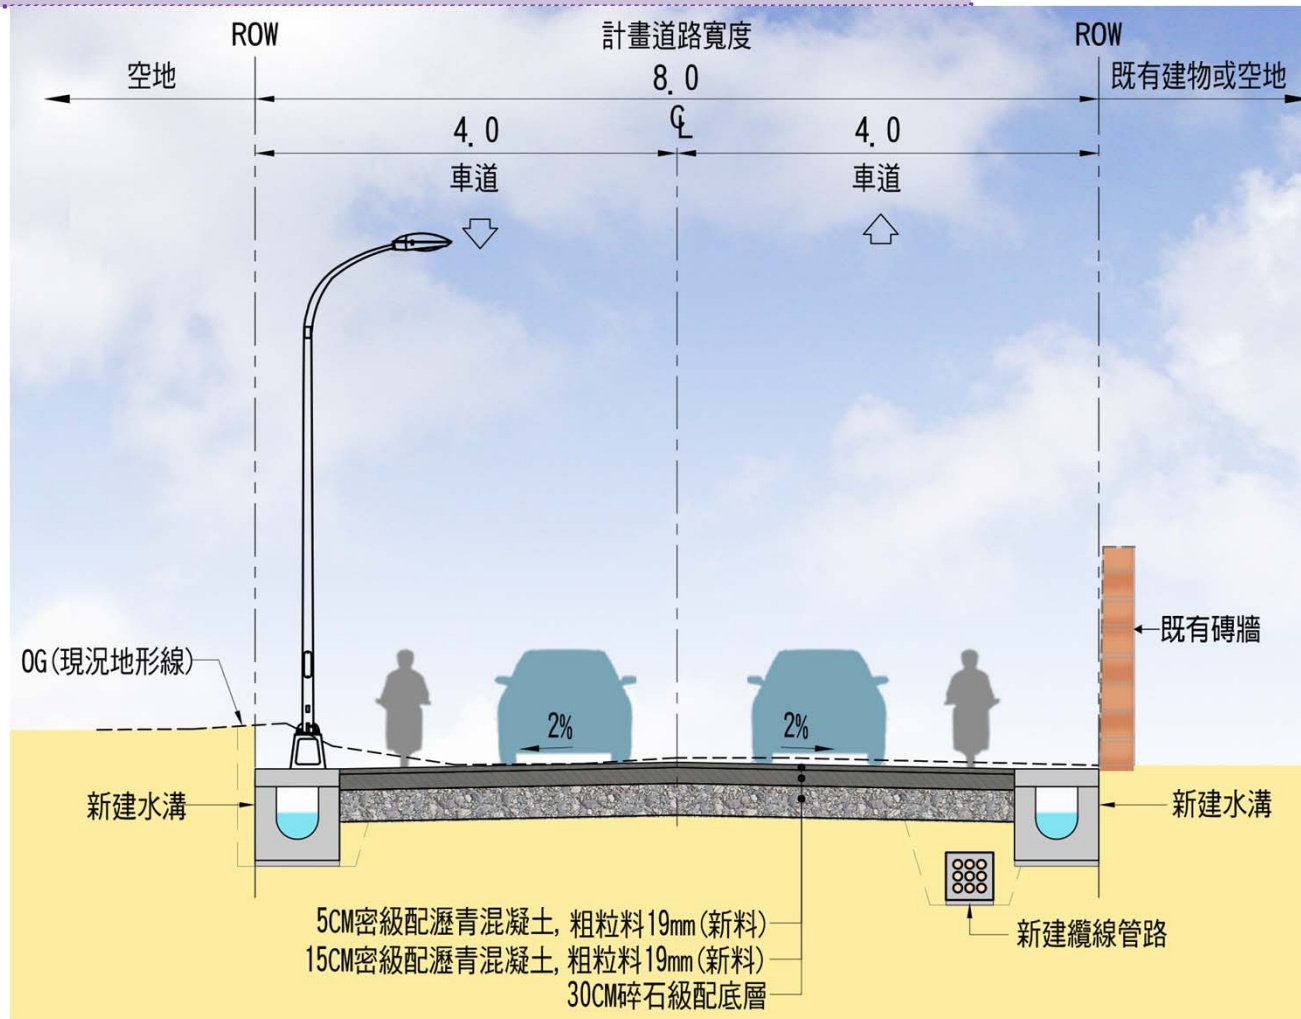

3.

交通維持規劃


- 既有道路：一次施作單側範圍，採半半施工，維持人車通行。
- 新闢道路：該路段封閉施工。

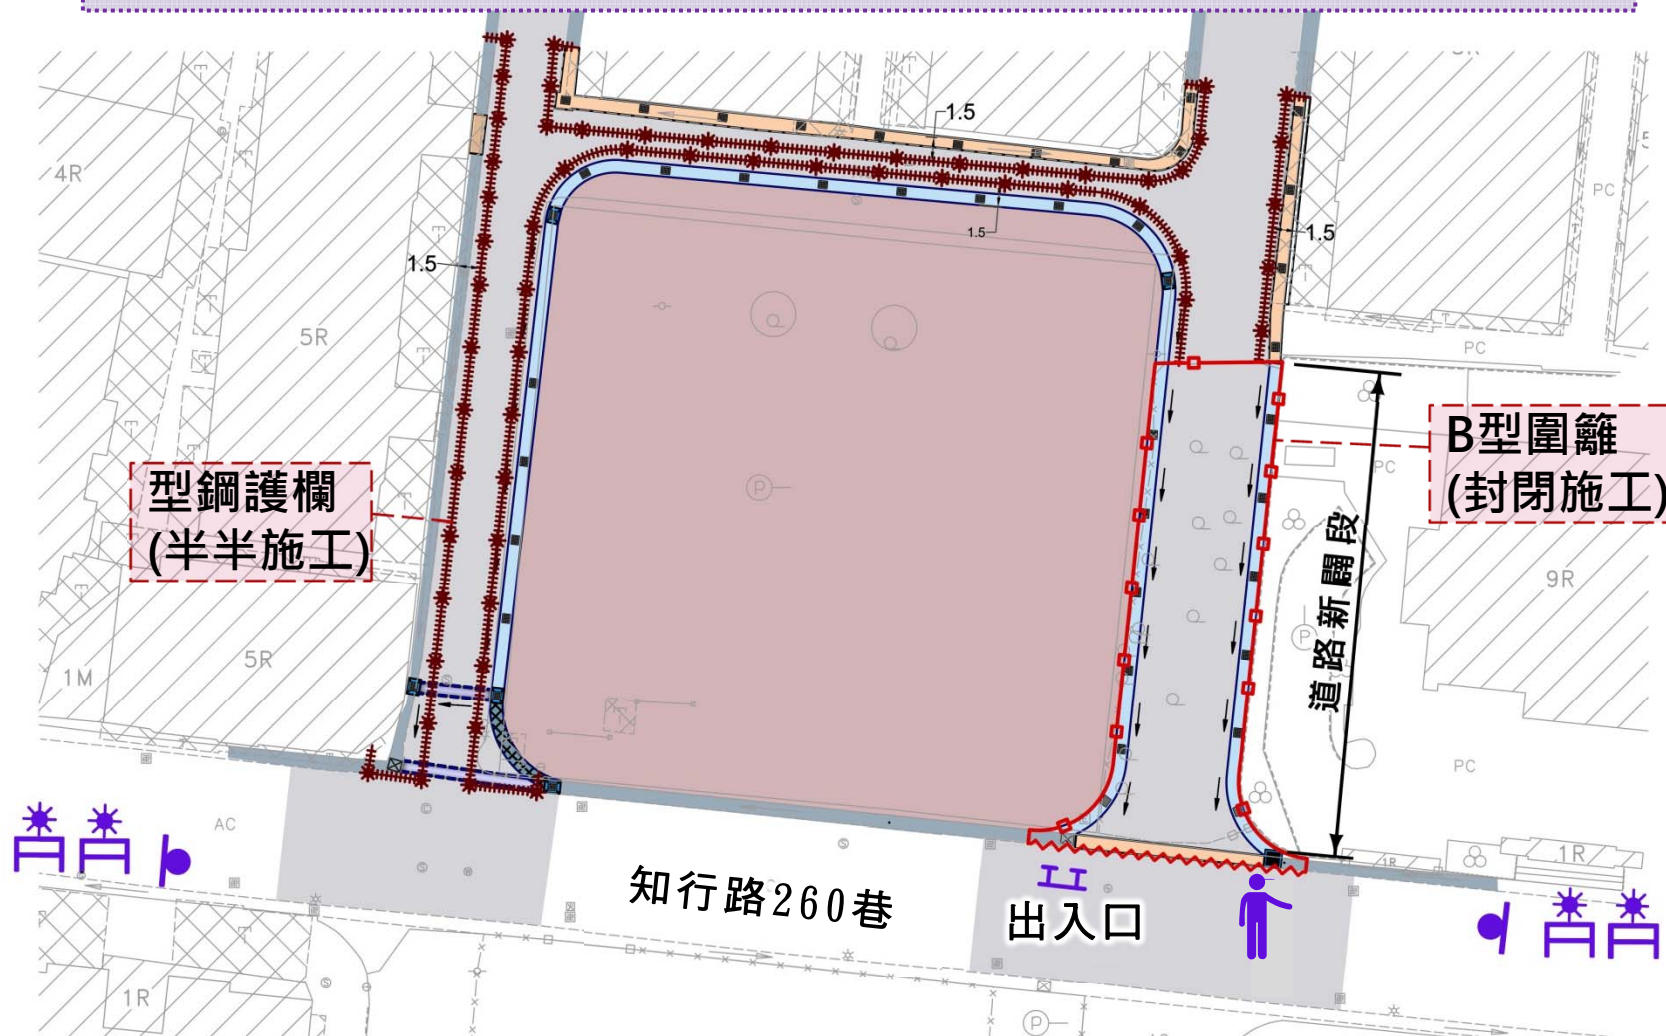

4.

工程效益

- 都市計畫道路
- 完工後臺北市交通路網更趨完善，有效提升整體市容

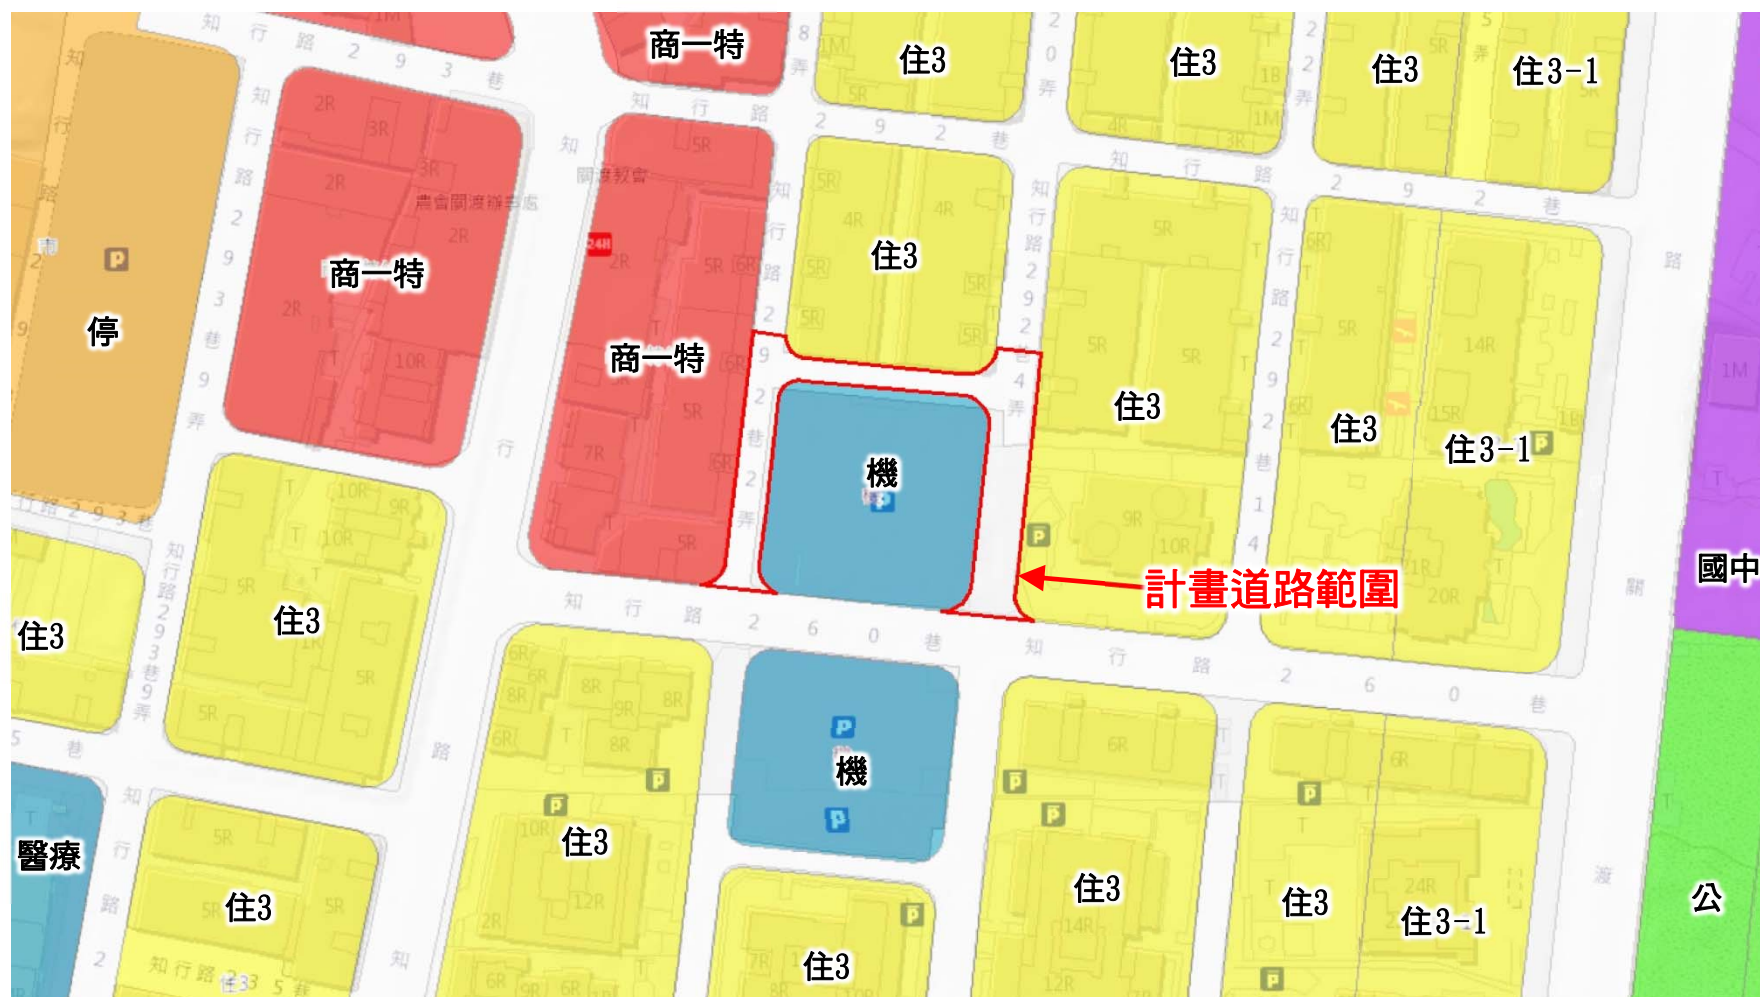


5.

預定施工工期




預定施工期程規劃



■ 主要要徑為整地開挖、排水設施、路燈纜線管路、路基回填、瀝青鋪面與標線劃設等施工項目，整體施工期程評估約需150個日曆天(未含發包招標作業)

預定施工進度參考圖 預估工期：150日曆天						
項次	任務名稱	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月
1	佈設圍籬及交通安全設施	5				
2	喬木移除、地坪及既有設施拆(移)除		60			
3	既有管路探挖、檢測及放樣		10			
4	路面切割及整地		14			
5	施作側溝、路燈及纜線管路			50		
6	土方作業及路基整理				26	
7	鋪設瀝青混凝土及標線劃設					14
8	既有設施復舊及清理作業					6
備註：工期已考量勞動基準法第三十六條修正為「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。」編列為150日曆天。						



簡 報 完 畢
