



捷運統計通報

(第 03 號)

臺北市政府捷運工程局

109 年 10 月 22 日

◎截至 109 年 9 月底止，興建中捷運工程包含新莊機廠、萬大-中和-樹林線(第一期)、信義線東延段及臺中捷運烏日文心北屯線，其中新莊機廠及臺中捷運烏日文心北屯線實際進度較預計進度超前，其餘路線則相同。

興建中捷運工程進度

109 年 9 月底

單位：%

進度別	新莊機廠	萬大-中和-樹林線(第一期)	信義線東延段	臺中捷運烏日文心北屯線
預計進度	96.85	49.64	44.69	93.25
實際進度	97.05	49.64	44.69	94.48
實際進度較預計進度增加百分點	0.20	-	-	1.23


資料來源：臺北市政府捷運工程局。

說明：新莊機廠進度係依行政院交通部核定期程為計算基準，其餘各線進度係依臺北市政府核定期程為計算基準。

◎為順利推動捷運建設，並多面向宣導建設成果，捷運工程局 109 年 1 至 9 月計辦理記者座談會 6 次、發布新聞稿 67 次、舉辦說明會及協調會 201 次、受理民眾洽詢服務 500 件等多項公關業務，其中民眾洽詢服務案件以索取資料為最大宗，計 256 件，占 51.2%，其次為施工問題，計 24 件，占 4.8%。

受理民眾洽詢服務件數

109 年 1 至 9 月

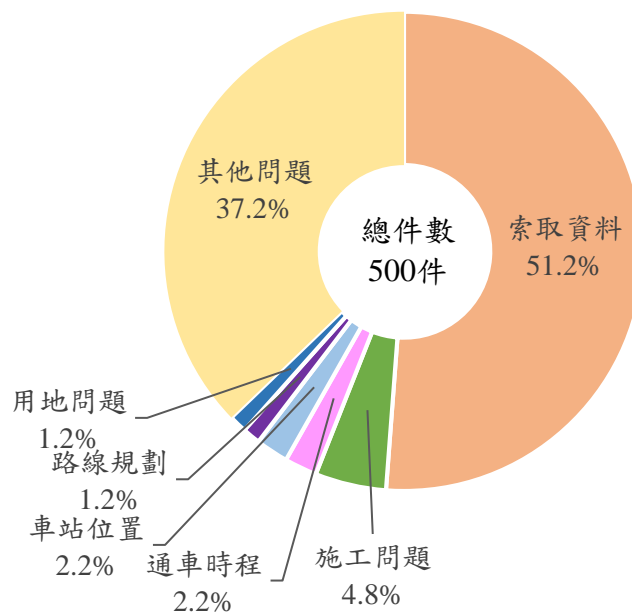

資料來源：臺北市政府捷運工程局。
