

臺北市
工務統計月報

**THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN
OF PUBLIC WORKS**


中華民國108年11月
November 2019



臺北市政府工務局編製
中華民國 108 年 12 月

**Public Works Department
Taipei City Government, December 2019**

臺北市政府工務局業務職掌

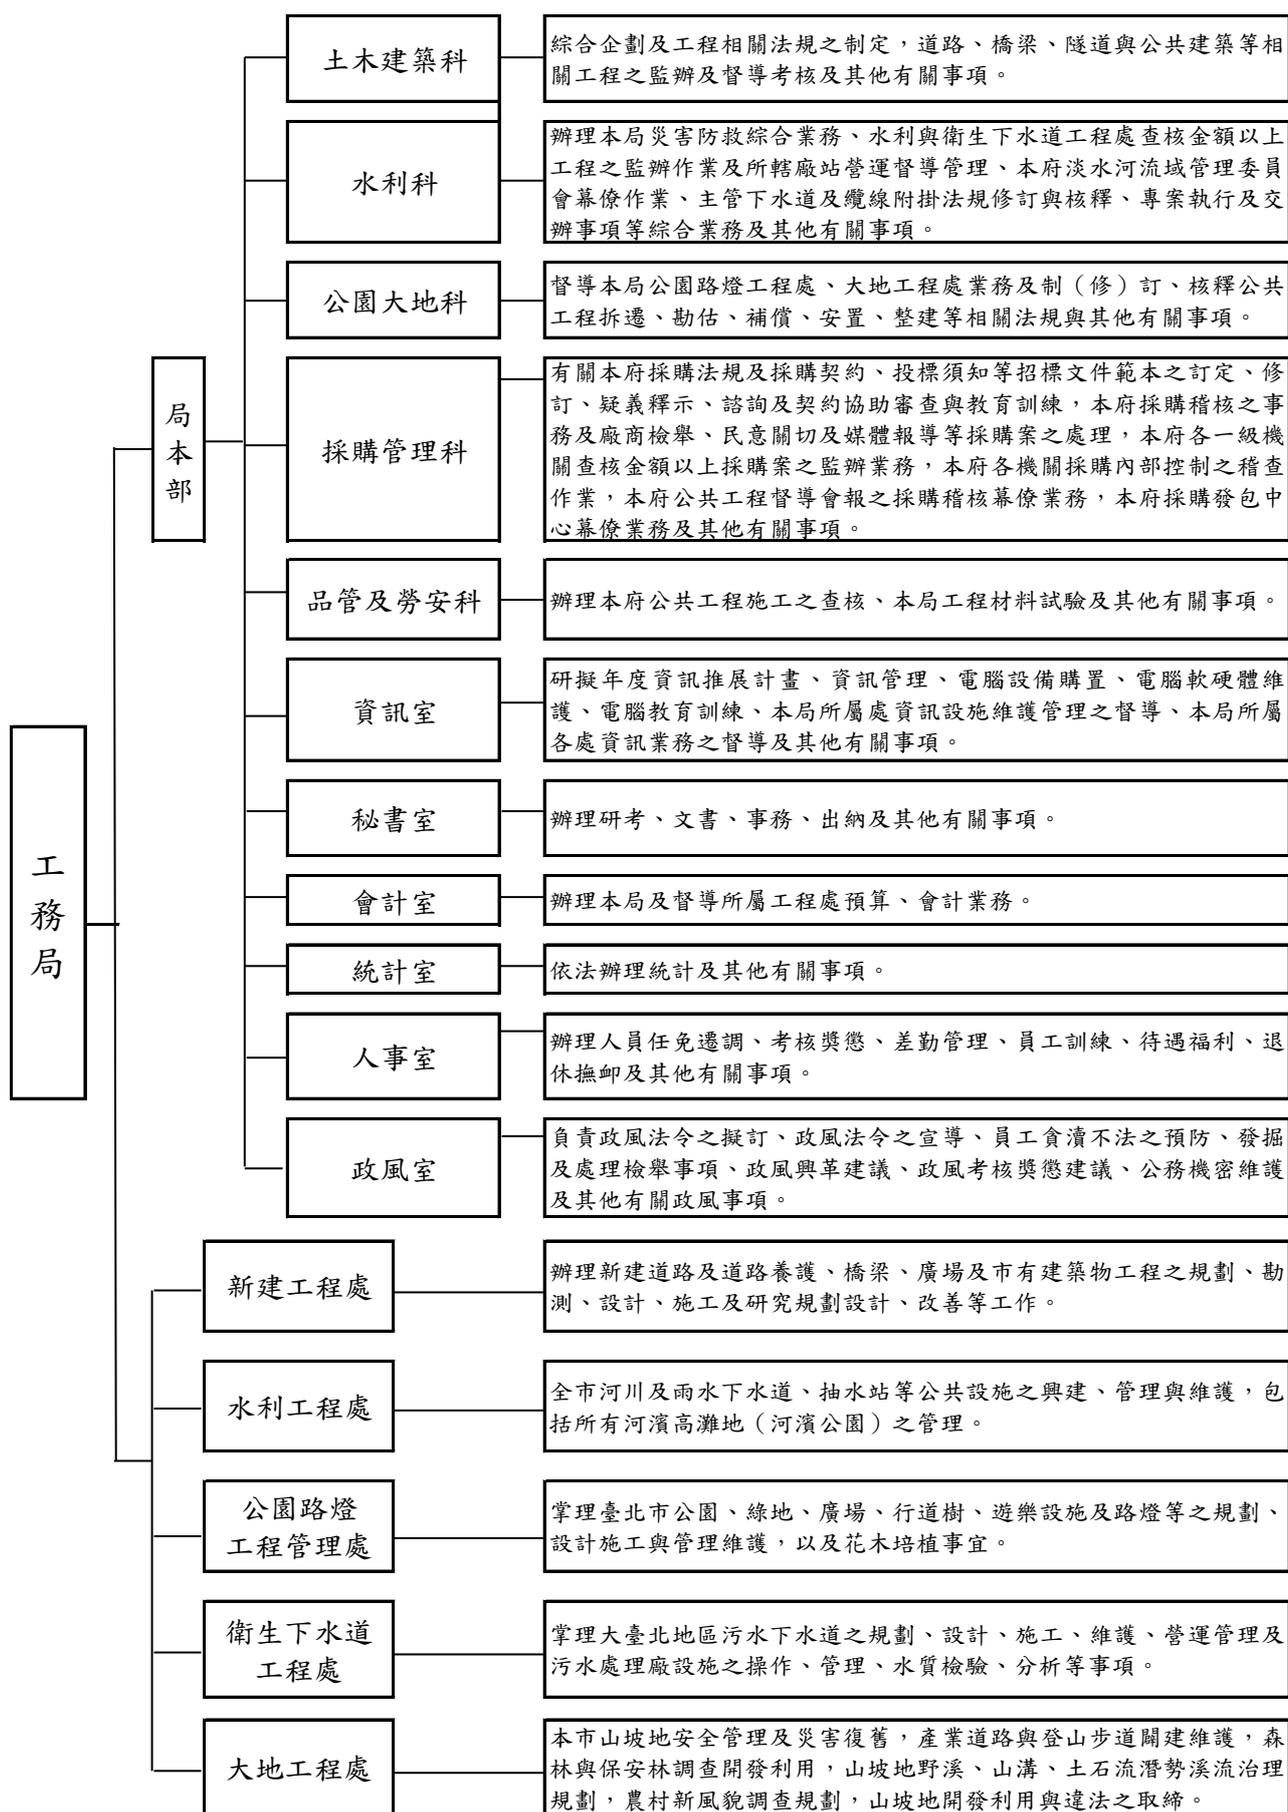

局本部

工務局

土木建築科

綜合企劃及工程相關法規之制定，道路、橋梁、隧道與公共建築等相關工程之監辦及督導考核及其他有關事項。

水利科

辦理本局災害防救綜合業務、水利與衛生下水道工程處查核金額以上工程之監辦作業及所轄廠站營運督導管理、本府淡水河流域管理委員會幕僚作業、主管下水道及纜線附掛法規修訂與核釋、專案執行及交辦事項等綜合業務及其他有關事項。

公園大地科

督導本局公園路燈工程處、大地工程處業務及制(修)訂、核釋公共工程拆遷、勘估、補償、安置、整建等相關法規與其他有關事項。

採購管理科

有關本府採購法規及採購契約、投標須知等招標文件範本之訂定、修訂、疑義釋示、諮詢及契約協助審查與教育訓練，本府採購稽核之事務及廠商檢舉、民意關切及媒體報導等採購案之處理，本府各一級機關查核金額以上採購案之監辦業務，本府各機關採購內部控制之稽查作業，本府公共工程督導會報之採購稽核幕僚業務，本府採購發包中心幕僚業務及其他有關事項。

品管及勞安科

辦理本府公共工程施工之查核、本局工程材料試驗及其他有關事項。

資訊室

研擬年度資訊推展計畫、資訊管理、電腦設備購置、電腦軟硬體維護、電腦教育訓練、本局所屬處資訊設施維護管理之督導、本局所屬各處資訊業務之督導及其他有關事項。

秘書室

辦理研考、文書、事務、出納及其他有關事項。

會計室

辦理本局及督導所屬工程處預算、會計業務。

統計室

依法辦理統計及其他有關事項。

人事室

辦理人員任免遷調、考核獎懲、差勤管理、員工訓練、待遇福利、退休撫卹及其他有關事項。

政風室

負責政風法令之擬訂、政風法令之宣導、員工貪瀆不法之預防、發掘及處理檢舉事項、政風興革建議、政風考核獎懲建議、公務機密維護及其他有關政風事項。

新建工程處

辦理新建道路及道路養護、橋梁、廣場及市有建築物工程之規劃、勘測、設計、施工及研究規劃設計、改善等工作。

水利工程處

全市河川及雨水下水道、抽水站等公共設施之興建、管理與維護，包括所有河濱高灘地(河濱公園)之管理。

公園路燈工程處

掌理臺北市公園、綠地、廣場、行道樹、遊樂設施及路燈等之規劃、設計施工與管理維護，以及花木培植事宜。


衛生下水道工程處

掌理大臺北地區污水下水道之規劃、設計、施工、維護、營運管理及污水處理廠設施之操作、管理、水質檢驗、分析等事項。

大地工程處

本市山坡地安全管理及災害復舊，產業道路與登山步道闢建維護，森林與保安林調查開發利用，山坡地野溪、山溝、土石流潛勢溪流治理規劃，農村新風貌調查規劃，山坡地開發利用與違法之取締。

Duties of the Public Works Department, Taipei City Government


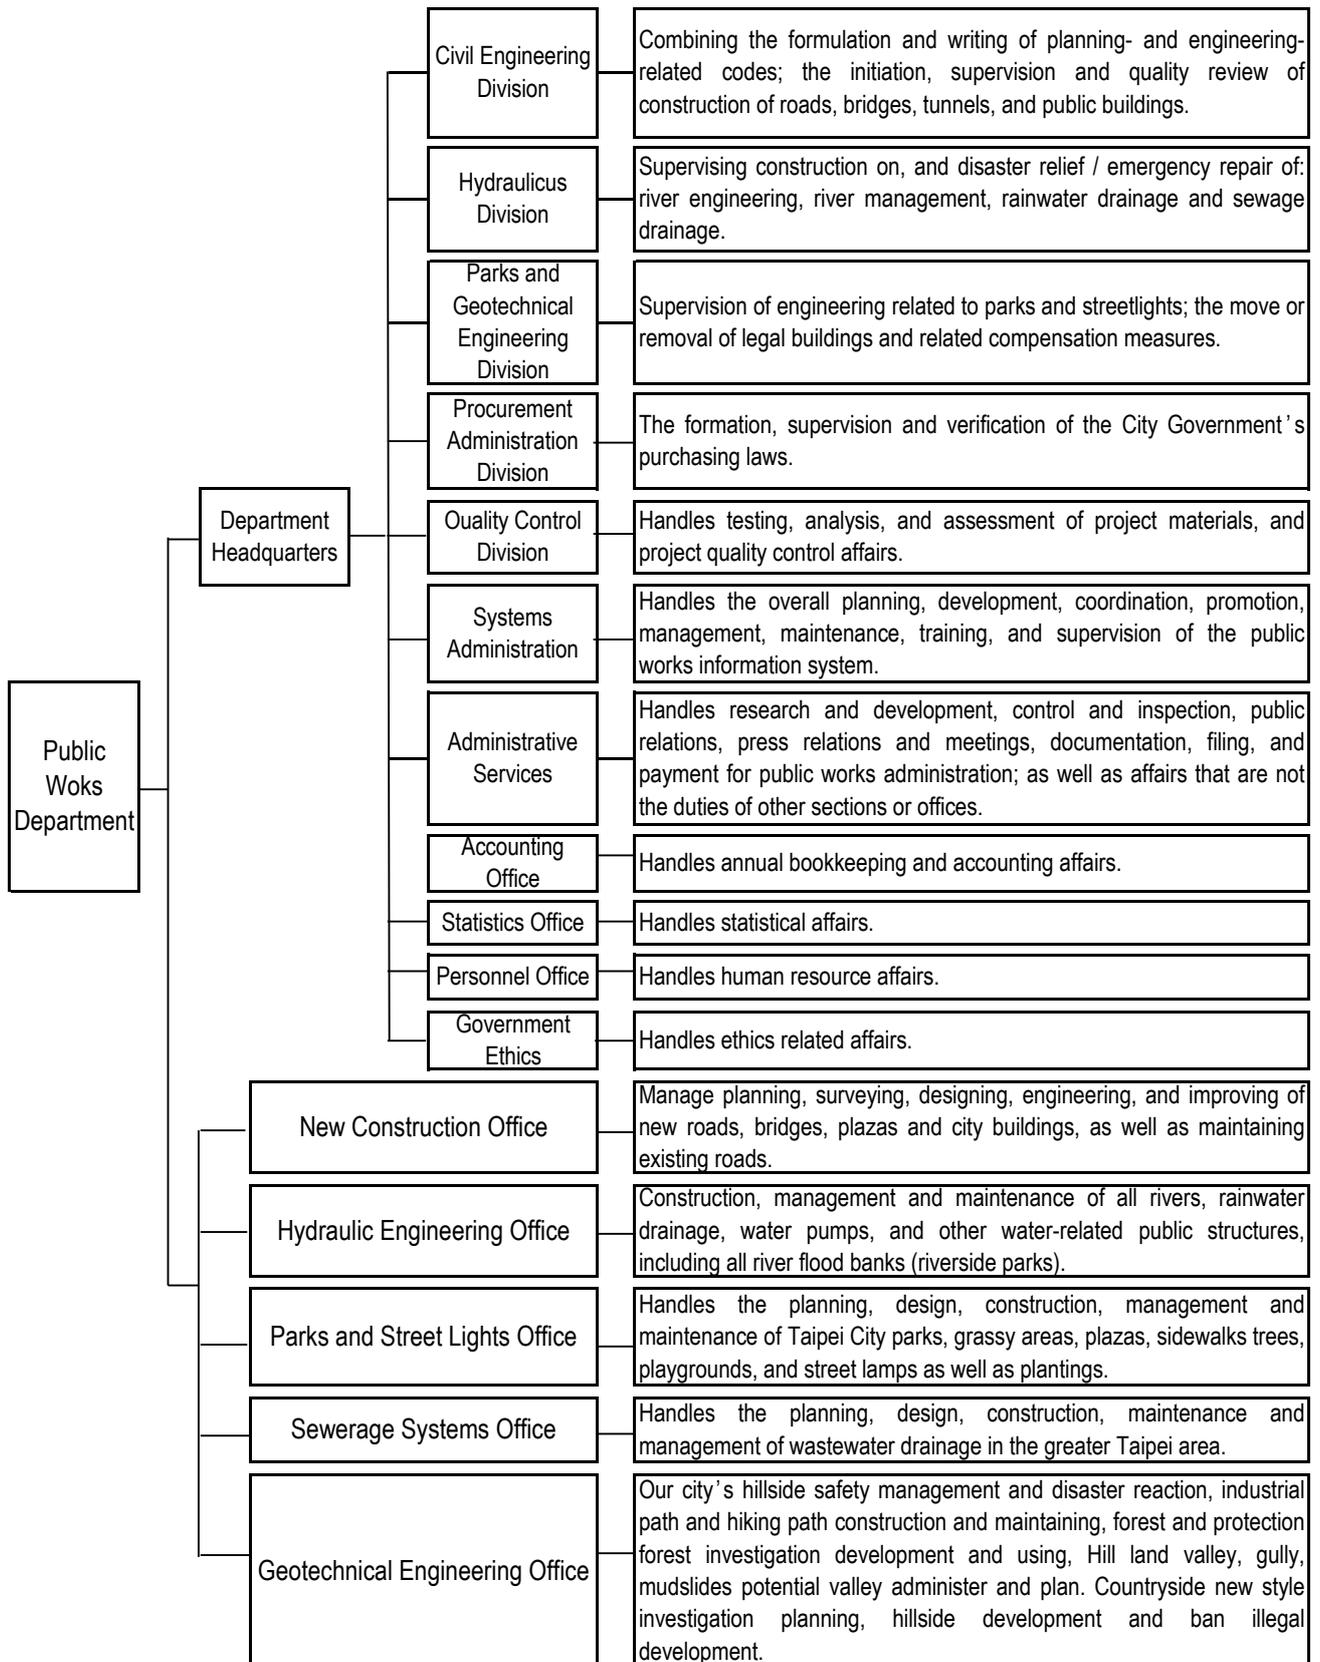




目次

統計圖	1
摘要	4
統計表	
表1 道路新建、拓寬、改善工程	6
表2 橋梁新建、拓建工程	10
表3 人行道改善工程	12
表4 隧道、地下道工程	14
表5 停車場新建工程	14
表6 公有建築物工程	16
表7 共同管道及景觀工程	18
表8 防洪工程	20
表9 抽水站新建、擴建工程	24
表10 雨水下水道新建、改善工程	26
表11 公園綠地新建、改善工程	28
表12 污水下水道新建、改善工程	36
表13 治山防災整體治理工程	38
表14 污水下水道用戶接管概況	42
表15 公園綠地	44
表16 現有路燈盞數	46
表17 登山步道	47
表18 土地人口概況	53
表19 臺灣地區營造工程物價指數	54
表20 臺北市營造工程物價基本分類指數	56

CONTENTS

Statistical Charts.....	1
Summary.....	4
Statistical Tables	
Table 1 Road Expansion, Improvement and New Constructions	6
Table 2 Bridge Expansion, Improvement and New Constructions	10
Table 3 Sidewalk Improvement Work	12
Table 4 Tunnel Constructions	14
Table 5 New Parking Lots Constructions	14
Table 6 Public Building Constructions	16
Table 7 Communal Pipeline and Landscape Constructions	18
Table 8 Flood Protection Constructions	20
Table 9 Rainwater Pump Station Expansion and New Constructions	24
Table 10 Rainwater Drainage System Improvement and New Constructions	26
Table 11 Park Improvement and New Constructions	28
Table 12 Sewerage System Improvement and New Constructions	36
Table 13 Watershed Management and Disaster Prevention	38
Table 14 Overview of Household Sewerage System Connections.....	42
Table 15 Parks and Green Fields.....	44
Table 16 Number of Street Lamps.....	46
Table 17 Hiking Trails.....	47
Table 18 Overview of Land and Population.....	53
Table 19 Indices of Construction Cost in Taiwan Area.....	54
Table 20 Indices of Construction Cost in Taipei City.....	56

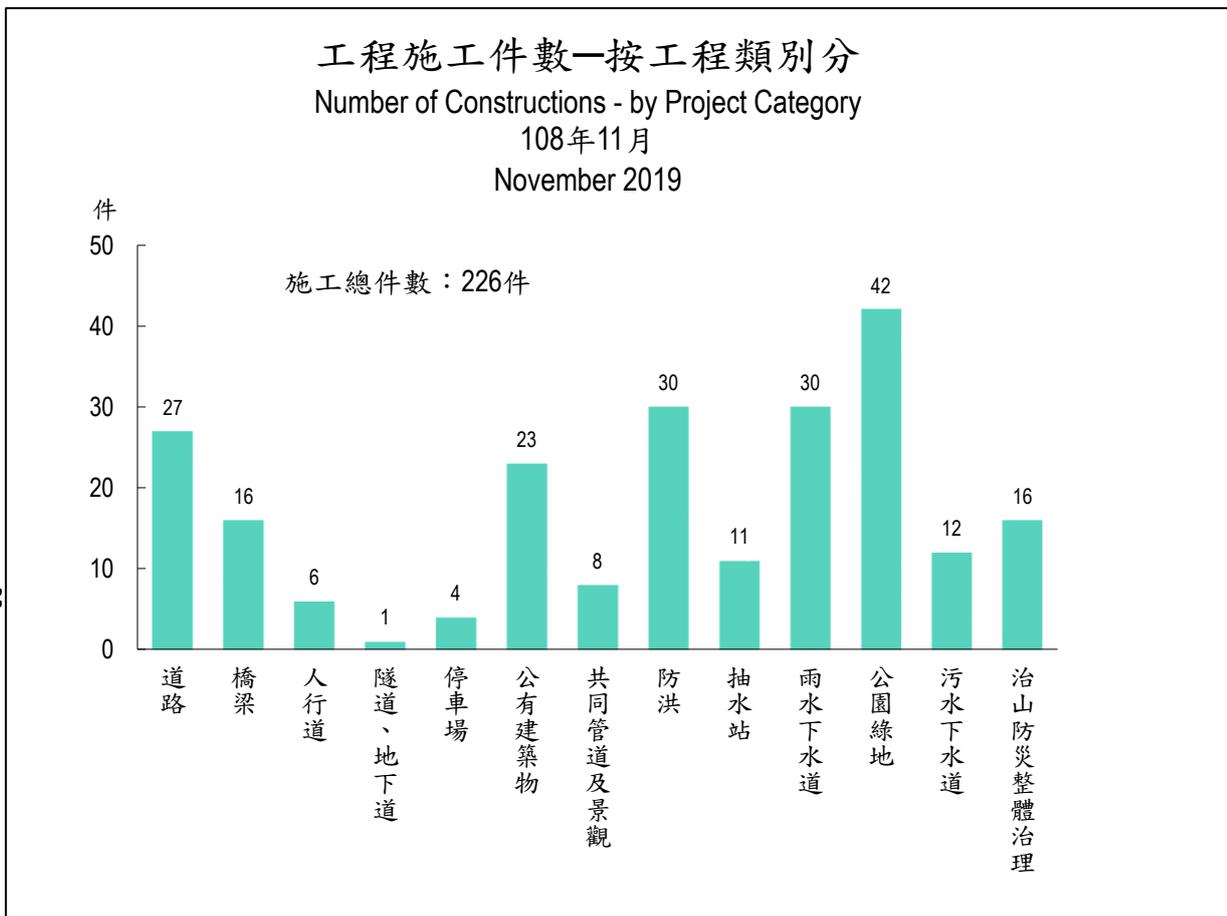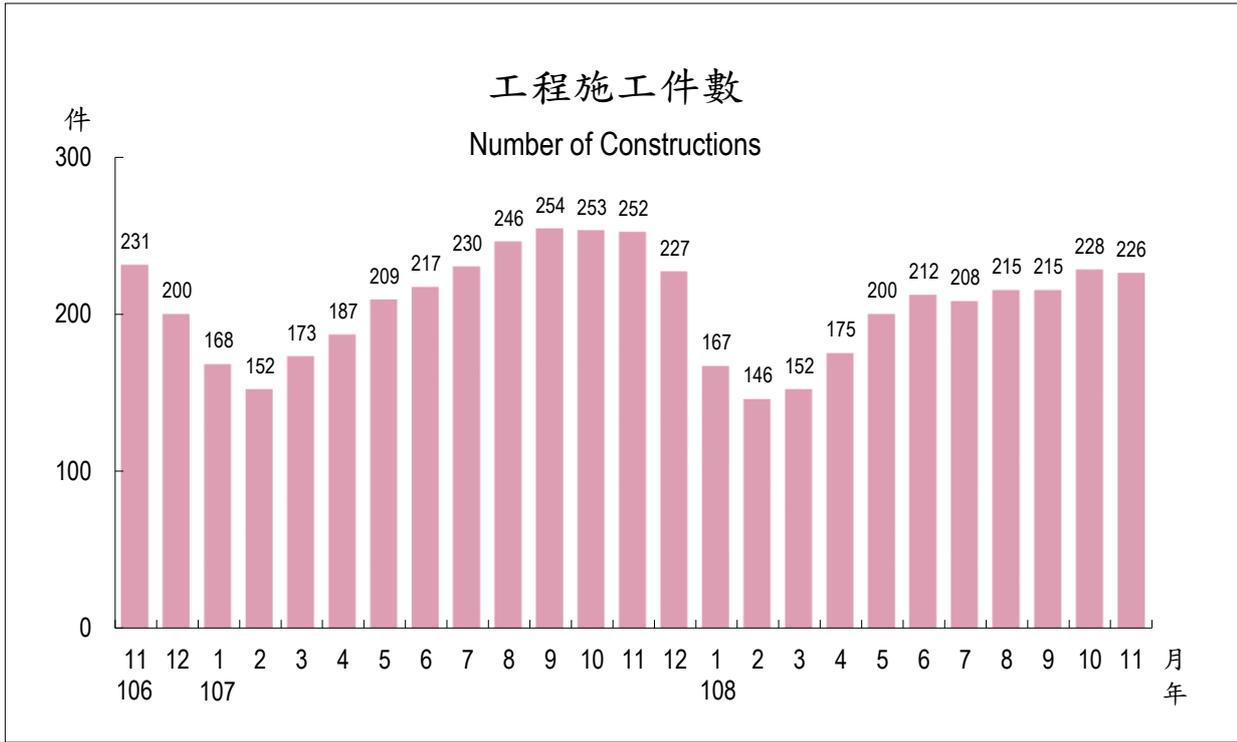

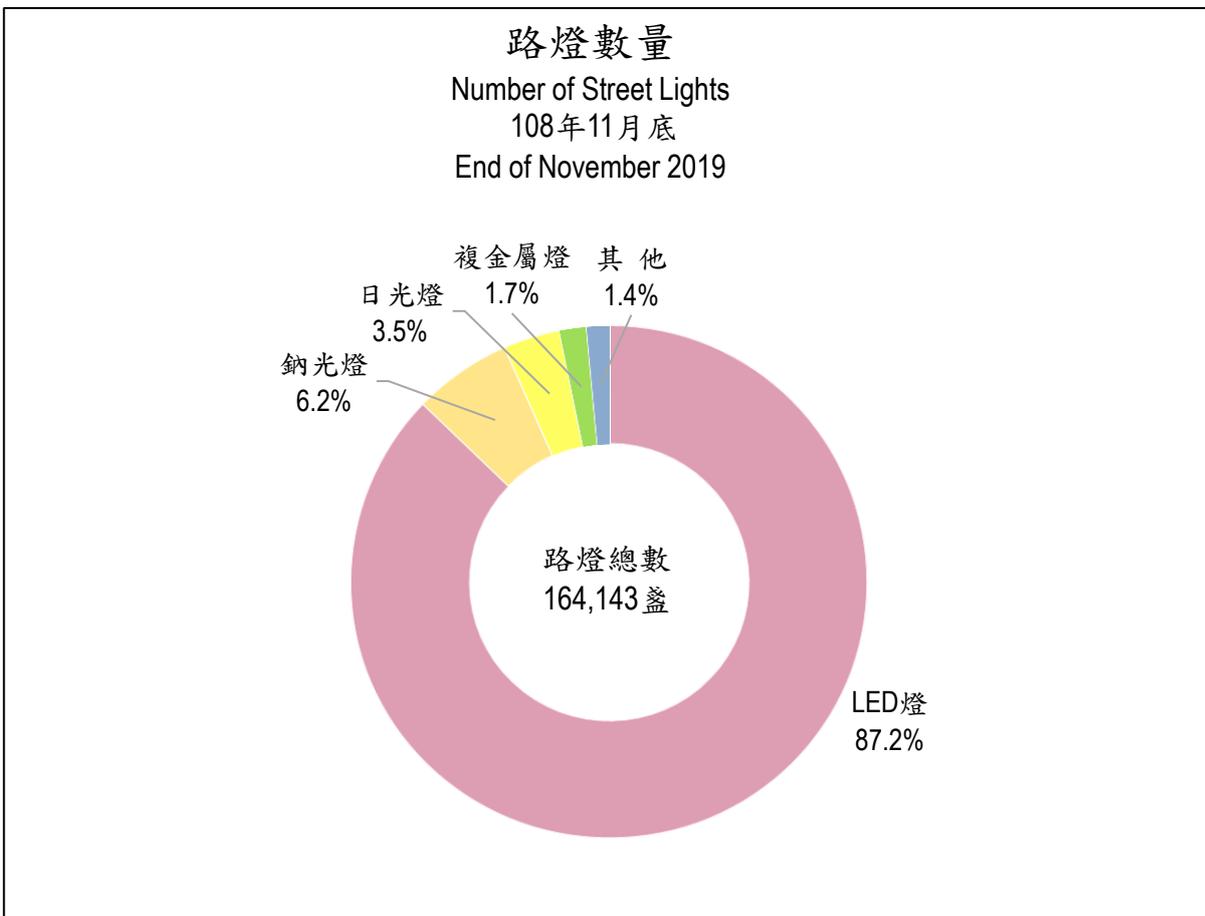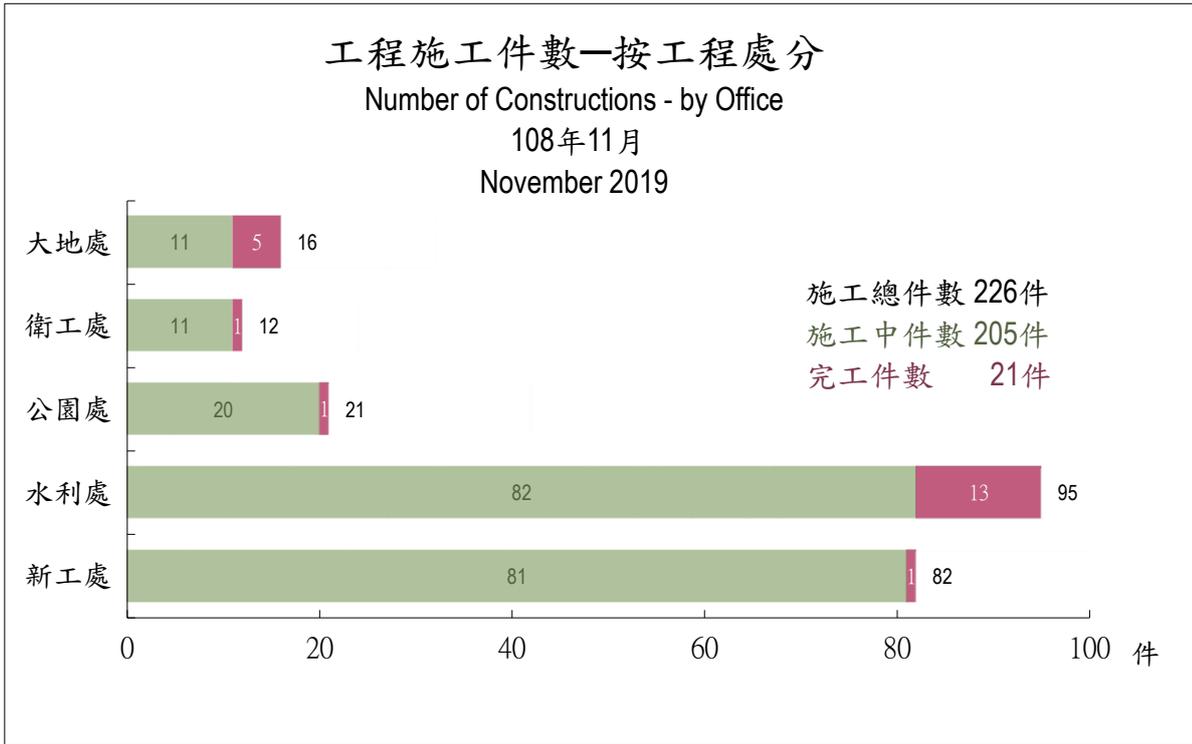


平均每一市民享有已開闢公園綠地面積

Per Capita Area of Parks and Green Fields

108年6月底


End of June 2019

平方公尺

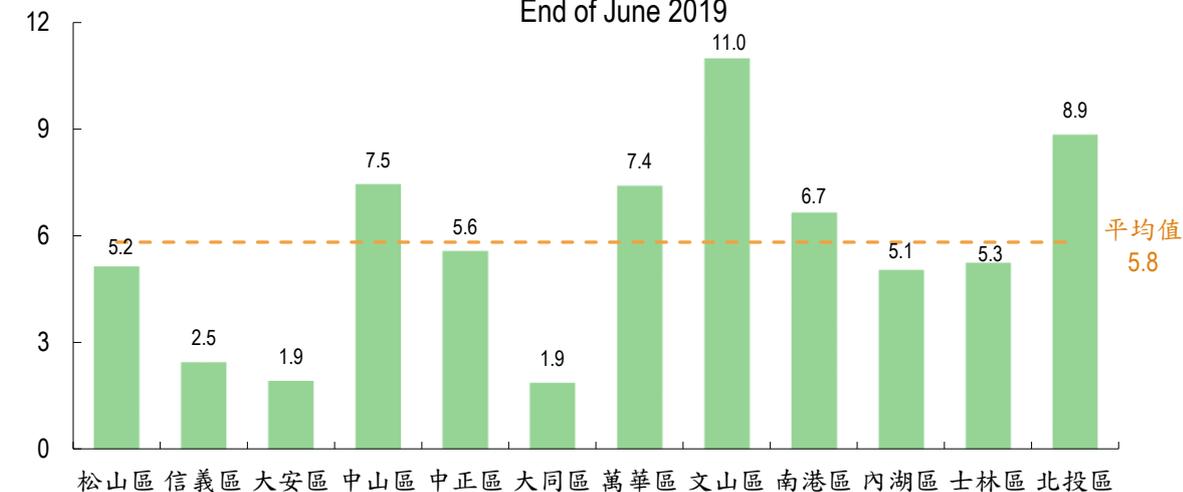

污水下水道用戶接管情形

Overview of Sewerage Connection

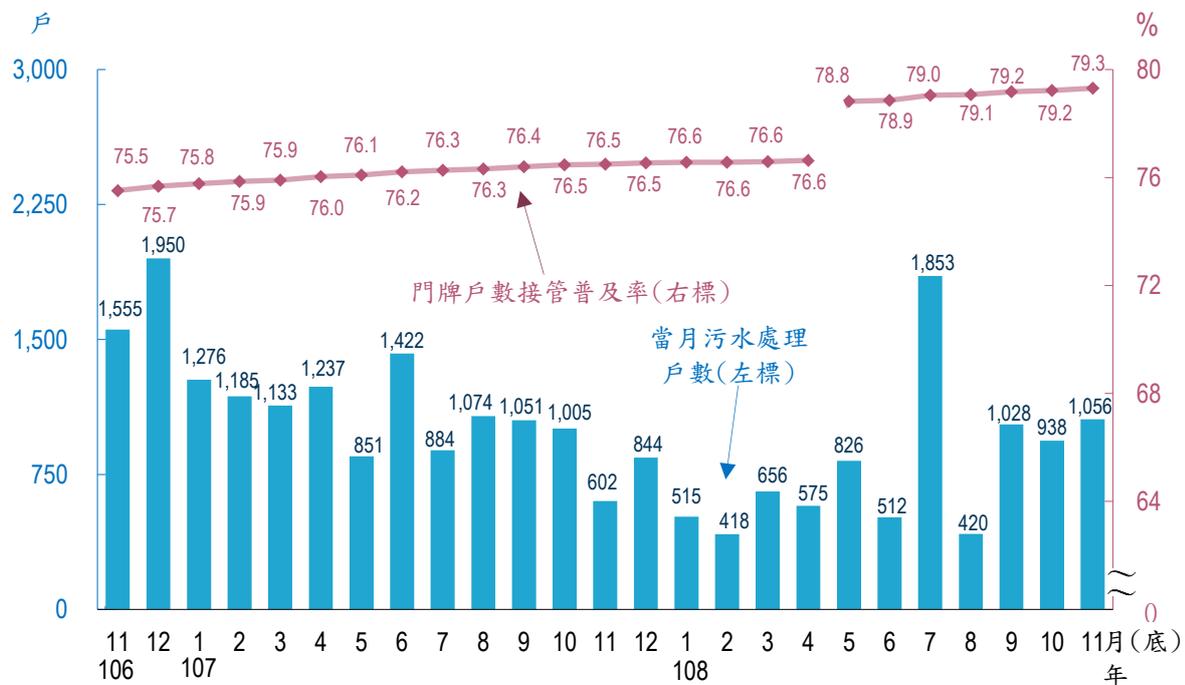

備註：108年5月起，門牌戶數接管普及率不計入建築物自設專用污水下水道設置戶數。

施工工程摘要

108年11月

Summary in November 2019

單位：件

unit：case

工程類別 Construction Category	施工件數 No. of Construction										備註 Note
	總計 Total	完工 Completed				施工中 Under Construction					
		合計 Sub-total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	合計 Sub-total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	停工 Work Suspension	
總計 Total	226	21	4	16	1	205	68	117	20	-	
百分比 %	100.0	9.3	1.8	7.1	0.4	90.7	30.1	51.8	8.8	-	
1. 道路新建、拓寬、改善 Road Expansion, Improvement and New Constructions	27	-	-	-	-	27	2	22	3	-	詳表1
2. 橋梁新建、拓建、改善 Bridge Expansion, Improvement and New Constructions	16	1	-	1	-	15	5	10	-	-	詳表2
3. 人行道改善工程 Sidewalk Improvement Work	6	-	-	-	-	6	-	6	-	-	詳表3
4. 隧道、地下道工程 Tunnel Constructions	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	詳表4
5. 停車場新建 New Parking Lots Constructions	4	-	-	-	-	4	3	-	1	-	詳表5
6. 公有建築物工程 Public Building Constructions	23	1	1	-	-	22	13	3	6	-	詳表6
7. 共同管道及景觀工程 Communal Pipeline and Landscape Constructions	8	-	-	-	-	8	5	3	-	-	詳表7
8. 防洪工程 Flood Protection Constructions	30	3	-	3	-	27	5	19	3	-	詳表8
9. 抽水站新建、擴建 Rainwater Pump Station Expansion and New Constructions	11	2	-	1	1	9	4	3	2	-	詳表9
10. 雨水下水道新建、改善 Rainwater Drainage System Improvement and New Constructions	30	2	-	2	-	28	4	23	1	-	詳表 10
11. 公園綠地新建、改善 Park Improvement and New Constructions	42	6	-	6	-	36	15	18	3	-	詳表 11
12. 污水下水道新建、改善 Sewerage System Improvement and New Constructions	12	1	-	1	-	11	1	10	-	-	詳表 12
13. 治山防災整體治理工程 Watershed Management and Disaster Prevention	16	5	3	2	-	11	11	-	-	-	詳表 13

資料來源：工務局。

Source: Public Works Department.

施工中工程

單位：件

Under Construction

unit : case

年(月)別／機關別	總計	超前	符合	落後	停工
Year (Month)／Sponsor	Total	Lead	Accord	Delay	Work Suspension
民國107年 2018					
1月 Jan.	155	59	61	35	-
2月 Feb.	144	56	65	23	-
3月 Mar.	157	63	63	31	-
4月 Apr.	177	65	74	38	-
5月 May	197	78	93	26	-
6月 June	205	79	106	20	-
7月 July	223	80	111	32	-
8月 Agu.	238	78	128	32	-
9月 Sep.	248	86	138	24	-
10月 Oct.	244	76	134	34	-
11月 Nov.	219	68	121	30	-
12月 Dec.	163	54	52	57	-
民國108年 2019					
1月 Jan.	153	52	50	51	-
2月 Feb.	131	46	47	38	-
3月 Mar.	144	46	64	34	-
4月 Apr.	164	61	81	22	-
5月 May	191	56	103	32	-
6月 June	205	53	120	32	-
7月 July	198	72	97	29	-
8月 Agu.	211	69	111	31	-
9月 Sep.	208	73	116	19	-
10月 Oct.	220	79	119	22	-
11月 Nov.	205	68	117	20	-
新建工程處 New Construction Office	81	29	42	10	-
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	82	14	60	8	-
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office	20	13	5	2	-
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office	11	1	10	-	-
大地工程處 Geotechnical Engineering Office	11	11	-	-	-

資料來源：工務局。

Source: Public Works Department.

表1 道路新建、拓寬、改善工程

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		總 計	200,765
新建工程處 New Construction Office	108	1. 108年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	8,199
	108	2. 108年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	8,091
	108	3. 108年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	5,647
	108	4. 108年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	9,557
	108	5. 108年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	11,324
	108	6. 108年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	8,828
	108	7. 108年度一般道路更新工程開口契約(第7標)(抵費地基金)	4,351
	108	8. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	2,024
	108	9. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	2,694
	108	10. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	2,228
	108	11. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	1,963
	108	12. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	4,140
	108	13. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	2,127
	108	14. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	4,953

Table 1 Road Expansion, Improvement and New Constructions

November 2019

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度	寬度	總面積	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	預定	實際	超前	符合	落後
Length (公尺)	Width (公尺)	Area (平方公尺)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	Scheduled (%)	Actual (%)	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m)	(m)	(m ²)				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
1,675	6-40	34,298	--	--	--	--	--	2	22	3
預約維護			108.04	108.12		70.33	70.33		✓	
預約維護			108.05	108.12		67.51	67.51		✓	
預約維護			108.05	108.12		73.84	73.84		✓	
預約維護			108.05	108.12		83.35	83.35		✓	
預約維護			108.04	108.12		88.00	88.00		✓	
預約維護			108.04	108.12		72.00	72.00		✓	
預約維護			108.05	108.12		67.69	67.69		✓	
預約維護			108.04	108.12		61.50	61.50		✓	
預約維護			108.04	108.12		93.22	93.22		✓	
預約維護			108.04	108.12		50.90	50.90		✓	
預約維護			108.05	108.12		66.08	66.08		✓	
預約維護			108.04	108.12		89.81	89.81		✓	
預約維護			108.04	108.12		65.00	65.00		✓	
預約維護			108.04	108.12		99.00	99.00		✓	

表1 道路新建、拓寬、改善工程 (續)

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
	108	15. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	4,240
	108	16. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	4,603
	108	17. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	3,698
	108	18. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	5,767
	108	19. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	8,739
	108	20. 108年度災害搶修工程開口契約(第1標)(士林北投、中山大同)	1,556
	108	21. 108年度災害搶修工程開口契約(第2標)(大安文山、中正萬華)	576
	108	22. 108年度災害搶修工程開口契約(第3標)(內湖南港、松山信義)	957
	108	23. 研究路2段61巷口道路改善工程	321
	106-108	24. 福興公園南側道路新築工程	6,474
	104-108	25. 福國路延伸工程(第2期)	86,644
	107-108	26. 興寧街66巷道路拓寬工程	427
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	108	27. 和興路84巷底暨北政橋周邊水防道路拓寬工程	640

資料來源：新建工程處、水利工程處。

Table 1 Road Expansion, Improvement and New Constructions (Cont.)

November 2019

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度	寬度	總面積	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	預定	實際	超前	符合	落後
Length (公尺)	Width (公尺)	Area (平方公尺)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	Scheduled (%)	Actual (%)	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m)	(m)	(m ²)				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
預約維護			108.04	108.12		72.49	72.49		✓	
預約維護			108.04	108.12		90.92	90.92		✓	
預約維護			108.04	108.12		95.00	95.00		✓	
預約維護			108.04	108.12		99.27	99.27		✓	
預約維護			108.04	108.12		87.50	87.50		✓	
預約維護			108.04	108.12		94.38	94.38		✓	
預約維護			108.04	108.12		50.00	50.00		✓	
預約維護			108.06	108.12		13.87	13.87		✓	
78	9-10	499	108.09	108.11		100.00	73.00			✓
102	12-14	1,331	107.07	109.01		88.89	93.63	✓		
1,420	10-40	31,546	107.11	110.11		8.63	9.66	✓		
75	6-20	922	108.04	108.09		100.00	60.00			✓
改善文山區和興路84巷底道路及指南路3段2巷現有道路狹窄致使影響交通之情況，故計畫辦理拓寬及相關周邊環境改善			108.06	108.10		100.00	94.00			✓

表2 橋梁新建、拓建、改善工程

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		總 計	292,571
新建工程處 New Construction Office	107-108	1. 復興橋西側人行景觀橋暨自行車牽引道新築工程	6,263
	104-108	2. 福國路延伸工程(第2期)	①...
	105-111	3. 中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	231,898
	106-108	4. 成功橋拓寬工程	19,907
	106-108	5. 建國高架橋及舊環南高架耐震補強改善工程(第一標)	6,477
	107-109	6. 福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程	11,169
	108	7. 108年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第1標)(士林北投、中山大同區)	3,235
	108	8. 108年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第2標)(內湖南港、松山信義區)	3,235
	108	9. 108年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第3標)(中正萬華、大安文山區)	3,235
	108	10. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第1標)(中山大同區)	929
	108	11. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第2標)(松山信義區)	929
	108	12. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第3標)(中正萬華區)	929
	108	13. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第4標)(內湖南港區)	929
	108	14. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第5標)(士林北投區)	929
	108	15. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第6標)(大安文山區)	929
		108	16. 108年臺北市道路橋梁隔音牆預約式增設及改善工程
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

Table 2 Bridge Expansion, Improvement and New Constructions

November 2019

工程內容 Construction Project						工期 Project Period			施工進度 Progress				
主橋 Main Span			引道 Lead Road			開工日期	預定完工日期	實際完工日期	預定	實際	超前	符合	落後
長度	寬度	面積	長度	寬度	面積								
(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(平方公尺)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
1,426	4-35.4	20,161	1,805	3-35	24,527	--	--	--	--	--	5	11	-
112	4-7	425	182	3-5	663	108.01	109.03		59.00	63.10	✓		
190	16	3,040	1,104	9-16	11,313	107.11	110.11		8.63	9.66	✓		
190	35.4	6,726	398	6-35	10,197	108.05	112.05		2.49	3.44	✓		
332	22-23	7,470	121	19-20	2,355	106.10	108.11	108.11	100.00	100.00		✓	
耐震補強改善						107.02	109.05		66.39	72.85	✓		
602	4-4.5	2,500	-	-	-	108.02	109.10		19.94	52.81	✓		
預約維護						108.04	108.12		66.00	66.00		✓	
預約維護						108.05	108.12		61.00	61.00		✓	
預約維護						108.06	108.12		46.00	46.00		✓	
預約維護						108.04	108.12		97.00	97.00		✓	
預約維護						108.05	108.12		64.00	64.00		✓	
預約維護						108.05	108.12		90.09	90.09		✓	
預約維護						108.05	108.12		60.16	60.16		✓	
預約維護						108.06	108.12		85.02	85.02		✓	
預約維護						108.04	108.12		70.00	70.00		✓	
預約式增設及改善						108.10	109.03		0.50	0.50		✓	

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ① The Construction Expense is included in the road project expenditure.

表3 人行道改善工程

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
新建工程處 New Construction Office		總 計	18,389
	108	1. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第一標)(中山、大同區)	2,756
	108	2. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第二標)(松山、信義區)	2,756
	108	3. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第三標)(中正、萬華區)	2,756
	108	4. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第四標)(內湖、南港區)	2,756
	108	5. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第五標)(士林、北投區)	2,756
	108	6. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)(大安、文山區)	4,608

資料來源：新建工程處。

Table 3 Sidewalk Improvement Work

November 2019

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度	寬度	總面積	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	預定	實際	超前	符合	落後
Length (公尺)	Width (公尺)	Area (平方公尺)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	Scheduled (%)	Actual (%)	Lead (件) (case)	Accord (件) (case)	Delay (件) (case)
(m)	(m)	(m ²)								
-	-	-	--	--	--	--	--	-	6	-
	預約維護		108.06	108.12		45.00	45.00		✓	
	預約維護		108.05	108.12		79.00	79.00		✓	
	預約維護		108.04	108.12		68.00	68.00		✓	
	預約維護		108.04	108.12		87.30	87.30		✓	
	預約維護		108.04	108.12		85.00	85.00		✓	
	預約維護		108.04	108.12		45.00	45.00		✓	

表4 隧道、地下道工程

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		總 計	12,679
新建工程處 New Construction Office	107	1. 108年度臺北市車(人)行地下道及隧道機電設備(含電梯、電扶梯)老化修繕工程	12,679

資料來源：新建工程處。

表5 停車場工程

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		總 計	-
新建工程處 New Construction Office	106-111	1. 臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程(附設地下停車場)	①...
	103-111	2. 中山國中綜合大樓新建工程(附設地下停車場)	①...
	107-112	3. 臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	①...
	104-110	4. 成功市場改建工程(地下停車場)	①...
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於公有建築工程內。

Table 4 Tunnel Constructions

November 2019

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度	寬度	總面積	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	預定	實際	超前	符合	落後
Length (公尺)	Width (公尺)	Area (平方公尺)				Scheduled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m)	(m)	(m ²)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	-	-	--	--	--	--	--	-	-	1
-	-	-	108.09	109.04		13.78	11.91			√

Source: New Construction Office.

Table 5 Parking Lots Constructions

November 2019

工程內容 Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
總面積	大型車停車位	小型車停車位	機車停車位	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	預定	實際	超前	符合	落後
Area (平方公尺)	(格位)	(格位)	(格位)				Scheduled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m ²)	(sites)	(sites)	(sites)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
76,876	277	951	336	--	--	--	--	--	3	-	1
28,975	277	27	56	106.12	111.07		35.31	37.20	√		
9,328	-	288	-	107.08	110.10		26.08	28.17	√		
22,435	-	267	140	108.07	111.06		3.00	2.00			√
16,138	-	369	140	108.07	112.09		2.11	2.19	√		

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ① The Construction Expense is included in the Public Building project expenditure.

表6 公有建築物工程

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱①	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	NT\$10 000
		總 計	1,935,254
新建工程處 New Construction Office	97-108	1. 北部流行音樂中心興建工程(南基地)	83,528
	104-108	2. 臺北市政府警察局刑事警察大隊辦公大樓新建工程(建築工程)	125,713
	104-108	3. 臺北市政府警察局南港分局南港派出所新建工程(建築工程)	48,308
	105-109	4. 臺北市市立大學圖書館改建工程	52,145
	106-111	5. 臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程	135,285
	100-109	6. 臺北藝術中心接續工程(第二標-昇降設備工程)	5,208
	101-108	7. 臺北市政府警察局士林分局社子派出所新建工程	75,097
	103-111	8. 中山國中綜合大樓新建工程	75,436
	100-109	9. 臺北藝術中心接續工程(第二標)	144,937
	102-110	10. 臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	116,037
	107-110	11. 臺北市政府消防局劍潭分隊重建工程	40,679
	108	12. 「北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)-專案住宅新建工程」修繕工程	500
	106-111	13. 臺北市南港區東新國民小學校舍改建工程	63,586
	107-110	14. 臺北市內湖國小新孝悌樓新建工程	45,194
	108	15. 萬大漁市新增臨時中繼設施(設備)工程	27,478
	103-112	16. 臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	101,625
	104-110	17. 成功市場改建工程	70,123
	97-108	18. 北部流行音樂中心興建工程(北基地零星工程)	2,606
	107-111	19. 臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	164,817
	107-112	20. 臺北市立大安高級工業職業學校新建綜合教學大樓工程(先期拆除暨樹木移植)	②...
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	88下半年-105	21. 代辦臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程	550,800
	107	22. 臺北市文山區景美運動公園南側第一期公共住宅地下連續壁新建工程	4,250
	108	23. 職能發展學院機工大樓及學員宿舍拆除工程	1,903

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①工程名稱如加註(建築工程)或(水電工程)者，係為列表達該細項工程之工期及施工進度，惟工程費仍係代辦該案之總經費(包含建築、水電、空調等細項工程)。

②本項工程工程費包含於共同管道及景觀工程內。

Table 6 Public Building Constructions

November 2019

工程內容 Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
棟數 No. of Buildings (棟) (building)	層數 Storeies		總面積 Area (平方公尺) (m ²)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (case)	符合 Accord (case)	落後 Delay (case)
	地上 Ground (層) (storey)	地下 Under-ground (層) (storey)									
25	--	--	489,441	--	--	--	--	--	14	3	6
4	6	1	24,335	105.04	108.12		95.59	93.83			✓
1	17	5	25,984	105.10	109.07		64.68	64.79	✓		
1	14	3	9,431	106.04	108.12		88.64	90.01	✓		
1	-	-	11,752	106.04	108.10		100.00	99.00			✓
5	5	3	34,228	106.12	111.07		35.31	37.20	✓		
1	-	-	-	107.04	109.11		59.17	60.50	✓		
1	11	3	12,045	107.06	109.11		39.51	38.71			✓
1	4	1	6,413	107.08	110.10		26.08	28.17	✓		
1	-	-	58,658	107.09	109.05		37.50	38.30	✓		
1	4	2	30,288	107.10	110.04		41.80	50.79	✓		
1	10	2	8,608	108.03	110.05		14.49	13.76			✓
-	-	-	-	108.05	108.12		70.00	70.00		✓	
...	4	1	...	108.06	110.10		5.98	5.99	✓		
1	5	1	27,829	108.06	111.10		2.26	3.10	✓		
-	-	-	-	108.07	109.10		61.15	61.15		✓	
2	4	2	25,624	108.07	111.06		3.00	2.00			✓
1	1	5	24,494	108.07	112.09		2.11	2.19	✓		
-	-	-	-	108.08	108.12		89.00	97.00	✓		
1	5	4	34,408	108.09	111.11		0.37	0.75	✓		
-	-	-	-	108.10	109.03		48.24	79.85	✓		
2	-	-	155,346	105.11	111.08		52.30	52.02			✓
-	-	-	-	108.08	108.12	108.11	96.00	100.00	✓		
-	-	-	-	108.10	109.02		35.00	35.00		✓	

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The construction name adding (construction work) or (plumbing/electrical wiring work), is to clearly express this project's construction period and progress. The construction expense is the total funds (including construction, plumbing/electrical wiring, air conditioning and so on.)

②The Construction Expense is included in the Communal Pipeline and Landscape Constructions expenditure.

表7 共同管道及景觀工程

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		總 計	89,226
新建工程處 New Construction Office	104-108	1. 福國路共同管道第二期工程	57,676
	106-108	2. 臺北市共同管道監控整合系統工程	1,852
	108	3. 108年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程 開口契約	3,470
	108	4. 108年度代辦人民申請設置斜坡道施作預約工程	413
	108-109	5. 臺北市台北地下街(原名鄭州路地下街)防災改善工程	21,716
	107-112	6. 臺北市立大安高級工業職業學校新建綜合教學大樓工程(先期 拆除暨樹木移植)	866
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	107	7. 107年度水利處轄管濕地及滯洪池等棲地預約維護工程	906
	108	8. 南港區四分溪四分橋上游周邊設施及環境整建工程	2,326

資料來源：新建工程處、水利工程處。

Table 7 Communal Pipeline and Landscape Constructions

November 2019

工程內容 Construction Project	工期 Project Period			施工進度 Progress				
	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
--	--	--	--	--	--	5	3	-
1.共同管道工程：幹管1,273公尺、支管845公尺、推管78公尺。 2.其他工程：纜線管路等。	106.11	109.12		22.25	24.62	✓		
整合本市目前營運中共同管道（東西向、基隆河截彎取直、南港經貿園區、洲美快速道路、地鐵東延、大度路、捷運信義線及捷運松山線）監控訊號	108.01	109.01		63.13	84.67	✓		
改善本市建築基地內騎樓及沿街面人行空間高低不平	108.05	108.12		68.50	68.50		✓	
108年度代辦人民申請設置斜坡道工程	108.05	108.12		0.00	0.00		✓	
配合防災計畫書審查，針對地下街進行防災設施強化及改善	108.06	109.07		31.41	37.89	✓		
本工程將拆除本市市立大安高級工業職業學校校內勵學樓，並配合拆除工程辦理校內弱電設備遷移及樹木移植工程	108.10	109.03		48.24	79.85	✓		
辦理本市河川濕地及滯洪池棲地生態保育維護工作	107.06	108.12		92.35	92.35		✓	
改善四分橋上游步道、排水等既有設施以及周邊環境景觀工程	108.09	108.12		94.00	99.00	✓		

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

表8 防洪工程
108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	NT\$10 000
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	總 計		170,658
	104	1. 北投士林科技園區區段徵收公共工程-填土整地工程(第2期-T16、T17、T18工區)	29,508
	105	2. 北投士林科技園區區段徵收公共工程-填土整地工程(第2期-T16、T17、T18以外工區)	82,147
	105-107	3. 洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤防新建工程	36,385
	108	4. 108年度南區水利建造物預約維護檢修改善工程	595
	108	5. 108年度沉沙池清疏及維護工程	432
	105-107	6. 北投洲美堤防外灘地整建工程	7,100
	108	7. 108年度全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程	189
	108	8. 108年度西區水利建造物預約維護檢修改善工程	595
	108	9. 108年度東區水利建造物預約維護檢修改善工程	595
	108	10. 108年度淡水河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(淡水河淡1號疏散門至淡5號疏散門段)	121
	108	11. 108年度基隆河系災後淤土、樹木復原維護工程(基隆河右岸高速公路內湖橋上游，內溝、大溝溪及金瑞園區)	121
	108	12. 108年度基隆河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(基隆河左岸高速公路內湖橋至中山橋段)	121
	108	13. 108年度基隆河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(基隆河右岸高速公路內湖橋至雙溪匯流口及雙溪左岸)	121
	108	14. 全市堤防美化工程(第4期)第四標	543
108	15. 社子大橋周邊護岸及環境改善工程	4,130	

Table 8 Flood Protection Constructions
November 2019

工程內容 Construction Project					工期 Project Period			施工進度 Progress				
堤防	護岸	丁壩	閘門	其他	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	預定	實際	超前	符合	落後
Embankment (公尺)	Riverbank Protection (公尺)	Spur Dam (座)	Gate (座)	Others	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	Scheduled (%)	Actual (%)	Lead (case)	Accord (case)	Delay (case)
(m)	(m)	(set)	(set)	Others	Date	Date	Date	(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	-	-	-	-	--	--	--	--	--	5	22	3
北投士林科技園區區段徵收公共工程-填土整地工程(T16、T17、T18工區)					104.10	109.01		93.55	93.61	✓		
北投士林科技園區區段徵收公共工程-填土整地工程(T16、T17、T18以外工區)					107.07	109.09		67.43	67.60	✓		
洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤防新建工程					107.12	109.07		62.17	65.23	✓		
南區水利建造物預約維護檢修改善工程					108.03	108.12		95.00	95.00		✓	
辦理全市公私有泥沙池清疏					108.03	108.12		96.66	96.66		✓	
自行車道、人行道、低水護岸整建、景觀高燈、獨木舟碼頭景觀工程					108.03	109.01		66.40	67.05	✓		
全市河濱公園疏散門及堤頂擋水門等維護檢修工程					108.03	108.12		98.57	98.57		✓	
基隆河：左岸-高速公路內湖橋至社子島頭；右岸-高速公路內湖橋至雙溪匯流口、雙溪：左、右岸、淡水河：台北橋至社子島頭					108.04	108.12		98.00	98.00		✓	
基隆河：左岸-高速公路內湖橋至大坑溪匯流口；右岸-高速公路內湖橋至內溝溪匯流口、內溝溪、大坑溪、四分溪					108.04	108.12		99.15	99.15		✓	
淡水河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(淡水河淡1號疏散門至淡5號疏散門段)					108.04	108.11	108.11	100.00	100.00		✓	
基隆河系災後淤土、樹木復原維護工程(基隆河右岸高速公路內湖橋上游，內溝、大溝溪及金瑞園區)					108.05	108.12		79.00	79.00		✓	
基隆河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(基隆河左岸高速公路內湖橋至中山橋段)					108.05	108.11	108.11	100.00	100.00		✓	
基隆河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(基隆河右岸高速公路內湖橋至雙溪匯流口及雙溪左岸)					108.05	108.11	108.11	100.00	100.00		✓	
堤壁彩繪2,259m ² 、馬賽克6.48m ²					108.07	108.10		100.00	97.00			✓
社子大橋旁龍舟碼頭及周邊護岸改善；社子大橋橋下空間及停車場環境改善					108.07	109.02		49.00	49.00		✓	

表8 防洪工程(續)

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
	108	16. 108年度北區水利建造物預約維護檢修改善工程(第2標)	560
	108	17. 108年度淡水河災後淤、土樹木復原預約維護工程(新店溪永福橋至華中橋段)	121
	108	18. 108年度災後淤土清運預約維護工程	115
	108	19. 108年度淡水河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(新店溪萬板大橋至淡水河淡1號疏散門段)	121
	108	20. 全市堤防美化工程(第4期)第五標	206
	108	21. 108年度基隆河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(基隆河左岸高速公路內湖橋上游段, 含四分溪及大坑溪)	121
	108	22. 磺溪建德橋至福國路兩岸堤防改建工程	5,498
	108	23. 108年度全市河川高灘地災後設施搶修預約維護工程(淡水河、新店溪、景美溪及支流河川)	124
	108	24. 108年度淡水河災後淤土、樹木復原預約維護工程(景美溪北新橋上游段)	121
	108	25. 108年度淡水河災後淤土、樹木復原預約維護工程(景美溪北新橋至永福橋段)	121
	108	26. 108年度基隆河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(基隆河左岸中山橋至洲美大橋段)	121
	108	27. 108年度淡水河災後淤土、樹木復原預約維護工程(淡水河淡5號疏散門至基隆河洲美大橋段)	121
	108	28. 信義區東大排改善工程	609
	108	29. 108年度全市河川高灘地災後設施搶修預約維護工程(基隆河, 含雙溪、關渡水岸公園及支流河川)	124
	108	30. 雙溪橡皮壩護坦及周邊護岸整建工程	3,072

資料來源：水利工程處。

Table 8 Flood Protection Constructions (Cont.)

November 2019

工程內容 Construction Project					工期 Project Period			施工進度 Progress				
堤防	護岸	丁壩	閘門	其他	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	預定	實際	超前	符合	落後
Embankment (公尺)	Riverbank Protection (公尺)	Spur Dam (座)	Gate (座)	Others	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	Scheduled (%)	Actual (%)	Lead (case)	Accord (case)	Delay (case)
基隆河：右岸—雙溪匯流口至淡水河關渡省市交界處；磺溪：左、右岸；磺港溪、貴子坑溪、水磨坑溪					108.08	108.12		88.32	88.32		✓	
108年度淡水河災後淤、土樹木復原預約維護工程(新店溪永福橋至華中橋段)					108.08	108.12		35.00	35.00		✓	
災後淤土清運維護					108.10	108.12		40.00	40.00		✓	
108年度淡水河災後淤土、樹木復原預約維護工程(新店溪華中橋至萬板大橋段)					108.10	108.12		71.86	71.86		✓	
彩繪782m ² 、馬賽克45m ²					108.10	108.12		90.00	65.50			✓
108年度基隆河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(基隆河左岸高速公路內湖橋上游段，含四分溪及大坑溪)					108.10	108.12		31.00	31.00		✓	
磺溪建德橋至福國路兩岸堤防拆除及重建(打設基樁)					108.10	109.05		18.22	38.15	✓		
河川高灘地災後設施搶修					108.10	108.12		35.00	35.00		✓	
108年度淡水河災後淤土、樹木復原預約維護工程(景美溪北新橋上游段)					108.10	108.12		95.00	95.00		✓	
108年度淡水河災後淤土、樹木復原預約維護工程(景美溪北新橋至華中橋段)					108.10	108.12		42.34	42.34		✓	
108年度基隆河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(基隆河左岸中山橋至洲美大橋段)					108.10	108.12		56.00	56.00		✓	
108年度淡水河災後淤土、樹木復原預約維護工程(淡水河淡5號疏散門至基隆河洲美大橋段)					108.10	108.12		20.00	20.00		✓	
兩岸砌石護岸共134m、鄰水欄杆83.7m、生態渠道402m ² 、鋪面更新202m ² 、木百葉格柵牆94.55m ² 、立面彩繪167m ² 、更新人行跨橋1座					108.10	109.01		39.40	30.00			✓
河川高灘地災後設施搶修					108.11	108.12		13.00	13.00		✓	
雙溪橡皮壩護坦打除、打設基樁、整建，並改善周邊護岸					108.11	109.05		0.82	0.82		✓	

Source: Hydraulic Engineering Office

表9 抽水站新建、擴建工程

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費	工程內容		
				抽水機		
				Pump Set		
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense	數量	口徑	抽水量
			(萬元)	Number	caliber	Pumping Capacity
			NT\$10 000	(座)	(吋)	(立方公尺/秒)
		總 計	154,011	-	-	-
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	105-108	1. 抽水站第六分區暨總二管理中心自動化監控系統建置工程	20,860	-	-	-
	105-108	2. 玉成抽水站機組更新工程	76,485	-	-	-
	107	3. 大直二抽水站新建工程	26,540	-	-	-
	108	4. (108)抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程	1,148	-	-	-
	108	5. (108)全市沉水泵吊視檢修工程	439	-	-	-
	108	6. 士林抽水站發電機及抽水機組更新工程	22,130	-	-	-
	108	7. 臺北市雨量站、河川水位站、閘門及疏散門3G升級4G工程	1,199	-	-	-
	108	8. 全市抽水井遠端監視工程	1,474	-	-	-
	108	9. 全市抽水站站房及閘門房結構檢修工程(第2標)	775	-	-	-
	108	10. 北投民族街等4處抽水井設置及排水改善工程	2,000	-	-	-
	108	11. 臺北市大溝溪、大湖、碧湖及南港等4處閘門遠端控制操作改善工程	961	-	-	-

資料來源：水利工程處。

Table 9 Rainwater Pump Station Expansion and New Constructions

November 2019

Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
發電機 Electric Generator		抽水機房 Pump Set Room		開工 日期	預定 完工 日期	實際 完工 日期	預定	實際	超前	符合	落後
數量	馬力	數量	面積				Scheduled	Actual	Lead	Accord	Delay
Number	Horse- power	Number	Area						(件)	(件)	(件)
(座)	(匹)	(座)	(平方 公尺)								
(set)	(hp)	(set)	(m ²)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	-	-	-	--	--	--	--	--	4	4	3
抽水站第六分區暨總二管理中心自動化 監控系統建置工程				105.09	108.07	108.11	100.00	100.00			✓
抽水站機組更新				105.11	108.11	108.11	100.00	100.00			✓
建置大直二抽水站一座，包含抽水站 體、前池5部4cms 豎軸式抽水機組、柴 油引擎、冷卻系統、電動攔污柵、儀控 設備及自動化系統等				107.12	109.04		60.72	55.78			✓
辦理抽水站前池及閘門周邊清疏工程				108.04	108.12		99.99	99.99			✓
沉水泵吊視檢修工程				108.05	108.12		73.71	82.00	✓		
士林抽水站發電機及抽水機組更新工程				108.08	109.07		0.30	0.90	✓		
包含雨量站、河川水位站、閘門及疏散 門等測站升級為4G無線路由器、4G無線 通訊模組及系統配合增修、整體相關功 能運轉測試等				108.09	109.02		59.50	59.50			✓
架設現場PLC控制器及有線或無線傳輸 設備將第四、五、六分區轄管抽水井之 抽水機組設備運轉狀態傳回各分區管理 中心遠端監視				108.09	109.03		23.01	70.00	✓		
本案係為辦理大直、濱江、玉成、劍 潭、福林、奇岩抽水站、高灘地東區管 理站及機電管理站屋頂漏水、鋼筋鏽蝕 及牆面剝落白華問題改善。康樂抽水站 噪音改善				108.10	109.02		15.20	14.10			✓
新建抽水井4座、新設8吋20HP抽水機10 台、控制盤及配電盤各4座				108.11	109.03		3.50	4.00	✓		
增設閘門監控設備、遮雨設施、吊門機 平台，更新單梯桿吊門機、雙梯桿吊門 機、吊門機控制模組、既有閘門監控功 能、既有分區監控主機				108.11	109.05		0.60	0.60			✓

Source: Hydraulic Engineering Office.

表10 雨水下水道新建、改善工程
108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
		總 計	34,371
新建工程處 New Construction Office		新工處主辦工程合計	-
	106-108	1. 福興公園南側道路新築工程	①...
	104-108	2. 福國路延伸工程(第2期)	①...
	107-108	3. 興寧街66巷道路拓寬工程	①...
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		水利處主辦工程合計	34,371
	108	4. (108)雨水下水道人孔調升降工程(北區工區)	818
	108	5. 108年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(南區)	597
	108	6. 108年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(北區)	597
	108	7. (108)雨水下水道人孔調升降工程(南區工區)	1,008
	108	8. (108)雨水下水道人孔調升降工程(北投工區)	659
	108	9. (108)雨水下水道人孔調升降工程(南內工區)	575
	108	10. 108年度雨水下水道預約維護工程(南港、內湖區)	1,373
	108	11. 108年度雨水下水道預約維護工程(北投區)	1,194
	108	12. 108年度雨水下水道預約維護工程(大安、中正區)	1,373
	108	13. 108年度雨水下水道預約維護工程(士林、大同區)	1,373
	108	14. 108年度雨水下水道預約維護工程(中山、松山區)	1,373
	108	15. 108年度雨水下水道預約維護工程(信義區)	597
	108	16. 108年度雨水下水道預約維護工程(文山、萬華區)	1,194
	108	17. (108)雨水下水道人孔調升降緊急搶修工程	766
	108	18. (108)雨水下水道結構修補工程(百齡等11集水區)	2,964
	108	19. 南港高工前等6處側溝更新工程	1,425
	108	20. 108年雨水下水道結構修補預約維護工程(北區)	1,860
	108	21. 康樂街結構修補工程(上游段-125巷至72巷)	1,441
	108	22. 康樂街結構修補工程(下游段-69號至24號)	1,722
	108	23. 小巨蛋周邊排水改善緊急工程	1,305
	108	24. 108年度雨水下水道預約維護工程(大安、中正區)(第二標)	315
	108	25. (108)雨水下水道結構修補預約維護工程(南區)	1,860
	108	26. (108)雨水下水道結構修補預約維護工程(含人孔調升降-南區)	976
	108	27. 代辦大安區大安路1段84巷等4處側溝改善工程	426
	108	28. (108)雨水下水道結構修補預約維護工程(含人孔調升降-北區)	976
	108	29. 雨水下水道結構修補工程(新生等10集水區)	4,597
	108	30. 108年度雨水下水道預約維護工程(信義區)(第二標)	1,010

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

Table 10 New and Improvement Constructions of Rainwater Drainage System
November 2019

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
側溝	箱涵	管涵	開工日期	預定完工日期	實際完工日期	預定	實際	超前	符合	落後
Side Ditch (公尺)	Box Culvet (公尺)	Pipe Culvet (公尺)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	Scheduled (%)	Actual (%)	Lead (件) (case)	Accord (件) (case)	Delay (件) (case)
(m)	(m)	(m)								
860	1,206	-	--	--	--	--	--	4	25	1
860	1,206	-	--	--	--	--	--	2	-	1
92	-	-	107.07	109.01		88.89	93.63	✓		
633	1,206	-	107.11	110.11		8.63	9.66	✓		
135	-	-	108.04	108.09		100.00	60.00			✓
-	-	-	--	--	--	--	--	2	25	-
人孔調升降緊急搶修工程			108.02	108.12		69.00	69.00		✓	
緊急搶修預約維護工程			108.02	108.12		91.50	91.50		✓	
緊急搶修預約維護工程			108.03	108.12		90.00	90.00		✓	
人孔調升降緊急搶修工程			108.03	108.12		92.00	92.00		✓	
人孔調升降緊急搶修工程			108.03	108.11	108.11	100.00	100.00		✓	
人孔調升降緊急搶修工程			108.03	108.12		96.00	96.00		✓	
預約維護工程			108.03	108.12		92.00	92.00		✓	
預約維護工程			108.03	108.12		86.20	86.20		✓	
預約維護工程			108.03	108.12		75.00	75.00		✓	
預約維護工程			108.03	108.12		83.00	83.00		✓	
預約維護工程			108.03	108.12		96.00	96.00		✓	
預約維護工程			108.04	108.12		78.00	78.82	✓		
預約維護工程			108.04	108.12		82.00	82.00		✓	
人孔調升降緊急搶修工程			108.05	108.12		89.00	89.00		✓	
結構修補工程			108.06	109.01		78.00	78.00		✓	
側溝更新工程			108.06	108.11	108.11	100.00	100.00		✓	
結構修補、管線橫越缺失處理			108.07	108.12		78.00	78.00		✓	
結構修補工程			108.07	109.01		42.66	42.66		✓	
結構修補工程			108.07	109.02		39.63	39.63		✓	
辦理民族大排清淤、敦化北路155巷隔間牆打除及補強等			108.08	108.12		83.00	84.00	✓		
預約維護工程			108.09	108.12		38.00	38.00		✓	
結構修補、橫越缺失處理			108.10	108.12		5.50	5.50		✓	
結構修補及配合人孔調升降工程			108.10	109.04		15.05	15.05		✓	
新築側溝：402.6m、新築集水井：6座、新建弱電管路(共構型)：402.6m、道路銑鋪：1,497m ²			108.10	108.12		50.50	50.50		✓	
結構修補及配合人孔調升降工程			108.10	109.04		6.00	6.00		✓	
結構修補工程			108.11	109.11		0.50	0.50		✓	
預約維護工程			108.11	109.06		2.00	2.00		✓	

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the road project expenditure.

表11 公園綠地新建、改善工程

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費	總面積	土木工程						
					廣場	遊戲地坪	園路人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆阻車
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000	Total Area (平方公尺) (m ²)	Plaza (平方公尺) (m ²)	Game Area (平方公尺) (m ²)	Side-walk (平方公尺) (m ²)	Chair (座) (no.)	Arbor (座) (no.)	Flower Shelf (處) (no.)	Baluster Arrestment Car (公尺) (m)
		總計	62,152	47,782	12,718	5,988	6,442	265	2	9	1,210
		公園處主辦工程合計	45,050	47,782	12,718	5,988	6,442	265	2	9	1,210
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office	108	1. 日善(萬華411號)公園新建工程(108-102)	1,360	2,247	733	-	-	39	-	1	-
	107	2. 新新公園新建工程(107-169)	6,788	25,373	1,948	-	449	-	-	2	491
	108	3. 景勤1號(信義415)公園新建工程(108-116)	3,590	6,112	2,573	-	-	16	-	-	-
	107	4. 金杭公園及金山公園新建工程(107-168)	2,378	6,107	952	397	952	-	-	-	-
	108	5. 糶米(信義383號)公園新建工程(108-147)	1,642	1,971	-	203	277	17	-	-	87
	108	6. 辛亥生態(文木91號)公園新建工程(108-151)	9,200	5,972	493	1,071	3,096	22	1	1	169
	108	7. 108年度南港公園管理所轄公園整建工程-南港區、信義區整建工程(108-135)	980	...	-	536	-	39	-	-	-
	107	8. 南港公園更新工程(第二期)(107-097)	7,195	...	425	1,683	800	-	1	-	82
	108	9. 108年度替代役中心分隊辦公室及倉庫整修工程(G-108-156)	55	...							
	108	10. 108年度青年公園管理所轄公園整建工程-大安區公園整建工程(108-145)	513	...	601	-	95	-	-	5	-
	108	11. 108年度南港公園管理所轄公園整建工程-文山區公園整建工程(108-138)	878	...	-	494	-	-	-	-	-

Table 11 Park Improvement and New Constructions
November 2019

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 遊具	體健 設施	球場 (運動 場)	無障 礙 坡道	鋪植 草皮	栽植 樹花木	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度	實際 進度	超前	符合	落後
Gutter (公尺)	Swim- ming Pool (處)	Park Light (座)	Child's Game Tool (座)	Physically Healthy Facility (公尺)	Sta- dium (處)	Barrier- free Ramp (座)	Turfing (平方 公尺)	Planting Trees and Flowers (株)				Sched- uled	Actual	Lead (件)	Ac- cord (件)	Delay (件)
(m)	(lot)	(set)	(set)	(m)	(lot)	(set)	(m ²)	(no.)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
3,121	-	690	105	15	-	3	31,501	96,489	--	--	--	--	--	15	24	3
3,121	-	690	105	15	-	3	31,501	96,489	--	--	--	--	--	13	6	2
131	-	28	-	-	-	-	1,228	850	108.04	108.11	108.11	100.00	100.00			✓
343	-	248	-	-	-	-	8,092	45,590	107.11	108.12		95.63	96.69	✓		
581		196	-	-	-	-	3,534	9,136	108.04	108.12		98.50	96.00			✓
111	-	17	6	1	-	-	1,392	26,970	107.12	108.12		82.31	84.31	✓		
-	-	-	4	2	-	-	410	3,558	108.08	109.03		17.00	27.00	✓		
604	-	39	20	4	-	2	10,609	271	108.08	109.08		12.75	19.00	✓		
-	-	-	12	3	-	-	-	-	108.06	108.12		95.60	95.60			✓
853	-	110	15	-	-	-	2,189	3,874	107.04	108.12		97.50	97.74	✓		
									108.11	108.12		90.00	93.00	✓		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.08	108.12		51.12	55.85	✓		
-	-	-	4	-	-	-	-	-	108.07	108.12		66.20	66.20			✓

表11 公園綠地新建、改善工程 (續1)

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費	總面積	土木工程						
					廣場	遊戲地坪	園路人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆阻車
Sponsor	Budget Year	Construction Name	NT\$10 000	Total Area (m ²)	Plaza (m ²)	Game Area (m ²)	Side-walk (m ²)	Chair (座)	Arbor (座)	Flower Shelf (處)	Baluster Arrestment Car (公尺)
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office	108	12. 興隆公園更新工程(108-113)	2,289	...	1,537	295	-	36	-	-	-
	108	13. 明美公園增設雨水回收再利用系統統包工程案(108-152)	798	...							
	108	14. 108年度陽明山公園管理所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程(108-124)	928	...	1,521	200	-	15	-	-	-
	108	15. 108年度轄管公園公廁改善工程(108-149)	642	...	-	-	-	-	-	-	-
	108	16. 108年度園藝管理所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(108-131)	1,056	...	269	221	454	76	-	-	310
	108	17. 108年度青年公園管理所轄公園整建工程-中正區、萬華區公園整建工程(108-148)	417	...	789	104	-	-	-	-	-
	108	18. 108年度花卉試驗中心所轄公園整建工程(108-144)	1,227	...	-	294	-	2	-	-	-
	108	19. 108年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(108-103)	2,383	...	-	-	319	-	-	-	-
	108	20. 108年大豐及蘭雅公園兒童遊戲場修繕統包工程(108-153)	62	...	-	490	-	-	-	-	-
	108	21. 108年度圓山公園管理所轄公園整建工程-中山區、松山區、大同區公園整建工程(108-132)	670	...	878	-	-	3	-	-	71

Table 11 Park Improvement and New Constructions (Cont. 1)

November 2019

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 遊具	體健 設施	球場 (運動 場)	無障 礙 坡道	鋪植 草皮	栽植 樹花木	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度	實際 進度	超前	符合	落後
Gutter (公尺)	Swim- ming Pool (處)	Park Light (座)	Child's Game Tool (座)	Physically Healthy Facility (公尺)	Stadi- um (處)	Barrier- free Ramp (座)	Turfing (平方 公尺)	Planting Trees and Flowers (株)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	Sched- uled (%)	Actual (%)	Lead (件)	Ac- cord (件)	Delay (件)
(m)	(lot)	(set)	(set)	(m)	(lot)	(set)	(m ²)	(no.)				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
230	-	52	-	-	-	-	2,547	240	108.04	108.12		70.62	71.07	✓		
16							1,500	6,000	108.10	108.12		66.70	98.97	✓		
-	-	-	8	2	-	-	-	-	108.05	108.12		94.50	94.92	✓		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.08	109.01		80.17	80.79	✓		
-	-	-	5	-	-	-	-	-	108.05	109.01		68.08	80.77	✓		
75	-	-	-	2	-	-	-	-	108.08	109.01		89.45	86.45			✓
161	-	-	7	-	-	-	-	-	108.08	109.02		50.00	50.00			✓
-	-	-	20	1	-	1	-	-	108.09	109.02		20.00	21.00	✓		
-	-	-	4	-	-	-	-	-	108.10	109.03		9.90	9.90			✓
15	-	-	-	-	-	-	-	-	108.05	109.03		51.91	51.91			✓

表11 公園綠地新建、改善工程 (續2)

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費	總面積	土木工程						
					廣場	遊戲地坪	園路人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆阻車
			Construction Expense (萬元)	Total Area (平方公尺)	Plaza (平方公尺)	Game Area (平方公尺)	Side-walk (平方公尺)	Chair (座)	Arbor (座)	Flower Shelf (處)	Baluster Arrestment Car (公尺)
Sponsor	Budget Year	Construction Name	NT\$10 000	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(no.)	(no.)	(no.)	(m)
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		水利處主辦工程合計	17,103	-	-	-	-	-	-	-	-
	107	22. 107年度全市河濱公園水電設施預約維護工程	574	...	-	-	-	-	-	-	-
	108	23. 108年度全市河濱公園綠化預約維護工程(1)	800	...	-	-	-	-	-	-	-
	108	24. 108年度基隆河美堤河濱公園颱風豪雨碼頭、廁所等設施撤離工程	203	...	-	-	-	-	-	-	-
	108	25. 108年度北區河濱公園土木預約維護工程	670	...	-	-	-	-	-	-	-
	108	26. 108年度東區河濱公園土木預約維護工程	670	...	-	-	-	-	-	-	-
	108	27. 108年度東區河濱公園路面整建預約維護工程	658	...	-	-	-	-	-	-	-
	108	28. 108年度南區河濱公園土木預約維護工程	670	...	-	-	-	-	-	-	-
	108	29. 全市河濱公園褐根病防治及其他病蟲害防治工程	144	...	-	-	-	-	-	-	-
	108	30. 108年度淡水河系河濱公園颱風豪雨碼頭、廁所等設施撤離工程	338	...	-	-	-	-	-	-	-
	108	31. 108年度全市河濱公園自行車道等跨排放水路橋改善工程	1,238	...	-	-	-	-	-	-	-

Table 11 Park Improvement and New Constructions (Cont. 2)

November 2019

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 遊具	體健 設施	球場 (運動 場)	無障 礙 坡道	鋪植 草皮	栽植 樹花木	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度	實際 進度	超前	符合	落後
Gutter (公尺)	Swim- ming Pool (處)	Park Light (座)	Child's Game Tool (座)	Physically Healthy Facility (公尺)	Stadi- um (處)	Barrier- free Ramp (座)	Turfing (平方 公尺)	Planting Trees and Flowers (株)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	Sche- duled (%)	Actual (%)	Lead (件)	Ac- cord (件)	Delay (件)
(m)	(lot)	(set)	(set)	(m)	(lot)	(set)	(m ²)	(no.)				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--	2	18	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.05	108.12		98.61	98.61		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		68.98	68.98		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.11	108.11	100.00	100.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		97.00	97.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		80.50	80.50		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		83.00	83.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.11	108.11	100.00	100.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		88.20	88.20		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.05	108.12		99.00	99.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.05	108.11		100.00	90.00			✓

表11 公園綠地新建、改善工程 (續3完)

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費	總面積	土木工程							
					廣場	遊戲地坪	園路人行道	座椅	涼亭	花架	欄杆阻車	
Sponsor	Budget Year	Construction Name	NT\$10 000	Total Area (平方公尺)	Plaza (平方公尺)	Game Area (平方公尺)	Side-walk (平方公尺)	Chair (座)	Arbor (座)	Flower Shelf (處)	Baluster Arrestment Car (公尺)	
				(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(no.)	(no.)	(no.)	(m)	
	108	32. 108年度全市河濱公園花海工程	1,053	...	-	-	-	-	-	-	-	
	108	33. 全市河濱公園橋下休憩區整體改造工程	558	...	-	-	-	-	-	-	-	
	108	34. 南湖右岸河濱公園自行車道動線改善工程	1,085	...	-	-	-	-	-	-	-	
	108	35. 大佳河濱公園共融式遊戲場(第3期)整建工程	2,320	...	-	-	-	-	-	-	-	
	108	36. 108年度基隆河大佳河濱公園颱風豪雨碼頭、廁所等設施撤離工程	96	...	-	-	-	-	-	-	-	
	108	37. 108年度基隆河成美左岸河濱公園颱風豪雨碼頭、廁所等設施撤離工程	222	...	-	-	-	-	-	-	-	
	108	38. 108年河濱公園高灘地積土清除工程	2,433	...	-	-	-	-	-	-	-	
	108	39. 108年度全市河濱公園土木預約維護工程	741	...	-	-	-	-	-	-	-	
	108	40. 全市河濱公園跨排水路橋路面及周邊設施改善工程	1,526	...	-	-	-	-	-	-	-	
	108	41. 108年度全市河濱公園路面整建預約維護工程	770	...	-	-	-	-	-	-	-	
	107	42. 108年度全市河濱公園水電設施預約維護工程	335	...	-	-	-	-	-	-	-	

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

Table 11 Park Improvement and New Constructions (Cont. 3 End)

November 2019

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水 溝	游泳 池	園燈	兒童 遊具	體健 設施	球場 (運動 場)	無障 礙 坡道	鋪植 草皮	栽植 樹花木	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定 進度	實際 進度	超前	符合	落後
Gutter (公尺)	Swim- ming Pool (處)	Park Light (座)	Child's Game Tool (座)	Physically Healthy Facility (公尺)	Sta- dium (處)	Barrier- free Ramp (座)	Turfing (平方 公尺)	Planting Trees and Flowers (株)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	Sche- duled (%)	Actual (%)	Lead (件)	Ac- cord (件)	Delay (件)
(m)	(lot)	(set)	(set)	(m)	(lot)	(set)	(m ²)	(no.)				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.06	108.12		91.87	91.87		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.07	108.12		92.00	92.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.07	108.11	108.11	100.00	100.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.08	109.01		65.50	70.00	✓		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.08	108.11	108.11	100.00	100.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.08	108.11	108.11	100.00	100.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.09	108.12		73.11	95.00	✓		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.10	108.12		17.30	17.30		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.11	108.12		29.00	29.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.11	109.01		45.00	45.00		✓	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.11	109.03		69.25	69.25		✓	

Source: Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office.

表12 污水下水道新建、改善工程

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		總 計	45,503
	105-108	1. 106年度中山區中山北路2段及林森北路附近地區污水接管工程	4,392
	105-108	2. 第5期大安及文山區分管網工程(107年預約工程)	2,770
	105-108	3. 第5期北投及士林區分管網工程(107年預約工程)	4,641
	105-108	4. 第5期松山信義及南港內湖區分管網工程(107年預約工程)	2,795
	105-108	5. 第5期萬華中正及大同中山區分管網工程(107年預約工程)	4,215
	105-108	6. 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程)	2,322
	105-108	7. 106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程	16,120
	105-108	8. 第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程)	3,057
	107	9. 107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程	1,250
	107	10. 107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程	1,250
	107	11. 107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程	1,250
108	12. 代辦臺北市職能發展學院「衛生下水道納管工程」	1,442	

資料來源：衛生下水道工程處。

Table 12 Sewerage System Improvement and New Constructions

November 2019

工程內容 Construction Project							工期 Project Period			施工進度 Progress				
主幹管	次幹管	分支管	抽揚 水站	人孔	清除 孔	截流 設施	開工 日期	預定完 工日期	實際完 工日期	預定	實際	超前	符合	落後
Trunk	Sub- Trunk	Branch Pipeline	Pumping Station (座)	Man- hole (座)	Cleanout (座)	Interception Facilities (個)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	Scheduled (%)	Actual (%)	Lead (件) (case)	Ac- cord (件) (case)	Delay (件) (case)
(m)	(m)	(m)	(no.)	(no.)	(no.)	(no.)	Date	Date	Date	(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	-	7,152	-	186	60	-	--	--	--	--	--	1	11	-
		1,897		17			107.01	108.11	108.11	100.00	100.00		✓	
							107.04	108.12		95.77	95.77		✓	
							107.04	108.12		68.81	68.81		✓	
							107.05	108.12		83.51	83.51		✓	
							107.03	108.12		66.00	66.00		✓	
							107.03	108.11		100.00	100.00		✓	
		4,385		132			106.09	109.04		81.50	82.41	✓		
							107.03	108.12		90.00	90.00		✓	
							107.06	108.12		91.84	91.84		✓	
							107.05	108.12		95.30	95.30		✓	
							107.06	108.12		91.18	91.18		✓	
		870		37	60		108.05	108.11		100.00	100.00		✓	

Source: Sewerage Systems Office.

表13 治山防災整體治理工程

108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費	工程內容			
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防
			Construction Expense (萬元)	Against Granulated Substance Dam (座)	Submerged Dam (座)	Spur Dam (座)	Embankment (公尺)
Sponsor	Budget Year	Construction Name	NT\$10 000	(set)	(set)	(set)	(m)
大地工程處 Geotechnical Engineering Office		總計	44,149	-	-	-	-
	108	1. 108年度臺北市山坡地邊坡(南區)暨農業環境維護預約式工程	4,522				鑽孔260M、排水溝35M、擋土牆40M、木棧道10M、欄杆10M、鋼構36M、護欄50M、鋼軌480M、木平台40M ²
	108	2. 108年度臺北市山坡地邊坡改善與設施維護工程	2,820				RC駁坎+L型溝298.6M、L型溝149.1M、梯形溝113M、排水孔321孔、消能式防落石網8座、集水井8座計190M
	108	3. 108年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落緊急水土保持工程	1,442				擋土牆約12.5m、矩形暗溝約31.8m、掛網噴漿100m ²
	108	4. 108年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)	2,238	-	-	-	-
	108	5. 108年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區)	2,038	-	-	-	-
	108	6. 107年度山區道路AC路面銑鋪及改善維護預約式工程	4,800	-	-	-	-
	108	7. 108年度臺北市山區道路緊急處理工程(北投及信義區)	4,870	-	-	-	-
	108	8. 108年度臺北市山區道路緊急處理工程(內湖區)	2,980	-	-	-	-
	108	9. 108年度臺北市山區道路緊急處理工程(大安及文山區)	3,435	-	-	-	-

Table 13 Watershed Management and Disaster Prevention

November 2019

Construction Project							工期 Project Period			施工進度 Progress				
整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 控制	崩塌地 處理	植生 綠美化	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定	實際	超前	符合	落後
Rectifi- cation (公尺)	Groundsill Works (座)	Riverbank Protection (公尺)	Fish Way (座)	Gully Control (公尺)	Protec- tion for collapse (公頃)	Greening Beautifi- cation (平方 公尺)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	Sche- duled (%)	Actual (%)	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(m)	(set)	(m)	(set)	(m)	(hectare)	(m ²)	Date	Date	Date	(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	20	163	-	-	-	153	--	--	--	--	--	14	2	-
-	2	20	-	-	-	-	108.04	108.12		93.45	99.97	✓		
-	-	-	-	-	-	-	108.06	108.12		77.80	80.50	✓		
-	-	-	-	-	-	153	108.04	108.12		82.58	88.42	✓		
-	-	15	-	-	-	-	108.03	108.12		84.28	96.10	✓		
-	18	128	-	-	-	-	108.03	108.12		80.12	96.13	✓		
工區01-文山區木柵路五段43巷							108.02	108.12	108.11	94.57	100.00	✓		
工區9-平溪產業道路(0+800~1+800)														
人車分道，塊狀護欄							108.04	108.11	108.11	100.00	100.00		✓	
							108.04	108.12	108.11	95.00	100.00	✓		
瀝青混凝土鋪築							108.04	108.12		93.36	98.70	✓		

表13 治山防災整體治理工程（續）
108年11月

主辦工程機關	預算年度	工程名稱	工程費	工程內容			
				防砂壩	潛壩	丁壩	堤防
Sponsor	Budget Year	Construction Name	Construction Expense (萬元) NT\$10 000	Against Granulated Substance Dam (座) (set)	Sub-merged Dam (座) (set)	Spur Dam (座) (set)	Embankment (公尺) (m)
	108	10. 108年度臺北市山區道路緊急處理工程 (士林及南港區)	3,150	-	-	-	-
	108	11. 108年度4m以下山區道路AC路面銑鋪及 改善維護預約式工程	2,926	-	-	-	-
	108	12. 108年度臺北市北區登山步道維護更新 預約式工程	1,338	-	-	-	-
	108	13. 108年度臺北市南區登山步道維護更新 預約式工程	1,688	-	-	-	-
	108	14. 108年度登山步道周邊改善工程	2,556	-	-	-	-
	108	15. 108年度休閒遊憩設施緊急處理預約式 工程	2,697	-	-	-	-
	108	16. 108年度坡地休閒遊憩場域維護工程	649	-	-	-	-

資料來源：大地工程處。

Table 13 Watershed Management and Disaster Prevention (Cont.)

November 2019

Construction Project							工期 Project Period			施工進度 Progress					
整流	固床工	護岸	魚道	蝕溝 控制	崩塌地 處理	植生 綠美化	開工 日期	預定 完工	實際 完工	預定	實際	超前	符合	落後	
Rectifi- cation (公尺)	Groundsill Works (座)	Riverbank Protection (公尺)	Fish Way (座)	Gully Control (公尺)	Protec- tion for collapse (公頃)	Greening Beautifi- cation (平方 公尺)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	Sche- duled (%)	Actual (%)	Lead (case)	Accord (case)	Delay (case)	
(m)	(set)	(m)	(set)	(m)	(hectare)	(m ²)				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)	
AC鋪設、鋼軌微型樁、紐澤西護欄、造型護欄、仿燒山欄杆、不銹鋼欄杆、市容查報							108.04	108.12		81.80	97.40	✓			
單一案件施作							108.05	108.12	108.11	75.00	100.00	✓			
登山步道、休憩平台、扶手欄杆							108.04	108.12		92.00	96.66	✓			
登山步道、休憩平台、扶手欄杆							108.04	108.12		93.81	99.90	✓			
登山步道、休憩平台、扶手欄杆							108.06	109.04		23.33	24.98	✓			
露營場、風景區及轄管休閒場域等設施平時維護及緊急修復，包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、路燈修繕、木平台木椅修繕、樹洞拓寬、木棧道上警示黃漆、廢棄水管移除、設置緊急標誌等							108.04	108.12		67.00	83.67	✓			
圓山風景區、內溝溪生態展示館、內雙溪自然中心之設施維護，包含入口意象、平台、木棧道、涼亭及欄杆除鏽護漆等，另有改善公廁1處。							108.06	108.11	108.11	100.00	100.00		✓		

Source: Geotechnical Engineering Office.

表14 污水下水道用戶接管概況

年(月)別	當年(月)污水處理戶數(戶)			
	No. of Households Served by Wastewater Collection in Each Year (Month) (no.)			
	總計	公共污水下水道 門牌用戶接管戶數	建築物自設專用污 水下水道設置戶數	建築物自設污水處理 設施設置戶數
Year (Month)	Grand Total	Public Sanitary Sewers	Specific Sanitary Sewers	Households with Building Sewage Processing Facilities
民國 91 年 2002	41 852	37 885	1 478	2,489
民國 92 年 2003	34 718	31 928	1 684	1 106
民國 93 年 2004	39 930	37 991	1 081	858
民國 94 年 2005	47 585	44 936	1 251	1 398
民國 95 年 2006	29 132	25 798	1 224	2 110
民國 96 年 2007	34 430	32 513	-960	2 877
民國 97 年 2008	42 775	40 010	1 172	1 593
民國 98 年 2009	34 635	33 300	216	1 119
民國 99 年 2010	41 663	40 902	163	598
民國 100 年 2011	31 993	31 237	3	753
民國 101 年 2012	31 442	30 822	1	619
民國 102 年 2013	24 543	24 145	2	396
民國 103 年 2014	21 825	21 638	-	187
民國 104 年 2015	12 391	12 265	-	126
民國 105 年 2016	10 584	10 475	-	109
民國 106 年 2017	10 468	10 357	-	111
民國 107 年 2018	12 564	12 528	-	36
11月 Nov.	602	601	-	1
12月 Dec.	844	843	-	1
民國 108 年 2019				
1月 Jan.	515	515	-1	1
2月 Feb.	418	418	-	-
3月 Mar.	656	655	-	1
4月 Apr.	575	572	-	3
5月 May	826	818	-	8
6月 June	512	437	-	75
7月 July	1 853	1 852	-	1
8月 Aug.	420	419	-	1
9月 Sep.	1 028	1 434	-281	-125
10月 Oct.	938	937	-	1
11月 Nov.	1 056	1 053	-	3

資料來源：衛生下水道工程處。

說明：(1)污水處理率=累計污水處理戶數×戶量/人口數×100，103年以前戶量以4計算。自99年起比率超過100%者，以100%表示。

(2)門牌戶數接管普及率 $g=b/d \times 100$ ，108年4月以前 $g=(b+c)/d \times 100$ 。

(3)96年、108年清查資料，扣除專用污水下水道重複列計者，致用戶數為負值或減少。

Table 14 Overview of Household Sewerage System Connections

截至當年(月)底累計污水處理戶數 (戶) Accumulated No. of Households Served by Wastewater Collection (no.)				門牌 總戶數 No. of Doorplates (戶) (no.) d	污水處理率 Percentage of Population Served by Wastewater Collection (%) e	門牌戶數 接管普及率 Doorplate Sewer Connection Rate (%) g
總計 Grend Total a	公共污水下水道 門牌用戶接管戶數 Public Sanitary Sewers b	建築物自設專用污水 下水道設置戶數 Special Sanitary Sewers c	建築物自設污水處理 設施設置戶數 Households with Building Sewage Processing Facilities			
412,745	383,828	22 869	6 048	943 876	62.49	43.09
447 463	415 756	24 553	7 154	981 847	68.13	44.84
487 393	453 747	25 634	8 012	988 693	74.34	48.49
534 978	498 683	26 885	9 410	987 274	81.79	53.23
564 110	524 481	28 109	11 520	987 274	85.72	55.97
598 540	556 994	27 149	14 397	1 033 315	91.06	56.53
641 315	597 004	28 321	15 990	1 035 299	97.80	60.40
675 950	630 304	28 537	17 109	1 062 320	103.70	62.02
717 613	671 206	28 700	17 707	1 068 561	100.00	65.50
749 606	702 443	28 703	18 460	1 076 178	100.00	67.94
781 048	733 265	28 704	19 079	1 082 773	100.00	70.37
805 591	757 410	28 706	19 475	1 087 747	100.00	72.27
827 416	779 048	28 706	19 662	1 094 032	100.00	73.83
839 807	791 313	28 706	19 788	1 099 882	80.42	74.56
850 391	801 788	28 706	19 897	1 104 774	81.07	75.17
860 859	812 145	28 706	20 008	1 111 127	81.81	75.68
873 423	824 673	28 706	20 044	1 114 906	82.81	76.54
872 579	823 830	28 706	20 043	1 114 598	82.69	76.49
873 423	824 673	28 706	20 044	1 114 906	82.81	76.54
873 938	825 188	28 705	20 045	1 115 348	82.58	76.56
874 356	825 606	28 705	20 045	1 115 735	82.68	76.57
875 012	826 261	28 705	20 046	1 116 384	82.79	76.58
875 587	826 833	28 705	20 049	1 116 464	82.91	76.63
894 116	880 398	3 755	9 963	1 116 991	84.41	78.82
894 628	880 835	3 755	10 038	1 116 921	84.49	78.86
896 481	882 687	3 755	10 039	1 116 696	84.78	79.04
896 901	883 106	3 755	10 040	1 116 879	84.61	79.07
897 929	884 540	3 474	9 915	1 117 213	84.46	79.17
898 867	885 477	3 474	9 916	1 117 746	84.58	79.22
899 923	886 530	3 474	9 919	1 117 834	84.71	79.31

Source: Sewerage Systems Office.

Explanation: 1. Percentage of Population Served by Wastewater Collection = Accumulated No. of Households Served by Wastewater Collection × Household Mean Size / Population × 100. Before 2014, Household Mean Size was 4. From 2010 onward, the figures exceeding 100% were showed 100%.

2. Doorplate Sewer Connection Rate $g = b/d \times 100$. Before April 2019, $g = (b+c)/d \times 100$.

3. In 2007 and 2019, repeated calculation numbers were deducted from the number of Special Sanitary Sewer connected households, which results a negative number or a decrease in the amount.

表15 公園綠地

單位：處、平方公尺

年底及區別 End of Year & District				公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、河濱公園、線形公園處數、面積					
				總計 Grand Total		公 園 Parks		綠 地 Green Fields	
				處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area
民國 87 年 底	End of 1998	660	11 375 178	452	6 398 546	156	497 422		
民國 88 年 底	End of 1999	683	11 765 710	463	6 628 170	168	653 065		
民國 89 年 底	End of 2000	702	12 201 274	470	6 746 291	174	690 698		
民國 90 年 底	End of 2001	726	12 643 384	484	7 144 069	184	729 714		
民國 91 年 底	End of 2002	745	12 723 060	496	7 210 701	188	733 779		
民國 92 年 底	End of 2003	757	12 773 055	504	7 237 804	191	743 565		
民國 93 年 底	End of 2004	765	12 983 800	512	7 362 764	188	712 630		
民國 94 年 底	End of 2005	773	13 098 871	518	7 421 787	190	711 236		
民國 95 年 底	End of 2006	784	13 246 975	524	7 522 538	192	712 296		
民國 96 年 底	End of 2007	794	13 441 988	531	7 682 047	192	712 796		
民國 97 年 底	End of 2008	804	13 525 134	536	7 773 009	195	690 415		
民國 98 年 底	End of 2009	813	13 508 871	542	7 772 495	198	673 026		
民國 99 年 底	End of 2010	821	13 529 929	547	7 782 650	200	683 749		
民國 100 年 底	End of 2011	833	13 643 094	551	7 898 079	206	676 185		
民國 101 年 底	End of 2012	838	13 667 760	556	7 932 743	206	668 463		
民國 102 年 底	End of 2013	843	13 687 731	564	7 955 002	203	666 175		
民國 103 年 底	End of 2014	851	13 748 610	569	8 000 077	205	680 430		
民國 104 年 底	End of 2015	857	13 805 960	573	8 062 480	206	674 507		
民國 105 年 底	End of 2016	861	14 329 914	576	8 582 016	207	678 257		
民國 106 年 底	End of 2017	871	14 352 093	581	8 586 192	211	684 639		
民國 107 年 底	End of 2018	930	15 440 822	601	9 422 086	212	682 141		
民國 108 年 6 月 底	End of June 2019	932	15 466 861	603	9 445 824	212	680 150		
松山區	SongShan	52	1 057 900	46	180 411	3	4 464		
信義區	XinYi	84	545 448	54	414 730	20	43 122		
大安區	DaAn	67	596 367	61	587 683	6	8 684		
中山區	ZhongShan	98	1 704 149	70	764 668	23	39 419		
中正區	ZhongZheng	30	886 073	19	567 224	2	20 720		
大同區	DaTong	33	238 010	20	126 974	4	4 681		
萬華區	WanHua	38	1 396 800	29	302 048	2	2 012		
文山區	WenShan	98	2 998 987	78	2 463 524	16	22 610		
南港區	NanGang	60	804 994	36	633 713	14	67 413		
內湖區	NeiHu	100	1 449 727	82	907 804	11	58 732		
士林區	ShiLin	104	1 498 178	42	774 828	44	138 358		
北投區	BeiTou	162	2 251 364	66	1 722 217	67	269 935		
跨區域	Others	6	38 864	-	-	-	-		

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

Table 15 Parks and Green Fields

Parks, Green Fields, Sport Spots for Children, Plaza, Riverside Parks & Linear Parks								Unit: number; m ²
兒童遊樂場 Sport Spots for Children		廣場 Plaza		河濱公園 Riverside Parks		線形公園 Linear Parks		平均每一市民 享有公園綠地面積
處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	Per Capita Area of Parks and Green Fields
11	15 552	19	128 708	22	4 334 950	-	-	4.31
11	15 552	19	128 501	22	4 340 422	-	-	4.45
11	15 552	23	141 777	24	4 606 956	-	-	4.61
11	15 874	23	146 771	24	4 606 956	-	-	4.80
11	15 874	26	155 750	24	4 606 956	-	-	4.82
11	15 874	26	157 156	25	4 618 656	-	-	4.86
11	15 874	29	174 980	25	4 717 552	-	-	4.95
11	16 030	29	152 429	25	4 797 389	-	-	5.01
11	16 030	29	152 382	28	4 843 729	-	-	5.03
11	16 030	32	173 641	28	4 857 474	-	-	5.11
11	16 030	34	188 206	28	4 857 474	-	-	5.16
10	15 080	35	190 796	28	4 857 474	-	-	5.18
10	15 080	36	190 976	28	4 857 474	-	-	5.17
10	15 080	38	196 276	28	4 857 474	-	-	5.15
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	-	-	5.11
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	-	-	5.09
10	15 080	39	195 549	28	4 857 474	-	-	5.09
10	15 080	40	196 419	28	4 857 474	-	-	5.10
10	15 082	40	197 085	28	4 857 474	-	-	5.32
10	15 082	41	208 706	28	4 857 474	-	-	5.35
8	13 612	44	212 828	28	4 857 474	37	252 681	5.79
8	13 612	44	217 120	28	4 857 474	37	252 681	5.82
-	-	1	864	2	872 161	-	-	5.15
-	-	10	87 596	-	-	-	-	2.46
-	-	-	-	-	-	-	-	1.93
-	-	2	4 529	3	895 533	-	-	7.46
-	-	8	64 623	1	233 506	-	-	5.59
-	-	8	12 005	1	94 350	-	-	1.87
-	-	2	15 060	5	1 077 680	-	-	7.42
-	-	-	-	4	512 853	-	-	10.98
6	11 927	2	3 941	2	88 000	-	-	6.66
-	-	4	5 489	3	477 702	-	-	5.06
1	908	4	10 570	5	523 789	8	49 725	5.25
1	777	3	12 443	2	81 900	23	164 092	8.85
-	-	-	-	-	-	6	38 864	...

Source: Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office.

表16 現有路燈盞數
Table 16 Number of Street Lights

單位：盞							Unit : set
年(月)底別	總計	複金屬燈 (含水銀燈)	鈉光燈	日光燈	LED燈	其他	
End of Year(Month)	Grand Total	Metal Halide Light (Include Mercury Vapour Light)	Sodium Light	Fluorescent Light	LED Light	Others	
民國 91 年底	End of 2002	124 493	84 458	32 435	7 598	-	2
民國 92 年底	End of 2003	131 044	73 680	48 415	8 865	-	84
民國 93 年底	End of 2004	134 828	75 006	50 075	9 204	55	488
民國 94 年底	End of 2005	135 823	75 273	50 816	9 188	58	488
民國 95 年底	End of 2006	140 320	76 095	54 320	9 469	58	378
民國 96 年底	End of 2007	143 345	76 470	55 929	10 102	724	120
民國 97 年底	End of 2008	144 145	79 085	53 394	8 212	1 250	2 204
民國 98 年底	End of 2009	145 508	79 758	54 123	8 230	1 285	2 112
民國 99 年底	End of 2010	146 791	80 198	54 966	8 230	1 285	2 112
民國 100 年底	End of 2011	148 213	80 931	55 716	8 169	1 285	2 112
民國 101 年底	End of 2012	149 535	76 803	56 049	8 066	1 897	6 720
民國 102 年底	End of 2013	151 248	38 647	61 997	7 196	41 452	1 956
民國 103 年底	End of 2014	154 305	11 328	61 859	7 899	70 400	2 819
民國 104 年底	End of 2015	155 501	10 148	61 845	7 846	73 323	2 339
民國 105 年底	End of 2016	157 696	6 836	60 898	7 587	80 036	2 339
民國 106 年底	End of 2017	159 546	4 948	56 808	7 587	87 864	2 339
民國 107 年底	End of 2018	162 834	5 168	32 209	7 869	114 921	2 667
11月底	End of Nov.	161 762	5 168	36 074	7 869	110 004	2 647
12月底	End of Dec.	162 834	5 168	32 209	7 869	114 921	2 667
民國108年	2019						
1月底	End of Jan.	162 834	5 168	32 209	7 869	114 921	2 667
2月底	End of Feb.	163 458	5 168	29 759	7 869	117 995	2 667
3月底	End of Mar.	163 458	5 168	29 759	7 869	117 995	2 667
4月底	End of Apr.	163 458	5 168	29 759	7 869	117 995	2 667
5月底	End of May	163 458	5 168	29 759	7 869	117 995	2 667
6月底	End of June	163 458	3 172	26 557	7 869	123 193	2 667
7月底	End of July	163 458	3 172	23 283	7 869	126 467	2 667
8月底	End of Aug.	163 458	3 172	23 283	7 869	126 467	2 667
9月底	End of Sep.	163 458	3 172	23 283	7 869	126 467	2 667
10月底	End of Oct.	163 688	3 172	19 560	7 355	130 934	2 667
11月底	End of Nov.	164 143	2 749	10 164	5 796	143 143	2 291
108年11月底較上年同期增減% Annual Change Rate(%)		1.47	- 46.81	- 71.82	- 26.34	30.13	- 13.45

資料來源：公園路燈工程管理處。

說明：1.本表以台灣電力公司供電之盞數計列。

2.97年起路燈種類重新歸類計算，無法銜接。

Explanation: 1.This table is calculated based on lamps powered by Taiwan Power Company.

2.Street lights were reclassified since 2008, figures are not directly comparable to previous years.

表17 登山步道

108年11月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	總長(公尺) Length (m)
總計		135 條	104 310
信義區小計		23 條	12 470
(XY-01)	虎山溪步道	慈惠堂→真光禪寺→復興園	950
(XY-02)	虎山山腰步道	復興園→山神廟叉路	527
(XY-03)	虎山自然步道	慈惠堂→山神廟→南港山稜線叉路口	1 100
(XY-04)	虎山生態步道	虎山400m涼亭→王家土雞城叉路口	480
(XY-05)	虎山復興園步道	復興園→瑤池宮	580
(XY-06)	美的世界社區步道	瑤池宮→松山路673號美的世界社區(增長180m)	500
(XY-07)	虎山120高地步道	福德街221巷→虎山120高地	238
(XY-08)	虎山峰下方步道	福德街221巷→虎山峰下涼亭	157
(XY-09)	虎山峰前方步道	福德街221巷→虎山峰前涼亭	220
(XY-10)	虎山奉天宮步道	奉天宮→松山路679-1號	890
(XY-11)	虎山吉福宮步道	福德街51巷→虎山120高地	509
(XY-12)	吉福宮叉路步道	吉福宮上方右叉路→涼亭右轉下福德街51巷	322
(XY-13)	象山北星寶宮步道	靈雲宮→山頂→北星寶宮叉路	824
(XY-14)	天寶聖道宮步道	北星寶宮→天寶聖道宮	408
(XY-15)	姆指山步道	姆指山登山口→北星寶宮	1 355
(XY-16)	北台慈惠堂步道	北台慈惠堂→南港山親山步道三叉路	150
(XY-17)	永春崗顏子廟步道	永春崗公園→顏子廟	220
(XY-18)	象山永春崗步道	松山路650巷超市旁→象山頂前南港山叉路口(含入口意象範圍)	850
(XY-19)	象山一線天步道	象山990m巨石叉路→一線天→75m叉路口	822
(XY-20)	市立療養院步道	療養院→稜線(象山親山460m)(含入口意象範圍)	233
(XY-21)	象山自然步道	市療羽球場→象山煙火平台	400
(XY-22)	石泉巖步道	石泉巖→中正巖	289
(XY-23)	糶米古道	吳興街600巷→極樂公墓	446
中山區小計		2 條	2 274
(CS-01)	復興電台線步道	中山北路5段282巷→劍潭山稜線	700
(CS-02)	劍潭山稜線步道	劍潭山打印台經老地方→通北街叉路口→軍營門口(延伸374m至軍營前)	1 574

資料來源：大地工程處。

Source: Geotechnical Engineering Office.

Table 17 Hiking Trails (Cont. 1)

End of November 2019

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	總長(公尺) Length (m)
文山區小計		22 條	15 379
(WS-01)	試院支線步道	考試院上方涼亭→仙跡岩足跡步道叉路(含木柵路1段23號旁入口路段)	452
(WS-02)	景興國小支線步道	親山步道915m景興國小叉路口→景興國小	368
(WS-03)	溝子口支線步道	親山步道1300m海巡署叉路口→(往光輝路口)樓梯盡頭	568
(WS-04)	麥田支線步道	麥田山莊→仙跡岩稜線(含福德宮304巷支線)	413
(WS-05)	海巡署支線	興隆路三段304巷25號勞保局倉庫前→溝子口步道上方向牌	400
(WS-06)	指南慈惠堂步道	指南路三段→指南慈惠堂再接商店街至獅子亭前方涼亭	750
(WS-07)	大成殿步道	指南路三段→大成殿步道口	605
(WS-08)	猴山岳步道	指南宮後山猴山岳步道口→新光路	602
(WS-09)	茶展中心步道	茶業推廣中心停車場→指南路三段	760
(WS-10)	健康步道	茶業推廣中心步道口→私人工寮旁	414
(WS-11)	壺穴步道	茶壺站對面寒舍入口→壺穴吊橋	550
(WS-13)	飛龍步道	環山二道→樟山寺	960
(WS-14)	救千宮步道	樟山寺→混元宮前高速公路涵洞下步道口	1 029
(WS-15)	指南國小步道	指南國小→樟山寺前叉路口	686
(WS-16)	三玄宮步道	指南國小→三玄宮	1 320
(WS-17)	貓空越嶺步道	貓空纜車站對面步道口→稜線上十字路口(含入口意象範圍)	800
(WS-18)	樟樹步道	三墩石步道口→大觀園後方停車場(+談茶支線160m)	1 100
(WS-19)	楓林步道	樟樹步道楓林支線叉路口→指南路談天園對面步道口(含涼亭範圍)	160
(WS-20)	石獅腳步道	高振盛茶農步道口→樟樹步道德隆茶行叉路口(含入口意象範圍)	350
(WS-21)	老樟樹步道	樟樹步道老樟樹叉路口→繞一圈至前方80m出口	70
(WS-22)	樟湖步道	指南路3段38巷涵鈺軒→指南路3段34巷瓦厝	2 500
(WS-23)	待老坑步道	樟湖步道待老坑叉路→待老坑山至老泉街26巷優人神鼓	522

表17 登山步道(續2)

108年11月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	總長(公尺) Length (m)
南港區小計		11 條	10 565
(NG-01)	南港山(一)中華技術學院	中華技術學院→南港山鞍部→分界點	1 970
(NG-02)	南港山(二)北興宮	南港山鞍部→北興宮(含入口意象範圍)	685
(NG-03)	南港山(三)麗山橋口	研究院路四段50巷→南港山鞍部(含入口意象範圍)	1 175
(NG-04)	九五峰	南港山鞍部→姆指山山頂陵線	2 165
(NG-05)	更寮步道	舊莊街二段122巷→土庫岳→大豐產業道路	2 450
(NG-06)	棧寮步道	舊莊街二段232巷→魏靜時故居(含入口意象範圍)	440
(NG-07)	桂花林步道+2條支線	舊莊街二段添進茶園→南港茶葉製造示範廠第2停車場	495
(NG-08)	桂花吊橋步道+支線	舊莊街二段寶豐庭茶莊→舊莊路2段328號	305
(NG-09)	桂花吊橋親水步道	舊莊街二段寶樹橋旁→桂花吊橋	170
(NG-10)	示範廠環山步道	舊莊街二段南港茶葉製造示範廠第1停車場→環山步道口	510
(NG-11)	桂花亭步道	桂花亭入口意象→舊莊街二段步道口(含入口意象範圍)	200
內湖區小計		23 條	24 192
(NH-01)	碧湖步道	內湖路三段碧湖步道口→新福本坑出口(葉氏祖廟前)(含步道兩端的入口意象範圍)	1 300
(NH-02)	大溝溪溪畔步道	大湖山莊街底大溝溪公園涼亭外→鯉魚山50m處相接	680
(NH-03)	圓覺寺步道	鯉魚山叉路→瀑布潭→圓覺寺步道口→峰碧塔門口	1 185
(NH-04)	鯉魚山步道	碧山路→葉氏祖廟(含入口意象範圍)	1 065
(NH-05)	碧山巖步道	碧山路23號→碧山巖	346
(NH-06)	忠勇山步道	慈聖宮→忠勇山頂	800
(NH-07)	忠勇山越嶺步道	碧山巖→忠勇山→林氏墓園→金龍產業道路	1 660
(NH-08)	大崙尾山步道圓明寺支線	大崙尾山打印台→湧泉寺(圓明寺門前)	3 180
(NH-09)	碧山露營場步道	碧山工作站→露營場	86
(NH-10)	碧山露營場下方木棧道	碧山工作站→露營場+串連道(枕木步道交會)	272
(NH-11)	碧山露營場枕木步道	碧山工作站→自然生態教室→營地側門	1 088
(NH-12)	白鷺鷥山步道	老公祠福佑宮→白鷺鷥山→金湖路268號進入(含入口意象範圍)	1 845

Table 17 Hiking Trails (Cont. 3)

End of November 2019

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	總長(公尺) Length (m)
(NH-13)	康樂山步道	成功路5段山海寺牌樓→安泰街水源頭福德宮	1 470
(NH-14)	明舉山步道	安泰街打印台→內溝溪生態展示館前	1 450
(NH-15)	康樂街步道	康樂街236號內溝里民活動中心→六角木造涼亭	383
(NH-16)	龍船岩步道碧山路支線	碧山路62號→龍船岩叉路口(福德宮)	368
(NH-17)	龍船岩步道開眼山支線	開眼山→龍船岩	554
(NH-18)	龍船岩步道五路財神廟支線	龍船岩叉路(福德宮)→五路財神廟	1 330
(NH-19)	金面山步道	內湖步道叉路→金龍里福德宮(剪刀石→小金面)	2 786
(NH-20)	採石場步道	環山路一段136巷底→打印台前叉路(論劍亭上方)(含入口意象範圍)	700
(NH-21)	竹月寺步道	採石場步道40m叉路右經竹月寺→金面山稜線	1 080
(NH-22)	金面山68巷支線步道	環山路二段68巷底→金面山稜線泰安亭	464
(NH-23)	郭氏古厝步道	內湖文德路步道口→郭氏古厝	100
士林區小計		23 條	18 780
(SL-01)	風櫃嘴步道	溪山里至善路三段336巷51號至風櫃嘴步道口	614
(SL-02)	大崎頭步道	至善路三段370巷步道口至坪頂古圳清風亭	1 030
(SL-03)	坪頂古圳步道	至善路三段370巷29號步道口至平菁街95巷步道口	1 350
(SL-04)	鵝尾山步道礁坑橋支線 (平溪步道)	至善路3段181巷5弄→平等國小旁平菁路105巷底	1 345
(SL-05)	鵝尾山步道簡厝支線	至善路三段277巷→至善路3段371巷20弄	303
(SL-06)	平菁步道	至善路三段71巷步道口→平菁街140號	929
(SL-07)	竹林步道	平菁路42巷禾豐餐廳停車場旁至公平橋	525
(SL-08)	永圳步道	永公路350巷反射境後直行到路底至圳溝邊(距公平橋300m)	320
(SL-09)	水管路步道	中山北路七段232巷1弄→愛富三街(含入口意象範圍)	2 600
(SL-10)	下竹林步道	中山北路七段190巷112號→仁民路	1 034
(SL-11)	婆婆橋步道	至善路二段266巷底→劍南路口圓明寺前(舊路200M)	555
(SL-12)	鄭成功廟步道	劍南路鄭成功廟旁→上方九蓮寺叉路	312
(SL-13)	大崙頭山步道	碧山路→山頂	515
(SL-14)	大崙頭森林步道	碧溪產業道路1.7K森林步道口→稜線步道(含入口意象範圍)	833

表17 登山步道(續4)

108年11月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	總長(公尺) Length (m)
(SL-15)	大崙頭自然步道	碧溪產業道路2.4K枕木步道口→稜線步道(含入口意象範圍)	620
(SL-16)	大崙頭北面步道	大崙頭山頂→碧山路50號民宅前	960
(SL-18)	瞭望台步道	碧溪產道2.25K下方碎石步道→高架瞭望台(2.45K)(含瞭望台下方休憩平台)	200
(SL-19)	碧溪步道	碧溪產業道路1.5K石頭屋→大崙尾山步道2120m+新增枕木步道390m+舊枕木70m+(靶場支線88m)	1 450
(SL-20)	翠山(靶場)步道	中社路二段路底至碧溪步道交會處	1 145
(SL-21)	大崙尾山中社路支線	中社路二段→山頂	870
(SL-22)	大崙尾山步道碧山路支線	碧山路→大崙尾山頂	740
(SL-23)	翠山街步道	中社路2段公車終點站旁至翠山街口雙福宮	200
(SL-24)	雙溪國小步道	雙溪國小旁步道口至中社路2段明溪街口	330
北投區		31 條	20 650
(BT-01)	忠義山步道	忠義廟→親山步道打印台	850
(BT-02)	楓丹白露步道	忠義山打印台→楓丹白露社區前入口意象(含入口意象範圍)	450
(BT-03)	大屯山(一)下青巖步道	貴子坑水保教室前→下青巖(復興三路)	1 727
(BT-04)	大屯山(二)貴子坑步道	親山步道打印台→貴子坑露營場對面步道口	1 330
(BT-05)	中和里上清宮步道	復興三路212號→中清巖	880
(BT-06)	中和里永春寮步道	復興三路300巷底→中正山產業道路中段(增長至上清宮對面水泥橋)(增長322m)	760
(BT-07)	永春寮溪步道	上清宮'旁步道口→復興三路310巷步道口	350
(BT-08)	中和里白宮山莊步道	復興四路105巷10號→復興三路白宮山莊	520
(BT-09)	中正山(一)郵政訓練所步道	登山路61號→郵政訓練中心(含入口意象範圍)	906
(BT-10)	中正山(二)法雨寺步道	泉源產業道路→法雨寺+墓園支線(登山路40號至墓園邊200m)	924
(BT-11)	中正山親山步道	登山路立祥商店步道口→前行180m	180
(BT-13)	登泉步道	登山路17-2號→登山路28號(泉源產業道路)	218
(BT-14)	三楓步道	東昇路31號→登山路161號	79
(BT-15)	青楓步道	大梯田旁步道口→竹子湖產業道路2K+650	800

Table 17 Hiking Trails (Cont. 5 End)

End of November 2019

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	總長(公尺) Length (m)
(BT-16)	頂湖海芋步道	名陽畝農場旁步道口→海芋田景觀木橋	160
(BT-17)	猴崁步道	竹子湖路下切左轉→猴崁產業道路	350
(BT-18)	水尾巴拉卡步道	竹子湖水尾公車站→巴拉卡公路	518
(BT-19)	猴崁湖田國小步道	竹子湖9號→猴崁產業道路(1K+100)	650
(BT-20)	水車寮步道	湖田國小停車場旁步道口→大樹下土雞城步道口	550
(BT-21)	軍艦岩步道	陽明醫學院步道口→軍艦岩前叉路	500
(BT-22)	照明寺步道	軍艦岩下泥土步道→照明禪寺	1 230
(BT-23)	丹鳳山步道	照明寺旁丹鳳山入口→陳濟堂墓園門口	830
(BT-24)	半嶺步道	(向前延伸至湖底路)紅檀前方30m步道口→欄杆橋頭福德宮	1 200
(BT-25)	橫嶺古道	湖山路一段步道口→紅檀停車場	800
(BT-26)	湖山里湖山國小步道	湖底路48號湖山國小旁→湖山路25之1號	568
(BT-27)	風尾步道	東昇路38號前步道口→東昇路68-15號	291
(BT-28)	泉源里紗帽步道	泉源路232號上方路口至紗帽路10號巷口(對面至山谷下步道)	684
(BT-29)	淨水廠步道	泉源路260號淨水廠旁步道口→水圳步道邊	132
(BT-30)	湖山里鼎筆橋步道	鼎筆橋→東昇路(頂湖福德宮)	363
(BT-31)	陽峰古道	陽峰古道入口→鼎筆橋旁	1 100
(BT-32)	磺溪溫泉步道	行義路260巷天祥溫泉前步道口→行義路402巷皇池溫泉停車場旁步道口	750

表18 土地人口概況

Table 18 Land and Population

年(月)底別 End of Year(Month)	土地面積 Land (平方公里) (km ²)	戶籍戶數 No. of Households (戶) (no.)	人口數(人) Population (person)			人口密度 Population Density (人/平方公里) (person/ km ²)
			總計 Male Female			
			總計 Grend Total	男 Male	女 Female	
民國 88 年底 End of 1999	271.7997	879 156	2 641 312	1 309 434	1 331 878	9 718
民國 89 年底 End of 2000	271.7997	888 560	2 646 474	1,309,308	1,337,166	9,737
民國 90 年底 End of 2001	271.7997	894 763	2 633 802	1 300 179	1 333 623	9 690
民國 91 年底 End of 2002	271.7997	906 988	2 641 856	1 301 458	1 340 398	9 720
民國 92 年底 End of 2003	271.7997	914 716	2 627 138	1 291 742	1 335 396	9 666
民國 93 年底 End of 2004	271.7997	923 325	2 622 472	1 286 303	1 336 169	9 649
民國 94 年底 End of 2005	271.7997	933 110	2 616 375	1 279 513	1 336 862	9 626
民國 95 年底 End of 2006	271.7997	941 317	2 632 242	1 282 691	1 349 551	9 684
民國 96 年底 End of 2007	271.7997	947 745	2 629 269	1 277 556	1 351 713	9 674
民國 97 年底 End of 2008	271.7997	958 433	2 622 923	1 270 948	1 351 975	9 650
民國 98 年底 End of 2009	271.7997	969 418	2 607 428	1 260 450	1 346 978	9 593
民國 99 年底 End of 2010	271.7997	983 237	2 618 772	1 262 554	1 356 218	9 635
民國 100 年底 End of 2011	271.7997	999 879	2 650 968	1 276 343	1 374 625	9 753
民國 101 年底 End of 2012	271.7997	1 017 063	2 673 226	1 285 361	1 387 865	9 835
民國 102 年底 End of 2013	271.7997	1 026 738	2 686 516	1 289 945	1 396 571	9 884
民國 103 年底 End of 2014	271.7997	1 037 402	2 702 315	1 295 636	1 406 679	9 942
民國 104 年底 End of 2015	271.7997	1 043 948	2 704 810	1 295 462	1 409 348	9 951
民國 105 年底 End of 2016	271.7997	1 047 284	2 695 704	1 289 510	1 406 194	9 918
民國 106 年底 End of 2017	271.7997	1 050 755	2 683 257	1 281 917	1 401 340	9 872
民國 107 年底 End of 2018	271.7997	1 056 233	2 668 572	1 273 375	1 395 197	9 818
11月底 End of Nov.	271.7997	1 056 190	2 669 634	1 274 089	1 395 545	9 822
12月底 End of Dec.	271.7997	1 056 233	2 668 572	1 273 375	1 395 197	9 818
民國108年 2019						
1月底 End of Jan.	271.7997	1 056 328	2 666 908	1 272 385	1 394 523	9 812
2月底 End of Feb.	271.7997	1 056 439	2 664 983	1 271 327	1 393 656	9 805
3月底 End of Mar.	271.7997	1 057 137	2 663 425	1 270 279	1 393 146	9 799
4月底 End of Apr.	271.7997	1 057 682	2 661 317	1 269 117	1 392 200	9 791
5月底 End of May	271.7997	1 058 272	2 658 615	1 267 542	1 391 073	9 782
6月底 End of June	271.7997	1 058 621	2 657 652	1 266 944	1 390 708	9 778
7月底 End of July	271.7997	1 058 501	2 654 008	1 265 088	1 388 920	9 765
8月底 End of Aug.	271.7997	1 059 212	2 650 154	1 263 106	1 387 048	9 750
9月底 End of Sep.	271.7997	1 061 362	2 647 164	1 261 548	1 385 616	9 739
10月底 End of Oct.	271.7997	1 061 184	2 646 204	1 260 951	1 385 253	9 736
11月底 End of Nov.	271.7997	1 061 088	2 645 293	1 260 292	1 385 001	9 733

資料來源：本府地政局、民政局。

Source: Department of Land , Department of Civil Affairs.

表19 臺灣地區營造工程物價指數

公式：採用拉式公式之變式

年(月)別 Year (Month)	總指數 General Index	水泥及其製品類 Cement & Related Products	砂石及級配類 Sand & Crashed Stone	磚瓦瓷類 Bricks & Tiles	金屬製品類 Metal Products	木材及其製品類 Timber & Related Products
項數 No of Items	115	7	3	5	21	5
權數(千分比) Weights	1,000	150.48	21.44	15.87	195.04	30.14
定 基 指 數						
基期：民國105年=100						
民國 100年 2011	102.29	92.89	84.54	90.10	134.22	100.08
民國 101年 2012	103.14	97.34	87.78	94.77	128.17	97.91
民國 102年 2013	102.79	98.99	89.07	97.65	121.07	99.74
民國 103年 2014	104.67	105.47	100.86	100.35	118.34	104.38
民國 104年 2015	101.71	105.62	102.10	100.79	100.84	104.52
民國 105年 2016	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
民國 106年 2017	102.40	96.80	99.12	98.93	113.34	99.92
民國 107年 2018	105.84	99.81	99.56	97.82	125.36	106.12
11月 Nov.	107.05	105.09	99.54	97.68	126.76	107.61
12月 Dec.	106.80	106.61	99.87	97.71	123.87	107.65
民國 108年 2019						
1月 Jan.	106.92	108.88	102.67	97.92	122.21	107.19
2月 Feb.	107.81	110.07	103.33	97.34	125.73	107.29
3月 Mar.	108.38	111.90	103.40	97.33	126.61	107.68
4月 Apr.	108.47	113.56	103.58	97.17	125.40	107.57
5月 May	108.25	113.69	103.74	97.28	123.68	107.70
6月 June	108.41	113.91	103.88	97.67	123.70	107.95
7月 July	108.40	114.56	103.71	98.03	122.69	107.71
8月 Aug.	108.58	114.92	103.81	98.08	122.75	107.76
9月 Sep.	108.34	115.36	103.74	98.08	120.84	107.44
10月 Oct.	Ⓕ 107.92	115.73	103.97	Ⓕ 97.99	118.57	107.34
11月 Nov.	108.12	116.28	104.36	97.85	118.71	107.38
年 增 率 (%)						
民國 100年 2011	3.33	-0.43	-3.08	2.13	7.32	10.89
民國 101年 2012	0.83	4.79	3.83	5.18	-4.51	-2.17
民國 102年 2013	-0.34	1.70	1.47	3.04	-5.54	1.87
民國 103年 2014	1.83	6.55	13.24	2.76	-2.25	4.65
民國 104年 2015	-2.83	0.14	1.23	0.44	-14.79	0.13
民國 105年 2016	-1.68	-5.32	-2.06	-0.78	-0.83	-4.32
民國 106年 2017	2.40	-3.20	-0.88	-1.07	13.34	-0.08
民國 107年 2018	3.36	3.11	0.44	-1.12	10.61	6.20
11月 Nov.	3.28	8.87	0.14	-0.53	6.68	5.69
12月 Dec.	2.82	10.56	0.67	-0.57	2.93	5.20
民國 108年 2019						
1月 Jan.	2.37	12.99	3.38	0.12	-0.45	4.13
2月 Feb.	3.45	14.44	3.92	-0.47	3.58	3.93
3月 Mar.	3.44	16.47	3.99	-0.45	2.11	2.90
4月 Apr.	3.35	18.05	3.85	-0.94	1.07	1.48
5月 May	2.85	17.68	4.01	-0.83	-1.08	1.28
6月 June	2.63	15.74	4.14	-0.46	-0.99	1.25
7月 July	2.01	14.76	3.96	0.17	-3.20	0.94
8月 Aug.	1.95	14.43	4.27	0.47	-3.70	0.71
9月 Sep.	1.35	13.04	4.45	0.39	-5.79	0.26
10月 Oct.	Ⓕ 0.60	11.39	4.68	Ⓕ 0.45	-8.11	-0.15
11月 Nov.	1.00	10.65	4.84	0.17	-6.35	-0.21

資料來源：物價統計月報。

說明：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正。

Table 19 Indices of Construction Cost in Taiwan Area

Formula : Laspeyres's Formula

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類 Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
8	4	16	2	15	29
15.54	7.63	86.82	21.48	56.96	398.61
Fixed Index			Base Period : 2016=100		
92.35	92.21	107.63	100.43	93.36	94.78
95.94	97.39	106.97	107.13	96.24	96.09
100.26	99.28	105.87	109.11	98.02	96.98
103.03	100.43	105.91	109.07	99.82	98.70
100.16	100.23	103.04	103.73	99.79	99.96
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
104.29	99.64	104.13	99.21	101.07	100.44
107.31	100.93	107.23	99.98	102.49	101.00
106.62	101.57	106.95	102.18	102.24	101.26
107.15	101.57	107.00	102.38	102.30	101.41
108.34	101.57	106.90	102.47	102.36	101.50
109.04	101.57	106.81	102.71	102.31	101.53
109.24	101.57	107.58	103.20	102.35	101.60
108.52	101.57	108.09	103.20	102.43	101.72
107.91	101.57	108.07	103.30	103.45	101.81
108.50	101.57	107.32	103.30	105.17	101.96
109.32	101.57	107.09	103.30	105.16	102.22
108.53	101.57	106.95	103.39	105.33	102.54
109.03	101.57	106.41	103.39	105.44	102.80
108.93	101.57	106.41	103.39	Ⓕ 104.01	Ⓕ 102.94
108.49	101.57	106.23	103.39	104.34	103.13
Annual Change Rate (%)					
6.31	9.45	5.86	3.43	3.83	1.25
3.89	5.62	- 0.61	6.67	3.08	1.38
4.50	1.94	- 1.03	1.85	1.85	0.93
2.76	1.16	0.04	- 0.04	1.84	1.77
-2.79	-0.20	-2.71	-4.90	-0.03	1.28
- 0.16	- 0.23	- 2.95	- 3.60	0.21	0.04
4.29	-0.36	4.13	-0.79	1.07	0.44
2.90	1.29	2.98	0.78	1.40	0.56
1.21	1.83	0.39	2.94	1.31	0.66
2.37	1.83	0.31	3.72	1.24	0.82
1.85	1.79	-0.24	3.81	1.21	0.85
1.89	1.79	-0.54	4.05	1.13	0.84
1.16	1.74	0.08	4.55	1.05	0.87
0.27	1.57	0.71	4.55	0.46	0.84
0.37	0.45	0.36	4.65	1.31	0.93
1.57	0.19	-0.56	4.35	1.31	1.06
1.91	0.12	-0.62	4.07	1.22	1.18
0.56	0.02	0.00	3.41	1.39	1.35
1.38	0.00	-0.12	1.89	1.56	1.57
1.52	-0.04	-0.11	1.40	Ⓕ 1.74	Ⓕ 1.65
1.75	0.00	-0.67	1.18	2.05	1.85

Source: Price Statistics Monthly.

Explanation: All data are subject to revision 3 months after original publication due to late reports and corrections by respondents.

表20 臺北市營造工程物價指數

公式：價比基期值加權算術平均式

年(月)別	總指數	水泥及其製品類	砂石及級配類	磚瓦瓷類	金屬製品類	木材及其製品類
Year (Month)	General Index	Cement & Related Products	Sand & Crashed Stone	Bricks & Tiles	Metal Products	Timber & Related Products
項數 No of Items	115	7	3	5	21	5
權數 (千分比) Weights	1,000.00	144.70	18.16	16.61	199.11	30.56

基期：民國105年=100

定 基 指 數

民國 100 年	2011	103.27	97.58	88.01	98.70	131.73	108.65
民國 101 年	2012	103.93	100.31	88.48	102.05	125.48	103.90
民國 102 年	2013	103.25	101.39	91.10	103.28	117.85	103.99
民國 103 年	2014	104.69	108.46	100.47	103.49	115.89	107.64
民國 104 年	2015	101.84	106.86	101.55	102.89	101.04	106.77
民國 105 年	2016	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
民國 106 年	2017	101.81	97.92	100.24	97.79	111.52	98.49
民國 107 年	2018	105.11	104.10	100.30	95.07	122.42	101.97
	11月 Nov.	106.86	112.72	99.26	95.40	124.32	102.83
	12月 Dec.	106.44	113.12	99.92	95.40	121.92	102.74
民國 108 年	2019						
	1月 Jan.	106.39	114.68	99.92	96.32	120.11	102.74
	2月 Feb.	107.15	115.28	99.92	94.35	122.97	102.74
	3月 Mar.	107.72	117.63	99.92	94.35	123.47	103.57
	4月 Apr.	108.29	120.20	99.92	94.22	122.03	103.57
	5月 May	107.97	120.20	99.92	94.22	120.31	104.44
	6月 June	108.19	120.20	99.92	94.10	120.75	104.57
	7月 July	108.27	120.24	102.43	94.10	119.64	104.57
	8月 Aug.	108.85	120.24	102.43	94.10	119.95	104.57
	9月 Sep.	108.67	120.63	102.43	94.10	118.24	104.57
	10月 Oct.	108.23	120.83	102.43	94.10	116.21	104.57
	11月 Nov.	108.29	120.83	103.29	93.12	116.18	104.57

年 增 率 (%)

民國 100 年	2011	6.18	- 3.78	- 12.44	- 0.31	41.02	14.44
民國 101 年	2012	0.64	2.80	0.53	3.39	- 4.74	- 4.37
民國 102 年	2013	- 0.65	1.08	2.96	1.21	- 6.08	0.09
民國 103 年	2014	1.39	6.97	10.29	0.20	- 1.66	3.51
民國 104 年	2015	- 2.72	- 1.48	1.07	- 0.58	- 12.81	- 0.81
民國 105 年	2016	- 1.81	- 6.42	- 1.53	- 2.81	- 1.03	- 6.34
民國 106 年	2017	1.81	- 2.08	0.24	- 2.21	11.52	- 1.51
民國 107 年	2018	3.24	6.31	0.06	- 2.78	9.77	3.53
	11月 Nov.	3.78	14.46	- 1.20	- 1.74	6.71	2.46
	12月 Dec.	3.21	14.80	- 0.55	- 1.74	3.47	2.37
民國 108 年	2019						
	1月 Jan.	2.68	16.37	- 0.55	1.49	- 0.07	2.32
	2月 Feb.	3.72	16.93	- 1.01	- 0.59	3.38	2.32
	3月 Mar.	3.63	19.18	- 1.01	- 0.59	1.76	3.15
	4月 Apr.	4.18	21.78	- 1.01	- 0.73	0.69	1.93
	5月 May	3.82	21.59	- 1.01	- 0.73	- 0.88	2.79
	6月 June	3.56	19.25	- 1.01	- 0.98	- 0.54	1.95
	7月 July	2.62	15.04	1.48	- 0.98	- 2.89	1.95
	8月 Aug.	2.94	14.63	2.61	- 0.98	- 3.02	1.65
	9月 Sep.	2.10	11.32	3.19	- 0.98	- 5.30	1.69
	10月 Oct.	1.07	8.44	3.19	- 1.36	- 8.19	1.69
	11月 Nov.	1.34	7.19	4.06	- 2.39	- 6.55	1.69

資料來源：臺北市物價統計月報。

Table 20 Indices of Construction Cost in Taipei City

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類① Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項材料類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
8	4	16	2	15	29
15.99	8.04	85.29	22.07	56.79	402.68
Fixed Index					
Base Period : 2016=100					
93.78	91.79	105.62	109.56	91.40	94.81
96.73	96.17	105.44	114.43	93.23	97.31
100.34	100.30	104.58	115.73	94.03	98.29
102.40	100.46	104.08	115.06	96.14	99.07
98.41	100.46	102.11	104.71	98.97	100.09
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
104.76	97.94	102.34	98.24	98.92	100.03
104.16	97.93	104.58	100.01	99.77	100.24
102.96	97.93	104.36	102.29	99.24	100.56
103.83	97.93	104.31	102.29	99.24	100.54
106.83	97.93	104.18	102.29	99.37	100.59
108.95	97.93	104.00	102.78	99.37	100.85
108.95	97.93	104.78	104.71	99.37	100.85
108.24	97.93	105.39	104.71	99.37	101.98
107.76	97.93	105.39	104.71	99.37	101.98
108.23	97.93	104.61	104.71	101.96	102.10
110.13	97.93	104.44	104.71	101.96	102.68
109.36	97.93	104.44	104.71	101.96	104.00
109.83	97.93	103.61	104.71	101.96	104.42
109.83	97.93	103.61	104.71	99.68	104.59
108.96	97.93	103.51	104.71	99.68	104.81
Annual Change Rate (%)					
1.12	-2.72	9.26	12.48	-6.90	-3.63
3.15	4.77	-0.17	4.45	2.00	2.64
3.73	4.29	-0.82	1.14	0.86	1.01
2.05	0.16	-0.48	-0.58	2.24	0.79
-3.90	0.00	-1.89	-9.00	2.94	1.03
1.62	-0.46	-2.07	-4.50	1.04	-0.09
4.76	-2.06	2.34	-1.76	-1.08	0.03
-0.57	-0.01	2.19	1.80	0.86	0.21
-2.28	-0.01	0.25	4.12	0.79	0.53
0.74	-0.01	0.13	4.12	0.79	0.51
3.85	-	-0.09	4.11	0.84	0.50
5.26	-	-0.26	4.61	0.84	0.94
2.82	-	-0.36	6.58	0.76	0.88
2.15	-	0.53	6.58	0.42	2.01
2.49	-	0.44	6.58	0.41	2.01
4.43	-	-0.78	6.58	0.54	2.13
6.26	-	-1.15	5.16	0.47	2.50
4.88	-	0.23	2.74	0.43	3.42
5.33	-	-0.24	2.37	0.43	3.84
5.78	-	-0.12	2.37	0.44	4.01
5.83	-	-0.81	2.37	0.44	4.23

Source: Price Statistics Monthly Taipei City.

臺北市工務統計月報

出版機關：臺北市政府工務局
地址：11008 臺北市信義區市府路1號4樓西南區
電話：1999(外縣市02-27208889)轉1404
網址：<https://pwd.gov.taipei>
發行人：林志峯
編輯：臺北市政府工務局統計室
出版年月：中華民國 108年12月
創刊年月：中華民國 73年1月
刊期頻率：月刊

THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN OF PUBLIC WORKS

Published by the Public Works Department, Taipei City Government

Address: Southwest Wing, 4F., No.1, City Hall Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11008, Taiwan (R.O.C.)

Telephone No: Please dial the 1999 Citizen Hotline (02-2720-8889 for out of Taipei) ext. 1404

Publisher: Chih-Feng LIN

Edited by the Statistics Office of PWD, TCG

Website: <https://pwd.gov.taipei>

Publishing Date: December 2019

First Edition: January 1984
