臺 北 市

工務統計月報

THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN OF PUBLIC WORKS

中華民國103年4月
April 2014

臺北市政府工務局編印
中華民國 103 年 5 月出版
Public Works Department
Taipei City Government

臺北市政府工務局業務職掌

工務局	局本部	土木建築科	綜合企劃及工程相關法規之制定，道路、橋梁、隧道及公共建築等相關工程之監辦與督導考核。
		水利科	河川工程、河川管理、雨水下水道、污水下水道等水利工程業務之督導及災害搶救之綜合業務。
		公園大地科	公園、路燈工程與坡地管理業務之督導，合法房屋拆遷及補償查估等相關業務。
		採購管理科	本府採購法令之制定及相關業務督導、稽核。
		品管及勞安科	工程材料之檢驗，本府公共工程品質之查核業務及本局勞工安全衛生管理推動事項。
		資訊室	工務資訊之整體規劃、發展、協調、推動、管理、維護、訓練及督導等事項。
		秘書室	文書、檔案、出納、總務、研考業務及不屬於其他各單位事項。
		會計室	依法辦理歲計、會計事項。
		統計室	依法辦理統計事項。
		人事室	依法辦理人事管理事項。
		政風室	依法辦理政風事項。
	新建工程處		辦理新建道路及道路養護、橋梁、廣場及市有建築物工程之規劃、勘測、設計、施工及研究規劃設計、改善等工作。
	水利工程處		全市河川及雨水下水道、抽水站等公共設施之興建、管理與維護，包括所有河濱高灘地（河濱公園）之管理。
	公園路燈工程管理處		掌理臺北市公園、綠地、廣場、行道樹、遊樂設施及路燈等之規劃、設計施工與管理維護，以及花木培植事宜。
	衛生下水道工程處		掌理大臺北地區污水下水道之規劃、設計、施工、維護、營運管理及污水處理廠設施之操作、管理、水質檢驗、分析等事項。
	大地工程處		本市山坡地安全管理及災害復舊，產業道路與登山步道闢建維護，森林與保安林調查開發利用，山坡地野溪、山溝、土石流潛勢溪流治理規劃，農村新風貌調查規劃，山坡地開發利用與違法之取締。

Duties of the Public Works Department, Taipei City Government

Public Woks Department

- Department Headquarters

Unit	Duties
Civil Engineering Division	Combining the formulation and writing of planning- and engineering-related codes; the initiation, supervision and quality review of construction of roads, bridges, tunnels, and public buildings.
Hydraulicus Division	Supervising construction on, and disaster relief / emergency repair of: river engineering, river management, rainwater drainage and sewage drainage.
Parks and Geotechnical Engineering Division	Supervision of engineering related to parks and streetlights; the move or removal of legal buildings and related compensation measures.
Procurement Administration Division	The formation, supervision and verification of the City Government’s purchasing laws.
Ouality Control Division	Handles testing, analysis, and assessment of project materials, and project quality control affairs.
Systems Administration	Handles the overall planning, development, coordination, promotion, management, maintenance, training, and supervision of the public works information system.
Administrative Services	Handles research and development, control and inspection, public relations, press relations and meetings, documentation, filing, and payment for public works administration; as well as affairs that are not the duties of other sections or offices.
Accounting Office	Handles annual bookkeeping and accounting affairs.
Statistics Office	Handles statistical affairs.
Personnel Office	Handles human resource affairs.
Government Ethics	Handles ethics related affairs.

Unit	Duties
New Construction Office	Manage planning, surveying, designing, engineering, and improving of new roads, bridges, plazas and city buildings, as well as maintaining existing roads.
Hydraulic Engineering Office	Construction, management and maintenance of all rivers, rainwater drainage, water pumps, and other water-related public structures, including all river flood banks (riverside parks).
Parks and Street Lights Office	Handles the planning, design, construction, management and maintenance of Taipei City parks, grassy areas, plazas, sidewalks trees, playgrounds, and street lamps as well as
Sewerage Systems Office	Handles the planning, design, construction, maintenance and management of wastewater drainage in the greater Taipei area.
Geotechnical Engineering Office	Our city’s hillside safety management and disaster reaction, industrial path and hiking path construction and maintaining, forest and protection forest investigation development and using, Hill land valley, gully, mudslides potential valley administer and plan. Countryside new style investigation planning, hillside development and ban illegal development.

目　次

CONTENTS

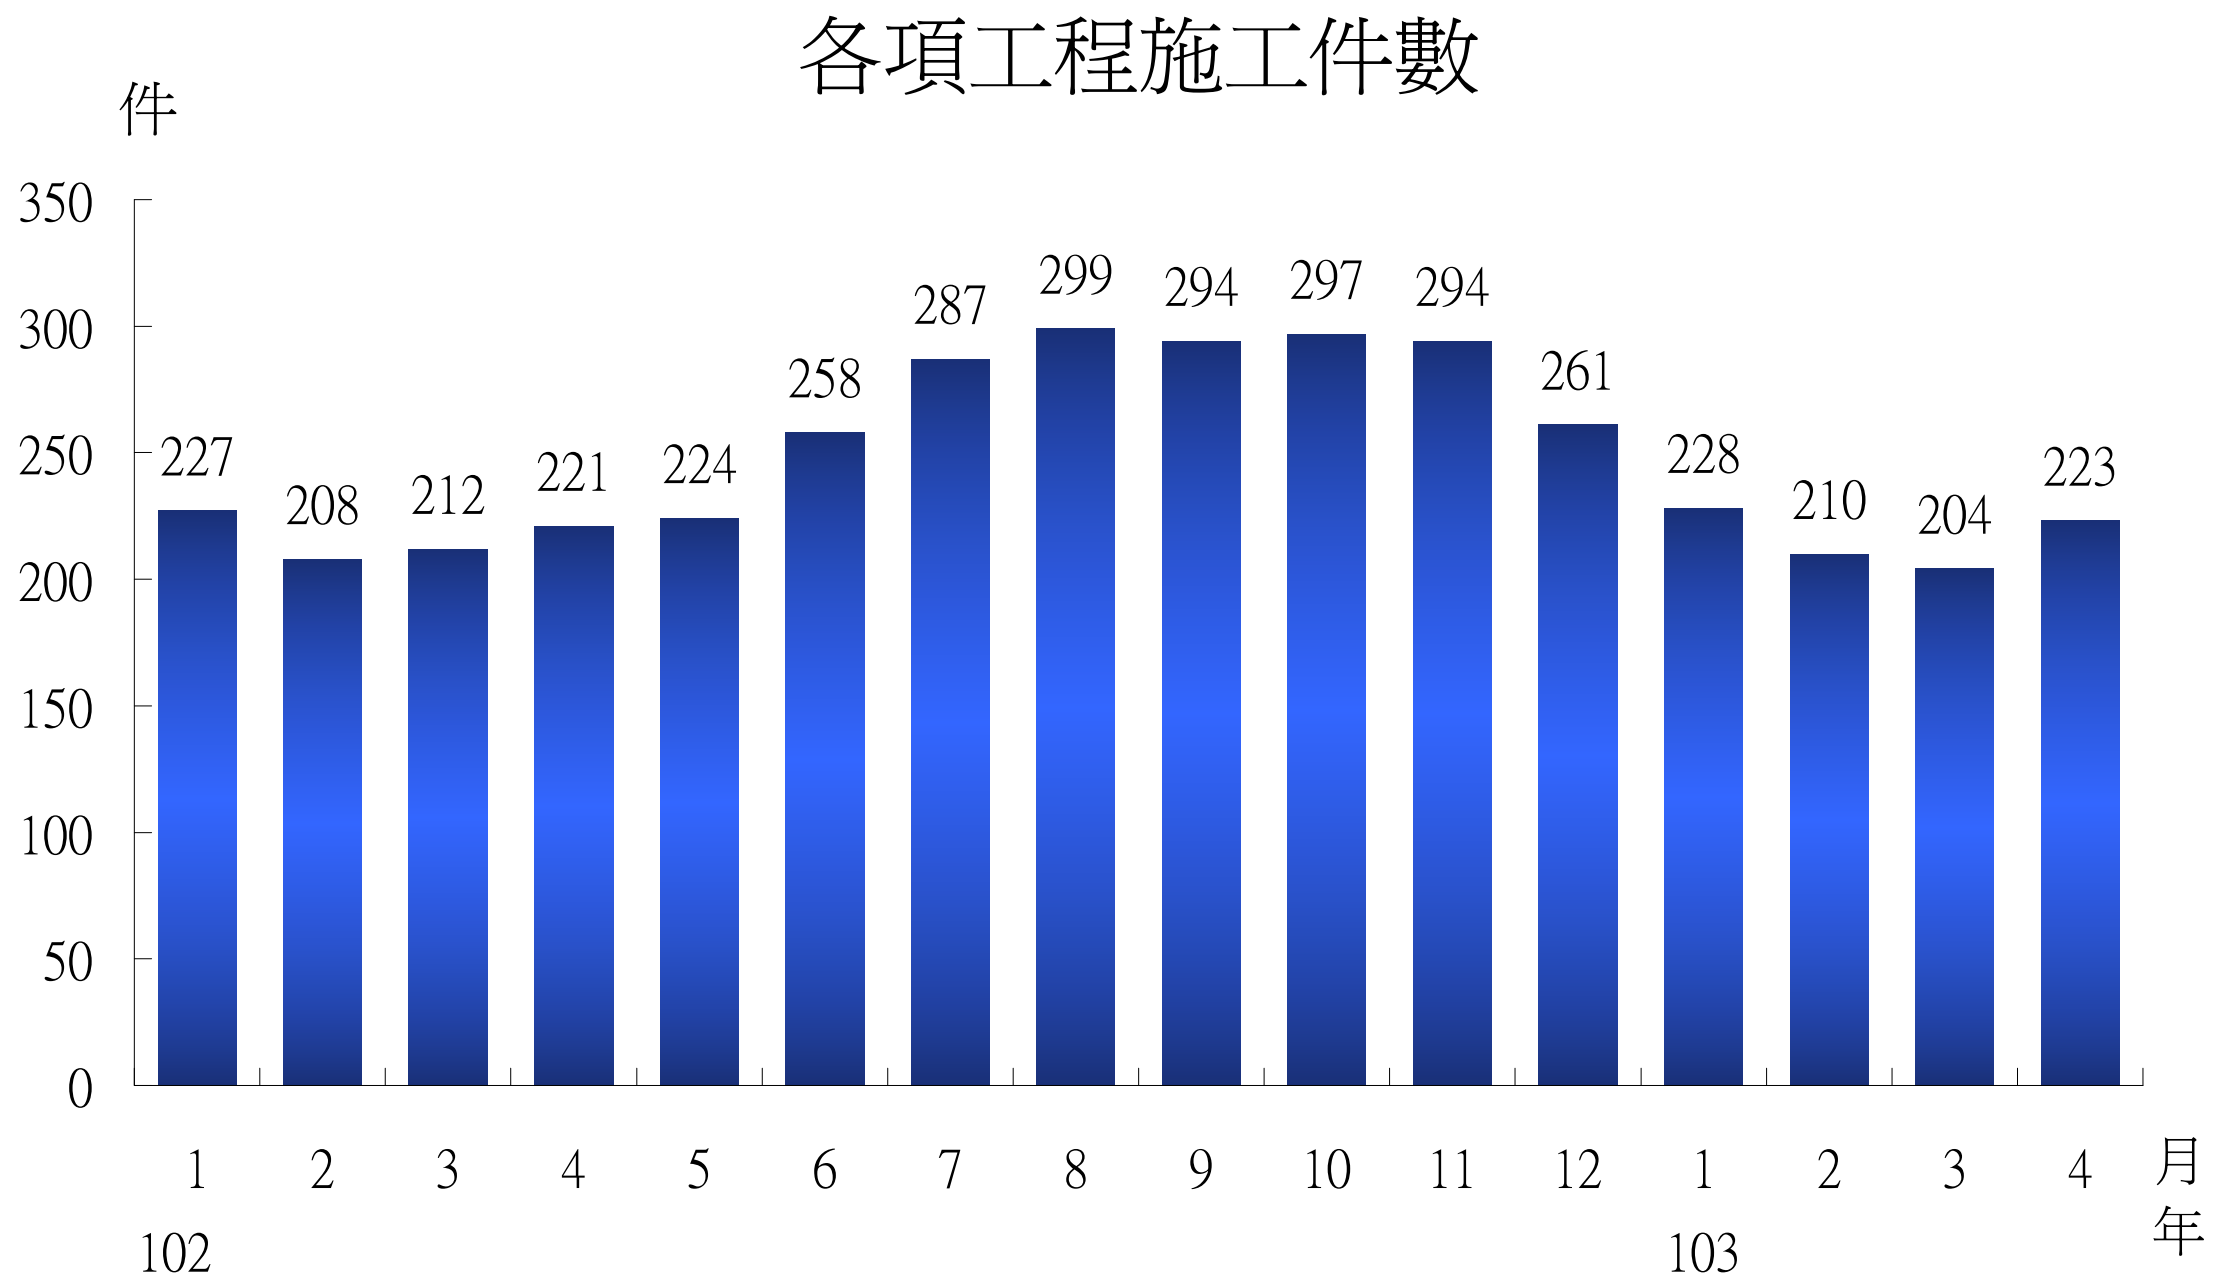

說明：自98年起，各月施工件數最多爲99年9月之334件，最少爲98年1月及103年3月之204件。

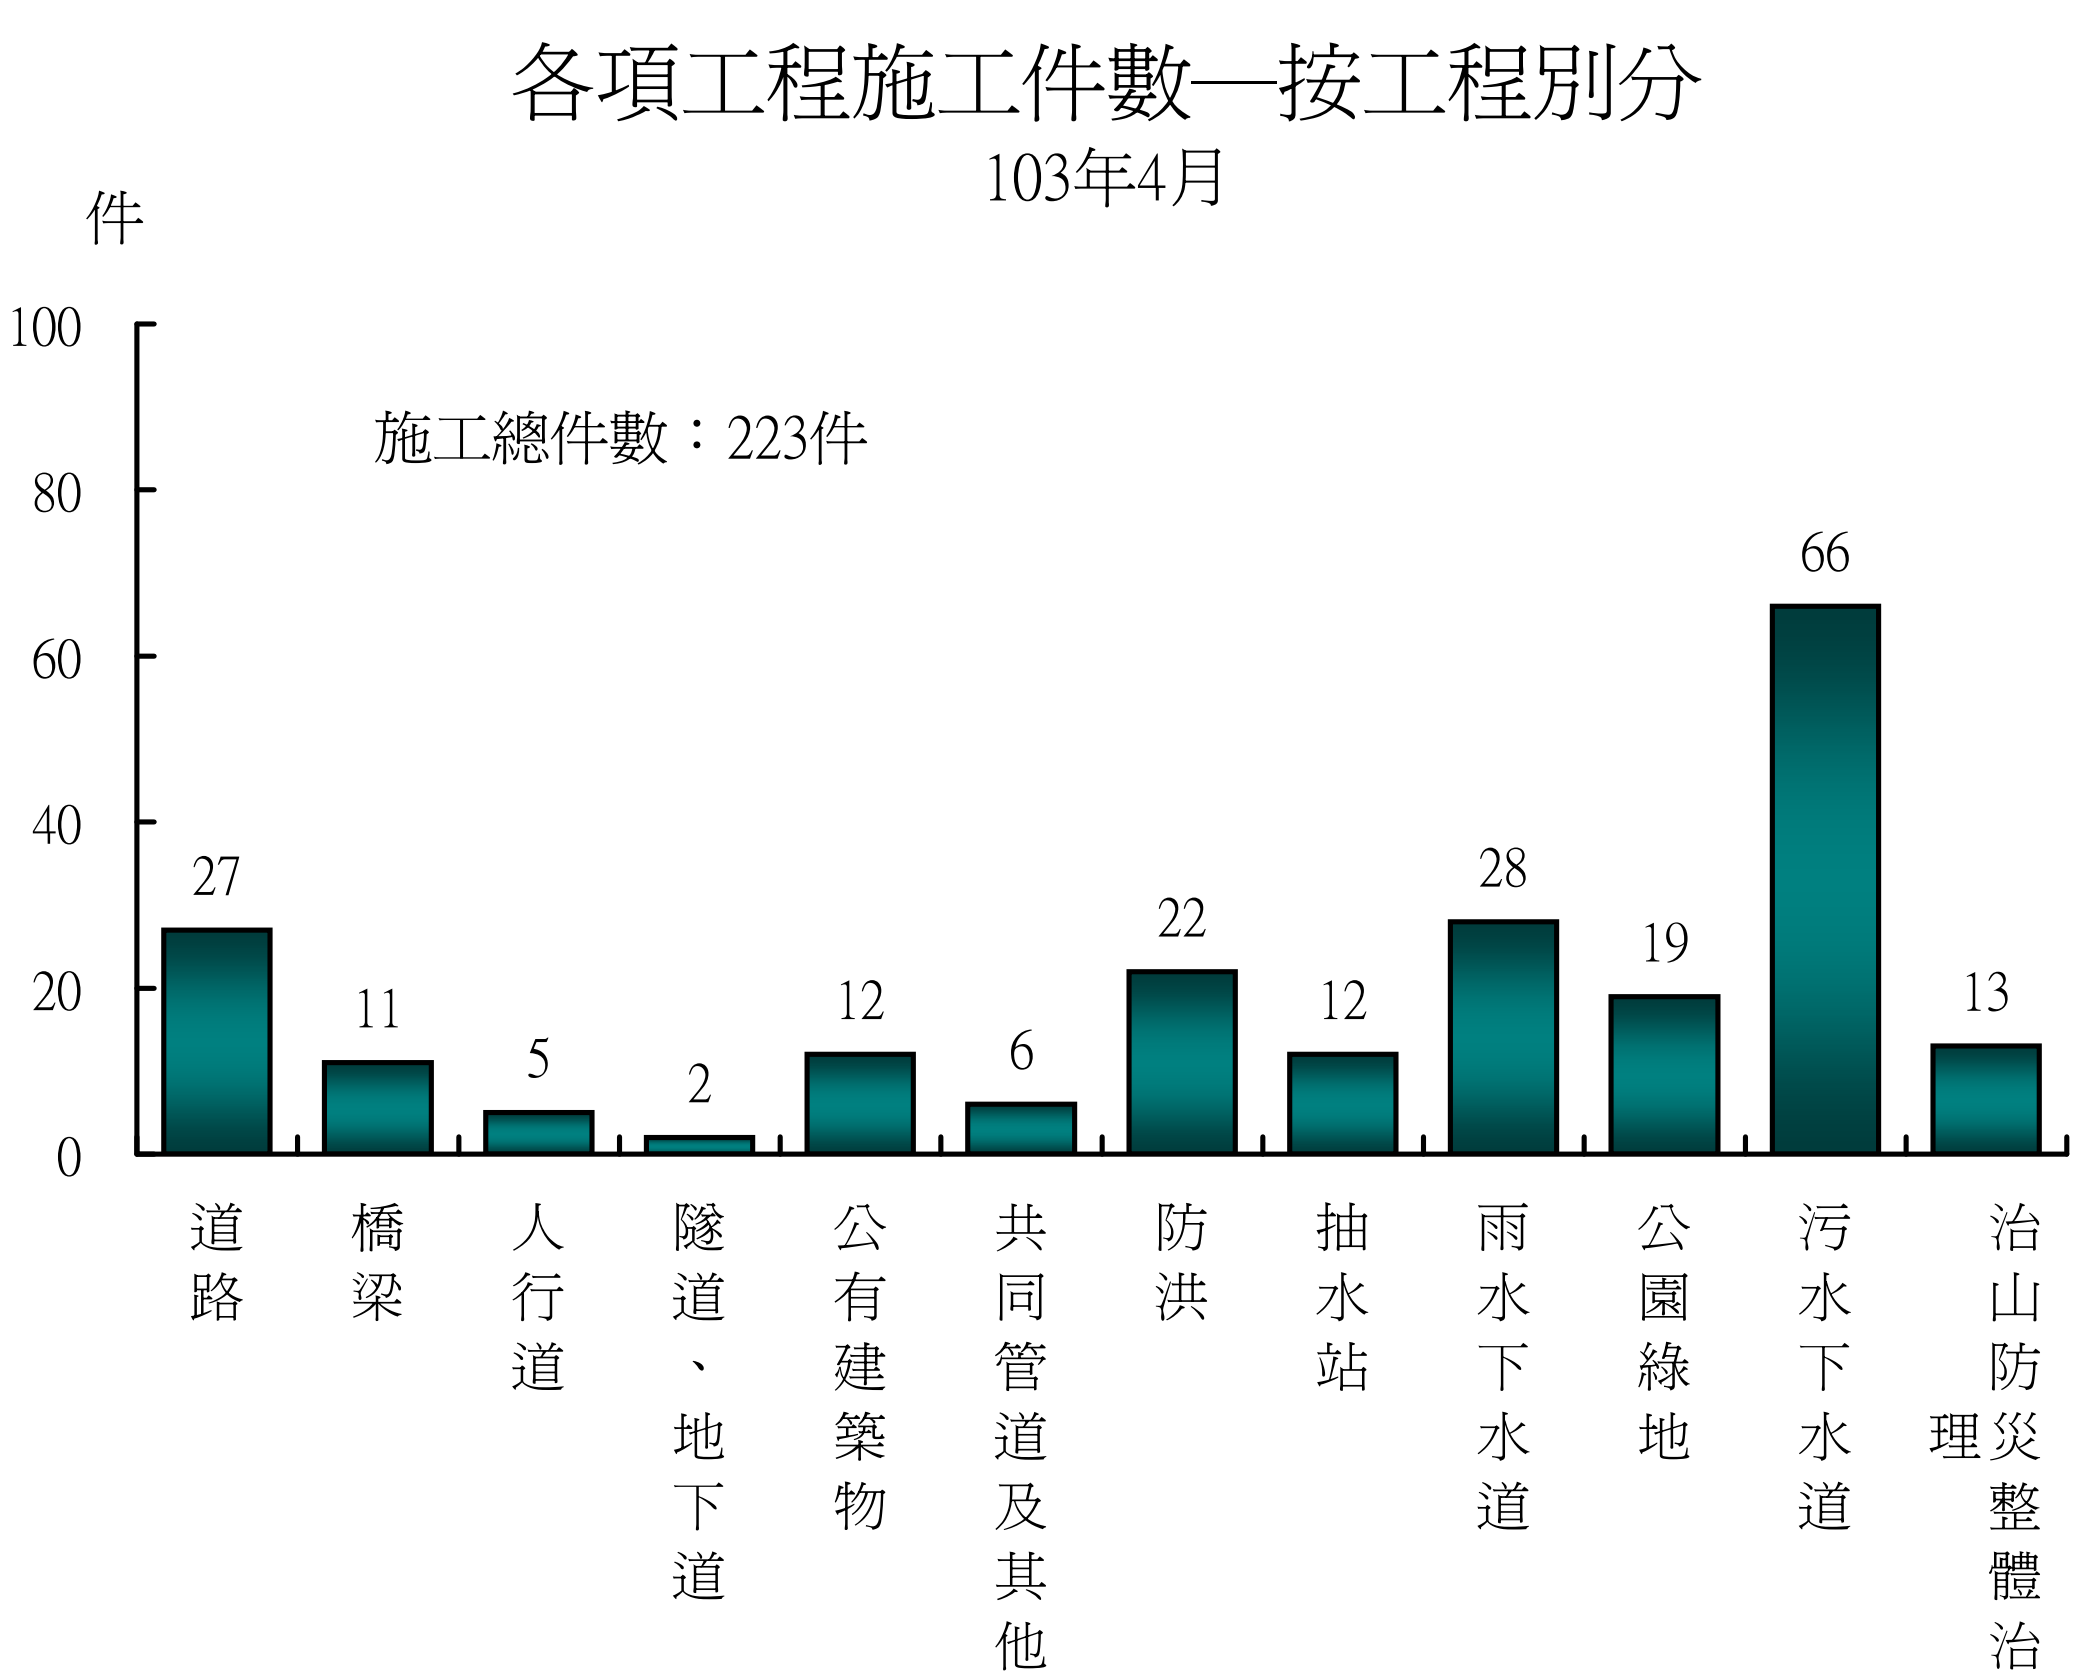

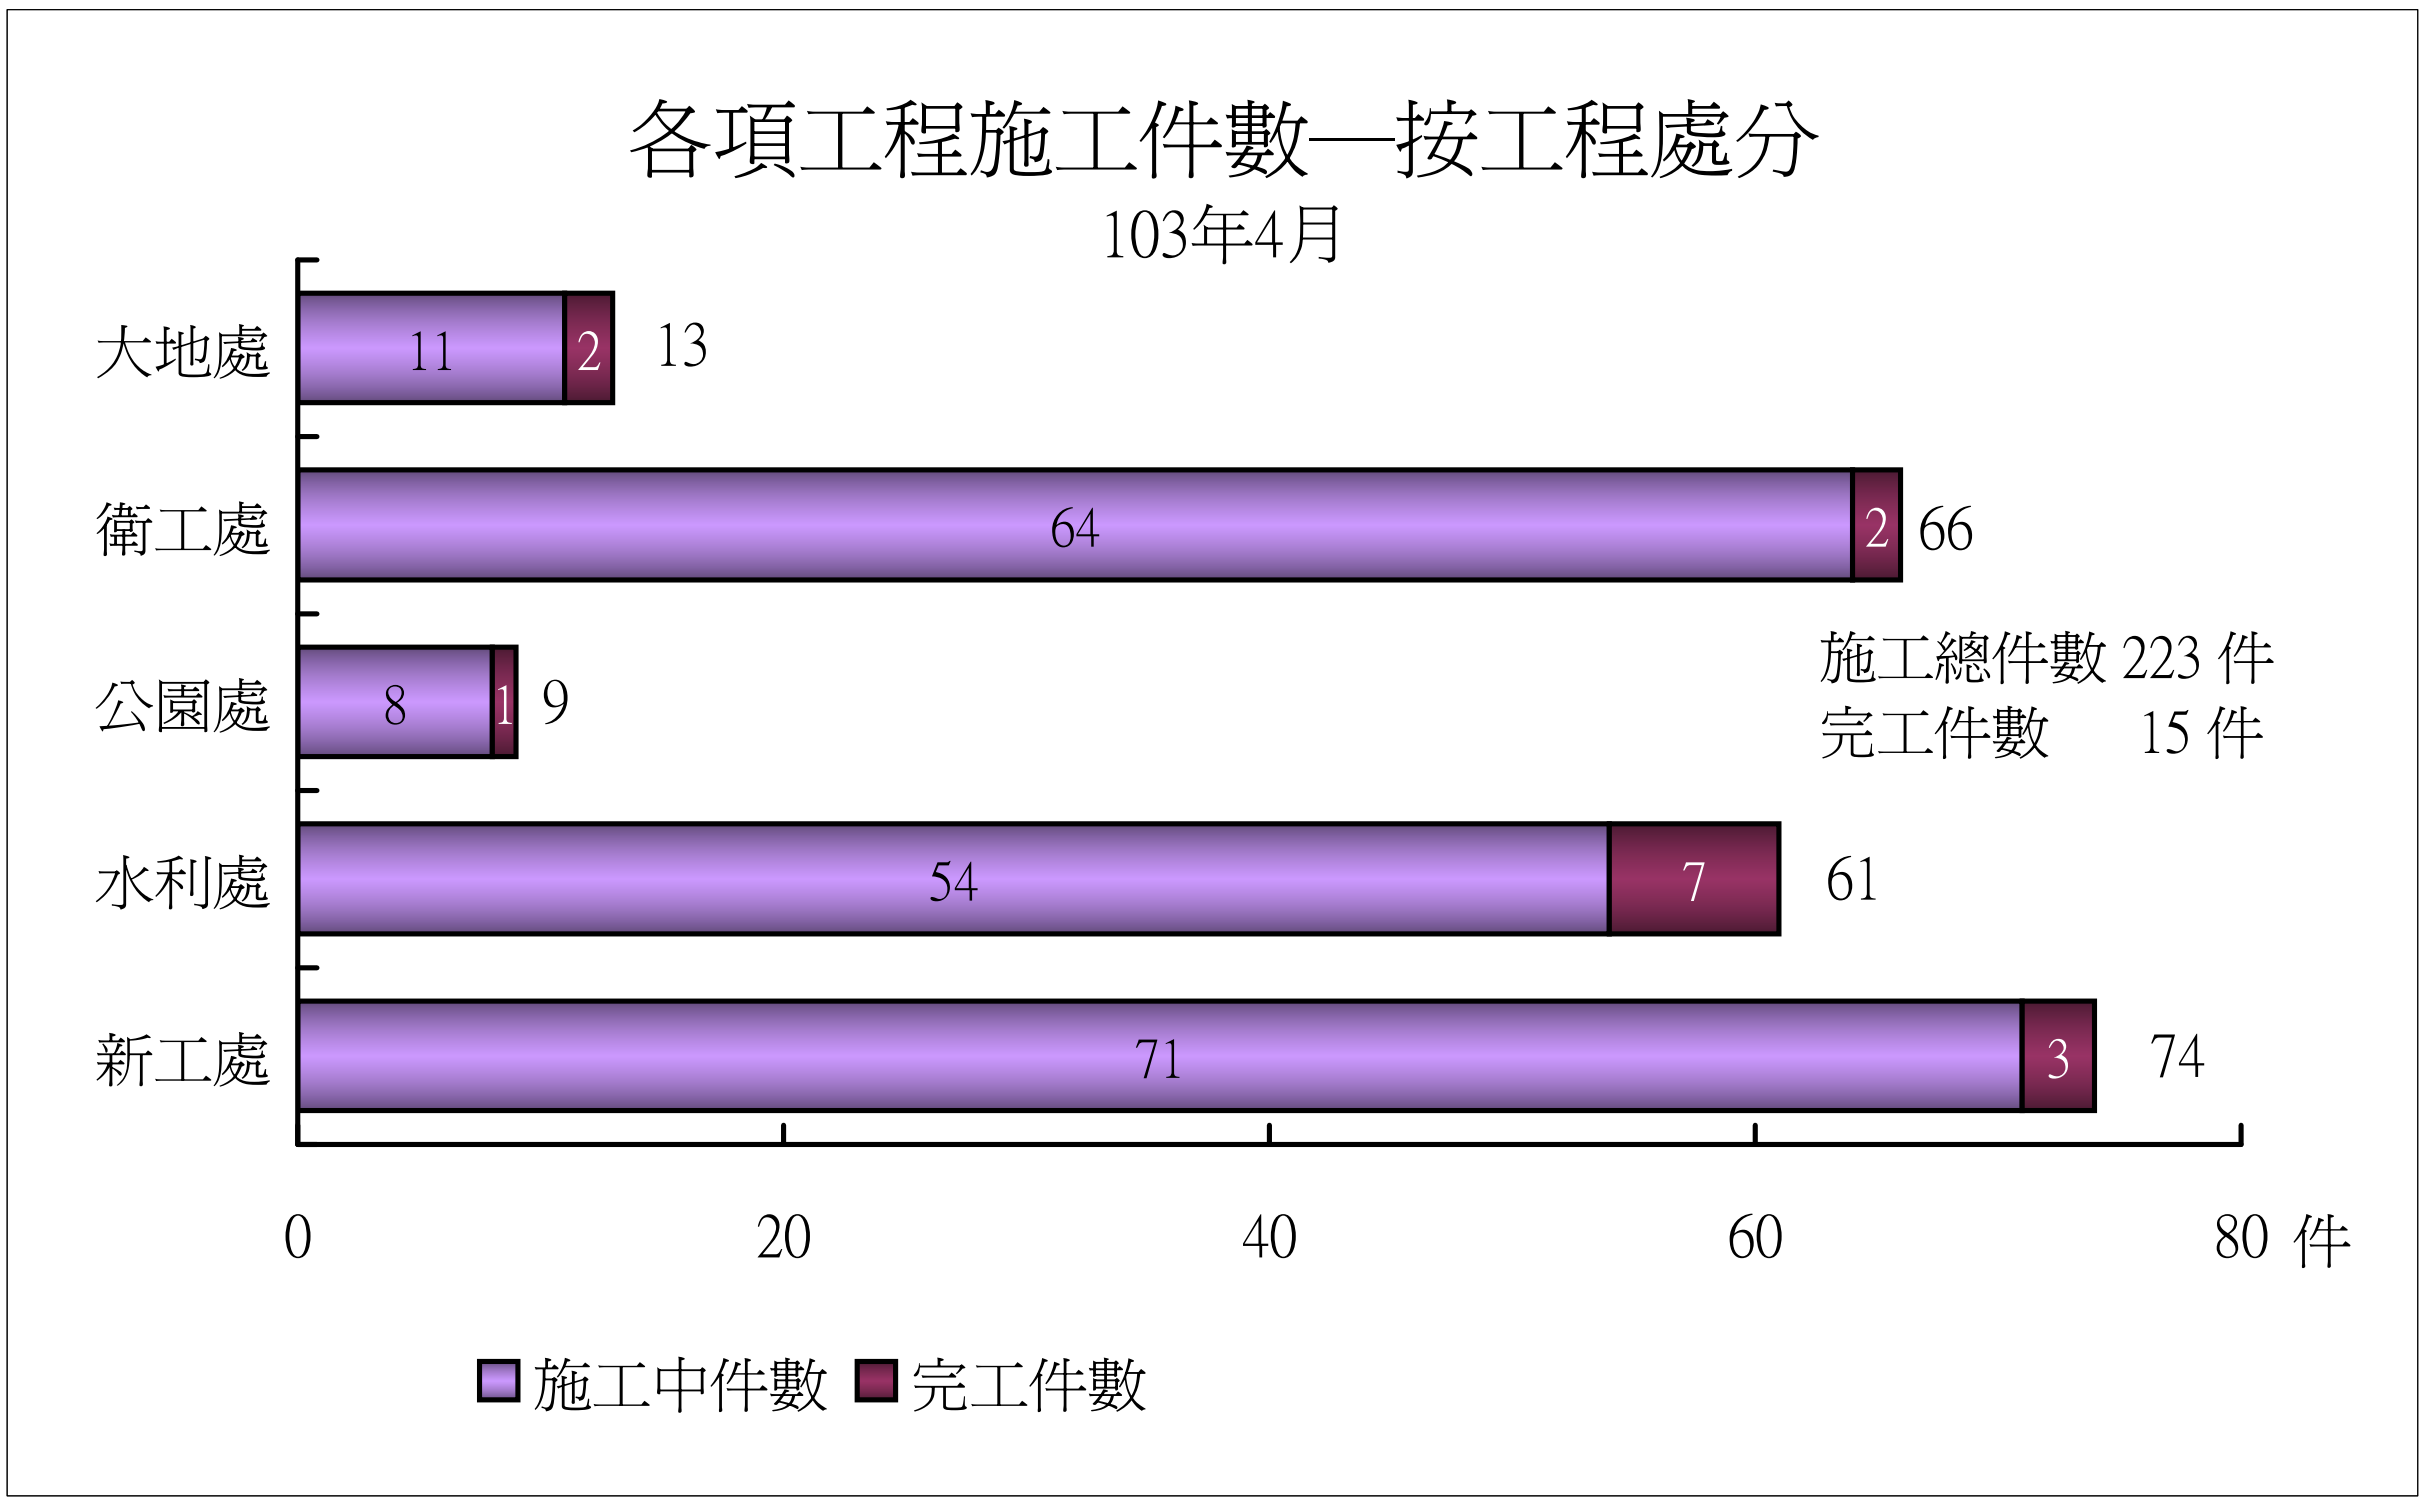
各項工程施工件數—按工程處分
103年4月
大地處
衛工處
公園處
水利處
新工處
11
2
13
64
2
66
8
1
9
54
7
61
71
3
74
施工總件數 223 件
完工件數 15 件
0
20
40
60
80 件
施工中件數
完工件數

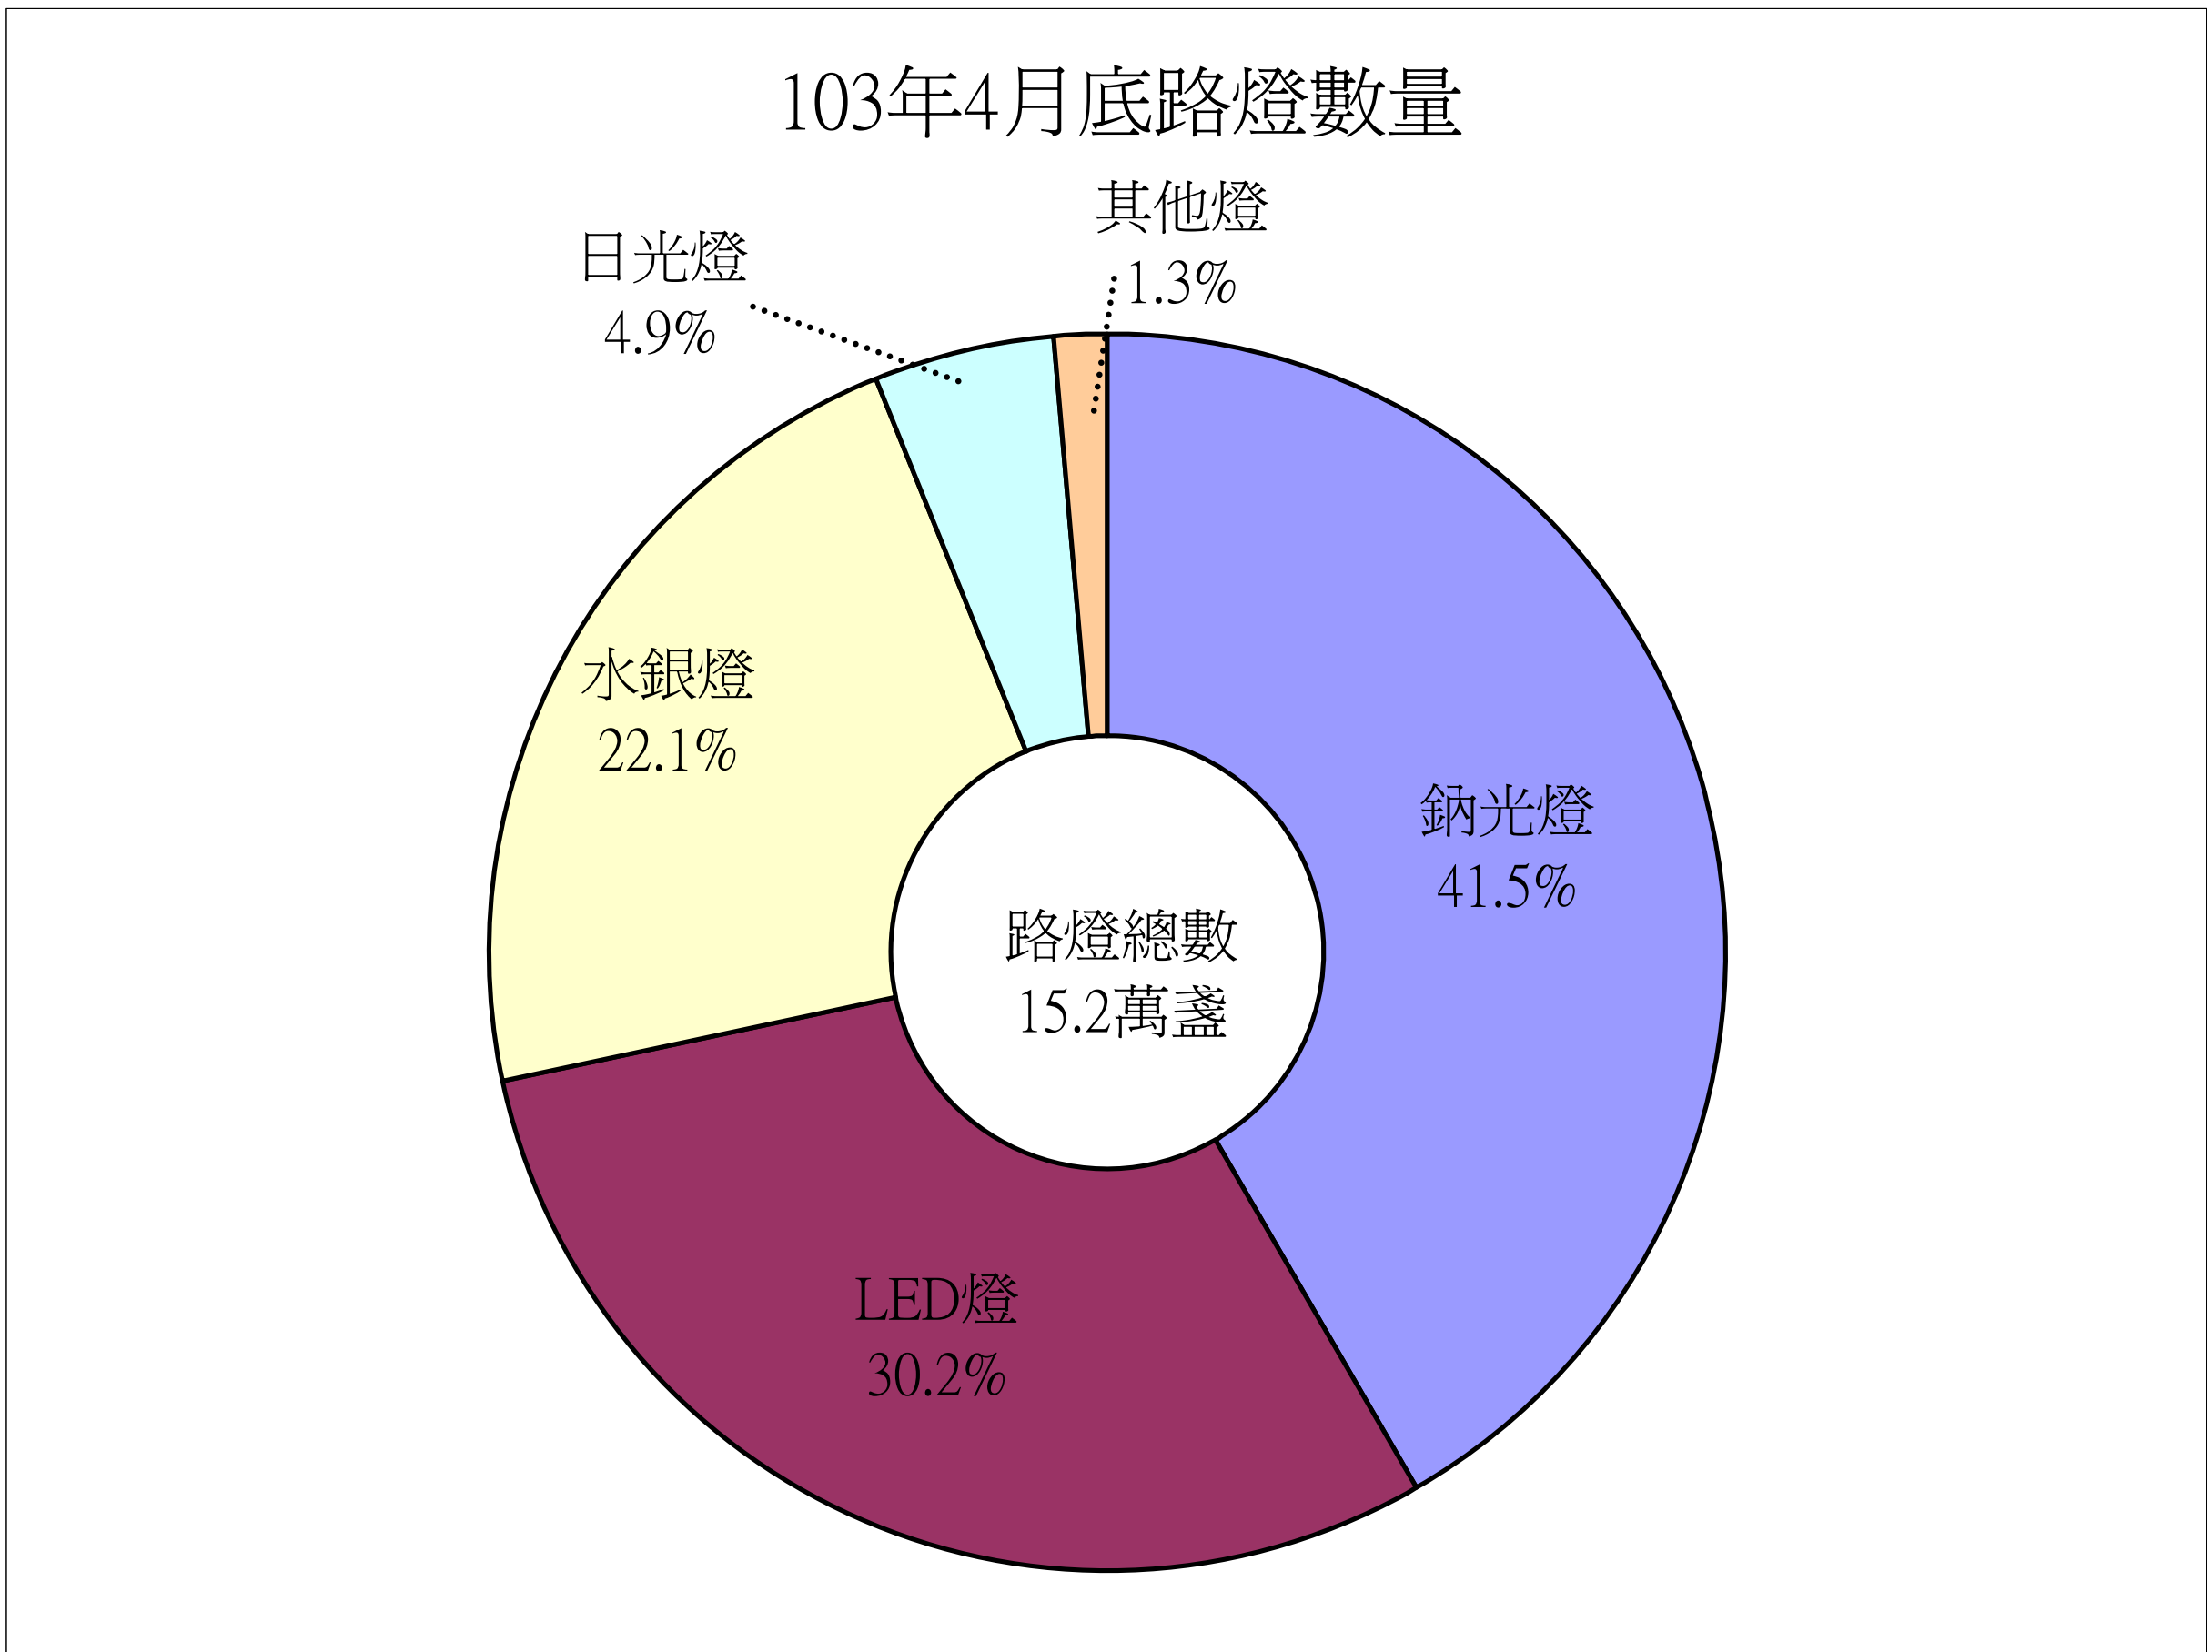
103年4月底路燈數量
其他燈
1.3%
日光燈
4.9%
水銀燈
22.1%
鈉光燈
41.5%
LED燈
30.2%
路燈總數
15.2萬盞

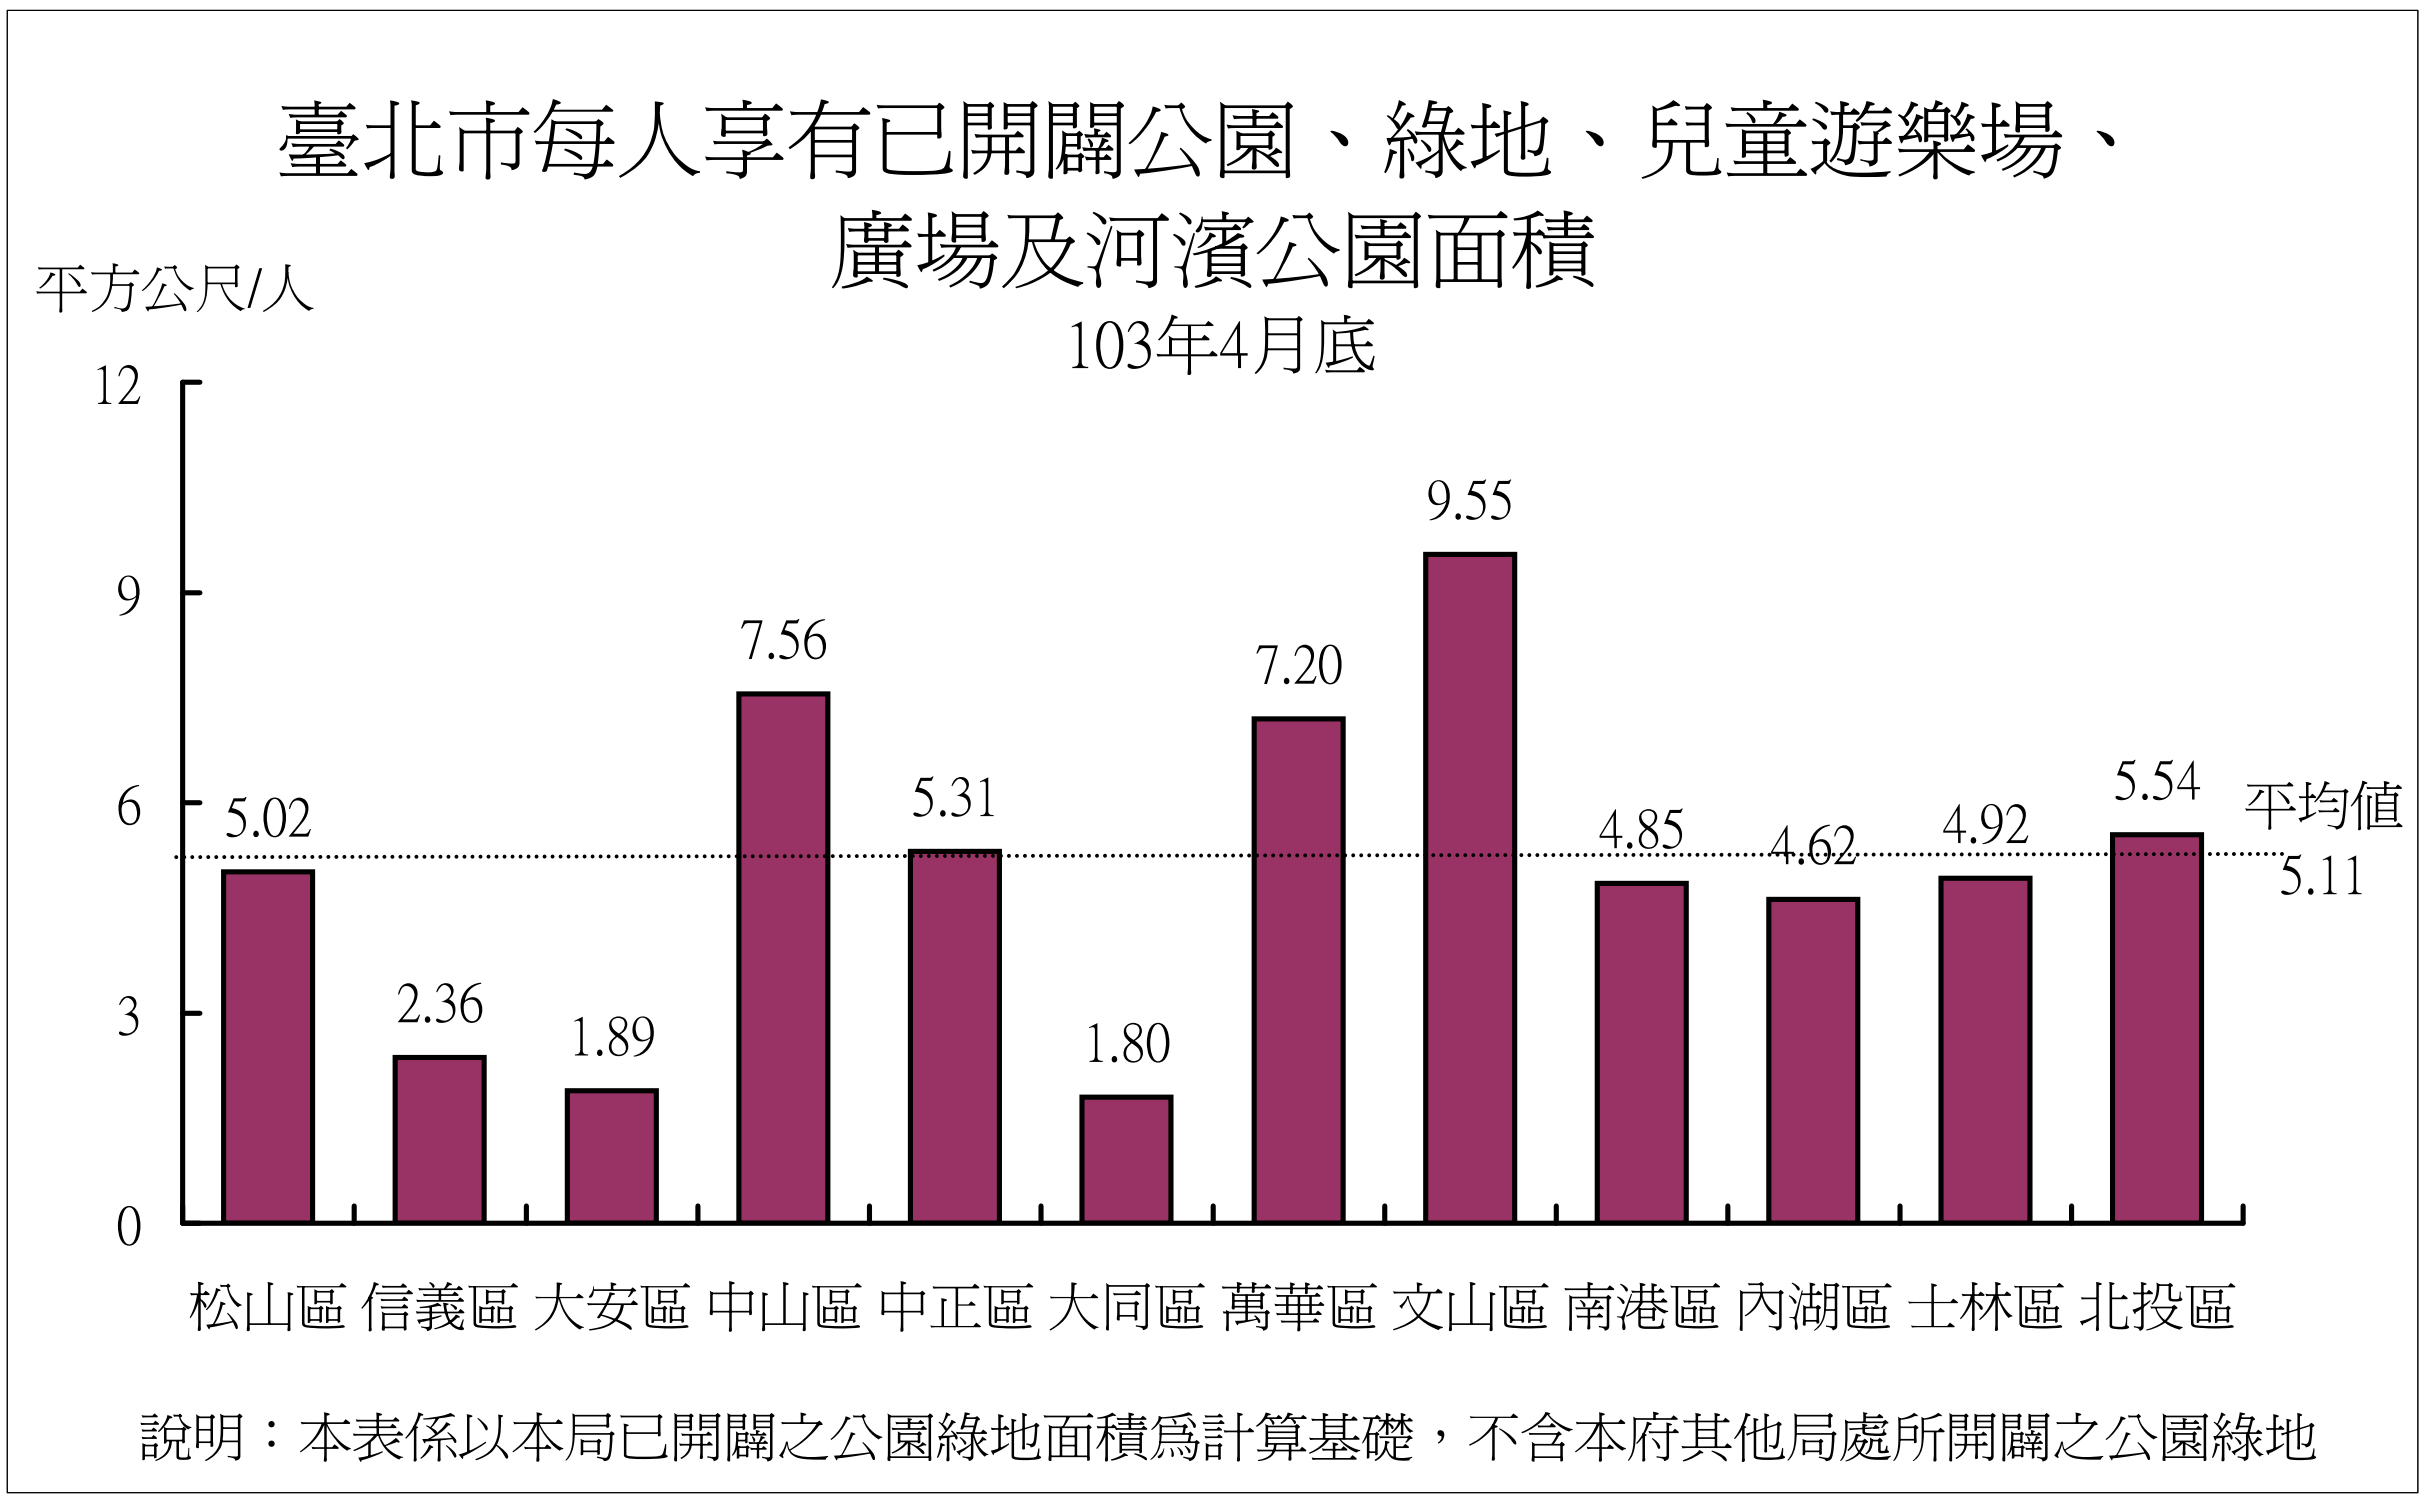
臺北市每人享有已開闢公園、綠地、兒童遊樂場、
廣場及河濱公園面積
平方公尺/人
103年4月底
12
9
6
3
0
5.02
2.36
1.89
7.56
5.31
1.80
7.20
9.55
4.85
4.62
4.92
5.54
平均值
5.11
松山區 信義區 大安區 中山區 中正區 大同區 萬華區 文山區 南港區 內湖區 士林區 北投區
說明：本表係以本局已開闢之公園綠地面積為計算基礎，不含本府其他局處所開闢之公園綠地

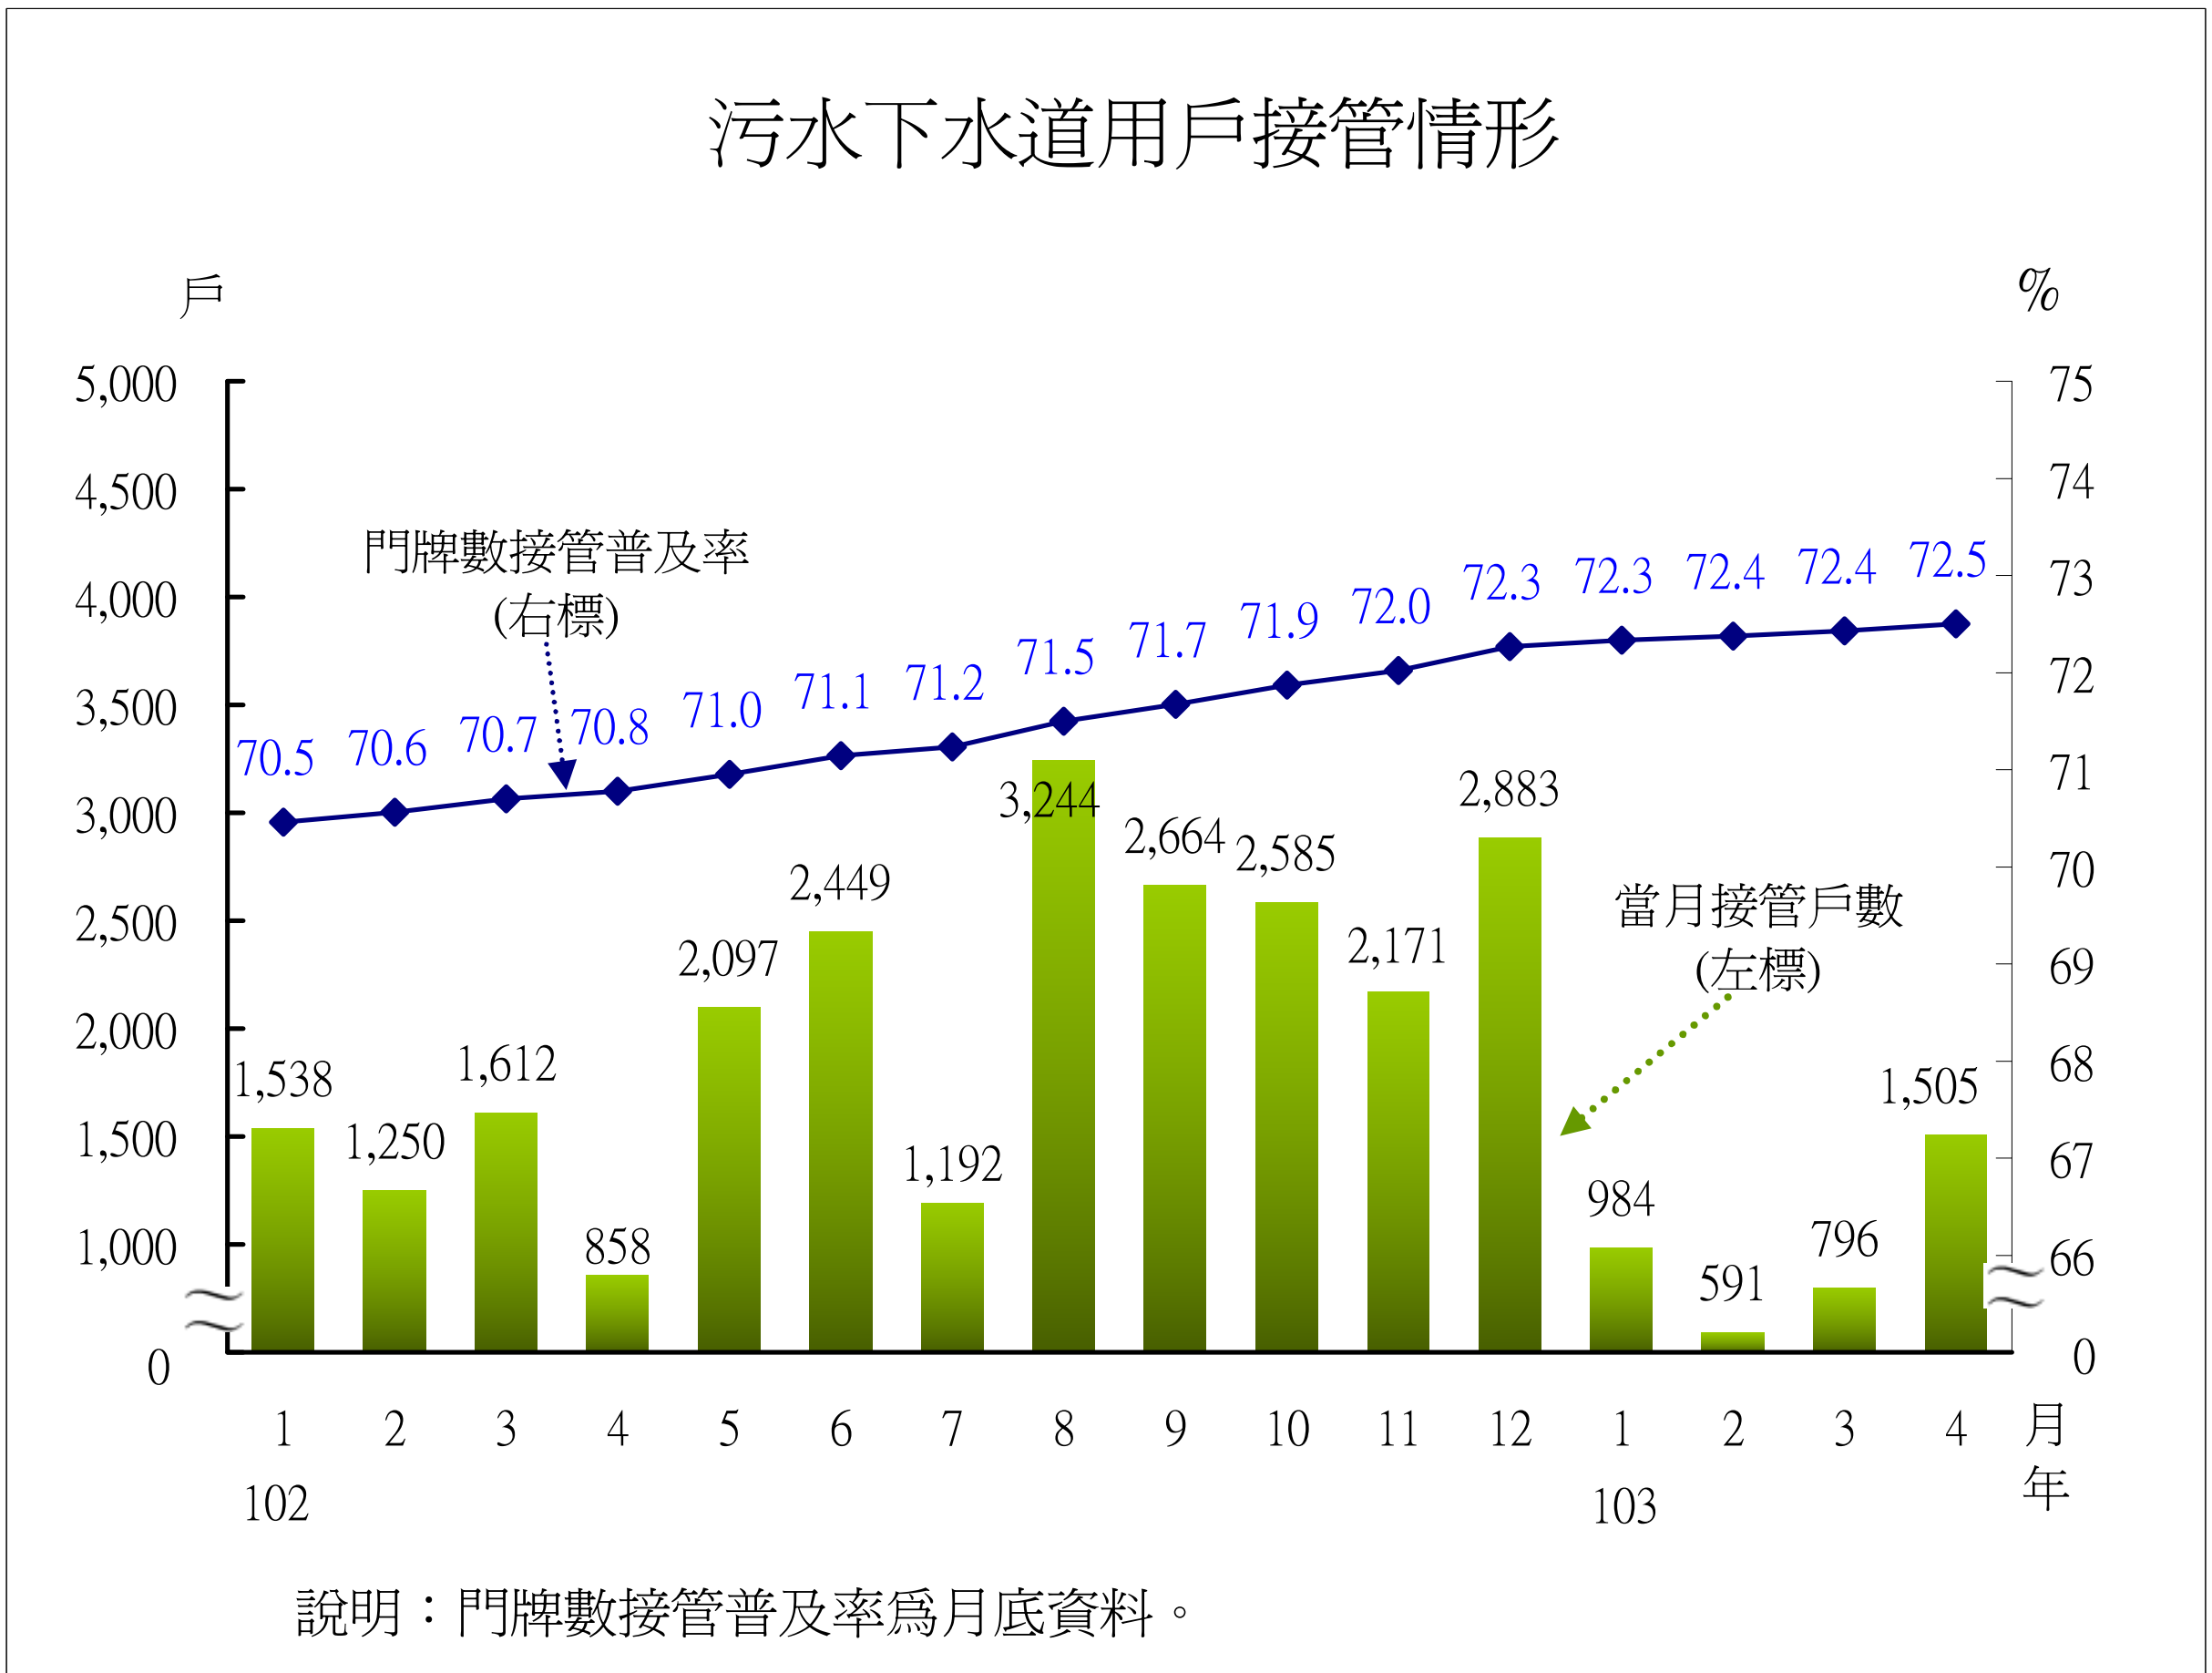
污水下水道用戶接管情形
戶
%
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
0
門牌數接管普及率
(右標)
70.5 70.6 70.7 70.8 71.0 71.1 71.2 71.5 71.7 71.9 72.0 72.3 72.3 72.4 72.4 72.5
1,538 1,250 1,612 858 2,097 2,449 1,192 3,244 2,664 2,585 2,171 2,883 984 591 796 1,505
當月接管戶數
(左標)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
月
102
103
年
說明：門牌數接管普及率為月底資料。

4月份施工工程簡要分析

Brief Analysis in Apr. 2014

單位：件　　　　unit：case

工程別 Construction	施工件數 No. of Construction										備註 Note
	總計 Total	完工 Completed				施工中 Under Construction					
		合計 Sub-total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	合計 Sub-total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	停工 Work Suspension	
總計 Total	223	15	-	13	2	208	60	103	42	3	
百分比 %	100.00	6.73	0.00	5.83	0.90	93.27	26.91	46.19	18.83	1.35	
1. 道路新建、拓寬、改善 Road Expansion, Improvement and New Constructions	27	1	-	-	1	26	5	16	5	-	詳表1
2. 橋梁新建、拓建、改善 Bridge Expansion, Improvement and New Constructions	11	-	-	-	-	11	1	2	8	-	詳表2
3. 人行道改善工程 Sidewalk Improvement Work	5	-	-	-	-	5	-	1	4	-	詳表3
4. 隧道、地下道工程 Tunnel Constructions	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	詳表4
5. 停車場新建 New Parking Lots Constructions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	詳表5
6. 公有建築物工程 Public Building Constructions	12	-	-	-	-	12	2	3	4	3	詳表6
7. 共同管道及其他工程 Communal Pipeline and Other Constructions	6	1	-	-	1	5	1	1	3	-	詳表7
8. 防洪工程 Flood Protection Constructions	22	3	-	3	-	19	6	12	1	-	詳表8
9. 抽水站新建、擴建 Rainwater Pump Station Expansion and New Constructions	12	-	-	-	-	12	3	4	5	-	詳表9
10. 雨水下水道新建、改善 Rainwater Drainage System Improvement and New Constructions	28	5	-	5	-	23	2	17	4	-	詳表10
11. 公園綠地新建、改善 Park Improvement and New Constructions	19	1	-	1	-	18	5	11	2	-	詳表11
12. 污水下水道新建、改善 Sewerage System Improvement and New Constructions	66	2	-	2	-	64	24	35	5	-	詳表12
13. 治山防災整體治理工程 Watershed Management and Disaster Prevention	13	2	-	2	-	11	9	1	1	-	詳表13

資料來源：工務局統計室。
Source：Statistics Office of Public Works Department

施工中工程

Under Construction

單位：件　　unit：case

年(月)別／機關別 Year (Month)／Sponsor Institution		總計 Total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	停工 Work Suspension
民國102年	2013					
1月	Jan.	201	55	97	47	2
2月	Feb.	186	42	94	48	2
3月	Mar.	191	48	98	44	1
4月	Apr.	202	53	122	26	1
5月	May	206	56	107	41	2
6月	June	249	56	153	38	2
7月	July	276	56	176	39	5
8月	Aug.	280	66	173	38	3
9月	Sep.	275	74	169	26	6
10月	Oct.	283	72	167	39	5
11月	Nov.	259	67	142	47	3
12月	Dec.	223	52	104	64	3
民國103年	2014					
1月	Jan.	203	53	92	56	2
2月	Feb.	195	51	90	48	6
3月	Mar.	183	44	82	53	4
4月	Apr.	208	60	103	42	3
新建工程處 New Construction Office		71	13	27	28	3
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		54	11	37	6	-
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office		8	3	3	2	-
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		64	24	35	5	-
大地工程處 Geotechnical Engineering Office		11	9	1	1	-

資料來源：工務局統計室。
Source：Statistics Office of PWD

表1.4月份道路新建、拓寬、改善工程

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)
新建工程處 New Construction Office		總　計	302,922
	100	1. 北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)	69,770
	102	2. 福國路延伸工程(第1期)道路橋梁、共同管道及代辦自來水管線工程	109,498
	102	3. 中山北安路501巷林蔭大道工程	8,533
	101-103	4. 士林86號道路新築工程	1,094
	101	5. 北投陽金(百拉卡)公路路口往北縣約500公尺處拓寬工程	2,366
	102	6. 102年度專案路面更新(第1標)(中山大同)	9,342
	102	7. 102年度專案路面更新(第2標)(松山信義)	4,812
	102	8. 102年度專案路面更新(第3標)(中正萬華)	5,198
	102	9. 102年度專案路面更新(第4標)(內湖南港)	6,980
	102	10. 102年度專案路面更新(第5標)(士林北投)	12,980
	102	11. 102年度專案路面更新(第6標)(大安文山)	10,016
	101-102	12. 101、102年度災害搶修預約式契約工程(第2標)(大安、文山、中正、萬華)	1,634
	102-103	13. 102、103年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第1標)(中山大同)	2,512
	102-103	14. 102、103年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第2標)(松山信義)	2,420

Table 1. Road Expansion, Improvement and New Constructions in Apr. 2014

工程內容 Construction Content			工期 While Constructing			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
…	…	…	--	--	--	--	--	5	16	6
4,577	4.2-19.1	44,104	101.02	104.04		44.85	42.72			v
1,802	28.2-45	63,269	102.03	104.08		23.64	33.79	v		
540	43-46	23,760	102.11	103.12		10.55	16.35	v		
165	12	1,980	103.04	103.08		0.10	0.10		v	
80	10.3	824	101.10	103.04		100.00	52.00			v
5,205	12-19	82,927	102.06	103.07		68.00	68.00		v	
2,175	14	30,450	102.06	102.10	103.04	100.00	100.00			v
1,944	10-14	25,233	102.06	103.07		60.07	58.81			v
4,400	8-24	79,512	102.06	103.05		91.74	96.98	v		
3,807	29-44	140,003	102.06	103.08		53.00	53.00		v	
7,118	9-26	100,785	102.06	103.08		56.61	56.61		v	
預約維護			101.01	102.12		100.00	49.91			v
預約維護			102.06	103.12		53.85	53.85		v	
預約維護			102.07	103.12		41.00	41.00		v	

表1.4月份道路新建、拓寬、改善工程(續)

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)
新建工程處 New Construction Office	102-103	15. 102、103年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第3標)(中正萬華)	2,426
	102-103	16. 102、103年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第4標)(內湖南港)	2,198
	102-103	17. 102、103年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第5標)(士林北投)	2,436
	102-103	18. 102、103年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第6標)(大安文山)	2,362
	102-103	19. 102、103年度一般道路更新預約式契約工程(第1標)(中山大同)	3,370
	102-103	20. 102、103年度一般道路更新預約式契約工程(第2標)(松山信義)	3,250
	102-103	21. 102、103年度一般道路更新預約式契約工程(第3標)(中正萬華)	3,294
	102-103	22. 102、103年度一般道路更新預約式契約工程(第4標)(內湖南港)	3,925
	102-103	23. 102、103年度一般道路更新預約式契約工程(第5標)(士林北投)	3,347
	102-103	24. 102、103年度一般道路更新預約式契約工程(第6標)(大安文山)	3,140
	102	25. 內湖民權東路6段190巷道路陡坡調降工程	908
	102	26. 仁愛路道路及附屬設施改善維護工程(B標)(基隆路-復興南路)	12,560
	102	27. 仁愛路道路及附屬設施改善維護工程(A標)(復興南路-中山南路)	12,550

資料來源：新建工程處。

Table 1. Road Expansion, Improvement and New Constructions in Apr. 2014 (Cont.)

工程內容 Construction Content			工期 While Constructing			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
預約維護			102.06	103.12		35.42	35.42		V	
預約維護			102.05	103.12		56.71	56.71		V	
預約維護			102.06	104.06		85.27	85.27		V	
預約維護			102.06	103.12		56.46	56.46		V	
預約維護			102.10	103.12		23.85	23.85		V	
預約維護			102.10	103.12		63.33	63.33		V	
預約維護			102.08	103.12		46.00	46.00		V	
預約維護			102.08	103.12		76.31	76.31		V	
預約維護			102.08	103.12		96.00	96.00		V	
預約維護			102.09	103.12		52.00	52.00		V	
230	8-10	2,283	102.08	103.05		64.89	59.93			V
2,014	33-34	67,638	102.09	103.07		50.62	55.10	V		
2,596	3-56	87,452	102.09	103.08		33.63	41.00	V		

Source：New Construction Office

表2.4月份橋梁新建、拓建、改善工程

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)
新建工程處 New Construction Office		**總　計**	…
	102	1. 福國路延伸工程(第一期)道路橋梁、共同管道及代辦自來水管線工程	①…
	101-102	2. 101-102年度全市橋涵預約維護改善工程(第1標)(中山大同區)	1,734
	101-102	3. 101-102年度全市橋涵預約維護改善工程(第2標)(松山信義區)	1,489
	101-102	4. 101-102年度全市橋涵預約維護改善工程(第3標)(中正萬華區)	1,398
	101-102	5. 101-102年度全市橋涵預約維護改善工程(第4標)(內湖南港區)	1,550
	101-102	6. 101-102年度全市橋涵預約維護改善工程(第5標)(士林北投區)	1,700
	101-102	7. 101-102年度全市橋涵預約維護改善工程(第6標)(大安文山區)	1,560
	101	8. 北投陽金(百拉卡)公路路口往新北市約500公尺處拓寬工程	①…
	101	9. 南湖大橋上游側加設人行及自行車道工程	4,978
	102	10. 麥帥二橋鋼纜套管更換維修工程	1,100
	101-102	11. 萬壽橋人行道拓寬暨護欄美化改善工程	1,920

資料來源：新建工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

Table 2. Bridge Expansion, Improvement and New Constructions in Apr. 2014

工程內容 Construction Content						工期 While Constructing			施工進度 Progress				
主橋 Main Span			引道 Lead Road			開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (㎡)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (㎡)								
…	…	…	…	…	…	--	--	--	--	--	1	2	8
295	28	8,260	370	2.75-28	7,330	102.03	104.08		23.64	33.79	V		
預約維護						101.05	103.06		90.69	90.69		V	
預約維護						101.08	102.12		100.00	89.73			V
預約維護						101.08	103.03		100.00	94.07			V
預約維護						101.07	102.12		100.00	91.89			V
預約維護						101.07	103.03		100.00	98.50			V
預約維護						101.08	102.12		100.00	90.00			V
80	4.3	344	…	…	…	101.10	103.04		100.00	52.50			V
290	3.3	957	334	3-4	1,034	101.10	103.07		89.80	41.65			V
-	-	-	-	-	-	102.11	103.05		94.18	78.26			V
-	-	-	-	-	-	103.02	103.08		23.01	23.01		V	

Source：New Construction Office

Note：①The Construction Expense is included in the road project expenditure.

表3. 4月份人行道改善工程

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)
新建工程處 New Construction Office		總　　計	22,961
	101-102	1. 101、102年度臺北市人行道預約改善工程(第1標)	4,720
	101-102	2. 101、102年度臺北市人行道預約改善工程(第2標)	4,646
	101-102	3. 101、102年度臺北市人行道預約改善工程(第3標)	4,646
	101-102	4. 101、102年度臺北市人行道預約改善工程(第4標)	4,490
	101-102	5. 101、102年度臺北市人行道預約改善工程(第6標)	4,459

資料來源：新建工程處。

Table 3. Sidewalk Improvement Work in Apr. 2014

工程內容 Construction Content			工期 While Constructing			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
...	...	...	--	--	--	--	--	-	1	4
預約維護			101.08	103.06		49.87	49.87		v	
預約維護			101.06	102.12		100.00	64.74			v
預約維護			101.06	102.12		100.00	65.78			v
預約維護			101.05	103.03		100.00	93.21			v
預約維護			101.04	103.03		100.00	88.40			v

Source：New Construction Office

表4. 4月份隧道、地下道工程

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)
	102	1. 林森南路車行地下道改善工程	1,760
	102	2. 林森南路車行地下道抽風機設備更新工程	900

資料來源：新建工程處。

表5. 4月份停車場新建工程

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)
		本月份無此項工程施工	

資料來源：新建工程處。

Table 4. Tunnel Constructions in Apr. 2014

工程內容 Construction Content			工期 While Constructing			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
地下道改善			103.02	103.07		39.12	46.14	v		
通風設備更新			103.02	103.08		0.68	8.91	v		

Source：New Construction Office

Table 5. New Parking Lots Constructions in Apr. 2014

工程內容 Construction Content				工期 While Constructing			施工進度 Progress				
總面積 Area (平方公尺) (㎡)	大型車停車位 (輛) (set)	小型車停車位 (輛) (set)	機車停車位 (輛) (set)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)

Source：New Construction Office

表6.4月份市公有建築物工程

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)
新建工程處 New Construction		總　計	1,792,295
	100	1. 臺北市松山區三民國民小學綜合大樓新建工程	16,600
	101-104	2. 臺北市政府消防局松江分隊新建工程	30,480
	101	3. 北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)專案住宅新建工程(建築主體工程)	250,300
	100-103	4. 臺北市身心障礙福利會館二期新建工程(建築工程)	14,070
	102	5. 北部流行音樂中心興建工程連續壁工程	11,386
	102	6. 養護工程隊分裝場房舍及瀝青混凝土分裝設備新建工程暨第四分隊庫房及景美庫房修繕工程	2,842
	101-103	7. 臺北市殯葬管理處第二殯儀館整建工程(建築工程)	38,600
	102	8. 林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程第一標	635,900
	102	9. 林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程第二標	441,500
	102	10. 林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程第三標	320,100
	102	11. 臺北市中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程(建築工程)	29,379
	102	12. 臺北市1999備援話務中心及消防局大同中隊室內裝修統包工程	1,138

資料來源：新建工程處。

Table 6. Public Building Constructions in Apr. 2014

工程內容 Project Content				工期 While Constructing			施工進度 Progress				
棟數 No. of Buildings (棟) (Building)	層數 Storeies 地上 Ground (層) (storey)	層數 Storeies 地下 Underground (層) (storey)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
56	--	--	702,457	--	--	--	--	--	2	3	4
1	3	1	4,195	100.12	103.01	終止契約	100.00	84.00			
1	12	3	11,348	101.05	103.10	停工	50.90	52.98			
15	10-13	2	108,834	101.09	104.09		30.48	27.57			∨
1	6	2	6,457	102.01	103.11		55.58	57.62	∨		
-	-	-	-	102.06	103.03		100.00	95.90			∨
1	1	-	257	102.08	103.02	停工	100.00	15.90			
1	4	2	13,923	102.09	104.11		8.95	8.56			∨
14	18	2	253,503	102.08	106.03		0.08	0.08		∨	
11	21	2	168,172	102.08	106.03		0.08	0.08		∨	
9	20	2	123,579	102.08	106.02		0.08	0.08		∨	
1	7	3	12,189	102.12	104.12		5.84	2.88			∨
1				103.03	103.05		35.04	36.70	∨		

Source：New Construction Office

表7.4月份共同管道及其他工程

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)
新建工程處 New Construction Office		總　計	…
	102	1. 161KV汐止-蘆洲線#36連接站及管路工程	6,316
	102	2. 福國路延伸工程(第1期)道路橋梁、共同管道及代辦自來水管線工程	①…
	102	3. 102年度「臺北市街道家具設計設置營運及管理計畫」案公車候車亭電力申裝工程	1,160
	102	4. 臺北市松山路道路景觀與人本環境改善工程(松隆路至永吉路段)	1,182
	102	5. 林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建工程─樹木移植工程	856
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	103	6. 車輛集用場空間改善	1,438

資料來源：新建工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

Table 7. Communal Pipeline and Other Constructions in Apr. 2014

工程內容 Construction Content	工期 While Constructing			施工進度 Progress				
	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
--	--	--	--	--	--	1	1	4
#36連接站1座，推管1處183公尺，工作井2座，管路埋設193公尺。	102.03	103.06		49.25	16.90			V
共同管道工程：施作幹管660公尺，支管1,230公尺，推管470公尺及代辦自來水管線工程。	102.03	104.08		23.64	33.79	V		
本工程屬電力工程，非屬建築工程，主要工項係於候車亭後上方裝設開關箱並埋設pvc管於人行道，銜接至台電人手孔，接電後可供候車亭之時間看板、廣告燈箱照明等共69處。	102.07	102.12		100.00	81.17			V
人行道拓寬施工面積1,669平方公尺，配合相關單位管線整合、交通牌誌整合更新、公車站位更新。	102.10	103.01	103.04	100.00	100.00			V
辦理林口國宅暨2017世界大學運動會選手村興建基地內樹木移植1,123棵，移植施工面積514,285平方公尺。	102.09	103.04		100.00	98.93			V
車輛集用場空間改善面積4,788平方公尺	103.03	103.04		99.90	99.90		V	

Source：New Construction Office

Note：①The Construction Expense is included in the road project expenditure.

表8.4月份防洪工程

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		總　　計	72,289
	101	1. 基隆河低水護岸整建工程-百齡橋至中山橋(第1期)疏浚工程	12,782
	102	2. 中港河碼頭及周邊環境改造工程	8,150
	102	3. 中港河自行車橋新建及關渡碼頭周邊環境改善工程	10,484
	102	4. 內溝溪景觀改善工程(第2標)	11,280
	102	5. 基隆河左岸新舊防潮堤間人工溼地整建工程	1,528
	102	6. 高灘地北區管理站整修統包工程	351
	102	7. 全市河濱公園疏散門及相關設備整建工程(第2標)	909
	102	8. 磺港溪壓力箱涵大業路西側管理房下游段清疏工程	1,126
	102	9. 北投士林科技園區區段徵收公共工程-施工圍籬及土方整理工程(第2期工區範圍先期工程)	4,986
	102	10. 102~103年度基隆河及淡水河航道整理預約維護工程	563
	102	11. 內溝溪景觀改善工程-賞螢步道	287
	102	12. 陽港3調洪沉砂池新建工程	10,632
	103	13. 103年度南區水利建造物預約維護檢修改善工程	470
	103	14. 103年度西區水利建造物預約維護檢修改善工程	470
	103	15. 103年度北區水利建造物預約維護檢修改善工程	470
	103	16. 全市河濱公園疏散門及相關設備整建工程(第3標)	2,220
	103	17. 103年度東區水利建造物預約維護檢修改善工程	470
	103	18. 103年度沉砂池清疏及維護工程	432
	103	19. 全市堤防美化工程(第4標)	952
	103	20. 社子島淡7閘門周邊護岸環境改善工程	652
	103	21. 南湖大橋至成功橋間堤防周邊環境改善工程	855
	103	22. 全市河濱公園疏散門及相關設備整建工程(第3標)	2,220

資料來源：水利工程處。

Table 8. Flood Protection Constructions in Apr. 2014

工程內容 Construction Content					工期 While Constructing			施工進度 Progress				
堤防 Embank-ment (公尺) (m)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	丁壩 Spur Dam (座) (Set)	閘門 Gate (座) (Set)	其他 Others	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	-	-	-	--	--	--	--	--	6	15	1
低水護岸整建工程					102.03	103.04	103.04	100.00	100.00		∨	
改建中港河碼頭及周邊設施					102.07	104.04		16.85	17.00	∨		
新建自行車棧道、觀景平臺、碼頭周邊設施改善					102.07	104.01		47.45	47.45		∨	
新作木平台6座、木棧道更新、低水步道含坡面改善					102.07	103.05		69.00	70.00	∨		
基隆河左岸新舊防潮堤間生態棲地改善					102.10	103.04	103.04	100.00	100.00		∨	
外牆翻新、室內裝修及機電系統改善					102.11	103.05		79.00	79.00		∨	
疏散門及大興水密門相關設備改善					102.12	103.04	103.04	100.00	100.00		∨	
壓力箱涵清淤作業					102.12	103.03		100.00	4.26			∨
圍籬及土方整理工程					102.12	104.12		26.00	28.00	∨		
防洪調節池之整地、植生、鋪面、人行步道、人行橋、擋土牆、溢流井等					103.01	103.12		37.00	37.00		∨	
賞螢步道工程					103.02	103.05		90.00	90.00		∨	
防洪調節池之整地、植生、鋪面、人行步道、人行橋、擋土牆、溢流井等					103.02	103.12		5.75	6.80	∨		
預約維護					103.03	103.12		53.00	53.00		∨	
預約維護					103.03	103.12		50.00	50.00		∨	
預約維護					103.03	103.12		23.20	23.20		∨	
疏散門及堤頂閘門、士林橋與南深橋陸閘等相關設備改善					103.03	104.04		3.00	3.00		∨	
預約維護					103.03	103.12		15.00	15.00		∨	
辦理全市公私有沉砂池清疏及維護作業					103.03	103.12		0.70	0.70		∨	
景美溪右岸堤防美化(萬芳路至萬壽橋段					103.04	103.06		12.00	15.00	∨		
碼頭周邊河道清淤與設施改善					103.04	103.08		1.60	3.20	∨		
成功橋至內湖垃圾山側堤內人行步道及周邊環境改善					103.04	103.07		15.00	15.00		∨	
疏散門及堤頂閘門、士林橋與南深橋陸閘等相關設備改善					103.03	104.04		3.00	3.00		∨	

Source：Hydraulic Engineering Office

表9.4月份抽水站新建、擴建工程

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)	工程內容 抽水機 Pump Set 數量 Number (座) (Set)	工程內容 抽水機 Pump Set 口徑 caliber (吋) (Inch)	工程內容 抽水機 Pump Set 抽水量 Pumping Capacity (立方公尺/每秒) (m^3/Sec)
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		總　計	102,039	14	-	-
	99	1. 洲美抽水站新建工程	30,586	4	-	-
	100	2. 芝山福德錦州抽水站機組更新工程	12,300	10	-	-
	101	3. 臺北市抽水站第二及三分區暨總一管理中心自動化監控系統建置工程	39,735	-	-	-
	101	4. 抽水站環境改造工程(第1期)	5,600	-	-	-
	102	5. 抽水站環境改造工程(第2期)第1標	4,990	-	-	-
	102	6. 臺北市CCTV河川水情監控設備建置工程(第1期)	2,102	-	-	-
	102	7. 河川閘門更新工程(第四標)	389	-	-	-
	103	8. 103年度抽水站沉水泵浦拆卸安裝檢修工程	574	-	-	-
	103	9. 各抽水站機房整修及鐵件更新工程	520	-	-	-
	103	10. 社子島地區及成美抽水站閘門及吊門機改善工程	3,136	-	-	-
	103	11. 中山抽水站排放水路兩側低水護岸及洲美(一)臨時抽水站旁土堤整建工程	1,335	-	-	-
	102	12. 文林抽水站新建工程(後續工程)	771	-	-	-

資料來源：水利工程處。

Table 9. Rainwater Pump Station Expansion and New Constructions in Apr. 2014

Construction Contentt				工期 While Constructing			施工進度 Progress				
發電機 Electric Generator		抽水機房 Pump Set Room		開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled	實際 Actual	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay
數量 Number (座) (Set)	馬力 Horse-power (匹) (Hp)	數量 Number (座) (Set)	面積 Area (平方公尺) (㎡)				(%)	(%)	(件) (case)	(件) (case)	(件) (case)
-	-	-	-	--	--	--	--	--	3	4	5
站房1座				99.09	102.03		100.00	95.13			V
-	-	-	-	100.12	103.06		95.40	96.66	V		
建置自動化監控系統、影像監視系統				101.08	104.02		51.19	48.91			V
環境改造工程				102.02	103.05		82.60	79.80			V
辦理撫遠等抽水站之站房改善外牆立面、周邊環境及指定處所內環境改善				103.01	103.10		20.40	23.18	V		
全市河川區域增設14處CCTV監控設備及6處河川水位計				103.02	103.06		70.20	71.10	V		
河川閘門水封更新及民生抽水站攔汙柵更新				102.12	103.04		100.00	95.50			V
抽水站沉水泵浦拆卸、吊運、沉水泵浦分解檢查、軸承機軸封更新				103.04	103.12		0.50	0.50		V	
各抽水站機房整修及鐵件更新工程				103.04	103.12		3.00	3.00		V	
社子島地區及成美抽水站閘門及吊門機改善				103.04	104.01		0.10	0.10		V	
中山抽水站排放水路兩側低水護岸各約50m及抽水站排水閘門前右岸低水護岸約60m整建				103.04	103.07		1.90	1.90		V	
地下儲油槽、景觀工程、制水閘內格柵及抽水站銘牌、連動控制系統				103.02	103.06		20.30	4.00			V

Source：Hydraulic Engineering Office

表10.4月份雨水下水道新建、改善工程

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費(萬元) Construction Expense (10 Thousands)
		總　　計	…
新建工程處 New Construction Office		新工處主辦工程計	…
	100	1. 北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)	①…
	102	2. 北投士林科技園區區段徵收公共工程-福國路雨水下水道工程(第1期)	58,473
	102	3. 中山北安路501巷林蔭大道工程	①…
	101-103	4. 士林86號道路新築工程	①…
	101-102	5. 101、102年度臺北市人行道預約改善工程(第3標)(中正、萬華)	①…
	101-102	6. 101、102年度臺北市人行道預約改善工程(第6標)(大安文山)	①…
	102	7. 102年度專案路面更新(第4標)(內湖南港)	①…
	102-103	8. 102、103年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第1標)(中山大同)	①…
	102-103	9. 102、103年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第4標)(內湖南港)	①…
	102-103	10. 102、103年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第6標)(大安文山)	①…
	102	11. 內湖民權東路6段190巷道路陡坡調降工程	①…
	102-103	12. 102、103年度一般道路更新預約式契約工程(第1標)(中山大同)	①…

Table 10. New and Improvement Constructions of Rainwater Drainage System in Apr. 2014

工程內容 Construction Content			工期 While Constructing			施工進度 Progress				
側溝 Side Ditch (公尺) (m)	箱涵 Box Culvet (公尺) (m)	管涵 Pipe Culvet (公尺) (m)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
8,950	2,687	2,122	--	--	--	--	--	2	22	4
8,929	2,687	2,092	--	--	--	--	--	2	6	4
7,098	712.4	1,608.5	101.02	104.04		44.85	42.72			V
-	972	221	102.03	103.04	103.04	100.00	100.00		V	
1,156	1,003	244	102.11	103.12		10.55	16.35	V		
325	-	-	103.04	103.08		0.10	0.10		V	
預約維護			101.06	102.12		100.00	65.78			V
預約維護			101.04	103.03		100.00	88.40			V
預約維護			102.06	103.05		91.74	96.98	V		
預約維護			102.06	103.12		53.85	53.85		V	
預約維護			102.05	103.12		56.71	56.71		V	
預約維護			102.06	103.12		56.46	56.46		V	
350	-	18	102.08	103.05		64.89	59.93			V
預約維護			102.10	103.12		23.85	23.85		V	

表10. 4月份雨水下水道新建、改善工程(續)

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費(萬元) Construction Expense (10 Thousands)
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		水利處主辦工程計	25,670
	102	13. 102年度雨水下水道預約維護工程(南港、內湖、信義區)(第1標)	1,838
	102	14. (102)雨水下水道結構修補工程(北區)	3,664
	102	15. (102)雨水下水道人孔調升降緊急搶修工程	424
	102	16. (102)雨水下水道結構修補工程(南區)	1,707
	102	17. (102)雨水下水道結構修補工程(長安、民生、北建國、圓山集水分區)	2,600
	102	18. 102年度雨水下水道預約維護工程(文山萬華區)(第2標)	680
	102	19. 新生大排兩側地盤改良工程(民族-松江路段)	3,856
	102	20. 大同區光能里赤峰街71巷至53巷與南京西路25巷周邊排水改善工程	918
	103	21. 103年度雨水下水道預約維護工程(北投區)(第1標)	678
	103	22. 103年度雨水下水道預約維護工程(文山、萬華區)(第1標)	1,278
	103	23. 103年度雨水下水道預約維護工程(大安、中正區)(第1標)	996
	103	24. (102)雨水下水道結構修補工程(南建國集水分區)	2,866
	103	25. 103年度雨水下水道預約維護工程(中山、松山區)(第1標)	996
	103	26. 103年度雨水下水道預約維護工程(士林、大同區)(第1標)	1,372
	103	27. 103年度全市雨水下水道試挖及復舊工程	238
	103	28. 103年度雨水下水道預約維護工程(南港、內湖、信義區)(第1標)	1,560

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於人行道、橋梁、道路及公有建築物工程內。

Table 10. New and Improvement Constructions of Rainwater Drainage System in Apr. 2014 (Cont.)

工程內容　Construction Content			工期　While Constructing			施工進度　Progress				
側溝 Side Ditch (公尺) (m)	箱涵 Box Culvet (公尺) (m)	管涵 Pipe Culvet (公尺) (m)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
21	-	30	--	--	--	--	--	-	16	-
預約維護			102.03	103.04	103.04	100.00	100.00		V	
結構修補工程			102.04	103.04	103.04	100.00	100.00		V	
人孔調升降			102.04	103.05		52.00	52.00		V	
結構修補工程			102.06	103.04	103.04	100.00	100.00		V	
結構修補工程			102.10	103.10		42.78	42.78		V	
預約維護			102.11	103.04	103.04	100.00	100.00		V	
雙環塞地盤改良工程			102.12	103.06		90.00	90.00		V	
21	-	30	102.12	103.05		85.08	85.08		V	
預約維護			103.03	103.12		6.00	6.00		V	
預約維護			103.04	103.12		7.00	7.00		V	
預約維護			103.04	103.12		2.00	2.00		V	
結構修補工程			103.04	104.03		0.55	0.55		V	
預約維護			103.04	103.12		0.10	0.10		V	
預約維護			103.04	103.12		0.10	0.10		V	
試挖及復舊工程			103.04	103.12		0.50	0.50		V	
預約維護			103.04	103.12		1.00	1.00		V	

Source：New Construction Office, Hydraulic Engineering Office

Note：①The Construction Expense is included in the sidewalk, bridge, road and public building project expenditure.

表11. 4月份臺北市公園綠地新建、改善工程

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	施工預算 Budget (新臺幣萬元) (N.T$ 10,000)	總面積 Total Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	土木工程 遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 園路人行道 Side-walk (平方公尺) (㎡)	土木工程 座椅 Chair (座) (No.)	土木工程 涼亭 Arbor (座) (No.)	土木工程 花架 Flower Shelf (處) (No.)	土木工程 欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
		總　計	22,647	…	2,746	766	4,243	27	6	6	31
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office		公園處主辦工程計	10,090	…	2,746	766	4,243	27	6	6	31
	101	1. 文山(景美)21號二十一興泰公園擴建工程(101-275)	2,881	31,440	-	-	-	-	-	-	-
	101	2. 北投223號公園新建工程(101-190)	321	1,461	122	-	336	5	-	-	-
	103	3. 文山(木柵)87號公園新建工程(103-072)	319	1,611	-	-	186	5	-	-	-
	102	4. 石牌公園更新工程(102-164)	850	…	2,161	101	342	-	4	-	25
	101	5. 文山(景美)21號二十-興泰公園擴建工程地上物拆除案(101-274)	889	…	-	-	-	-	-	-	-
	102	6. 102年圓山公園管理所所轄公園整建工程一中山區及大同區公園整建工程(102-194)	296	…	45	350	770	2	-	1	-
	102	7. 前港公園西北側棚架新設工程(102-223)	118	…	60	-	-	-	-	-	-
	102	8. 前山公園更新工程(102-205)	3,583	…	-	73	1,606	5	2	4	-
	102	9. 102年度華山公園更新工程(102-248)	833	…	359	242	1,003	10	-	1	6

Table 11. Park Improvement and New Constructions in Apr. 2014

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 While Constructing			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swim ming Pool (處) (Lot)	園燈 Park Light (座) (Set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (Set)	體健設施 Physically healthy facility (公尺) (m)	球場(運動場) Sta-dium (處) (Lot)	殘障坡道 Disability Ramp (座) (Set)	舖植草皮 turfing (平方公尺) (㎡)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (No.)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定進度 Sche-duled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
1,158	-	85	1	-	-	4	31,541	40,178	--	--	--	--	--	5	12	2
1,158	-	85	1	-	-	4	31,541	40,178	--	--	--	--	--	3	4	2
336	-	-	-	-	-	-	26,610	15,380	102.08	104.07		37.57	37.83	∨		
57	-	6	-	-	-	1	675	3,382	102.09	103.07		6.00	6.00		∨	
42	-	6	-	-	-	1	221	3,050	103.04	103.08		1.00	1.00		∨	
388	-	28	-	-	-	-	-	-	102.07	103.04	103.04	100.00	100.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.08	104.07		35.80	37.75	∨		
35	-	-	-	-	-	-	-	-	102.09	102.11		100.00	97.50			∨
-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.03	103.04		100.00	95.00			∨
151	-	45	-	-	-	-	2,380	5,562	103.03	103.08		2.50	3.36	∨		
149	-	-	1	-	-	2	1,655	12,804	103.03	103.08		31.20	31.20		∨	

表11. 4月份臺北市公園綠地新建、改善工程 (續)

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	施工預算 Budget (新臺幣萬元) (N.T$ 10,000)	總面積 Total Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Side-walk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (No.)	涼亭 Arbor (座) (No.)	花架 Flower Shelf (處) (No.)	欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		**水利處主辦工程計**	12,557	…	-	-	-	-	-	-	-
	102	10. 延平河濱公園重陽橋周邊景觀整建工程	3,920	…	-	-	-	-	-	-	-
	102	11. 華中河濱公園露營場風雨廣場及相關設施整建工程	2,029	…	-	-	-	-	-	-	-
	103	12. 華中河濱公園露營位增設及相關設施整建工程	1,843	…	-	-	-	-	-	-	-
	103	13. 103年度南區河濱公園土木預約維護工程	1,156	…	-	-	-	-	-	-	-
	103	14. 103年度淡水河系河濱公園颱風豪雨搶險工程	338	…	-	-	-	-	-	-	-
	103	15. 103年度基隆河美堤河濱公園颱風豪雨搶險工程	191	…	-	-	-	-	-	-	-
	103	16. 103年度基隆河成美左岸河濱公園颱風豪雨搶險工程	140	…	-	-	-	-	-	-	-
	103	17. 103年度北區河濱公園園路及水防道路預約維護工程	1,066	…	-	-	-	-	-	-	-
	103	18. 103年度基隆河大佳河濱公園颱風豪雨搶險工程	215	…	-	-	-	-	-	-	-
	103	19. 美堤河濱公園人車分道及相關設施改善工程(第2標)	1,658	…	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

Table 11. Park Improvement and New Constructions in Apr. 2014(Cont.)

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 While Constructing			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (Lot)	園燈 Park Light (座) (Set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (Set)	體健設施 Physically healthy facility (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (Lot)	殘障坡道 Disability Ramp (座) (Set)	舖植草皮 turfing (平方公尺) (㎡)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (No.)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定進度 Scheduled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--	2	8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.10	103.06		24.36	24.36		∨	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.02	103.06		58.00	68.00	∨		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.08		0.12	2.00	∨		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.12		15.00	15.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.12		15.00	15.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.12		20.00	20.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.12		25.00	25.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.12		14.50	14.50		∨	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.12		8.00	8.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.12		3.80	3.80		∨	

Source：Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office

表12. 4月份污水下水道新建、改善工程

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		總　計	329,335
	101-104	1. 第3期大同及中山區分管網工程(101年預約工程)	3,578
	101-104	2. 第3期大同及中山區分管網工程(103年預約工程)	3,425
	100-104	3. 第3期大安及文山區分管網工程(101年預約工程)	3,248
	100-104	4. 第3期大安及文山區分管網工程（貓纜貓空站污水處理專用管工程）	4,480
	100-104	5. 第3期大安及文山區分管網工程（102年預約工程）	2,880
	100-104	6. 第3期大安及文山區分管網工程(103年預約工程)	3,982
	100-104	7. 第3期北投及士林區分管網工程(101年預約工程)	3,233
	100-104	8. 第3期北投及士林區分管網工程(102年預約工程)	3,042
	100-104	9. 第3期松山及信義區分管網工程(101年預約工程)	3,400
	100-104	10. 第3期松山及信義區分管網工程(102年預約工程)	2,830
	100-104	11. 第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國小附近地區)	9,880
	100-104	12. 第3期南港及內湖區分管網工程(101年東湖國中附近地區)	10,420
	100-104	13. 第3期南港及內湖區分管網工程(102年預約工程)	4,137
	101-104	14. 第3期萬華及中正區分管網工程(101年預約工程)	3,517
	101-103	15. 北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(大自然社區附近區域)	6,172
	101-105	16. 格致路及東山路附近地區分管網工程(東山路附近地區)	17,900

Table 12. Sewerage System Improvement and New Constructions in Apr. 2014

工程內容 Construction Content							工期 While Constructing			施工進度 Progress				
主幹管 Trunk (m)	次幹管 Sub-Trunk (m)	分支管 Branch Pipeline (m)	抽揚水站 Pumping Station (座) No.	人孔 Manhole (座) No.	清除孔 Cleanout (座) No.	截流設施 Interception Facilities (個) No.	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Sche-duled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	105,014	2	1,445	-	-	--	--	--	--	--	24	37	5
-	-	-	-	-	-	-	101.06	103.06		63.00	63.00		v	
-	-	154	-	-	-	-	103.04	104.12		0.00	0.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	102.12	103.06		55.00	55.00		v	
-	-	4,275	-	62	-	-	102.09	104.01		21.50	21.54	v		
-	-	-	-	-	-	-	102.07	103.12		41.78	41.78		v	
-	-	552	-	40	-	-	103.04	104.12		0.10	0.10		v	
-	-	-	-	-	-	-	101.07	103.06		64.30	64.30		v	
-	-	248	-	29	-	-	102.06	103.12		0.02	0.02		v	
-	-	-	-	-	-	-	100.06	103.06		20.00	20.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	102.06	103.12		2.90	2.90		v	
-	-	3,601	-	103	-	-	101.08	103.10		19.00	19.00		v	
-	-	3,202	-	99	-	-	101.08	103.10		89.50	89.33			v
-	-	-	-	-	-	-	102.06	103.12		38.06	38.06		v	
-	-	1,010	-	41	-	-	101.06	103.06		28.83	28.83		v	
-	-	2,033	-	68	-	-	101.09	104.05		11.20	11.30	v		
-	-	-	-	-	-	-	102.01	104.10		29.10	25.58			v

表12. 4月份污水下水道新建、改善工程 (續1)

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office	98-102	17. 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(98年度日僑學校及社中街附近地區)	7,620
	98-102	18. 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年度行義路附近)	5,936
	98-102	19. 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度至善路一、二段附近地區)	7,746
	98-102	20. 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度清江國小附近地區)	5,330
	98-102	21. 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)	3,233
	101-104	22. 第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)	2,725
	100-104	23. 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(100年預約工程)	2,539
	100-104	24. 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年再興中學附近地區)	6,232
	100-104	25. 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年考試院附近地區)	6,767
	100-104	26. 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年辛亥捷運站附近地區)	4,935
	100-104	27. 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)	2,690
	100-104	28. 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程（102年軍功路附近地區）	1,770
	100-104	29. 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)	2,169
	101-105	30. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年北投醫院等附近地區)	8,895
	101-105	31. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年復興高中附近地區)	7,485
	101-105	32. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)	2,638
	101-105	33. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程（102年桃源國小附近地區）	6,247

Table 12. Sewerage System Improvement and New Constructions in Apr. 2014 (Cont. 1)

工程內容 Construction Content							工期 While Constructing			施工進度 Progress				
主幹管 Trunk (m)	次幹管 Sub-Trunk (m)	分支管 Branch Pipeline (m)	抽揚水站 Pumping Station (座) No.	人孔 Manhole (座) No.	清除孔 Cleanout (座) No.	截流設施 Interception Facilities (個) No.	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Sche-duled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	8,656	-	85	-	-	99.10	103.04	103.04	100.00	100.00		v	
-	-	5,895	-	79	-	-	99.08	103.12		62.50	65.02	v		
-	-	7,315	-	94	-	-	101.01	103.05		94.50	95.00	v		
-	-	5,210	-	30	-	-	100.12	103.07		64.00	64.10	v		
-	-	885	-	27	-	-	100.11	103.05		75.61	75.61		v	
-	-	-	-	-	-	-	101.07	103.06		86.00	86.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	101.03	103.06		70.00	70.00		v	
-	-	5,799	-	5	-	-	101.08	103.09		93.00	93.20	v		
-	-	6,980	-	278	-	-	101.12	103.12		71.00	71.20	v		
-	-	5,084	-	6	-	-	101.08	103.07		73.50	73.75	v		
-	-	-	-	-	-	-	101.06	103.06		66.00	66.00		v	
-	-	1,565	-	26	-	-	102.12	103.08		2.00	5.64	v		
-	-	-	-	-	-	-	102.05	103.12		39.20	39.20		v	
-	-	9,022	-	50	-	-	102.04	103.11		31.00	30.00			v
-	-	8,980	-	85	-	-	102.04	103.12		41.00	41.30	v		
-	-	-	-	-	-	-	101.07	103.06		48.00	48.00		v	
-	-	6,723	-	70	-	-	102.10	103.11		28.00	31.00	v		

表12. 4月份污水下水道新建、改善工程(續2)

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office	101-105	34. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程（102年關渡國小附近地區）	5,170
	101-105	35. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)	2,282
	100-104	36. 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年永吉國中附近地區)	7,070
	100-104	37. 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)	2,794
	100-104	38. 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程（102年松山火車站附近地區）	5,750
	100-104	39. 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)	2,316
	100-104	40. 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年南港火車站、中央研究院、南港R13道路等附近地區)	5,639
	100-104	41. 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)	2,782
	100-104	42. 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)	2,545
	101-104	43. 第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)	2,825
	102	44. 大同及中山區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)	643
	102	45. 北投及士林區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)	565
	102	46. 南港及內湖區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)	604
	102	47. 萬華及中正區用戶接管後巷配合美化工程(102年預約工程)	605
	103	48. 萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程	2,073
	97-101	49. 基隆河流域水質改善及污水疏流工程(101年士林主幹管、越基隆河聯絡管疏流及提升成美礫間進流量)	8,500

Table 12. Sewerage System Improvement and New Constructions in Apr. 2014 (Cont. 2)

工程內容 Construction Content							工期 While Constructing			施工進度 Progress				
主幹管 Trunk (m)	次幹管 Sub-Trunk (m)	分支管 Branch Pipeline (m)	抽揚水站 Pumping Station (座) No.	人孔 Manhole (座) No.	清除孔 Cleanout (座) No.	截流設施 Interception Facilities (個) No.	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Sche-duled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	5,683	-	62	-	-	102.09	103.10		23.00	23.10	V		
-	-	-	-	-	-	-	102.06	103.12		19.00	19.00		V	
-	-	6,013	2	56	-	-	101.11	103.12		41.50	48.01	V		
-	-	-	-	-	-	-	101.06	103.06		88.00	88.00		V	
-	-	-	-	-	-	-	102.12	104.06		4.70	6.50	V		
-	-	-	-	-	-	-	102.05	103.12		93.00	93.00		V	
-	-	5,836	-	48	-	-	101.10	103.07		73.50	73.52	V		
-	-	-	-	-	-	-	101.06	103.06		91.00	91.00		V	
-	-	-	-	-	-	-	102.06	103.12		8.00	8.00		V	
-	-	-	-	-	-	-	101.06	103.06		40.50	40.50		V	
-	-	-	-	-	-	-	102.06	103.06		78.90	78.90		V	
-	-	-	-	-	-	-	102.06	103.09		30.50	30.50		V	
-	-	-	-	-	-	-	102.06	103.07		45.00	45.00		V	
-	-	-	-	-	-	-	102.06	103.06		31.40	31.40		V	
-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.12		0.01	0.01		V	
-	-	293	-	2	-	-	102.01	103.05		90.00	90.30	V		

表12.4月份污水下水道新建、改善工程(續3完)

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office	100-104	50. 紓流、抽水站及站體改善及增設工程（第一標）	8,600
	98-103	51. 臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程	12,978
	101	52. 內湖三期重劃區污水管線更新工程	1,980
	100-103	53. 第2期大安及文山區管線更新工程(大安區國泰醫院附近地區)	3,330
	100-103	54. 第2期北投及士林區管線更新工程(士林區劍潭附近地區)	7,319
	100-103	55. 第2期松山及信義區管線更新工程第1標(松山區民生社區新中街以西地區)	7,004
	100-103	56. 第2期松山及信義區管線更新工程第2標(松山區民生社區新中街以東地區)	8,258
	100-103	57. 第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區)	2,812
	101	58. 迪化污水處理廠污泥減量統包工程	18,000
	103	59. 103年度管線修繕及拆遷配合工程（預約式契約）	2,060
	103	60. 103年度管線維護工程（設施及框蓋維護預約式契約）	2,770
	103	61. 103年度管線維護工程（管線清理檢視預約式契約）	3,540
	103	62. 103年度管線維護工程（管線修繕預約式契約）	2,870
	103	63. 103年度場站維護工程	1,034
	100	64. 臺北近郊系統與六堵系統間之污水紓流工程	5,758
	102	65. 新莊抽水站增設壓力溢流抽水機及附屬設備工程	12,400
	99	66. 八里污水處理廠污水設備更新工程第2期第6標(綜合2)	5,380

資料來源：衛生下水道工程處。

Table 12. Sewerage System Improvement and New Constructions in Apr. 2014 (Cont.3 End)

工程內容 Construction Content							工期 While Constructing			施工進度 Progress				
主幹管 Trunk (m)	次幹管 Sub-Trunk (m)	分支管 Branch Pipeline (m)	抽揚水站 Pumping Station (座) No.	人孔 Manhole (座) No.	清除孔 Cleanout (座) No.	截流設施 Interception Facilities (個) No.	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Sche-duled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	-	-	-	-	-	103.02	103.12		1.98	1.98		∨	
-	-	-	-	-	-	-	102.02	103.07		81.96	81.27			∨
-	-	-	-	-	-	-	101.05	103.04	103.04	100.00	100.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	102.04	103.09		46.00	46.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	102.04	103.12		54.50	57.00	∨		
-	-	-	-	-	-	-	102.03	103.11		16.50	17.50	∨		
-	-	-	-	-	-	-	102.03	104.04		2.70	3.36	∨		
-	-	-	-	-	-	-	102.04	103.08		6.15	9.14	∨		
-	-	-	-	-	-	-	101.08	103.06		94.63	95.57	∨		
-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.12		10.00	38.00	∨		
-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.12		9.74	9.74		∨	
-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.12		0.00	0.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.12		3.05	3.05		∨	
-	-	-	-	-	-	-	103.04	104.01		0.00	0.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	100.10	103.07		69.50	69.53	∨		
-	-	-	-	-	-	-	102.06	103.09		29.36	24.66			∨
-	-	-	-	-	-	-	102.01	103.05		68.50	71.10	∨		

Source：Sewerage Systems Office

表13. 4月份治山防災整體治理工程

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (10 Thousands)	工程內容 防砂壩 Against Granulated Substance Dam (座) (Set)	工程內容 潛壩 Sub-merged Dam (座) (Set)	工程內容 丁壩 Spur Dam (座) (Set)	工程內容 堤防 Embank-ment (公尺) (m)
大地工程處 Geotechnical Engineering Office		**總 計**	18,357	-	-	-	-
	102	1. 102年度「山坡地災害緊急處理工程(單價發包)(北區)」	2,484	漿砌塊石430m、集水井2座、排水溝570m			
	102	2. 102年度「山坡地災害緊急處理工程(單價發包)(南區)」	2,484	靜水池1座、集水井5座、沉沙池1座			
	103	3. 103年度溪溝緊急處理工程	834	清淤除草			
	103	4. 103年度溪溝周邊環境綠美化工程	1,509	清淤除草			
	103	5. 103年度土石流潛勢溪流緊急處理工程	833	造型護欄施作、清淤除草			
	103	6. 103年度溪溝改善及設施維護工程(第一期)	1,166	仿漂流木欄杆施作			
	102	7. 102年「登山步道改善及維護工程」(第二期)	1,388	北投區：竹子湖青楓步道、黑森林步道、陽峰古道、橫嶺古道及風尾步道改善			
	103	8. 103年「登山步道改善及維護工程」(第一期)	1,924	茶香造型欄杆、木棧道、花崗岩步道、既有步道重新施作RC鋪面、既有步道面貼花崗岩石片、LOGO陶板地磚			
	103	9. 103年度「臺北市山區道路環境綠美化及路面工程」(第一期)	1,626	既有擋土牆水注清除青苔、花台整理(人工挖方)			
	103	10. 103年度「臺北市山區道路改善及維護工程」(第一期)	2,272	工程告示牌、柔性告示牌設置，護欄施作位置放樣、			
	103	11. 103年度「臺北市山區道路改善及維護工程」(第二期)	954	放樣整地、鑿除原有鋼筋混凝土			
	103	12. 103年度「風景區遊憩設施改善及維護工程」(圓山風景區)	609	鐵皮棚架、建物拆除，鋪面PC及樓梯RC敲除			
	103	13. 103年度「風景區遊憩設施改善及維護工程」(仙跡岩風景區)	276	工程告示牌、施工圍籬			

資料來源：大地工程處。

Table 13. Watershed Management and Disaster Prevention in Apr. 2014

Construction Content							工期 While Constructing			施工進度 Progress				
整流 Rectifi-cation (公尺) (m)	固床工 Groundsill Works (座) (Set)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	魚道 Fish Way (座) (Set)	蝕溝控制 Gully Control (公尺) (m)	崩塌地處理 Protec-tion for collapse (公頃) (hectare)	植生綠美化 Greening Beautifi-cation (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定 Sche-duled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	290	-	59	0.26	1,290	--	--	--	--	--	9	3	1
-	-	-	-	-	0.17	1,260	102.1	103.04	103.04	100.00	100.00		v	
-	-	290	-	59	0.09	30	102.1	103.04	103.04	100.00	100.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.10		0.15	0.15		v	
-	-	-	-	-	-	-	103.03	103.10		0.63	2.31	v		
-	-	-	-	-	-	-	103.03	103.09		1.00	2.51	v		
-	-	-	-	-	-	-	103.03	103.07		1.83	5.73	v		
士林區：天母古道更新改善。內湖區：金龍禪寺步道至碧山巖步道改善工程							102.07	103.01		100.00	95.00			v
環狀路線指向導覽牌、立仿木紋立柱，既有便橋美化、景牆、壺穴休憩平台、涼亭、三角吊橋、石材貓形茶壺意象、石材熊貓意象、石材貓意象、貓熊造型石椅、貓造型石椅							103.04	103.11		0.16	0.27	v		
既有擋土牆整理(水注清除青苔，清除雜物、鑽孔植筋放樣)							103.04	103.10		0.50	0.90	v		
整地、護欄基礎開挖造型護欄PC打底、護欄基礎鋼筋綁紮組立及護欄模板組立							103.03	103.09		0.96	1.49	v		
-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.09		0.02	0.54	v		
太白山莊後側PC敲除，材料準備							103.04	103.09		0.88	2.74	v		
-	-	-	-	-	-	-	103.04	103.07		1.00	17.60	v		

Source： Geotechnical Engineering Office

表14. 臺北市污水下水道用戶接管概況

年（月）別 Year (Month)		當月接管戶數 Number of Connected Household in Each Month			
		總計 Grend Total	公共污水下水道 Public Sanitary Sewers	專用污水下水道 Specific Sanitary Sewers	建築物污水處理設施設置戶數 Households of Building Sewage Processing Facilities
民國 88 年底	End of 1999	28 225	…	…	…
民國 89 年底	End of 2000	36 246	…	…	…
民國 90 年底	End of 2001	33 367	28 065	1 617	3 685
民國 91 年底	End of 2002	41 852	37 885	1 478	2 489
民國 92 年底	End of 2003	34 718	31 928	1 684	1 106
民國 93 年底	End of 2004	39 930	37 991	1 081	858
民國 94 年底	End of 2005	47 585	44 936	1 251	1 398
民國 95 年底	End of 2006	29 132	25 798	1 224	2 110
民國 96 年底	End of 2007	34 430	32 513	-960	2 877
民國 97 年底	End of 2008	42 775	40 010	1 172	1 593
民國 98 年底	End of 2009	34 635	33 300	216	1 119
民國 99 年底	End of 2010	41 663	40 902	163	598
民國 100 年底	End of 2011	31 993	31 237	3	753
民國 101 年底	End of 2012	31 442	30 822	1	619
民國 102 年底	End of 2013	24 543	24 145	2	396
4月底	End of Apr.	858	842	-	16
5月底	End of May	2 097	2 075	-	22
6月底	End of June	2 449	2 433	-	16
7月底	End of July	1 192	1 176	-	16
8月底	End of Aug.	3 244	3 227	-	17
9月底	End of Sep.	2 664	2 632	2	30
10月底	End of Oct.	2 585	2 344	-	241
11月底	End of Nov.	2 171	2 170	-	1
12月底	End of Dec.	2 883	2 882	-	1
民國103年	2014				
1月底	End of Jan.	984	969	-	15
2月底	End of Feb.	591	584	-	7
3月底	End of Mar.	796	795	-	1
4月底	End of Apr.	1 505	1 467	-	38

資料來源：衛生下水道工程處。

說明：(1)全市計畫接管總服務戶數665,000戶，係依據84年1月底全市人口數為基準每戶以4人計得。

(2)計畫用戶接管普及率 f=(b+c)/665,000*100；門牌數接管普及率 g=(b+c)/d*100

(3)96年清查資料，其中專用污水下水道重複計列2,371戶，於96年接管戶數中扣除，致96年專用下水道用戶當年接管戶數為負值。

(4)自99年1月起各項普及率超過100%者，以100%表示。

Table 14. Overview of Household Sewerage System Connections in Taipei City

截至當月底累計接管戶數 Accumulated Number of Connection Household				門牌數	計畫用戶接管普及率	門牌數接管普及率
總計 Grend Total a	公共污水下水道 Public Sanitary Sewers b	專用污水下水道 Special Sanitary Sewers c	建築物污水處理設施設置戶數 Households of Building Sewage Processing Facilities	No. of Plates (戶) (No.) d	Planned Sewer Connection Rate (%) f	Household Sewer Connection Rate (%) g
301 280	…	…	…	…	…	…
337 526	…	…	…	…	…	…
370 893	345 943	21 391	3 559	943 876	55.24	38.92
412 745	383 828	22 869	6 048	943 876	61.16	43.09
447 463	415 756	24 553	7 154	981 847	66.21	44.84
487 393	453 747	25 634	8 012	988 693	72.09	48.49
534 978	498 683	26 885	9 410	987 274	79.03	53.16
564 110	524 481	28 109	11 520	987 274	83.10	55.97
598 540	556 994	27 149	14 397	1 033 315	87.84	56.53
641 315	597 004	28 321	15 990	1 035 299	94.03	60.40
675 950	630 304	28 537	17 109	1 062 320	99.07	62.02
717 613	671 206	28 700	17 707	1 068 561	100.00	65.50
749 606	702 443	28 703	18 460	1 076 178	100.00	67.94
781 048	733 265	28 704	19 079	1 082 773	100.00	70.37
805 591	757 410	28 706	19 475	1087 747	100.00	72.27
786 306	738 471	28 704	19 131	1 083 907	100.00	70.78
788 403	740 546	28 704	19 153	1 084 194	100.00	70.95
790 852	742 979	28 704	19 169	1 084 647	100.00	71.15
792 044	744 155	28 704	19 185	1 084 984	100.00	71.23
795 288	747 382	28 704	19 202	1 085 372	100.00	71.50
797 952	750 014	28 706	19 232	1 086 518	100.00	71.67
800 537	752 358	28 706	19 473	1 086 793	100.00	71.87
802 708	754 528	28 706	19 474	1 087 526	100.00	72.02
805 591	757 410	28 706	19 475	1 087 747	100.00	72.27
806 575	758 379	28 706	19 490	1 088 135	100.00	72.33
807 166	758 963	28 706	19 497	1 088 354	100.00	72.37
807 962	759 758	28 706	19 498	1 088 635	100.00	72.43
809 467	761 225	28 706	19 536	1 089 513	100.00	72.50

Source：Sewerage Systems Office

Explanation：1.The total population to be served by city authority was 665,000 household, which was based on the figures in January 1995 and 4 members for each household.

2.Planned Sewer Connection Rate f =(b+c)/d*100 ；Household Sewer Connection Rate g=(b+c)/d*100 ；

3.During 2007 material checking, 2,371 households of Special Sanitary Sewer was found to be repeated calculation. The number was deducted from 2007 connected households, as a result the number of connected households is below zero.

4.From 2010 onward, the connection rates exceeding 100% were showed 100%.

表15. 臺北市公園綠地①

面積單位：平方公尺

年底及區別 End of Year & District		公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、河濱公園座數、面積 總計 Grand Total 座數 No.	總計 Grand Total 面積 Area	公　園 Parks 座數 No.	公　園 Parks 面積 Area	綠　地 Green Fields 座數 No.	綠　地 Green Fields 面積 Area
民　國　85　年　底	End of 1996	798	11 023 705	426	9 794 207	354	1 091 101
民　國　86　年　底	End of 1997	832	11 084 831	434	9 823 519	379	1 119 477
民　國　87　年　底	End of 1998②	660	11 375 178	452	6 398 546	156	497 422
民　國　88　年　底	End of 1999	683	11 765 710	463	6 628 170	168	653 065
民　國　89　年　底	End of 2000	702	12 201 274	470	6 746 291	174	690 698
民　國　90　年　底	End of 2001	726	12 643 384	484	7 144 069	184	729 714
民　國　91　年　底	End of 2002	745	12 723 060	496	7 210 701	188	733 779
民　國　92　年　底	End of 2003	757	12 773 055	504	7 237 804	191	743 565
民　國　93　年　底	End of 2004	765	12 983 800	512	7 362 764	188	712 630
民　國　94　年　底	End of 2005	773	13 098 871	518	7 421 787	190	711 236
民　國　95　年　底	End of 2006	784	13 246 975	524	7 522 538	192	712 296
民　國　96　年　底	End of 2007	794	13 441 988	531	7 682 047	192	712 796
民　國　97　年　底	End of 2008	804	13 525 134	536	7 773 009	195	690 415
民　國　98　年　底	End of 2009	813	13 508 871	542	7 772 495	198	673 026
民　國　99　年　底	End of 2010	821	13 529 929	547	7 782 650	200	683 749
民　國　100　年　底	End of 2011	833	13 643 094	551	7 898 079	206	676 185
民　國　101　年　底	End of 2012	838	13 667 760	556	7 932 743	206	668 463
民　國　102　年　底	End of 2013	843	13 687 731	564	7 955 002	203	666 175
民國103年4月底	**End of Mar. 2014**	**849**	**13 745 538**	**567**	**8 001 187**	**205**	**676 248**
松山區	SongShan	47	1 056 231	41	178 742	3	4 860
信義區	XinYi	81	540 630	52	406 321	20	45 698
大安區	DaAn	66	592 526	59	585 450	7	7 076
中山區	ZhongShan	98	1 729 940	70	797 926	23	32 235
中正區	ZhongZheng	29	867 952	19	567 224	2	20 720
大同區	DaTong	31	234 223	18	113 609	5	16 418
萬華區	WanHua	36	1 391 876	27	298 325	1	200
文山區	WenShan	93	2 595 328	72	2 059 587	17	22 888
南港區	NanGang	54	581 999	30	404 055	14	74 076
內湖區	NeiHu	96	1 309 473	78	767 550	11	58 732
士林區	ShiLin	96	1 426 453	42	752 103	44	139 083
北投區	BeiTou	122	1 418 907	59	1 070 295	58	254 262

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

附　　註：①係為本局已開闢之公園綠地，不含本府其他局處所開闢之公園綠地。

②87年本局公園處依都市計畫規劃屬性重新整理詮釋都市計畫及非都市計畫公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、河濱公園資料，故自87年度起資料無法與以前年度銜接。

Table15. Parks and Green Fields in Taipei City

Unit：m^2

Parks、Green Fields、Sport Spots for Children、Plaza＆Riverside Parks						平均每一市民享有公園綠地面積 Parks and Green Fields Area Per Capita
兒童遊樂場 Sport Spots for Children		廣　　場 Plaza		河濱公園 Riverside Parks		
座數 No.	面積 Area	座數 No.	面積 Area	座數 No.	面積 Area	(m^2/人) (m^2/person)
…	…	18	138 397	…	…	4.23
…	…	19	141 835	…	…	4.27
11	15 552	19	128 708	22	4 334 950	4.31
11	15 552	19	128 501	22	4 340 422	4.45
11	15 552	23	141 777	24	4 606 956	4.61
11	15 874	23	146 771	24	4 606 956	4.80
11	15 874	26	155 750	24	4 606 956	4.82
11	15 874	26	157 156	25	4 618 656	4.86
11	15 874	29	174 980	25	4 717 552	4.95
11	16 030	29	152 429	25	4 797 389	5.01
11	16 030	29	152 382	28	4 843 729	5.03
11	16 030	32	173 641	28	4 857 474	5.11
11	16 030	34	188 206	28	4 857 474	5.16
10	15 080	35	190 796	28	4 857 474	5.18
10	15 080	36	190 976	28	4 857 474	5.17
10	15 080	38	196 276	28	4 857 474	5.15
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	5.11
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	5.09
10	15 080	39	195 549	28	4 857 474	5.11
1	468	-	-	2	872 161	5.02
-	-	9	88 611	-	-	2.36
-	-	-	-	-	-	1.89
-	-	2	4 246	3	895 533	7.56
-	-	7	46 502	1	233 506	5.31
-	-	7	9 846	1	94 350	1.80
1	1 000	2	14 671	5	1 077 680	7.20
-	-	-	-	4	512 853	9.55
6	11 927	2	3 941	2	88 000	4.85
-	-	4	5 489	3	477 702	4.62
1	908	4	10 570	5	523 789	4.92
1	777	2	11 673	2	81 900	5.54

Source：Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office

Note：②Data were compiled by the Parks and Lights Office, Public Works Department in accordance with the attributes of various urban development plans.The data covered all parks,green fields,sport spots for children,plaza and riverside parks under the urban development plans, etc.

表16. 現有路燈盞數
Table 16. Present Number of Street Lights

單位：盞 Unit：Set

年(月)底別 End of Year(Month)		總計 Grend Total	水銀燈 Mercury Vapour Light	鈉光燈 Sodium Light	日光燈 Fluorescent Light	LED燈 LED Light	其他 Others
民國 88 年底	End of 1999	109 764	83 461	20 551	5 740	-	12
民國 89 年底	End of 2000	114 213	84 114	24 347	5 740	-	12
民國 90 年底	End of 2001	117 559	85 327	26 369	5 851	-	12
民國 91 年底	End of 2002	124 493	84 458	32 435	7 598	-	2
民國 92 年底	End of 2003	131 044	73 680	48 415	8 865	-	84
民國 93 年底	End of 2004	134 828	75 006	50 075	9 204	55	488
民國 94 年底	End of 2005	135 823	75 273	50 816	9 188	58	488
民國 95 年底	End of 2006	140 320	76 095	54 320	9 469	58	378
民國 96 年底	End of 2007	143 345	76 470	55 929	10 102	724	120
民國 97 年底	End of 2008	144 145	79 085	53 394	8 212	1 250	2 204
民國 98 年底	End of 2009	145 508	79 758	54 123	8 230	1 285	2 112
民國 99 年底	End of 2010	146 791	80 198	54 966	8 230	1 285	2 112
民國 100 年底	End of 2011	148 213	80 931	55 716	8 169	1 285	2 112
民國 101 年底	End of 2012	149 535	76 803	56 049	8 066	1 897	6 720
民國 102 年底	End of 2013	151 248	38 647	61 997	7 196	41 452	1 956
4月底	End of Apr.	150 581	77 921	56 070	8 117	2 632	5 841
5月底	End of May	150 664	77 921	56 153	8 117	2 632	5 841
6月底	End of June	150 664	77 921	56 153	8 117	2 632	5 841
7月底	End of July	150 664	77 921	56 153	8 117	2 632	5 841
8月底	End of Aug.	150 664	77 921	56 153	8 117	2 632	5 841
9月底	End of Sep.	150 664	77 921	56 153	8 117	2 632	5 841
10月底	End of Oct.	151 020	48 464	63 597	7 196	29 930	1 833
11月底	End of Nov.	151 124	48 568	63 597	7 196	29 930	1 833
12月底	End of Dec.	151 248	38 647	61 997	7 196	41 452	1 956
民國103年	2014						
1月底	End of Jan.	151 390	34 147	62 139	7 196	45 952	1 956
2月底	End of Feb.	152 044	33 527	63 149	7 424	45 952	1 992
3月底	End of Mar.	152 044	33 527	63 149	7 424	45 952	1 992
4月底	End of Apr.	152 044	33 527	63 149	7 424	45 952	1 992
103年4月底較102年4月底增減% Annual Change Rate(%)		0.97	- 56.97	12.63	- 8.54	1 645.90	- 65.90

資料來源：公園路燈工程管理處。

說明：1.本表以台灣電力公司供電之盞數計列。
2.本表數字包含其他單位裝設後移交公園處維護之數字。
3.97年起路燈種類重新歸類計算，無法銜接。

Explanation：1.This table is calculated based on lamps powered by Taiwan Power Company.
2.The figures in this table include the number of facilities built by other units and then transferred to the Parks and Street Lights Office for maintenance.
3.The figures have been reclassified since 2008.Therefore, we cannot compare them with previous years.

表17. 臺北市登山步道

民國 103 年4月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
總計		130 條	--	100 930
信義區小計		22 條	--	12 140
(XY-401)	虎山溪步道	慈惠堂→真光禪寺→復興園	水泥鵝卵石木棧道花崗石	950
(XY-402)	虎山山腰步道	復興圓→山神廟叉路	花崗石	527
(XY-403)	虎山自然步道	慈惠堂→山神廟→南港山稜線叉路口	花崗石	1 100
(XY-404)	虎山復興園步道	復興園→瑤池宮	水泥植草磚	580
(XY-405)	美的世界社區步道	瑤池宮→松山路673號美的世界社區	花崗石枕木碎石	500
(XY-406)	虎山120高地步道	福德街221巷→虎山120高地	花崗石	238
(XY-407)	虎山峰下方步道	福德街221巷→虎山峰下涼亭	花崗石	157
(XY-408)	虎山峰前方步道	福德街221巷→虎山峰前涼亭	花崗石	220
(XY-409)	虎山奉天宮步道	奉天宮→松山路679-1號	花崗石砂岩塊石	890
(XY-410)	虎山吉福宮步道	福德街51巷→虎山120高地	花崗石枕木碎石	509
(XY-411)	象山北星寶宮步道	靈雲宮→山頂→北星寶宮叉路	花崗石	824
(XY-412)	天寶聖道宮步道	北星寶宮→天寶聖道宮	水泥	408
(XY-413)	北台慈惠堂步道	北台慈惠堂→南港山親山步道三叉路	砂岩塊石	150
(XY-414)	永春崗顏子廟步道	永春崗公園→顏子廟	花崗石	220
(XY-415)	象山永春崗步道(含入口意象範圍)	松山路650巷超市旁→象山頂前南港山叉路口	花崗石	850
(XY-416)	象山一線天步道	象山990m巨石叉路→一線天→75m叉路口	花崗石	822
(XY-417)	市立療養院步道(含入口意象範圍)	療養院→稜線(象山親山460m)	花崗石	233
(XY-418)	石泉巖步道	石泉巖→中正巖	水泥	289
(XY-419)	糶米古道	吳興街600巷→極樂公墓	大理石磚	446
(XY-420)	吉福宮叉路步道	吉福宮上方右叉路→涼亭右轉下福德街51巷	水泥	322
(XY-421)	姆指山步道	姆指山登山口→北星寶宮	花崗石砂岩塊石	1 355
(XY-422)	虎山生態步道	虎山400m涼亭→王家土雞城叉路口	花崗石木棧道	550
中山區小計		2 條	--	2 274
(CS-701)	復興電台線步道	中山北路5段282巷→劍潭山稜線	花崗石土徑枕木碎石水泥混凝土	700
(CS-702)	劍潭山稜線步道	劍潭山打印台經老地方→通北街叉路口→軍營門口	固化土	1 574
文山區小計		20 條	--	14 429
(WS-601)	試院支線步道	考試院上方涼亭→仙跡岩足跡步道叉路(含木柵路1段23號旁入口路段)	花崗石水泥	452

Table 17. Hiking Trails in Taipei City(Cont.1)

End of Apr. 2013

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(WS-602)	景興國小支線步道	親山步道915m景興國小叉路口→景興國小	花崗石磚	368
(WS-603)	溝子口支線步道	親山步道1300m海巡署叉路口→(往光輝路口)樓梯盡頭	花崗石	568
(WS-604)	麥田支線步道	麥田山莊→仙跡岩稜線(含福德宮304巷支線)	花崗石	413
(WS-605)	指南慈惠堂步道	指南路三段→指南慈惠堂再接商店街至獅子亭前方涼亭	水泥混凝土	750
(WS-606)	大成殿步道	指南路三段→大成殿步道口	水泥枕木	605
(WS-607)	茶展中心步道	茶業推廣中心停車場→指南路三段	水泥混凝土	760
(WS-608)	猴山岳步道	指南宮後山猴山岳步道口→新光路	水泥混凝土木棧道	602
(WS-609)	健康步道	茶業推廣中心步道口→私人工寮旁	安山石木棧道	414
(WS-610)	救千宮步道	樟山寺→混元宮前高速公路涵洞下步道口	水泥混凝土	1 029
(WS-611)	指南國小步道	指南國小→樟山寺前叉路口	水泥混凝土花崗石	686
(WS-612)	飛龍步道	環山二道→樟山寺	砂岩塊石	960
(WS-613)	三玄宮步道	指南國小→三玄宮	水泥混凝土砂岩塊石花崗石磚	1 320
(WS-614)	樟湖步道	指南路3段38巷涵鈺軒→指南路3段34巷瓦厝	花崗石碎石	2 500
(WS-615)	待老坑步道	樟湖步道待老坑叉路→待老坑山至老泉街26巷優人神鼓	枕木枕木碎石	522
(WS-616)	樟樹步道(含談茶支線160m)	三墩石步道口→大觀園後方停車場	花崗石枕木碎石	1 100
(WS-617)	貓空越嶺步道(含入口意象範圍)	貓空纜車站對面步道口→稜線上十字路口	花崗石	800
(WS-618)	楓林步道(含涼亭範圍)	樟樹步道楓林支線叉路口→指南路談天園對面步道口	水泥混凝土	160
(WS-619)	老樟樹步道	樟樹步道老樟樹叉路口→指南路口	花崗石	70
(WS-620)	石獅腳步道(含入口意象範圍)	高振盛茶農步道道口→樟樹步道德隆茶行叉路口	花崗石木棧道	350
南港區小計		11條	--	10 565
(NG-501)	南港山(一)中華技術學院	中華技術學院→南港山鞍部→分界點	花崗石砂岩塊石	1 970
(NG-502)	南港山(二)北興宮(含入口意象範圍)	南港山鞍部→北興宮	花崗石	685
(NG-503)	南港山(三)麗山橋口(含入口意象範圍)	研究院路四段50巷→南港山鞍部	花崗石土徑	1 175

表17. 臺北市登山步道(續2)

民國 103 年4月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(NG-504)	九五峰	南港山鞍部→姆指山山頂陵線	花崗石	2 165
(NG-505)	更寮步道	舊莊街二段122巷→土庫岳→大豐產業道路	花崗石砂岩塊石	2 450
(NG-506)	栳寮步道 (含入口意象範圍)	舊莊街二段232巷→魏靜時故居	花崗石枕木碎石	440
(NG-507)	桂花林步道+2條支線	舊莊街二段添進茶園→南港茶葉製造示範廠第2停車場	花崗石木棧道水泥	495
(NG-508)	桂花吊橋步道+支線	舊莊街二段寶豐庭茶莊→舊莊路2段328號	花崗石	305
(NG-509)	桂花吊橋親水步道	舊莊街二段寶樹橋旁→桂花吊橋	花崗石	170
(NG-510)	示範廠環山步道	舊莊街二段南港茶葉製造示範廠第1停車場→環山步道口	木棧道	510
(NG-511)	桂花亭步道 (含入口意象範圍)	桂花亭入口意象→舊莊街二段步道口	水泥枕木碎石	200
內湖區小計		33條	--	31 247
(NH-101)	圓覺寺步道	鯉魚山叉路→瀑布潭→圓覺寺步道口→峰碧塔門口	安山石	1 185
(NH-102)	鯉魚山步道 (含入口意象範圍)	碧山路→葉氏祖廟	花崗石安山石	1 065
(NH-103)	大崙頭山步道	碧山路→山頂	砂岩塊石	515
(NH-104)	忠勇山步道	慈聖宮→忠勇山頂	砂岩塊石	800
(NH-105)	碧山露營場步道	碧山工作站→露營場	砂岩塊石	86
(NH-106)	碧山露營場下方木棧道	碧山工作站→露營場+串連道(枕木步道交會)	木棧道	272
(NH-107)	碧山露營場枕木步道	碧山工作站→自然生態教室→營地側門	仿木水泥框碎石	1 088
(NH-108)	大崙尾山中社路支線	中社路二段→山頂	花崗石柏油路砂岩塊石	870
(NH-109)	白鷺鷥山步道 (含入口意象範圍)	老公祠福佑宮→白鷺鷥山→金湖路268號進入	花崗石砂岩塊石	1 845
(NH-110)	龍船岩步道碧山路支線	碧山路62號→龍船岩叉路口(福德宮)	砂岩塊石	368
(NH-111)	金面山步道 (剪刀石→小金面)	內湖步道叉路→金龍里福德宮	土徑	2 786
(NH-112)	康樂街步道 (含支線)	康樂街236號內溝里民活動中心→六角木造涼亭	花崗石	383
(NH-113)	碧山巖步道 (二段)	碧山路23號→碧山巖	砂岩塊石	346
(NH-114)	忠勇山越嶺步道	碧山巖→忠勇山→林氏墓園→金龍產業道路	砂岩塊石	1 660

Table 17. Hiking Trails in Taipei City(Cont.3)

End of Apr. 2013

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(NH-115)	大崙尾山步道(碧山路支線)	碧山路→大崙尾山頂	碎石水泥砂岩塊石	740
(NH-116)	大崙尾山步道(圓明寺支線)	大崙尾山打印台→湧泉寺(圓明寺門前)	砂岩塊石	3 180
(NH-117)	龍船岩步道(開眼山支線)	開眼山→龍船岩	砂岩塊石	554
(NH-118)	龍船岩步道(五路財神廟支線)	龍船岩叉路(福德宮)→五路財神廟	砂岩塊石	1 330
(NH-119)	婆婆橋步道	至善路二段266巷底→劍南路口圓明寺前	花崗石砂岩塊石	555
(NH-120)	鄭成功廟步道	劍南路鄭成功廟旁→上方九蓮寺叉路	砂岩塊石	312
(NH-121)	大崙頭森林步道(風衝林支線)(含入口意	碧溪產業道路1.7K森林步道口→稜線步道	木棧道	833
(NH-122)	大崙頭自然步道(含入口意象範圍)	碧溪產業道路2.4K枕木步道口→稜線步道	枕木碎石	620
(NH-123)	碧溪步道(含枕木支線、靶場支線)	碧溪產業道路1.5K石頭屋→大崙尾山步道2120m(含枕木支線)(靶場支線88m)	安山石木棧道枕木碎石	1 450
(NH-124)	大崙頭北面步道(含埤頭附近)	大崙頭山頂→碧山路50號民宅前	砂岩塊石	960
(NH-125)	康樂山步道	成功路5段山海寺牌樓→安泰街水源頭福德宮	水泥土徑	1 470
(NH-126)	明舉山步道	安泰街打印台→內溝溪生態展示館前	土徑	1 450
(NH-127)	採石場步道(含入口意象範圍)	環山路一段136巷底→打印台前叉路(論劍亭上方)	砂岩塊石泥徑	700
(NH-128)	竹月寺步道	採石場步道40m叉路右經竹月寺→金面山稜線	土徑	1 080
(NH-129)	金面山68巷支線步道	環山路二段68巷底→金面山稜線泰安亭	土徑	464
(NH-130)	大溝溪溪畔步道	大湖山莊街底大溝溪公園涼亭外→鯉魚山50m處相接	水泥鵝卵石	680
(NH-131)	瞭望台步道(含瞭望台下方休憩平台)	碧溪產道2.25K下方碎石步道→高架瞭望台(2.45K)	圓木碎石	200
(NH-132)	碧湖步道(含步道兩端的入口意象範圍)	內湖路三段碧湖步道口→新福本坑出口(葉氏祖廟前)	花崗石木棧道枕木碎石	1 300
(NH-133)	郭氏古厝步道	內湖文德路步道口→郭氏古厝	木棧道	100
士林區小計		13條	--	11 725
(SL-201)	鵝尾山步道礁坑橋支線(平溪步道)	至善路3段181巷5弄→平等國小旁平菁路105巷底	花崗石砂岩塊石	1 345

表17.臺北市登山步道(續4)

民國 103 年4月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(SL-202)	鵜尾山步道簡厝支線	至善路三段277巷→至善路3段371巷20弄	花崗石	303
(SL-203)	平菁步道	至善路三段71巷步道口→平菁街140號	花崗石	929
(SL-204)	水管路步道(含入口意象範圍)	中山北路七段232巷1弄→愛富三街	花崗石碎石	2 600
(SL-205)	下竹林步道	中山北路七段190巷112號→仁民路	花崗石安山石砂岩塊石	1 034
(SL-206)	風櫃嘴步道	溪山里至善路三段336巷51號至風櫃嘴步道口	花崗石砂岩塊石	614
(SL-207)	大崎頭步道	至善路三段370巷步道口至坪頂古圳清風亭	安山石	1 030
(SL-208)	坪頂古圳步道	至善路三段370巷29號步道口至平菁街95巷步道口	花崗石	1 350
(SL-209)	竹林步道	平菁路42巷禾豐餐廳停車場旁至公平橋	安山石	525
(SL-210)	翠山街步道	中社路2段公車終點站旁至翠山街口雙福宮	花崗石	200
(SL-211)	雙溪國小步道	雙溪國小旁步道口至中社路2段明溪街口	水泥	330
(SL-212)	永圳步道	永公路350巷反射境後直行到路底至圳溝邊(距公平橋300m)	安山石	320
(SL-213)	翠山(靶場)步道	中社路二段路底至碧溪步道交會處	透水磚土徑	1 145
北投區小計		29條	--	18 550
(BT-301)	忠義山步道	忠義廟→親山步道打印台	水泥砂岩塊石安山石	850
(BT-302)	中正山(一)郵政訓練所步道(含入口意象範圍)	登山路61號→郵政訓練中心	安山石	906
(BT-303)	丹鳳山步道	照明寺旁丹鳳山入口→陳濟堂墓園門口	水泥	830
(BT-304)	大屯山(一)下青礐步道	貴子坑水保教室前→下青礐(復興三路)	安山石木棧道花崗石砂岩	1 727
(BT-305)	大屯山(二)貴子坑步道	親山步道打印台→貴子坑露營場對面步道口	安山石	1 330
(BT-306)	軍艦岩步道	陽明醫學院步道口→軍艦岩前叉路	花崗石磚	500
(BT-307)	中正山(二)法雨寺步道	泉源產業道路→法雨寺┼墓園支線(登山路40號至墓園邊)200m	安山石	724
(BT-308)	中和里白宮山莊步道	復興四路105巷10號→復興三路白宮山莊	安山石	520
(BT-309)	中和里上清宮步道	復興三路212號→中清礐	花崗石	880

Table 17. Hiking Trails in Taipei City(Cont.5 End)

End of Apr. 2013

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(BT-310)	中和里永春寮步道(增長322m)	復興三路300巷底→中正山產業道路中段(增長至上清宮對面水泥橋)	安山石	760
(BT-311)	泉源里紗帽步道（對面至山谷下步道）	泉源路232號上方路口至紗帽路10號巷口（對面至山谷下步道）	水泥混凝土花崗石	684
(BT-312)	湖山里鼎筆橋步道	鼎筆橋→東昇路(頂湖福德宮)	安山石	363
(BT-313)	湖山里湖山國小步道	湖底路48號湖山國小旁→湖山路25之1號	花崗石	568
(BT-314)	水尾巴拉卡步道	竹子湖水尾公車站～巴拉卡公路	砂岩塊石	518
(BT-315)	猴崁湖田國小步道	竹子湖9號→猴崁產業道路(1K＋100)	砂岩塊石	650
(BT-316)	楓丹白露步道(含入口意象範圍)	忠義山打印台→楓丹白露社區前入口意象	土徑	450
(BT-317)	照明寺步道	軍艦岩下泥土步道→照明禪寺	土徑	1 230
(BT-318)	中正山親山步道	登山路立祥商店步道口→前行180m	安山石	180
(BT-319)	永春寮溪步道	上清宮'旁步道口→復興三路310巷步道口	花崗石	350
(BT-320)	半嶺步道	(向前延伸至湖底路)紅檀前方30m步道口→欄杆橋頭福德宮	花崗石水泥混凝土	1 200
(BT-321)	橫嶺古道	湖山路一段步道口→紅檀停車場	土徑	800
(BT-322)	猴崁步道	竹子湖路下切左轉→猴崁產業道路	安山石碎石	350
(BT-323)	頂湖海芋步道	名陽匐農場旁步道口→海芋田景觀木橋	安山石	160
(BT-324)	登泉步道	登山路17-2號→登山路28號(泉源產業道路)	水泥混凝土	218
(BT-325)	三楓步道	東昇路31號→登山路161號	砂岩塊石	79
(BT-326)	風尾步道	東昇路38號前步道口→東昇路68-15號	安山石	291
(BT-327)	淨水廠步道	泉源路260號淨水廠旁步道口→水圳步道邊	水泥混凝土	132
(BT-328)	水車寮步道	湖田國小停車場旁步道口→大樹下土雞城步道口	安山石	550
(BT-329)	磺溪溫泉步道	行義路260巷天祥溫泉前步道口→行義路402巷皇池溫泉停車場旁步道口	水泥混凝土	750

資料來源：大地工程處。 Source：Geotechnical Engineering Office

表18. 臺北市土地人口概況

Table 20. Land and Population in Taipei City

年（月）底別 End of Year(Month)	土地面積 Land (平方公里) (Km^2)	戶籍戶數 No. of Households (戶) (No.)	人口數(人) Population (person) 總計 Grend Total	男 Male	女 Female	人口密度 Population Density (人/平方公里) (Person/ k㎡)
民國87年底 End of 1998	271.7997	869 803	2 639 939	1 311 789	1 328 150	9 712
民國88年底 End of 1999	271.7997	879 156	2 641 312	1 309 434	1 331 878	9 718
民國89年底 End of 2000	271.7997	888 560	2 646 474	1 309 308	1 337 166	9 737
民國90年底 End of 2001	271.7997	894 763	2 633 802	1 300 179	1 333 623	9 690
民國91年底 End of 2002	271.7997	906 988	2 641 856	1 301 458	1 340 398	9 720
民國92年底 End of 2003	271.7997	914 716	2 627 138	1 291 742	1 335 396	9 666
民國93年底 End of 2004	271.7997	923 325	2 622 472	1 286 303	1 336 169	9 649
民國94年底 End of 2005	271.7997	933 110	2 616 375	1 279 513	1 336 862	9 626
民國95年底 End of 2006	271.7997	941 317	2 632 242	1 282 691	1 349 551	9 684
民國96年底 End of 2007	271.7997	947 745	2 629 269	1 277 556	1 351 713	9 674
民國97年底 End of 2008	271.7997	958 433	2 622 923	1 270 948	1 351 975	9 650
民國98年底 End of 2009	271.7997	969 418	2 607 428	1 260 450	1 346 978	9 593
民國99年底 End of 2010	271.7997	983 237	2 618 772	1 262 554	1 356 218	9 635
民國100年底 End of 2011	271.7997	999 879	2 650 968	1 276 343	1 374 625	9 753
民國101年底 End of 2012	271.7997	1 017 063	2 673 226	1 285 361	1 387 865	9 835
民國102年底 End of 2013	271.7997	1 026 738	2 686 516	1 289 945	1 396 571	9 884
4月底 End of Apr.	271.7997	1 019 228	2 679 051	1 287 663	1 391 388	9 857
5月底 End of May	271.7997	1 020 396	2 680 296	1 288 081	1 392 215	9 861
6月底 End of June	271.7997	1 021 435	2 681 554	1 288 596	1 392 958	9 866
7月底 End of July	271.7997	1 022 200	2 682 372	1 288 816	1 393 556	9 869
8月底 End of Aug.	271.7997	1 023 610	2 682 017	1 288 485	1 393 532	9 868
9月底 End of Sep.	271.7997	1 025 984	2 681 584	1 288 195	1 393 389	9 866
10月底 End of Oct.	271.7997	1 026 025	2 682 839	1 288 549	1 394 290	9 871
11月底 End of Nov.	271.7997	1 026 426	2 684 567	1 289 204	1 395 363	9 877
12月底 End of Dec.	271.7997	1 026 738	2 686 516	1 289 945	1 396 571	9 884
民國103年 2014						
1月底 End of Jan.	271.7997	1 027 004	2 688 140	1 290 558	1 397 582	9 890
2月底 End of Feb.	271.7997	1 027 238	2 689 327	1 291 019	1 398 308	9 895
3月底 End of Mar.	271.7997	1 027 984	2 690 232	1 291 306	1 398 926	9 898
4月底 End of Apr.	271.7997	1 028 991	2 691 331	1 291 738	1 399 593	9 902

資料來源：本府地政局、民政局。

Source：Department of Land , Department of Civil Affairs

表19. 臺灣地區營造工程物價指數

公式：採用拉式公式之變式

年(月)別 Year（Month）		總指數 General Index	水泥及其製品類 Cement & Related Products	砂石及級配類 Sand & Crashed Stone	磚瓦瓷類 Bricks & Tiles	金屬製品類 Metal Products	木材及其製品類 Timber & Related Products
項數 No of Items		115	7	3	5	21	5
權數 (千分比) Weights		1,000	158.85	17.24	12.37	213.87	17.81
基期：民國100年平均＝100		定基指數					
民國97年	2008	102.90	116.58	127.53	100.60	116.25	81.60
民國98年	2009	93.79	111.28	115.06	99.88	81.47	78.47
民國99年	2010	96.78	100.43	103.18	97.91	93.18	90.17
民國100年	2011	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
民國101年	2012	100.83	104.78	103.84	105.18	95.49	97.83
民國102年	2013	100.49	106.57	105.36	108.38	90.21	99.66
4月	Apr.	100.53	105.80	103.99	108.55	90.98	99.65
5月	May	100.13	106.00	103.97	108.79	89.70	99.63
6月	June	99.87	106.17	103.86	108.79	87.91	99.45
7月	July	99.91	106.47	104.47	108.38	87.92	99.60
8月	Aug.	100.08	106.62	105.19	108.32	88.53	100.29
9月	Sep.	100.54	106.59	106.26	108.28	89.79	100.45
10月	Oct.	100.53	107.06	106.74	108.48	89.58	100.65
11月	Nov.	100.78	107.77	107.91	108.97	89.96	100.75
12月	Dec.	101.01	108.88	109.23	109.60	90.23	101.05
民國103年	1-4月平均	101.61	110.85	114.25	110.84	89.21	103.19
1月	Jan.	101.38	109.86	111.85	110.11	90.03	101.81
2月	Feb	101.46	109.93	113.06	110.97	89.01	102.60
3月	Mar.	101.49	110.34	114.17	111.13	88.58	103.73
4月	Apr.	102.12	113.26	117.91	111.16	89.20	104.62
		年增率（%）					
民國97年	2008	13.98	8.43	12.77	8.96	32.74	- 0.91
民國98年	2009	- 8.85	- 4.55	- 9.78	- 0.72	- 29.92	- 3.84
民國99年	2010	3.19	- 9.75	- 10.33	- 1.97	14.37	14.91
民國100年	2011	3.33	- 0.43	- 3.08	2.13	7.32	10.90
民國101年	2012	0.83	4.78	3.84	5.18	- 4.51	- 2.17
民國102年	2013	- 0.34	1.71	1.46	3.04	- 5.53	1.87
4月	Apr.	- 1.43	1.88	1.13	4.12	- 9.78	1.08
5月	May	- 2.12	0.62	0.53	3.56	- 10.31	1.02
6月	June	- 1.76	0.58	- 0.78	2.50	- 9.82	1.41
7月	July	- 1.18	1.03	- 0.10	1.56	- 7.85	2.10
8月	Aug.	- 0.84	1.10	0.62	1.45	- 6.39	3.58
9月	Sep.	0.35	0.91	1.44	1.41	- 1.65	3.42
10月	Oct.	0.92	1.25	1.94	1.50	0.91	3.90
11月	Nov.	0.82	1.68	3.19	1.88	- 0.03	4.13
12月	Dec.	0.92	2.82	4.54	2.14	- 0.25	4.78
民國103年	1-4月平均	0.85	4.75	9.68	2.89	- 3.26	4.74
1月	Jan.	0.79	3.81	7.16	2.60	- 2.60	4.86
2月	Feb.	0.60	3.86	8.54	3.38	- 4.09	4.47
3月	Mar.	0.48	4.30	9.61	3.17	- 4.41	4.66
4月	Apr.	1.58	7.05	13.39	2.40	- 1.96	4.99

資料來源：中華民國統計資訊網 / 物價統計月報。

說　　明：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正。

Table 19. Indices of Construction Cost in Taiwan Area

Formula：Laspeyres's Formula

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類 Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
8	4	16	2	15	29
30.46	8.72	123.54	31.54	43.55	342.07
Fixed Index					Base Period：2011=100
86.52	87.13	91.25	82.29	91.96	97.86
86.72	88.60	88.73	87.35	94.15	98.21
94.07	91.37	94.46	96.68	96.31	98.76
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
103.88	105.63	99.39	106.66	103.08	101.38
108.56	107.67	98.36	108.64	104.99	102.33
108.12	107.16	99.14	108.63	104.25	102.27
107.27	107.16	98.11	108.63	104.25	102.25
108.22	107.49	98.04	108.63	106.04	102.24
108.68	107.70	97.46	108.63	105.69	102.40
108.75	107.92	97.09	108.69	105.74	102.48
109.95	107.92	98.08	108.73	105.87	102.50
110.13	108.22	97.75	108.73	105.01	102.54
109.41	108.42	97.76	108.73	105.62	102.60
109.51	108.56	97.55	108.73	105.71	102.54
111.31	108.77	98.44	108.73	105.79	103.14
110.58	108.56	98.51	108.80	105.60	102.68
111.68	108.56	99.05	108.80	105.86	103.07
111.89	108.97	98.73	108.66	105.87	103.21
111.07	108.97	97.46	108.66	105.83	103.60
Annual Change Rate (%)					
5.45	9.92	5.27	34.97	13.62	2.46
0.23	1.69	- 2.76	6.15	2.38	0.36
8.48	3.13	6.46	10.68	2.29	0.56
6.30	9.45	5.86	3.43	3.83	1.26
3.88	5.63	- 0.61	6.66	3.08	1.38
4.51	1.93	- 1.04	1.86	1.85	0.94
3.62	2.33	- 0.97	1.64	1.08	1.14
1.67	1.57	- 1.91	- 0.02	0.88	0.77
4.89	1.84	- 1.53	0.10	2.79	0.73
6.59	1.87	- 1.59	0.00	2.24	0.89
4.92	1.81	- 2.12	- 0.01	2.08	0.95
4.00	1.69	- 1.08	0.03	2.11	0.94
3.23	1.50	- 1.86	0.03	1.74	0.92
3.86	1.54	- 1.66	0.36	1.49	0.91
4.13	1.53	- 1.31	0.36	1.36	0.70
3.34	1.50	- 1.18	0.18	1.72	1.03
4.24	1.61	- 0.86	0.42	1.98	0.79
3.85	1.20	- 0.66	0.25	1.69	1.04
2.57	1.48	- 1.53	0.03	1.71	1.00
2.73	1.69	- 1.69	0.03	1.52	1.30

Source：http://www.stat.gov.tw / Price Statistics Monthly

Explanation：All data are subject to revision 3 months after original publication due to late reports and corrections by respondents.

表20. 臺北市營造工程物價指數

公式：價比基期值加權算術平均式

年(月)別 Year（Month）	總指數 General Index	水泥及其製品類 Cement & Related Products	砂石及級配類 Sand & Crashed Stone	磚瓦瓷類 Bricks & Tiles	金屬製品類 Metal Products	木材及其製品類 Timber & Related Products
權數 (千分比) Weights	1,000.00	153.73	15.64	13.97	203.18	19.64
項數 No of Items	115	7	3	5	21	5
基期：民國100年平均＝100	定基指數					
民國97年 2008	102.83	115.78	113.61	99.70	117.10	90.08
民國98年 2009	94.62	111.37	101.35	101.53	83.56	86.26
民國99年 2010	97.26	101.41	100.51	99.01	93.41	94.94
民國100年 2011	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
民國101年 2012	100.64	102.80	100.54	103.40	95.25	95.62
民國102年 2013	99.98	103.91	103.52	104.65	89.46	95.71
4月 Apr.	100.10	103.85	102.02	104.96	90.16	95.65
5月 May	99.63	103.85	102.02	104.96	89.01	95.61
6月 June	99.52	103.85	102.02	104.96	87.64	95.89
7月 July	99.48	103.83	102.02	104.58	87.60	95.39
8月 Aug.	99.69	103.82	104.23	104.54	88.34	95.45
9月 Sep.	100.06	103.82	105.97	104.54	89.21	95.75
10月 Oct.	100.03	103.97	105.97	104.54	89.03	95.89
11月 Nov.	100.05	103.97	105.97	104.54	89.22	96.04
12月 Dec.	100.13	104.35	105.97	104.54	89.44	96.28
民國103年 1-4月平均	100.80	107.73	111.26	104.54	88.53	98.47
1月 Jan.	100.46	105.73	110.02	104.54	89.14	97.66
2月 Feb.	100.48	105.73	111.50	104.54	88.27	98.10
3月 Mar.	100.71	106.87	111.50	104.54	88.05	98.59
4月 Apr.	101.56	112.59	112.02	104.54	88.64	99.53
	年增率（%）					
民國97年 2008	13.75	8.03	9.53	6.44	32.14	3.20
民國98年 2009	- 7.99	- 3.81	- 10.79	1.83	- 28.64	- 4.24
民國99年 2010	2.79	- 8.94	- 0.83	- 2.48	11.79	10.05
民國100年 2011	2.82	- 1.39	- 0.51	1.00	7.05	5.33
民國101年 2012	0.64	2.80	0.54	3.40	- 4.75	- 4.38
民國102年 2013	- 0.66	1.08	2.97	1.21	- 6.08	0.09
4月 Apr.	- 1.52	1.86	3.88	1.02	- 10.24	- 1.02
5月 May	- 2.40	0.69	2.56	0.61	- 10.77	- 1.06
6月 June	- 1.87	0.68	0.00	0.61	- 9.80	0.99
7月 July	- 1.49	0.53	0.00	0.24	- 8.34	1.32
8月 Aug.	- 1.22	0.26	2.17	- 0.01	- 7.01	1.39
9月 Sep.	- 0.01	0.28	3.87	- 0.01	- 2.56	1.70
10月 Oct.	0.69	0.42	3.87	- 0.01	0.81	1.61
11月 Nov.	0.53	0.12	3.87	- 0.01	0.42	1.71
12月 Dec.	0.45	0.49	3.87	- 0.01	- 0.20	1.67
民國103年 1-4月平均	0.50	3.72	9.05	- 0.11	- 2.73	3.05
1月 Jan.	0.23	1.80	7.84	- 0.01	- 2.27	2.49
2月 Feb.	0.11	1.78	9.29	- 0.01	- 3.35	2.65
3月 Mar.	0.21	2.88	9.29	- 0.01	- 3.59	3.03
4月 Apr.	1.46	8.42	9.80	- 0.41	- 1.69	4.05

資料來源：中華民國臺北市物價統計月報。

附　　註：①原95基期營造工程材料類之「電梯與電器用品類」於100年基期修訂為「機電設備類」。

Table 20. Indices of Construction Cost in Taipei City

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類① Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項材料類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
28.85	11.66	137.40	31.98	44.59	339.37
8	4	16	2	15	29
Fixed Index					Base Period：2011=100
85.76	92.37	97.61	72.70	93.55	99.06
86.44	93.05	92.89	85.48	97.66	98.50
92.74	94.36	96.67	97.40	98.17	98.38
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
103.15	104.77	99.83	104.44	102.00	102.64
107.00	109.28	99.02	105.63	102.88	103.67
106.88	109.45	99.91	105.63	101.65	103.50
105.05	109.45	98.51	105.63	101.63	103.52
106.01	109.45	98.52	105.63	103.83	103.64
107.07	109.45	98.19	105.63	103.83	103.64
107.07	109.45	97.78	105.63	103.81	103.89
108.24	109.45	98.46	105.63	103.81	103.97
108.35	109.45	98.38	105.63	103.68	103.97
107.69	109.45	98.33	105.63	103.68	103.97
107.69	109.45	98.15	105.63	103.72	103.95
109.58	109.45	98.53	105.54	104.10	104.26
108.55	109.45	98.45	105.63	103.75	104.03
109.79	109.45	98.71	105.63	103.75	104.33
110.96	109.45	98.86	105.45	104.45	104.36
108.99	109.45	98.08	105.45	104.44	104.33
Annual Change Rate (%)					
2.93	7.61	3.21	40.08	9.49	2.49
0.79	0.74	- 4.83	17.58	4.39	- 0.56
7.29	1.41	4.06	13.95	0.52	- 0.13
7.83	5.98	3.45	2.67	1.86	1.65
3.15	4.77	- 0.17	4.44	2.00	2.64
3.73	4.31	- 0.82	1.14	0.86	1.00
2.46	7.52	-0.12	1.42	-0.17	1.12
- 0.10	4.23	-1.69	-0.50	-0.81	0.72
3.04	4.23	-1.61	0.00	1.29	0.75
5.66	4.23	-1.60	0.00	1.28	0.78
4.71	3.05	-2.34	0.00	1.27	1.04
3.37	2.83	-1.46	0.00	1.27	1.13
2.60	1.44	-2.36	0.00	1.14	1.10
3.90	1.44	-2.24	0.00	1.14	1.05
4.18	1.44	-1.64	0.00	1.18	0.98
2.69	0.48	-1.93	-0.09	2.42	0.85
3.12	1.44	-2.13	0.00	2.09	0.84
3.43	0.48	-1.82	0.00	2.08	0.90
2.26	0.00	-1.93	-0.17	2.75	0.87
1.98	0.00	-1.83	-0.17	2.74	0.80

Source：Commodity-Price Statistics Monthly, Taipei City

Note：①The "Electrical Equipment and Apparatus" replace the item "Elevator and Electrical Apparatus" used for the 2006 base period.

臺北市工務統計月報

出　版　機　關 ： 臺北市政府工務局

地　　　　址 ： 11008 臺北市信義區市府路1號4樓西南區

電　　　　話 ： 1999(外縣市02-27208889)轉1404

網　　　　址 ： http://www.pwb.taipei.gov.tw/

發　行　人 ： 張培義

編　　　　輯 ： 臺北市政府工務局統計室

出　版　年　月 ： 中華民國 103年5月

創　刊　年　月 ： 中華民國 73年 1月

刊　期　頻　率 ： 月刊

THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN
OF PUBLIC WORKS

Published by the Public Works Department,Taipei City Goverment

Address：Southwest Wing, 4F., No.1, Shifu Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11008, Taiwan (R.O.C.)

Telephone No：Please dial 1999 Taipei Citizen Hotline (02-2720-8889 for out of Taipei) ext. 1404

Publisher：Pei-yi Chang

Edited by the Statistics Office of PWD,TCG

Website ：http://www.pwb.taipei.gov.tw/

Publishing Date：May 2014

First Edition：January 1984
