臺 北 市

工務統計月報

THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN OF PUBLIC WORKS

中華民國104年3月

March 2015

臺北市政府工務局編製

中華民國 104 年 4 月出版

Public Works Department

Taipei City Government, April 2015

臺北市政府工務局業務職掌

工務局	局本部	土木建築科	綜合企劃及工程相關法規之制定，道路、橋梁、隧道及公共建築等相關工程之監辦與督導考核。
		水利科	河川工程、河川管理、雨水下水道、污水下水道等水利工程業務之督導及災害搶救之綜合業務。
		公園大地科	公園、路燈工程與坡地管理業務之督導，合法房屋拆遷及補償查估等相關業務。
		採購管理科	本府採購法令之制定及相關業務督導、稽核。
		品管及勞安科	工程材料之檢驗，本府公共工程品質之查核業務及本局勞工安全衛生管理推動事項。
		資訊室	工務資訊之整體規劃、發展、協調、推動、管理、維護、訓練及督導等事項。
		秘書室	文書、檔案、出納、總務、研考業務及不屬於其他各單位事項。
		會計室	依法辦理歲計、會計事項。
		統計室	依法辦理統計事項。
		人事室	依法辦理人事管理事項。
		政風室	依法辦理政風事項。
	新建工程處		辦理新建道路及道路養護、橋梁、廣場及市有建築物工程之規劃、勘測、設計、施工及研究規劃設計、改善等工作。
	水利工程處		全市河川及雨水下水道、抽水站等公共設施之興建、管理與維護，包括所有河濱高灘地（河濱公園）之管理。
	公園路燈工程管理處		掌理臺北市公園、綠地、廣場、行道樹、遊樂設施及路燈等之規劃、設計施工與管理維護，以及花木培植事宜。
	衛生下水道工程處		掌理大臺北地區污水下水道之規劃、設計、施工、維護、營運管理及污水處理廠設施之操作、管理、水質檢驗、分析等事項。
	大地工程處		本市山坡地安全管理及災害復舊，產業道路與登山步道闢建維護，森林與保安林調查開發利用，山坡地野溪、山溝、土石流潛勢溪流治理規劃，農村新風貌調查規劃，山坡地開發利用與違法之取締。

Duties of the Public Works Department, Taipei City Government

Public Woks Department		
	Department Headquarters	
	Civil Engineering Division	Combining the formulation and writing of planning- and engineering-related codes; the initiation, supervision and quality review of construction of roads, bridges, tunnels, and public buildings.
	Hydraulicus Division	Supervising construction on, and disaster relief / emergency repair of: river engineering, river management, rainwater drainage and sewage drainage.
	Parks and Geotechnical Engineering Division	Supervision of engineering related to parks and streetlights; the move or removal of legal buildings and related compensation measures.
	Procurement Administration Division	The formation, supervision and verification of the City Government’s purchasing laws.
	Ouality Control Division	Handles testing, analysis, and assessment of project materials, and project quality control affairs.
	Systems Administration	Handles the overall planning, development, coordination, promotion, management, maintenance, training, and supervision of the public works information system.
	Administrative Services	Handles research and development, control and inspection, public relations, press relations and meetings, documentation, filing, and payment for public works administration; as well as affairs that are not the duties of other sections or offices.
	Accounting Office	Handles annual bookkeeping and accounting affairs.
	Statistics Office	Handles statistical affairs.
	Personnel Office	Handles human resource affairs.
	Government Ethics	Handles ethics related affairs.
	New Construction Office	Manage planning, surveying, designing, engineering, and improving of new roads, bridges, plazas and city buildings, as well as maintaining existing roads.
	Hydraulic Engineering Office	Construction, management and maintenance of all rivers, rainwater drainage, water pumps, and other water-related public structures, including all river flood banks (riverside parks).
	Parks and Street Lights Office	Handles the planning, design, construction, management and maintenance of Taipei City parks, grassy areas, plazas, sidewalks trees, playgrounds, and street lamps as well as
	Sewerage Systems Office	Handles the planning, design, construction, maintenance and management of wastewater drainage in the greater Taipei area.
	Geotechnical Engineering Office	Our city’s hillside safety management and disaster reaction, industrial path and hiking path construction and maintaining, forest and protection forest investigation development and using, Hill land valley, gully, mudslides potential valley administer and plan. Countryside new style investigation planning, hillside development and ban illegal development.

目　次

CONTENTS

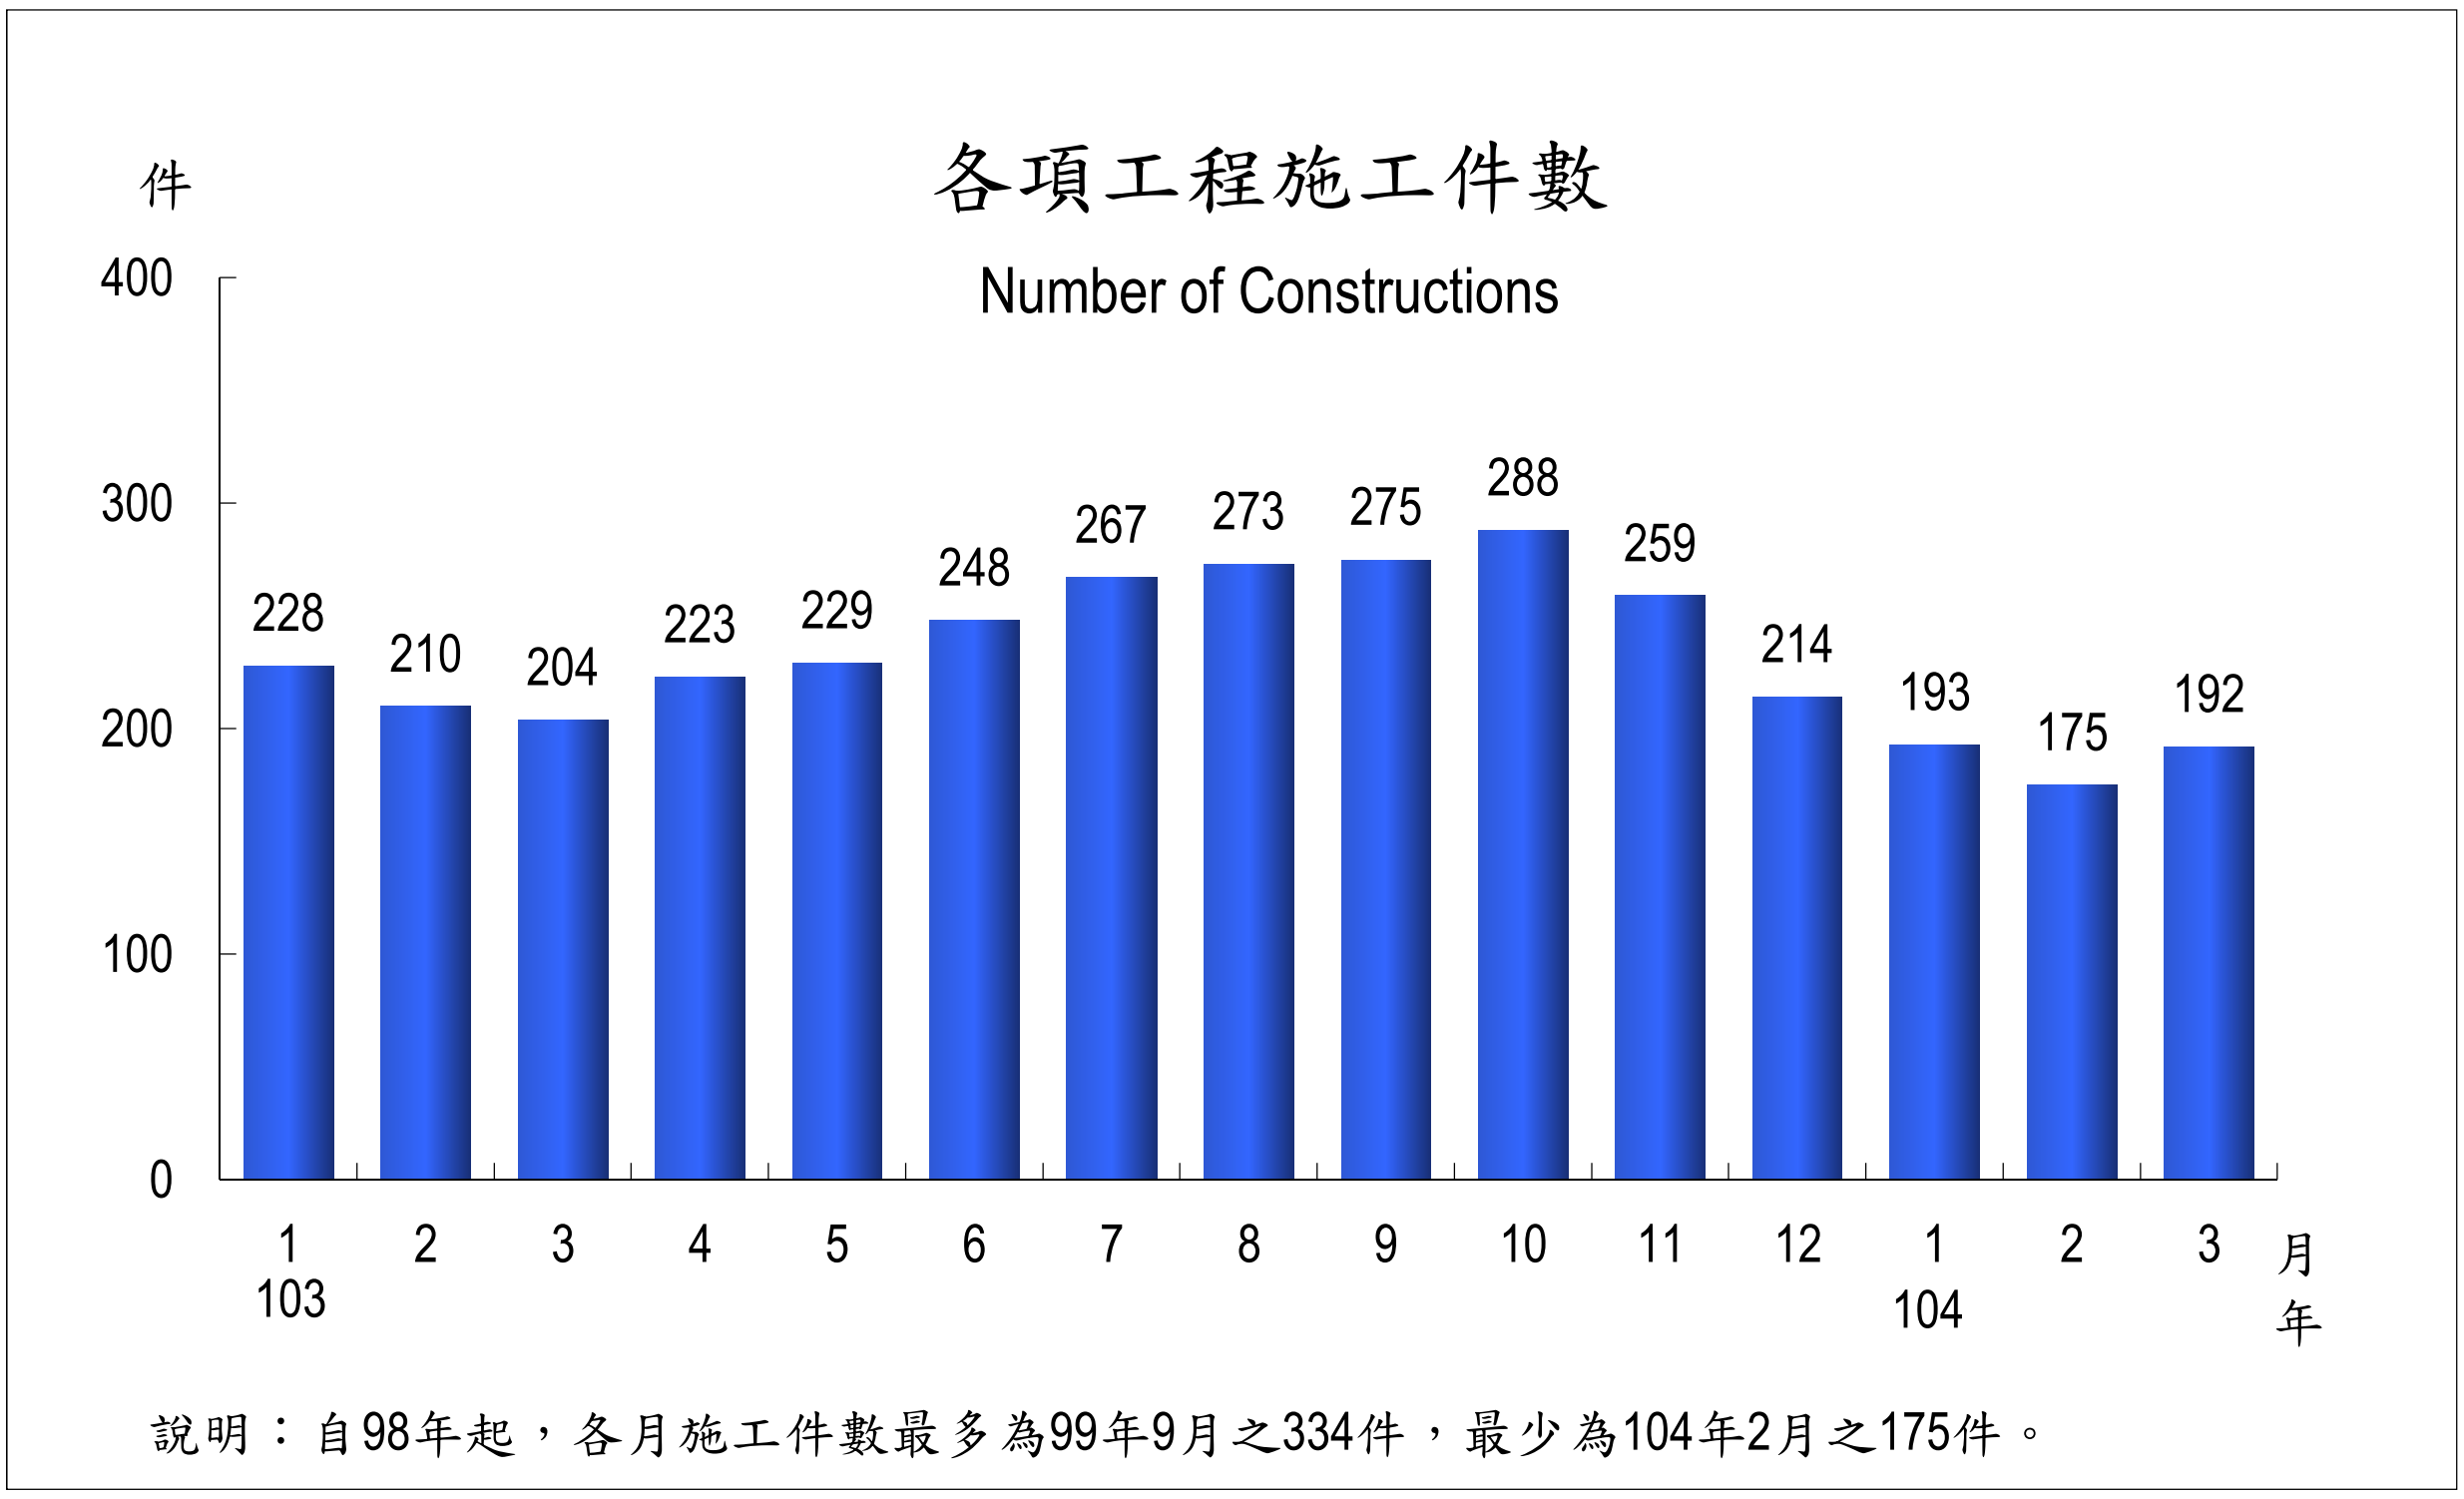
各項工程施工件數
Number of Constructions
件
400
300
200
100
0
228
210
204
223
229
248
267
273
275
288
259
214
193
175
192
1
103
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
104
2
3
月
年
說明：自98年起，各月施工件數最多為99年9月之334件，最少為104年2月之175件。

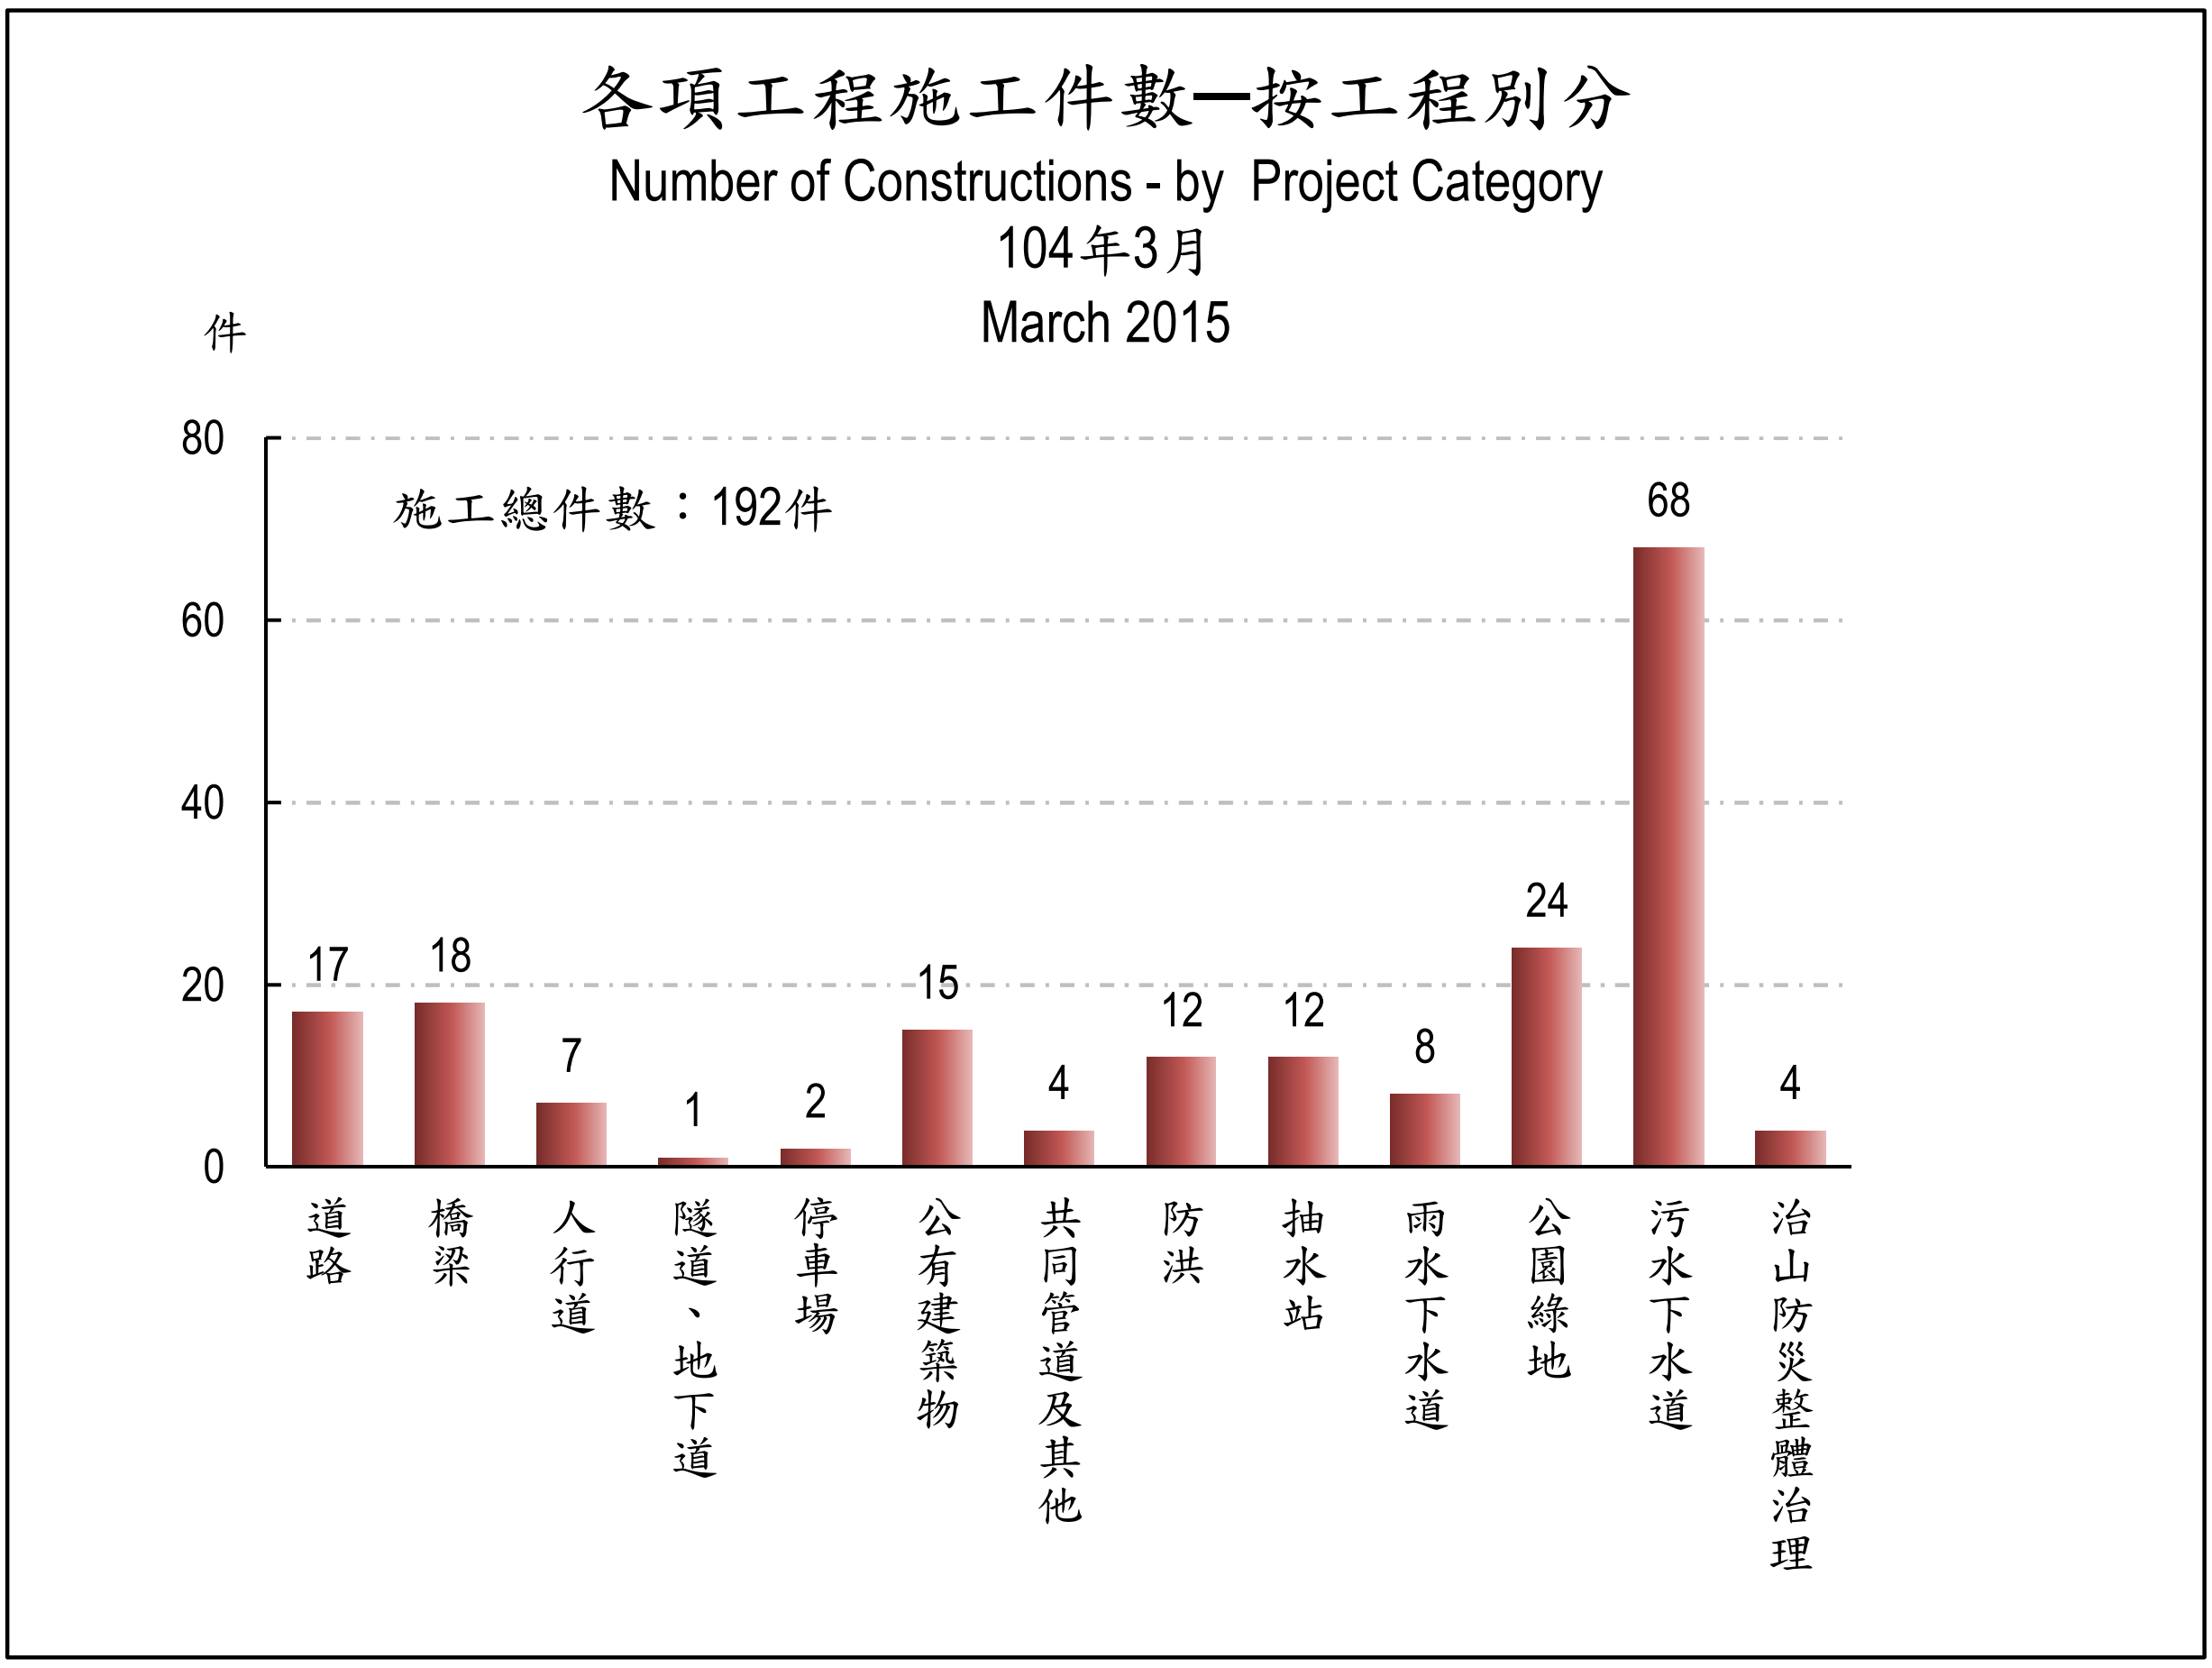
各項工程施工件數─按工程別分
Number of Constructions - by Project Category
104年3月
March 2015
件
80
60
40
20
0
施工總件數：192件
17
18
7
1
2
15
4
12
12
8
24
68
4
道路
橋梁
人行道
隧道、地下道
停車場
公有建築物
共同管道及其他
防洪
抽水站
雨水下水道
公園綠地
污水下水道
治山防災整體治理

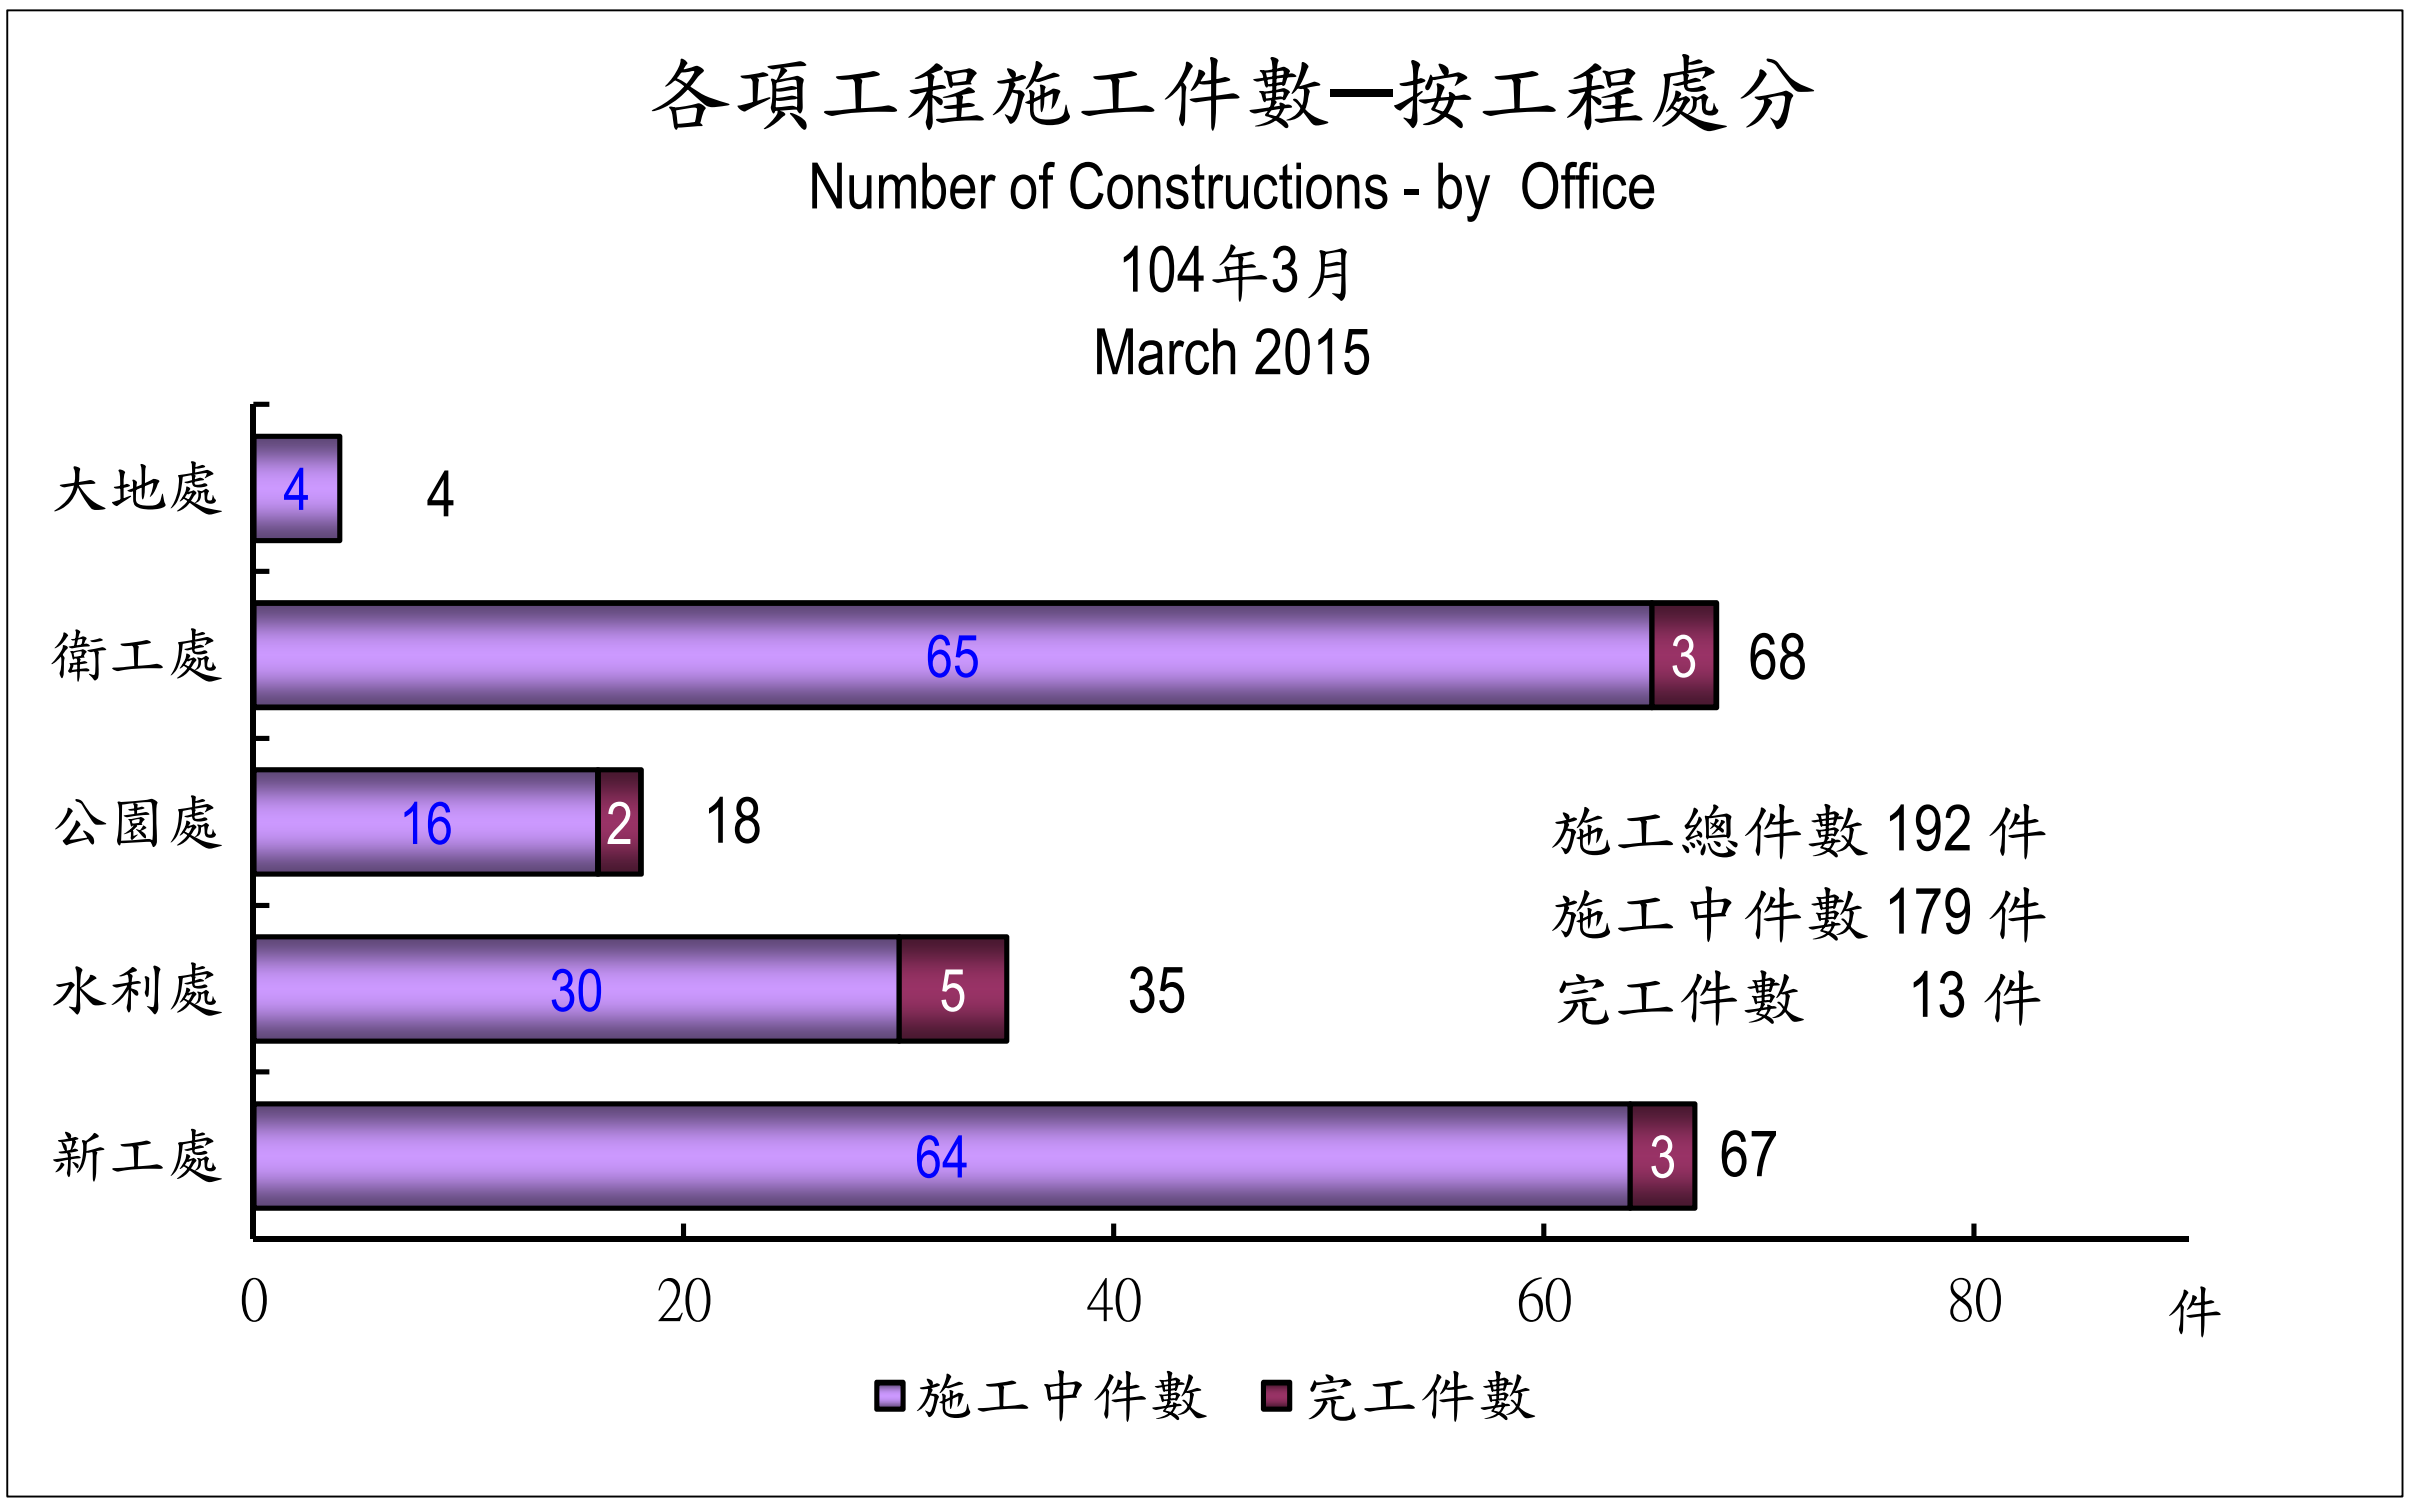
各項工程施工件數—按工程處分
Number of Constructions - by Office
104年3月
March 2015
大地處
衛工處
公園處
水利處
新工處
4
4
65
3
68
16
2
18
30
5
35
64
3
67
施工總件數 192 件
施工中件數 179 件
完工件數 13 件
0
20
40
60
80
件
施工中件數
完工件數

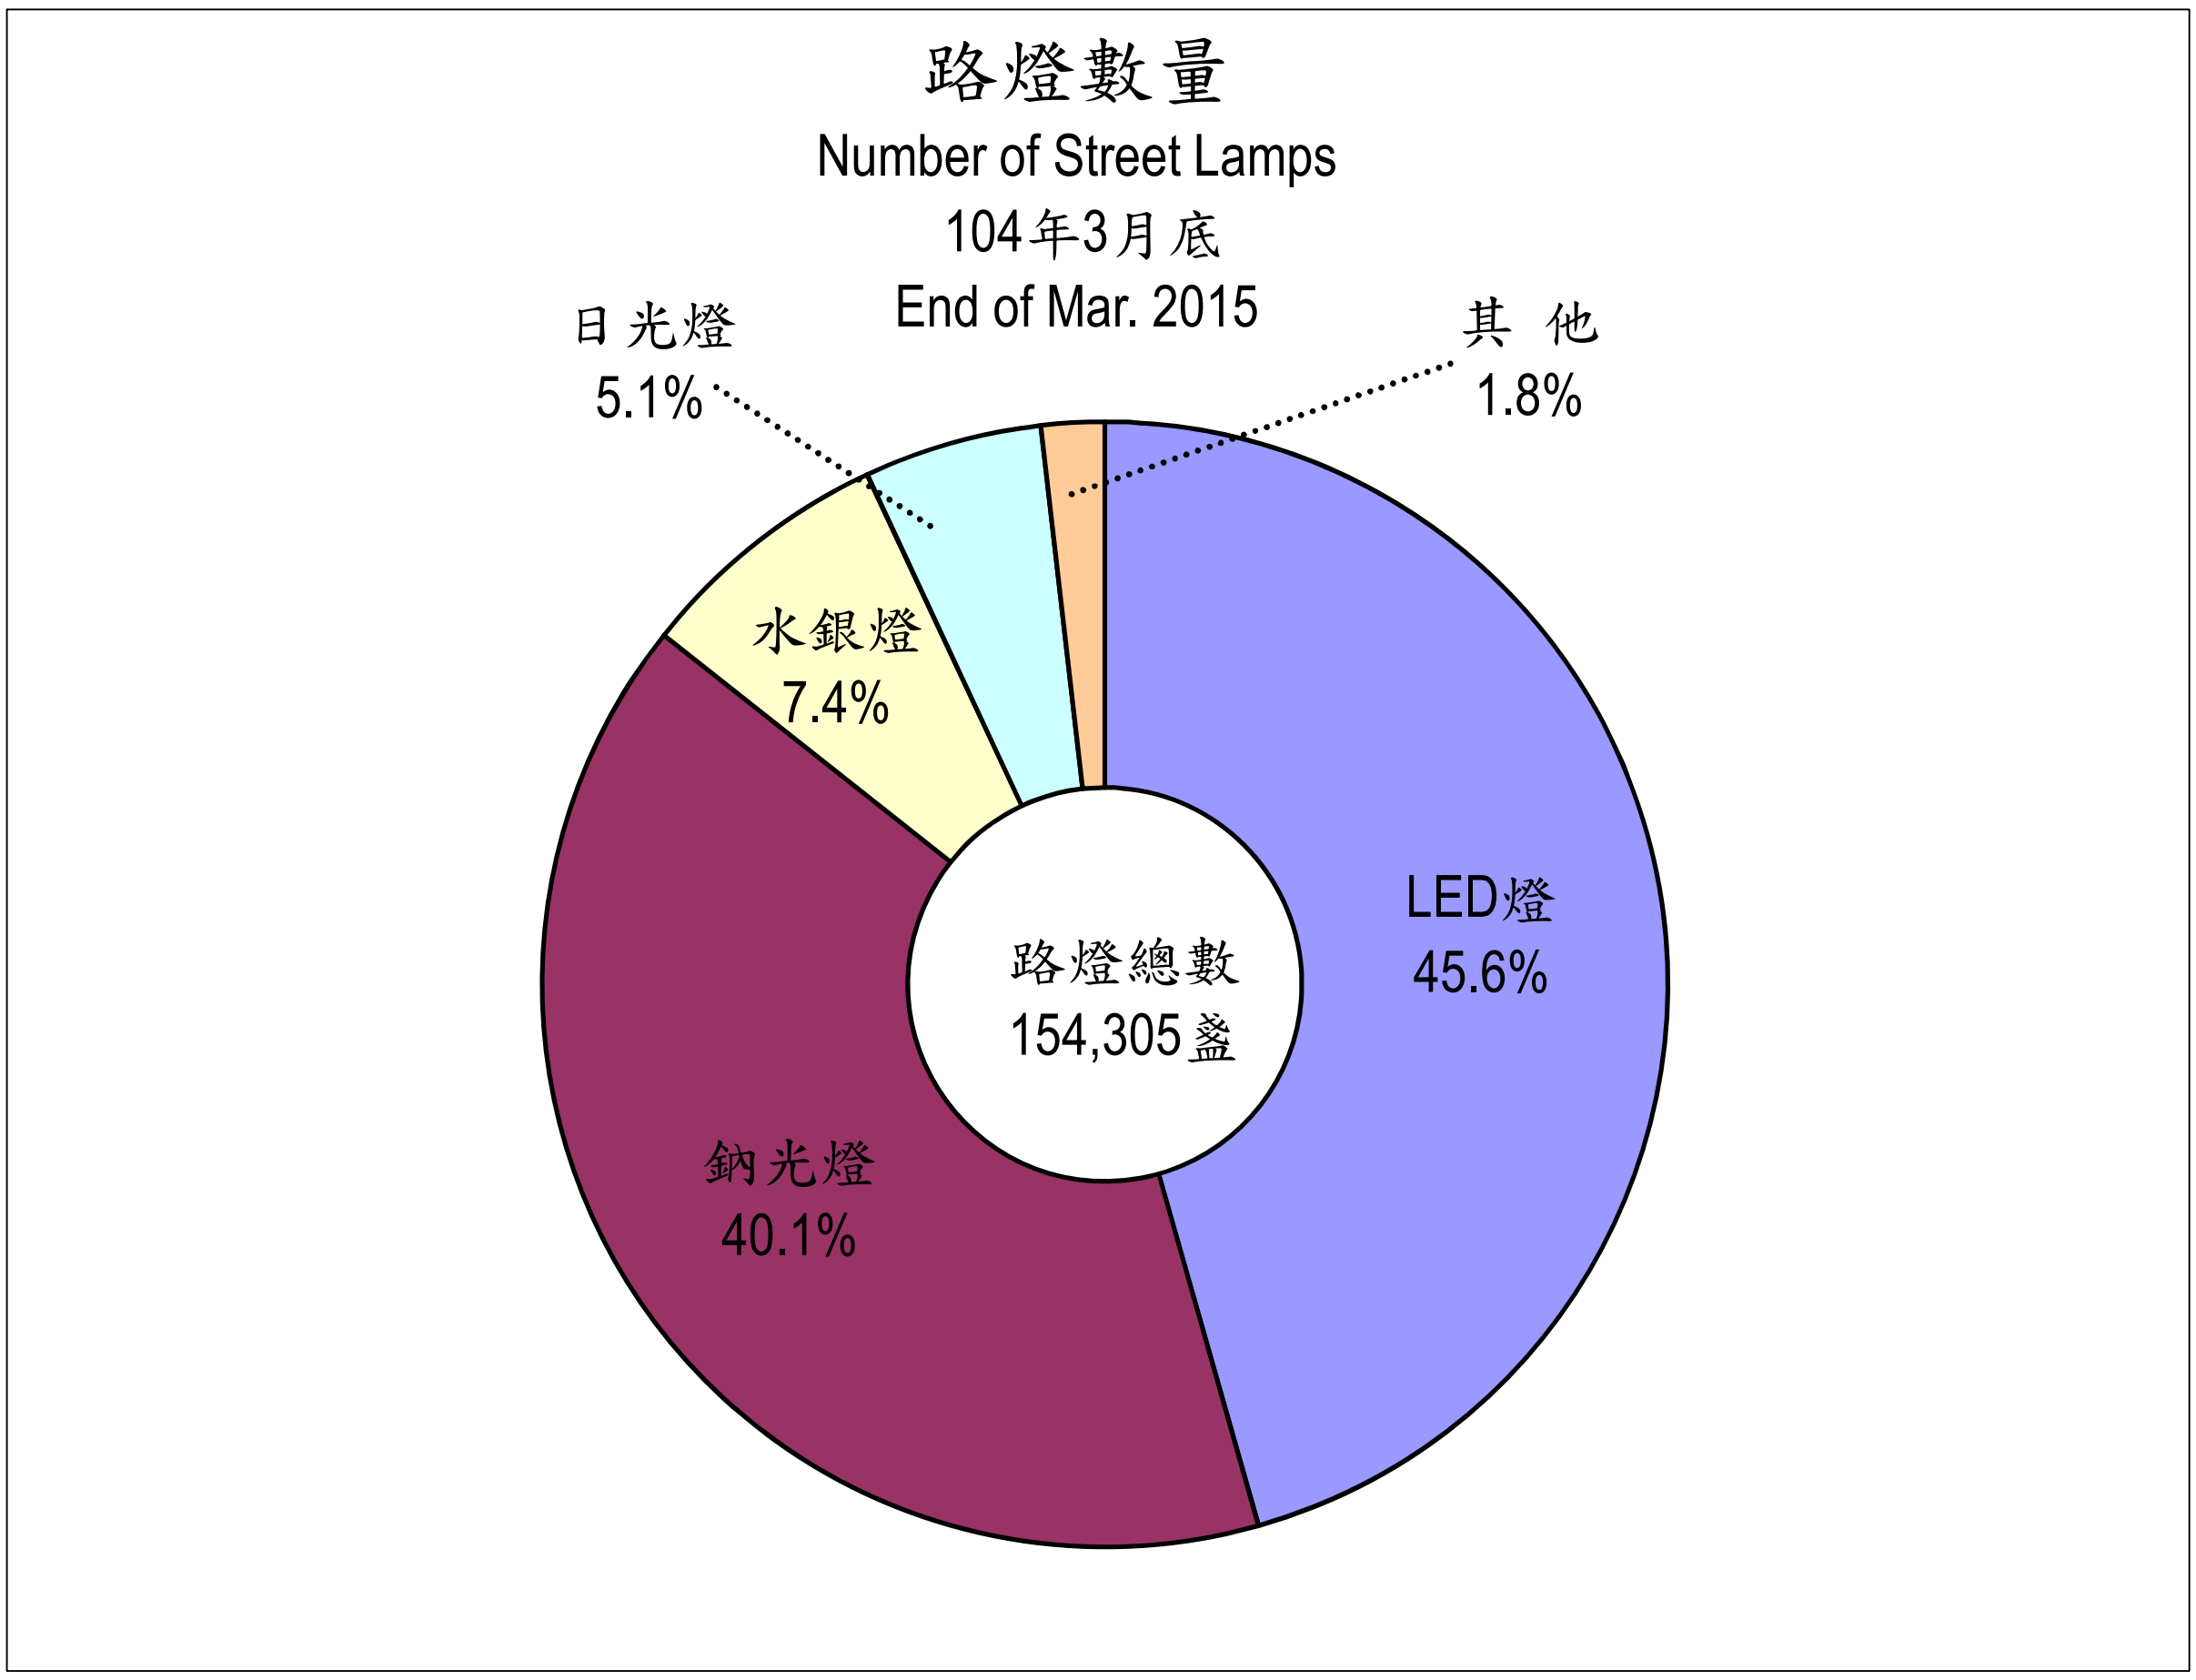
路燈數量
Number of Street Lamps
104年3月底
End of Mar. 2015
日光燈
5.1%
其 他
1.8%
水銀燈
7.4%
LED燈
45.6%
路燈總數
154,305 盞
鈉光燈
40.1%

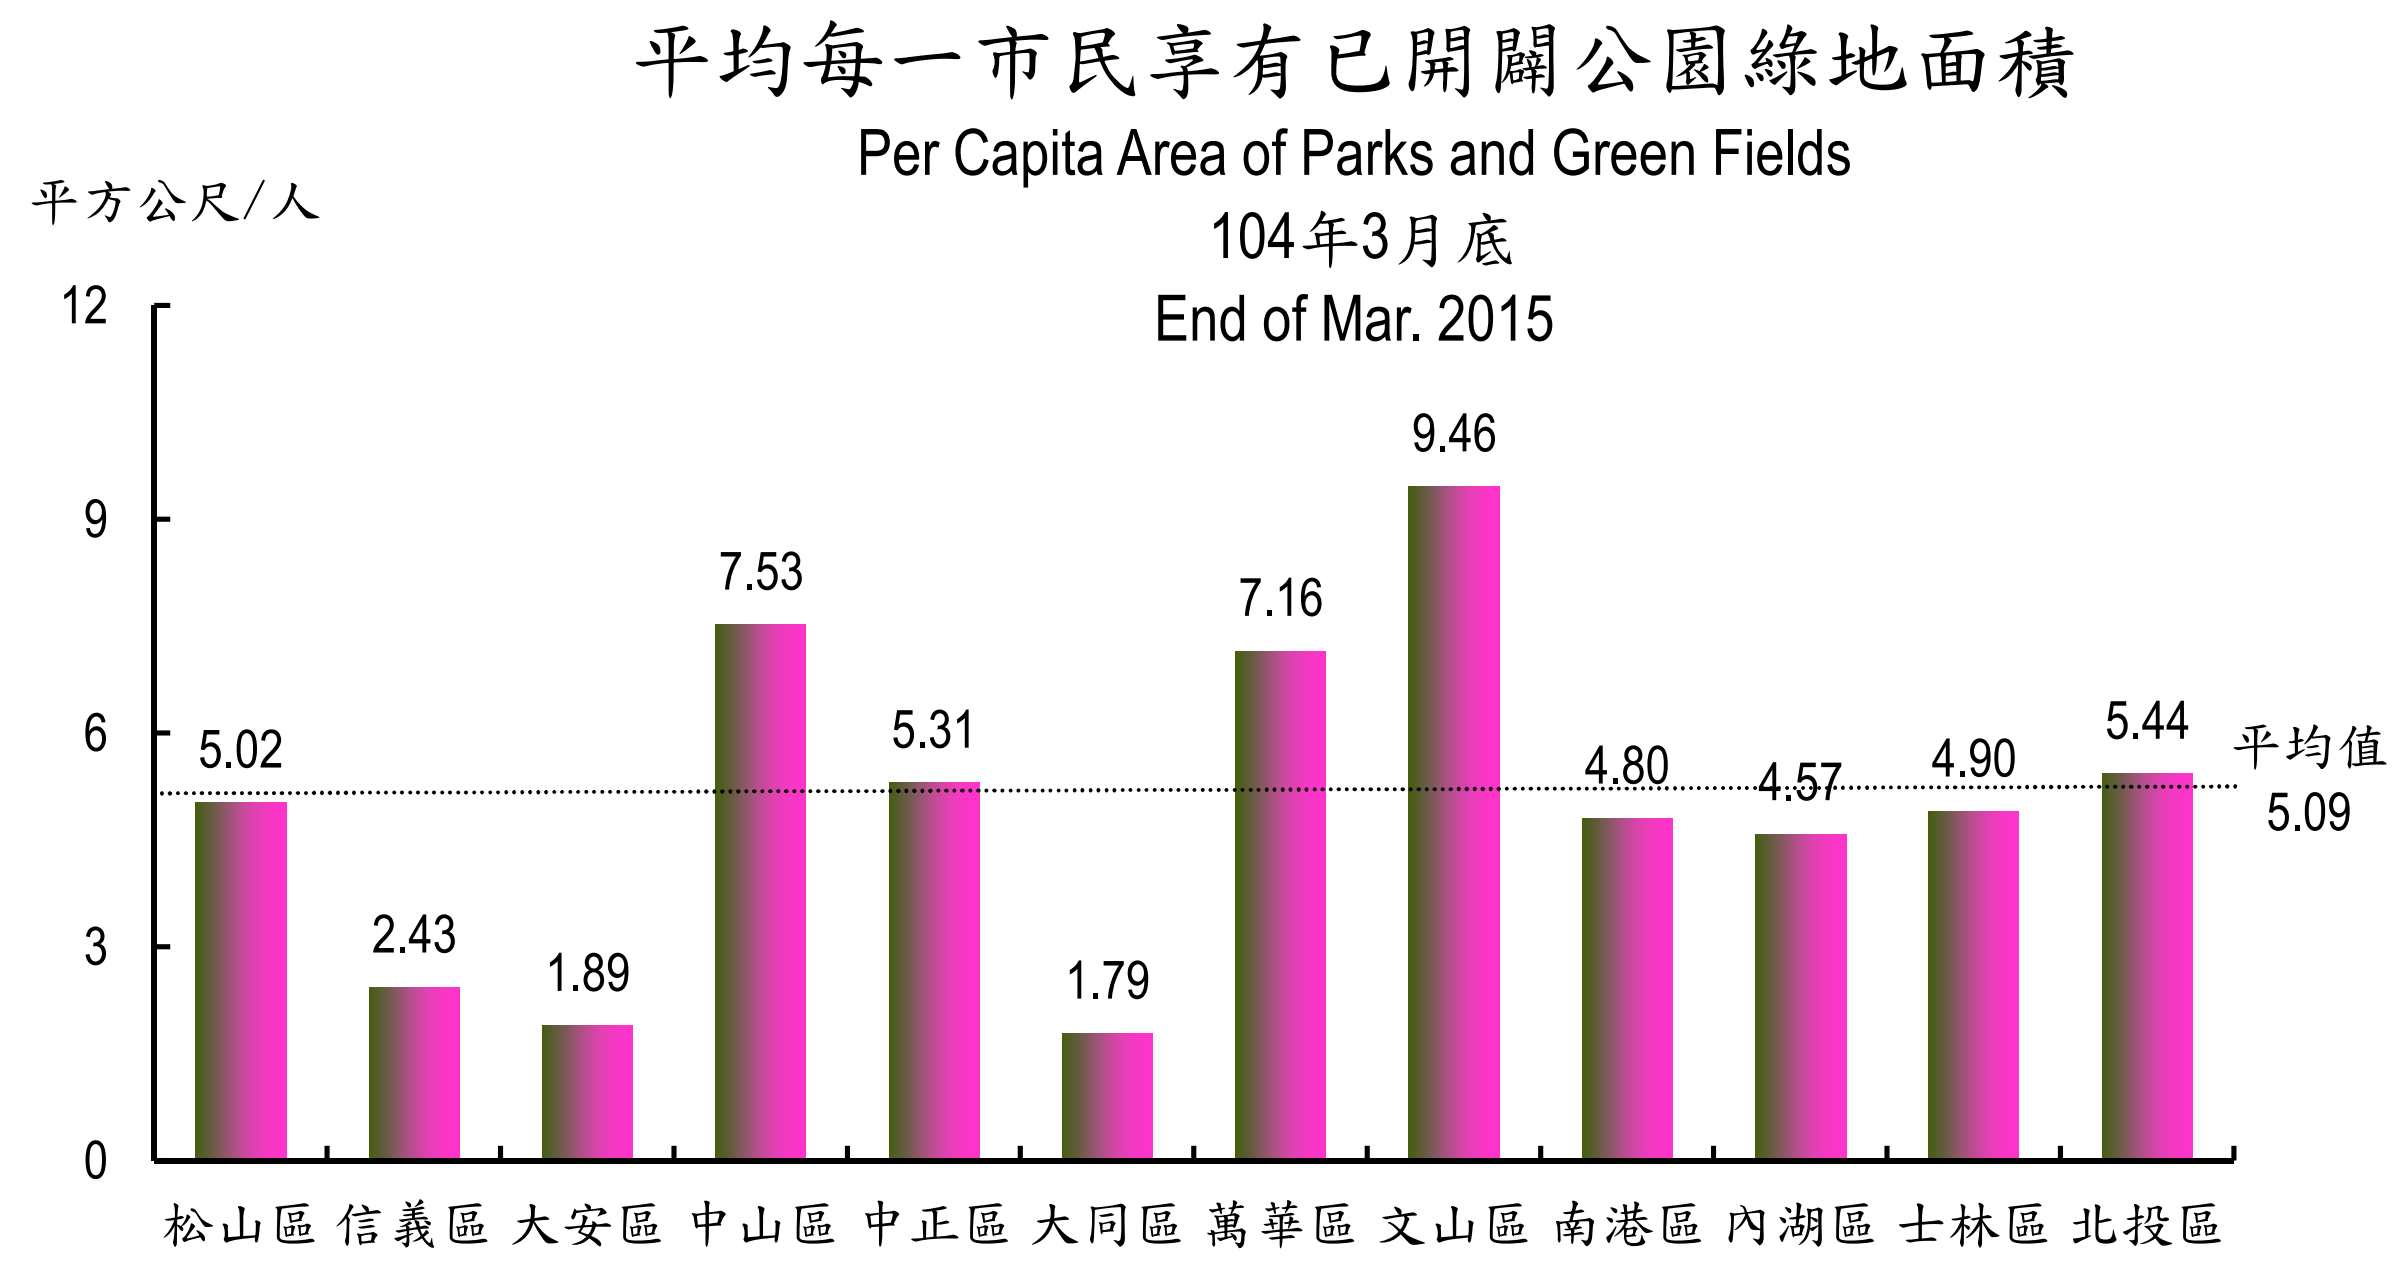

說明：僅含本局已開闢之公園綠地面積，不含本府其他機關所開闢者。

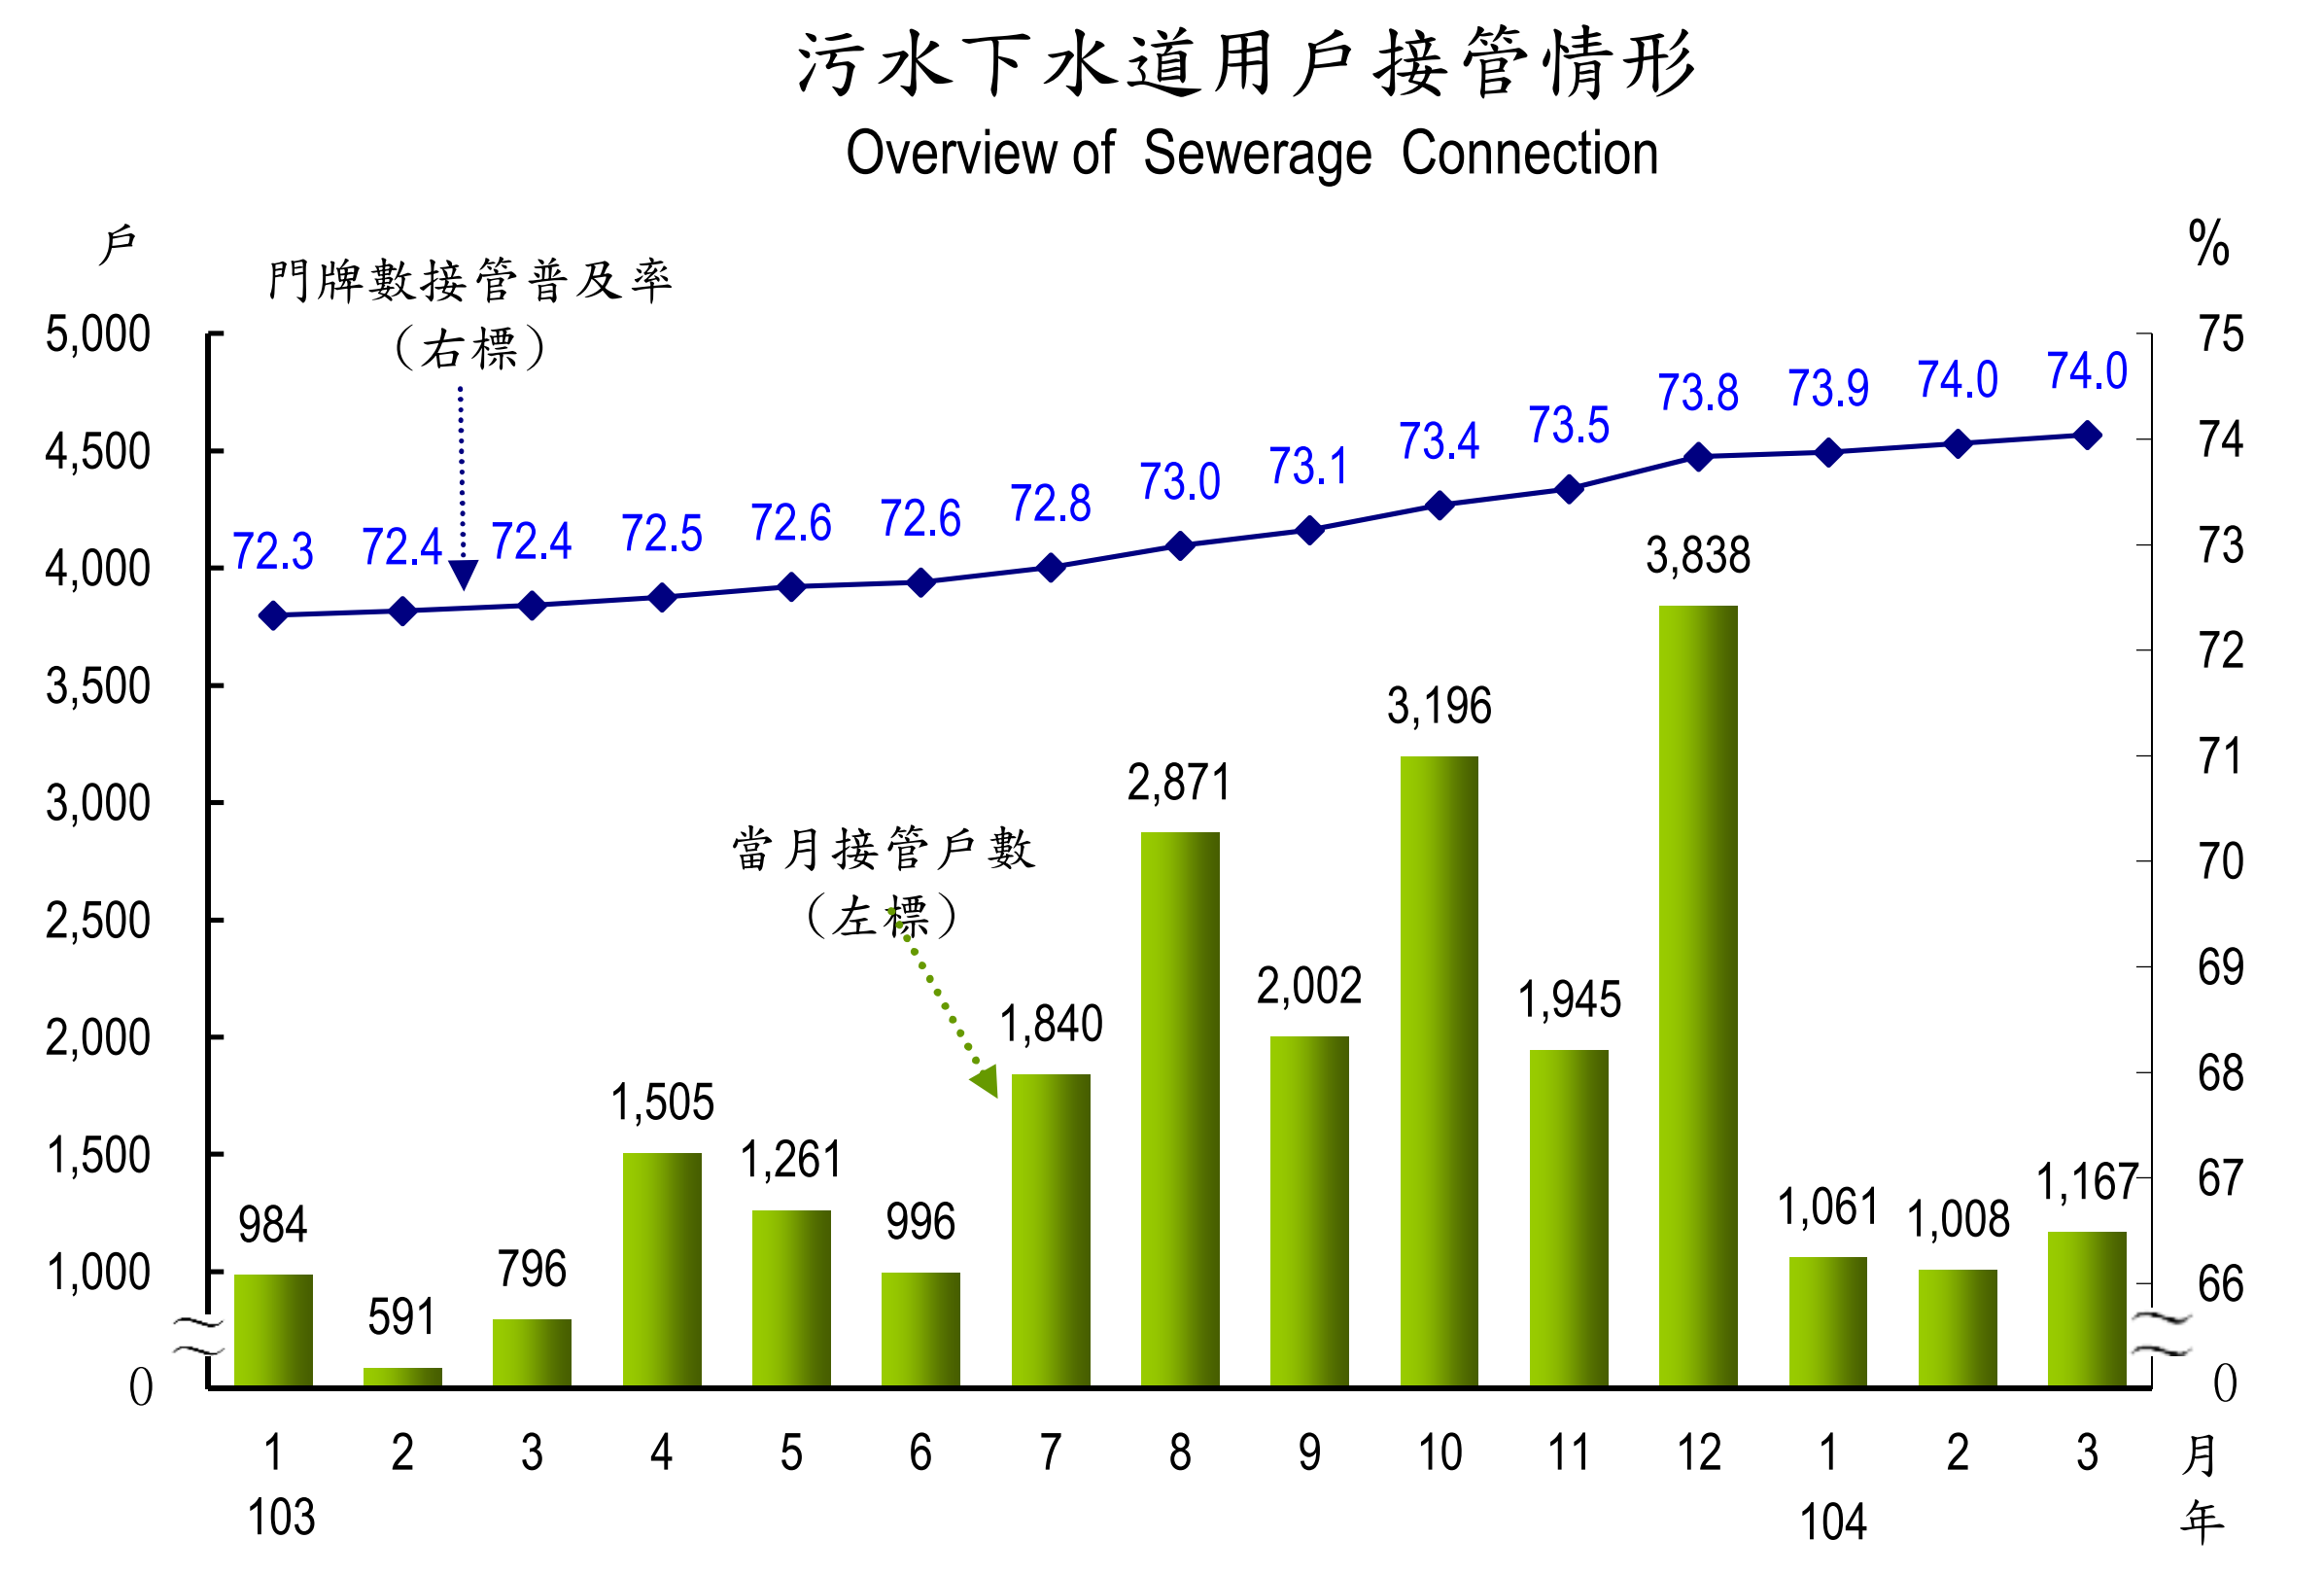

說明：門牌數接管普及率為月底資料。

施工工程簡要分析

104年3月

Brief Analysis in March 2015

單位：件　　unit：case

工程別 Construction	總計 Total	完工 Completed 合計 Sub-total	完工 超前 Lead	完工 符合 Accord	完工 落後 Delay	施工中 Under Construction 合計 Sub-total	施工中 超前 Lead	施工中 符合 Accord	施工中 落後 Delay	施工中 停工 Work Suspension	備註 Note
總計 Total	192	13	2	8	3	179	48	91	37	3	
百分比 %	100.0	6.8	1.0	4.2	1.6	93.2	25.0	47.4	19.3	1.6	
1. 道路新建、拓寬、改善 Road Expansion, Improvement and New Constructions	17	-	-	-	-	17	-	12	4	1	詳表1
2. 橋梁新建、拓建、改善 Bridge Expansion, Improvement and New Constructions	18	1	-	-	1	17	5	7	5	-	詳表2
3. 人行道改善工程 Sidewalk Improvement Work	7	-	-	-	-	7	-	5	2	-	詳表3
4. 隧道、地下道工程 Tunnel Constructions	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	詳表4
5. 停車場新建 New Parking Lots Constructions	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	詳表5
6. 公有建築物工程 Public Building Constructions	15	1	-	1	-	14	9	1	3	1	詳表6
7. 共同管道及其他工程 Communal Pipeline and Other Constructions	4	1	-	1	-	3	-	1	2	-	詳表7
8. 防洪工程 Flood Protection Constructions	12	3	1	1	1	9	3	5	1	-	詳表8
9. 抽水站新建、擴建 Rainwater Pump Station Expansion and New Constructions	12	1	-	-	1	11	2	6	3	-	詳表9
10. 雨水下水道新建、改善 Rainwater Drainage System Improvement and New Constructions	8	-	-	-	-	8	1	3	3	1	詳表10
11. 公園綠地新建、改善 Park Improvement and New Constructions	24	3	-	3	-	21	4	8	9	-	詳表11
12. 污水下水道新建、改善 Sewerage System Improvement and New Constructions	68	3	1	2	-	65	19	43	3	-	詳表12
13. 治山防災整體治理工程 Watershed Management and Disaster Prevention	4	-	-	-	-	4	3	-	1	-	詳表13

資料來源：工務局統計室。

Source：Statistics Office of Public Works Department

施工中工程

Under Construction

單位：件 unit：case

年(月)別／機關別 Year (Month)／Sponsor Institution		總計 Total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	停工 Work Suspension
民國103年	2014					
1月	Jan.	203	53	92	56	2
2月	Feb.	195	51	90	48	6
3月	Mar.	183	44	82	53	4
4月	Apr.	208	60	103	42	3
5月	May	218	70	97	39	2
6月	June	239	70	124	43	2
7月	July	250	64	136	49	1
8月	Aug.	262	68	142	50	2
9月	Sep.	254	69	125	58	2
10月	Oct.	264	69	142	51	2
11月	Nov.	208	60	107	40	1
12月	Dec.	178	59	65	51	3
民國104年	2015					
1月	Jan.	162	59	59	41	3
2月	Feb.	159	61	65	32	1
3月	Mar.	179	48	91	37	3
新建工程處 New Construction Office		64	16	27	18	3
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		30	7	16	7	-
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office		16	3	5	8	-
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		65	19	43	3	-
大地工程處 Geotechnical Engineering Office		4	3	-	1	-

資料來源：工務局統計室。
Source：Statistics Office of PWD

表1　道路新建、拓寬、改善工程

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)
新建工程處 New Construction Office		總　　計	222,707
	100	1. 北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)	69,770
	102	2. 福國路延伸工程(第1期)道路橋梁、共同管道及代辦自來水管線工程	109,498
	103	3. 林森南路3巷道路新築工程	610
	103	4. 北投223號公園西側道路新築工程	782
	103-104	5. 北投復興三路201巷道路局部拓寬工程	11,950
	103	6. 大安仁愛路3段118巷中段道路拓寬工程	255
	103	7. 103年度災害搶修預約式契約工程(第2標)(大安、文山、中正、萬華)	796
	103	8. 103年度一般道路更新及道路附屬設施改善預約式契約工程(第2標)(松山信義)	3,272
	103	9. 103年度一般道路更新及道路附屬設施改善預約式契約工程(第3標)(中正萬華)	2,364
	103	10. 103年度一般道路更新及道路附屬設施改善預約式契約工程(第6標)(大安文山)	2,572
	104	11. 104年度一般道路更新預約式契約工程(第1標)(中山大同)	8,932
	104	12. 104年度一般道路更新預約式契約工程(第5標)(士林北投)	7,090
	104	13. 104年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第1標)(中山大同)	700
	104	14. 104年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第2標)(松山信義)	486
	104	15. 104年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第3標)(中正萬華)	998
	104	16. 104年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第5標)(士林北投)	1,786
	104	17. 104年度道路附屬設施改善預約式契約工程(第6標)(大安文山)	846

資料來源：新建工程處。

Table 1 Road Expansion, Improvement and New Constructions

March 2015

工程內容 Construction Content			工期 While Constructing			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
…	…	…	--	--	--	--	--	-	12	4
4,577	4.2-19.1	44,104	101.02	104.04		94.33	84.78			V
1,802	28.2-45	63,269	102.03	104.08		67.30	67.28			V
82	14.5	1,189	103.12	104.03	停工	100.00	2.91			
217	4-10	1,127	104.01	104.09		2.74	2.74		V	
100	10	1,000	104.03	105.01		0.01	0.01		V	
49	8	390	103.12	104.03		100.00	79.00			V
預約維護			103.06	104.12		49.41	49.41		V	
預約維護			103.08	104.03		47.00	47.00		V	
預約維護			103.06	104.06		67.12	67.12		V	
預約維護			103.07	103.12		100.00	78.50			V
預約維護			104.03	105.03		0.01	0.01		V	
預約維護			104.03	104.12		0.01	0.01		V	
預約維護			104.03	105.03		0.03	0.03		V	
預約維護			104.03	104.12		0.01	0.01		V	
預約維護			104.03	105.12		3.00	3.00		V	
預約維護			104.03	104.12		0.10	0.10		V	
預約維護			104.03	104.12		5.00	5.00		V	

Source：New Construction Office

表2　橋梁新建、拓建、改善工程

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)
新建工程處 New Construction Office		總　計	…
	102	1. 福國路延伸工程(第一期)道路橋梁、共同管道及代辦自來水管線工程	①…
	103	2. 103年度全市橋涵預約維護改善工程(第3標)(中正萬華區)	717
	103	3. 103年度全市橋涵預約維護改善工程(第4標)(內湖南港區)	776
	103	4. 103年度全市橋涵預約維護改善工程(第5標)(士林北投區)	710
	102	5. 南湖大橋、成功橋及成美橋耐震補強工程	8,476
	100-103	6. 成功橋兩側引道及部分橋梁結構補強暨加設隔音牆工程	2,150
	102	7. 望星橋、士林復興橋、福林橋、雙溪橋及百齡橋耐震補強工程	4,580
	102	8. 永福橋耐震補強工程	4,870
	103	9. 內湖松山麥帥二橋隔音牆修繕(油漆防蝕塗裝)工程	221
	103	10. 大同萬華新環河高架隔音牆修繕(油漆防蝕塗裝)工程	656
	103	11. 文山木新路陸橋拆除工程	10,300
	103	12. 基隆路高架橋鋼構橋油漆防蝕塗裝改善工程	3,268
	103	13. 文山指南路3段2巷北實橋下游側加設人行道工程	200
	103	14. 洲美高架橋鋼構油漆防蝕塗裝改善工程(第二標)	4,383
	103	15. 萬華環河南路3段243巷前人行陸橋延長20公尺跨堤防工程	920
	103-104	16. 臺北市人行陸橋暨人行地下道拆除預約式契約工程(第二標)	810
	104	17. 104年度全市橋涵預約維護改善工程(第1標)(中山大同區)	709
	104	18. 104年度全市橋涵預約維護改善工程(第2標)(松山信義區)	711

資料來源：新建工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

Table 2　Bridge Expansion, Improvement and New Constructions

March 2015

工程內容 Construction Content						工期 While Constructing			施工進度　Progress				
主橋 Main Span			引道 Lead Road			開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (㎡)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (㎡)								
…	…	…	…	…	…	--	--	--	--	--	5	7	6
295	28	8,260	370	2.75-28	7,330	102.03	104.08		67.30	67.28			V
預約維護						103.09	104.12		88.52	88.52		V	
預約維護						103.10	104.03		100.00	31.60			V
預約維護						103.07	103.12	104.02	100.00	100.00			V
耐震補強						103.09	104.11		16.71	23.20	V		
橋梁結構補強、工型預力梁段及增設2公尺高之隔音牆643公尺						103.10	104.03		100.00	92.50			V
橋台分散水平力裝置總計80組PVC排水管56公尺及模板203平方公尺等						103.10	104.09		38.50	35.70			V
耐震補強						103.11	104.11		28.51	44.73	V		
隔音牆修繕						103.12	104.05		13.66	13.66		V	
隔音牆修繕						103.12	104.06		6.84	23.73	V		
16	12	204	99	12	1,226	103.12	105.01		12.27	13.91	V		
-	-	-	-	-	-	103.12	104.07		26.00	26.00		V	
15	9	128	-	-	-	103.12	104.05		38.72	38.72		V	
-	-	-	-	-	-	104.01	104.08		19.36	18.20			V
50	2	100	-	-	-	104.01	104.09		2.94	15.93	V		
…	…	…	…	…	…	104.01	104.12		19.00	19.00		V	
預約維護						104.03	104.12		0.17	0.17		V	
預約維護						104.03	104.12		0.72	0.72		V	

Source：New Construction Office

Note：①The Construction Expense is included in the road project expenditure.

表3　人行道改善工程

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)
新建工程處 New Construction Office		總　計	…
	103	1. 103年度臺北市人行道預約改善工程(第1標)	2,353
	103	2. 103年度臺北市人行道預約改善工程(第4標)	2,162
	103	3. 103年度臺北市人行道預約改善工程(第6標)	2,123
	103	4. 臺北市松山路道路景觀與人本環境改善工程(永吉路至忠孝東路5段)	①…
	104	5. 104年度臺北市人行道預約改善工程(第1標)	1,531
	104	6. 104年度臺北市人行道預約改善工程(第2標)	1,357
	104	7. 104年度臺北市人行道預約改善工程(第3標)	1,367

資料來源：新建工程處。

附註：①本項工程工程費包含於共同管道及其他工程內。

Table 3 Sidewalk Improvement Work

March 2015

工程內容 Construction Content			工期 While Constructing			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (m²)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
…	…	…	--	--	--	--	--	-	5	2
預約維護			103.06	104.03		100.00	82.00			V
預約維護			103.05	104.03		100.00	86.76			V
預約維護			103.05	104.12		43.50	43.50		V	
預約維護			104.02	104.10		0.11	0.11		V	
預約維護			104.03	104.12		2.50	2.50		V	
預約維護			104.01	104.12		10.00	10.00		V	
預約維護			104.03	105.03		1.80	1.80		V	

Source：New Construction Office

Note：①The Construction Expense is included in the Communal Pipeline and Other Constructions.

表4　隧道、地下道工程

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)
新建工程處 New Construction		總　計	2,240
	102-105	1. 信義快速道路象山、文山隧道油漆美化改善工程	2,240

資料來源：新建工程處。

表5　停車場新建工程

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)
新建工程處 New Construction		總　計	1,845
	97-102	1. 臺北市政府環保局北投區隊洲美停車場整建工程	1,845
	103	2. 臺北市文山永健國民小學遷校校舍新建工程暨附設地下停車場(建築工程)	①...

資料來源：新建工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

Table 4　Tunnel Constructions

March 2015

工程內容 Construction Content			工期 While Constructing			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
…	…	…	--	--	--	--	--	-	-	1
象山、文山隧道裂縫修補及油漆美化工程			104.01	104.06		10.10	7.20			v

Source：New Construction Office

Table 5　New Parking Lots Constructions

March 2015

工程內容 Construction Content				工期 While Constructing			施工進度 Progress				
總面積 Area (平方公尺) (㎡)	大型車停車位 (輛) (set)	小型車停車位 (輛) (set)	機車停車位 (輛) (set)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
13,954	28	223	98	--	--	--	--	--	2	-	-
4,364	28	6	15	103.11	104.07		24.00	24.13	v		
9,590	-	217	83	103.12	106.06		0.42	0.45	v		

Source：New Construction Office

Note：①The Construction Expense is included in the Bridge project expenditure.

表6　公有建築物工程

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)
新建工程處 New Construction		總　計	2,136,827
	101-103	1. 臺北市松山區三民國民小學綜合大樓新建工程(第二階段)	3,388
	101-104	2. 臺北市政府消防局松江分隊新建-建築主體工程(續)	24,446
	101	3. 北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)專案住宅新建工程	293,200
	102	4. 北部流行音樂中心興建工程連續壁工程①	11,386
	101-103	5. 臺北市殯葬管理處第二殯儀館整建工程(建築工程)	47,447
	102	6. 林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程第一標	635,900
	102	7. 林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程第二標	441,500
	102	8. 林口國宅暨2017世界大學運動會選手村新建統包工程第三標	320,100
	102	9. 臺北市中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程(建築工程)	29,379
	102	10. 文山區隊木柵復興分隊新建工程	3,288
	103	11. 臺北市議會空調主機設備汰換統包工程	1,860
	103	12. 臺北市文山區永建國民小學遷校校舍新建工程暨附設地下停車場(建築工程)	80,800
	103	13. 永吉倉庫房舍外牆磁磚更新工程	244
	97-108	14. 北部流行音樂中心興建工程(北基地)	242,000
	103	15. 軍人公墓骨灰埋藏設施工程	1,889

資料來源：新建工程處。

附註：①本項工程於103年4月3日第1階段竣工，第2階段將配合後續主體標發包後再開始。

Table 6　Public Building Constructions

March 2015

工程內容　Project Content				工期　While Constructing			施工進度　Progress				
棟數 No. of Buildings (棟) (Building)	層數　Storeies 地上 Ground (層) (storey)	層數　Storeies 地下 Underground (層) (storey)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
59	--	--	754,296	--	--	--	--	--	9	2	3
1	3	1	4,195	103.07	104.01		100.00	90.18			v
1	12	3	11,348	103.06	104.08		50.06	50.16	v		
15	10-13	2	108,834	101.09	104.07		73.97	52.91			v
-	-	-	-	102.06	103.03	停工	100.00	95.90			
1	4	2	13,923	102.09	104.12		34.82	36.21	v		
14	18	2	253,503	102.08	106.03		22.69	24.46	v		
11	21	2	168,172	102.08	106.03		19.86	21.33	v		
9	20	2	123,579	102.08	106.02		20.49	23.56	v		
1	7	3	12,189	102.12	105.03		42.07	42.63	v		
1	4	-	756	103.05	104.03		26.79	32.53	v		
-	-	-	-	103.10	104.03		100.00	12.00			v
3	-	-	16,050	103.12	106.06		0.42	0.45	v		
1	4	-	945	104.01	104.03	104.03	100.00	100.00		v	
1	-	-	40,802	104.01	107.01		0.44	0.51	v		
-	-	-	-	104.01	104.08		16.01	16.01		v	

Source：New Construction Office

表7　共同管道及其他工程

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)
新建工程處 New Construction Office		總　計	…
	102	1. 161KV汐止-蘆洲線#36連接站及管路工程	6,316
	102	2. 福國路延伸工程(第1期)道路橋梁、共同管道及代辦自來水管線工程	①…
	103	3. 103年度臺北市騎樓整平第10期工程(零星區域)	1,260
	103	4. 臺北市松山路道路景觀與人本環境改善工程(永吉路至忠孝東路5段)	2,169

資料來源：新建工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

Table 7　Communal Pipeline and Other Constructions

March 2015

工程內容 Construction Content	工期 While Constructing			施工進度　Progress				
	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
--	--	--	--	--	--	-	2	2
#36連接站1座，推管1處183公尺，工作井2座，管路埋設193公尺。	102.03	104.04		70.83	62.33			V
共同管道工程：施作幹管660公尺，支管1,230公尺，推管470公尺及代辦自來水管線工程。	102.03	104.08		67.30	67.28			V
改善本市騎樓高低不平面積6,624.21平方公尺。	103.07	104.03	104.03	100.00	100.00		V	
職災面積159平方公尺。	104.02	104.10		0.11	0.11		V	

Source：New Construction Office

Note：①The Construction Expense is included in the road project expenditure.

表8　防洪工程

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		總　計	46,351
	102	1. 中港河碼頭及周邊環境改造工程	8,150
	102	2. 中港河自行車橋新建及關渡碼頭周邊環境改善工程	10,484
	102	3. 北投士林科技園區區段徵收公共工程-施工圍籬及土方整理工程(第2期工區範圍先期工程)	4,986
	102	4. 陽港3調洪沉砂池新建工程	10,632
	103	5. 全市河濱公園疏散門及相關設備整建工程(第3標)	2,220
	103	6. 延平河濱公園大稻埕至洲美橋間堤壁美化工程(大稻埕至高速公路橋間)	2,243
	102	7. 延平河濱公園重陽橋周邊景觀整建後續工程	1,078
	104	8. 104年度南區水利建造物預約維護檢修改善工程	560
	104	9. 104年度西區水利建造物預約維護檢修改善工程	560
	104	10. 中港河自行車橋設施及環境改善工程	4,318
	104	11. 104年度北區水利建造物預約維護檢修改善工程	560
	104	12. 104年度東區水利建造物預約維護檢修改善工程	560

資料來源：水利工程處。

Table 8 Flood Protection Constructions

March 2015

工程內容 Construction Content					工期 While Constructing			施工進度 Progress				
堤防 Embank-ment (公尺) (m)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	丁壩 Spur Dam (座) (Set)	閘門 Gate (座) (Set)	其他 Others	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	-	-	-	--	--	--	--	--	4	6	2
改建中港河碼頭及周邊設施					102.07	104.04		96.71	97.21	V		
新建自行車棧道、觀景平臺、碼頭周邊設施改善					102.07	104.03	104.03	100.00	100.00		V	
圍籬及土方整理工程					102.12	104.12		81.65	82.31	V		
防洪調節池之整地、植生、鋪面、人行步道、人行橋、擋土牆、溢流井等					103.02	104.01	104.03	100.00	100.00			V
疏散門及堤頂閘門、士林橋與南深橋陸閘等相關設備改善					103.03	104.04		84.00	84.00		V	
進行高速公路橋以南至大稻埕以北之堤壁美化,及堤壁亮點設施營造					103.08	104.01		100.00	97.80			V
景觀整建					103.12	104.04	104.03	99.99	100.00	V		
預約維護檢修改善工程					104.03	104.12		27.00	27.00		V	
預約維護檢修改善工程					104.03	104.12		15.00	15.00		V	
新設中港河自行車跨橋與灘地公園周邊相關設施					104.03	104.08		4.64	5.00	V		
預約維護檢修改善工程					104.03	104.12		15.78	15.78		V	
預約維護檢修改善工程					104.03	104.12		10.00	10.00		V	

Source：Hydraulic Engineering Office

表9　抽水站新建、擴建工程

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)	工程內容 抽水機 Pump Set 數量 Number (座) (Set)	口徑 caliber (吋) (Inch)	抽水量 Pumping Capacity (立方公尺/每秒) (m^3/Sec)
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		總　計	66,833	-	-	-
	101	1. 臺北市抽水站第二及三分區暨總一管理中心自動化監控系統建置工程	39,735	-	-	-
	102	2. 抽水站環境改造工程(第2期)第1標	4,990	-	-	-
	103	3. 社子島地區及成美抽水站閘門及吊門機改善工程	3,136	-	-	-
	103	4. 景美抽水站機組增設工程	6,463	-	-	-
	103	5. 抽水站等建築物耐震能力補強工程(第2期)	1,641	-	-	-
	103	6. 抽水站環境改造工程(第2期)第2標	2,975	-	-	-
	103	7. 玉成抽水站2號機抽水機組維修工程	287	-	-	-
	104	8. 104年度抽水站沉水泵浦拆卸安裝檢修工程	638	-	-	-
	104	9. 104年度沉砂池清疏及維護工程	480	-	-	-
	104	10. 臺北市CCTV河川水情監控設備建置工程(第2期)	2,546	-	-	-
	101	11. 第一分區監控用電視牆更新工程	1,792	-	-	-
	103	12. 臺北市抽水站第四分區管理中心新建工程	2,150	-	-	-

資料來源：水利工程處。

Table 9 Rainwater Pump Station Expansion and New Constructions

March 2015

Construction Contentt				工期 While Constructing			施工進度 Progress				
發電機 Electric Generator		抽水機房 Pump Set Room		開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled	實際 Actual	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay
數量 Number (座) (Set)	馬力 Horse-power (匹) (Hp)	數量 Number (座) (Set)	面積 Area (平方公尺) (㎡)				(%)	(%)	(件) (case)	(件) (case)	(件) (case)
-	-	-	-	--	--	--	--	--	2	6	4
建置自動化監控系統、影像監視系統				101.08	104.02		100.00	98.35			V
辦理撫遠等抽水站之站房改善外牆立面、周邊環境及指定處所內環境改善				103.01	104.01		100.00	95.75			V
閘門及吊門機改善				103.04	104.02	104.03	100.00	100.00			V
增設4台6CMS抽水機組，擴充抽水容量至64CMS，檢討噪音及排氣改善項目				103.09	104.08		3.42	9.18	V		
建築物耐震能力補強暨耐久性損壞修復				103.10	104.05		55.00	80.00	V		
迪化大龍等抽水站站房改善外牆立面、周邊環境及甲方指定處所內環境改善				103.10	104.05		98.25	98.25		V	
玉成抽水站2號機抽水機組維修工程				104.01	104.04		77.55	77.55		V	
抽水站沉水泵浦拆卸安裝檢修				103.12	104.12		0.35	0.35		V	
辦理全市公私有沉砂池清疏及維護作業				104.02	104.12		16.85	16.85		V	
在全市河川區域增設14處CCTV監控設備及7處河川水位				104.03	104.08		0.01	0.01		V	
第一分區監控用電視牆更新等工程				104.03	104.09		0.10	0.10		V	
迪化抽水站內新建第四分區管理中心及改善周邊環境				104.03	104.12		0.90	0.30			V

Source：Hydraulic Engineering Office

表10 雨水下水道新建、改善工程

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)
		總　計	…
新建工程處 New Construction Office		新工處主辦工程計	…
	100	1. 北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)	①…
	102	2. 北投復興三路201巷道路局部拓寬工程	①…
	103	3. 林森南路3巷道路新築工程	①…
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		水利處主辦工程計	12,480
	103	4. (103)雨水下水道結構修補工程(南建國集水分區)	2,866
	103	5. (103)雨水下水道人孔調升降緊急搶修工程	535
	103	6. 103年全市雨水下水道預約維護工程	915
	103	7. 大同區赤峰街49至71巷與承德路2段及南京西路25巷周邊排水改善後續工程	2,111
	103	8. 士林區通河西街2段排水改善工程	6,053

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於人行道、橋梁、道路及公有建築物工程內。

Table 10　New and Improvement Constructions of Rainwater Drainage System

March 2015

工程內容　Construction Content			工期　While Constructing			施工進度　Progress				
側溝 Side Ditch (公尺) (m)	箱涵 Box Culvert (公尺) (m)	管涵 Pipe Culvert (公尺) (m)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
7,619	719	1,609	--	--	--	--	--	1	3	3
7,301	712	1,609	--	--	--	--	--	-	1	1
7,098	712.4	1,608.5	101.02	104.04		94.33	84.78			∨
10	-	-	104.03	105.01		0.01	0.01		∨	
193	-	-	103.12	104.03	停工	100.00	2.91			
318	6	-	--	--	--	--	--	1	2	2
結構修補工程			103.04	104.05		89.00	89.00		∨	
人孔調升降工程			103.05	104.03		100.00	95.00			∨
預約維護			103.11	104.03		100.00	70.00			∨
新設中央分隔島操作平台，新設控制箱2組			104.03	104.04		75.00	75.00		∨	
318	6		104.03	104.07		7.00	9.00	∨		

Source：New Construction Office, Hydraulic Engineering Office

Note：①The Construction Expense is included in the sidewalk, bridge, road and public building project expenditure.

表11　公園綠地新建、改善工程

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	施工預算 Budget (萬元) (NT$ 10,000)	總面積 Total Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Side-walk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (No.)	涼亭 Arbor (座) (No.)	花架 Flower Shelf (處) (No.)	欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
		總　計	35,510	…	6,533	1,974	28,751	185	12	3	-
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office		公園處主辦工程計	30,851	…	6,533	1,974	28,751	185	12	3	-
	101	1. 文山(景美)21號二十一興泰公園擴建工程(101-275)	2,988	31,440	-	-	-	-	-	-	-
	103	2. 北投242號綠地新建工程(103-131)	1,471	9,384	-	81	625	9	-	-	-
	103	3. 北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)-公5公園、綠3、綠4綠地新建工程(103-174)	6,283	14,239	2,172	-	1,569	33	1	-	-
	103	4. 北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)-公2公園新建工程(103-119)	1,093	4,006	1,084	-	293	5	-	1	-
	101	5. 文山(景美)21號二十-興泰公園擴建工程地上物拆除案(101-274)	889	…	-	-	-	-	-	-	-
	103	6. 胡適公園更新工程(103-125)	3,450	…	-	-	2,650	43	2	2	-
	103	7. 103年圓山公園管理所所轄公園整建工程一內湖區公園整建工程(103-159)	884	…	-	280	356	5	3	-	-
	103	8. 103年度本市公園周邊人行道整修工程(103-146)	3,255	…	-	-	13,423	-	-	-	-
	103	9. 石牌公園更新工程一二期工程(103-151)	2,081	…	1,460	553	1,560	35	-	-	-
	103	10. 美崙公園更新工程(103-167)	4,182	…	50	941	3,950	25	1	-	-
	104	11. 104本市公園、廣場園路整平改善工程一雙溪公園等園路改善工程(103-202)	346	…	-	-	755	-	-	-	-
	104	12. 103年圓山公園管理所所轄公園整建工程一碧湖、石潭等公園整建工程(103-200)	178	…	18	-	-	-	-	-	-

Table 11 Park Improvement and New Constructions

March 2015

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 While Constructing			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (Lot)	園燈 Park Light (座) (Set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (Set)	體健設施 Physically healthy facility (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (Lot)	殘障坡道 Disability Ramp (座) (Set)	鋪植草皮 turfing (平方公尺) (m²)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (No.)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定進度 Scheduled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
2,313	-	480	6	18	7	9	42,563	119,884	--	--	--	--	--	4	11	9
2,313	-	480	6	18	7	9	42,563	119,884	--	--	--	--	--	3	7	8
336	-	-	-	-	-	-	26,271	23,874	102.08	104.07		69.03	65.67			∨
436	-	19	-	2	-	-	659	5,662	103.08	104.04		80.07	78.76			∨
113	-	60	-	-	-	-	8,947	44,603	103.10	104.06		24.76	12.42			∨
189	-	17	-	-	-	-	1,615	15,152	103.12	104.04		12.00	4.60			∨
-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.08	104.07		61.95	71.95	∨		
783	-	146	-	-	1	1	1,524	9,727	103.07	104.04		95.02	91.26			∨
101	-	-	2	11	1	-	-	-	103.08	103.12		100.00	95.34			∨
-	-	-	-	-	-	-	896	-	103.08	104.03		100.00	99.20			∨
356	-	29	-	-	1	-	2,441	15,896	103.09	104.03	104.03	100.00	100.00		∨	
319	-	209	-	-	1	-	-	4,970	103.10	104.10		9.00	10.00	∨		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.01	104.04		52.00	52.00		∨	
4	-	-	-	-	3	-	-	-	104.01	104.03	104.03	100.00	100.00		∨	

表11 公園綠地新建、改善工程（續）

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	施工預算 Budget (萬元) (NT$ 10,000)	總面積 Total Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Side-walk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (No.)	涼亭 Arbor (座) (No.)	花架 Flower Shelf (處) (No.)	欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office	103	13. 復興公園設置廣場及綠美化工程(103-188)	670	…	235	-	-	-	1	-	-
	104	14. 104本市公園、廣場園路整平改善工程一後山埤140高地公園等園路改善工程(103-209)	640	…	-	-	-	-	-	-	-
	104	15. 104本市公園、廣場園路整平改善工程一港富廣場等園路改善工程(103-226)	258	…	389	119	447	20	1	-	-
	104	16. 104本市公園、廣場園路整平改善工程一成功公園等園路改善工程(104-064)	671	…	-	-	-	-	-	-	-
	104	17. 104本市公園、廣場園路整平改善工程一介壽公園等園路改善工程(103-201)	442	…	839	-	2,500	-	-	-	-
	104	18. 104本市公園、廣場園路整平改善工程一桃源公園等園路改善工程(104-063)	1,069	…	287	-	622	10	3	-	-
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		**水利處主辦工程計**	4,658	…	-	-	-	-	-	-	-
	103	19. 103年度北區河濱公園綠化預約維護工程	347	…	-	-	-	-	-	-	-
	103	20. 103年度東區河濱公園綠化預約維護工程	347	…	-	-	-	-	-	-	-
	103	21. 延平河濱公園重陽橋周邊景觀整建後續工程	1,078	…	-	-	-	-	-	-	-
	104	22. 104年度東區河濱公園土木預約維護工程	1,251	…	-	-	-	-	-	-	-
	104	23. 福和河濱公園人行步道等相關設施改善工程	1,540	…	-	-	-	-	-	-	-
	104	24. 104年度全市河濱公園褐根病防治及其他病蟲害防治工程	96	…	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

Table 11 Park Improvement and New Constructions (Cont.)

March 2015

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 While Constructing			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (Lot)	園燈 Park Light (座) (Set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (Set)	體健設施 Physically healthy facility (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (Lot)	殘障坡道 Disability Ramp (座) (Set)	鋪植草皮 turfing (平方公尺) (㎡)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (No.)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定進度 Scheduled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.01	104.04		65.00	65.00		v	
55	-	-	-	-	-	-	-	-	104.01	104.05		15.83	15.83		v	
-	-	-	4	5	-	8	-	-	104.02	104.04		45.66	46.40	v		
14	-	-	-	-	-	-	-	-	104.03	104.06		0.63	0.63		v	
-	-	-	-	-	-	-	210	-	104.03	104.07		8.59	7.40			v
135	-	-	-	-	-	-	-	-	104.03	104.08		0.00	0.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--	1	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.06	104.03		100.00	97.00			v
-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.06	104.03	104.03	100.00	100.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.12	104.04	104.03	99.99	100.00	v		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.02	104.12		8.00	8.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.03	104.06		2.50	2.50		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.03	104.12		1.00	1.00		v	

Source：Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office

表12 污水下水道新建、改善工程

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		總　計	331,907
	101-104	1. 第3期大同及中山區分管網工程(103年預約工程)	3,425
	100-104	2. 第3期大安及文山區分管網工程(101年預約工程)	3,248
	100-104	3. 第3期大安及文山區分管網工程(貓纜貓空站污水處理專用管工程)	4,480
	100-104	4. 第3期大安及文山區分管網工程(102年預約工程)	2,880
	100-104	5. 第3期大安及文山區分管網工程(103年預約工程)	3,982
	100-104	6. 第3期北投及士林區分管網工程(101年預約工程)	3,233
	100-104	7. 第3期北投及士林區分管網工程(102年預約工程)	3,042
	100-104	8. 第3期松山及信義區分管網工程(101年預約工程)	3,400
	100-104	9. 第3期松山及信義區分管網工程(102年預約工程)	2,830
	100-104	10. 第3期南港及內湖區分管網工程(101年明湖國小附近地區)	9,880
	100-104	11. 第3期南港及內湖區分管網工程(101年東湖國中附近地區)	10,420
	100-104	12. 第3期南港及內湖區分管網工程(102年預約工程)	4,137
	101-104	13. 第3期萬華及中正區分管網工程(101年預約工程)	3,517
	101-104	14. 第3期萬華及中正區分管網工程(103年預約工程)	4,500
	101-103	15. 北投行義路大自然社區附近區域分管網工程(大自然社區附近區域)	6,172
	101-105	16. 格致路及東山路附近地區分管網工程(東山路附近地區)	17,900
	104-105	17. 第4期大安及文山區分管網工程(104年預約工程)	3,514
	104-105	18. 第4期北投及士林區分管網工程(104年預約工程)	4,366
	104-105	19. 第4期松山及信義區分管網工程(104年預約工程)	2,653
	104-105	20. 第4期南港及內湖區分管網工程(104年預約工程)	4,044
	104-105	21. 第4期萬華及中正區分管網工程 (104年預約工程)	2,039
	98-102	22. 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(99年度行義路附近)	5,936
	98-102	23. 第2期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(100年度清江國小附近地區)	5,330
	101-104	24. 第3期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)	4,401

Table 12 Sewerage System Improvement and New Constructions

March 2015

工程內容 Construction Content							工期 While Constructing			施工進度 Progress				
主幹管 Trunk (m)	次幹管 Sub-Trunk (m)	分支管 Branch Pipeline (m)	抽揚水站 Pumping Station (座) No.	人孔 Manhole (座) No.	清除孔 Cleanout (座) No.	截流設施 Interception Facilities (個) No.	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Sche-duled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
84,128	-	76,627	2	1,276	-	-	--	--	--	--	--	20	45	3
-	-	154	-		-	-	103.04	104.12		16.00	16.00		∨	
-	-		-		-	-	102.12	104.04		98.00	98.00		∨	
-	-	4,275	-	62	-	-	102.09	104.07		71.50	71.60	∨		
-	-		-		-	-	102.07	104.04		98.00	98.00		∨	
-	-	552	-	40	-	-	103.04	104.12		34.00	34.00		∨	
-	-		-		-	-	101.07	104.04		99.68	99.68		∨	
-	-	248	-	29	-	-	102.06	104.09		30.12	30.12		∨	
-	-		-		-	-	100.06	104.03	104.03	100.00	100.00		∨	
-	-		-		-	-	102.06	104.06		13.88	13.88		∨	
-	-	3,601	-	103	-	-	101.08	104.09		52.00	50.00			∨
-	-	3,202	-	99	-	-	101.08	104.03	104.03	100.00	100.00		∨	
-	-		-		-	-	102.06	104.06		66.06	66.06		∨	
-	-	1,010	-	41	-	-	101.06	104.06		77.17	77.17		∨	
-	-	154	-		-	-	103.05	104.12		0.15	0.15		∨	
-	-	2,033	-	68	-	-	101.09	105.01		38.10	38.72	∨		
-	-		-		-	-	102.01	104.12		68.10	69.18	∨		
-	-		-		-	-	104.02	105.12		0.20	0.20		∨	
-	-		-		-	-	104.02	105.12		0.20	0.20		∨	
-	-		-		-	-	104.02	105.12		0.20	0.20		∨	
-	-		-		-	-	104.02	105.12		1.00	1.00		∨	
-	-		-		-	-	104.02	105.12		0.20	0.20		∨	
-	-	5,895	-	79	-	-	99.08	104.07	104.03	99.00	100.00	∨		
-	-	5,210	-	30	-	-	100.12	104.06		74.60	74.61	∨		
-	-		-		-	-	103.05	104.12		13.70	13.70		∨	

表12　污水下水道新建、改善工程（續1）

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office	100-104	25. 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(101年考試院附近地區)	6,767
	100-104	26. 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年軍功路附近地區)	1,770
	100-104	27. 第3期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)	2,169
	101-105	28. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年北投醫院等附近地區)	8,895
	101-105	29. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年復興高中附近地區)	7,485
	101-105	30. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(101年預約工程)	2,638
	101-105	31. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年桃源國小附近地區)	6,247
	101-105	32. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年關渡國小附近地區)	5,170
	101-105	33. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)	2,282
	101-105	34. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(103年中和街及復興三路附近地區)	3,997
	101-105	35. 第3期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)	3,997
	100-104	36. 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年永吉國中附近地區)	7,070
	100-104	37. 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(102年松山火車站附近地區)	5,750
	100-104	38. 第3期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)	3,497
	100-104	39. 第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(102年預約工程)	2,545
	101-104	40. 第3期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(103年預約工程)	4,401
	104-105	41. 第4期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	2,567
	104-106	42. 第4期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	3,602
	104-106	43. 第4期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	4,437
	104	44. 第4期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	2,592
	104-106	45. 第4期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	3,173
	104	46. 第4期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(104年預約工程)	2,310

Table 12 Sewerage System Improvement and New Constructions (Cont. 1)

March 2015

工程內容 Construction Content							工期 While Constructing			施工進度 Progress				
主幹管 Trunk (m)	次幹管 Sub-Trunk (m)	分支管 Branch Pipeline (m)	抽揚水站 Pumping Station (座) No.	人孔 Manhole (座) No.	清除孔 Cleanout (座) No.	截流設施 Interception Facilities (個) No.	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Sche-duled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	6,980	-	278	-	-	101.12	104.05		93.00	93.10	V		
-	-	1,565	-	26	-	-	102.12	104.04		99.99	99.99		V	
-	-		-		-	-	102.05	104.06		95.00	95.00		V	
-	-	9,022	-	50	-	-	102.04	104.09		59.00	59.10	V		
-	-	8,980	-	85	-	-	102.04	104.05		55.80	55.87	V		
-	-		-		-	-	101.07	104.05		52.50	52.50		V	
-	-	6,723	-	70	-	-	102.10	104.06		55.50	55.60	V		
-	-	5,683	-	62	-	-	102.10	104.07		64.00	64.10	V		
-	-		-		-	-	102.06	104.06		52.05	52.05		V	
-	-	2,517	-	48	-	-	103.08	104.06		46.10	48.10	V		
-	-	2,517	-	48	-	-	103.05	104.12		15.29	15.29		V	
-	-	6,013	2	56	-	-	101.11	104.06		69.30	69.30		V	
-	-		-		-	-	102.12	105.01		25.00	27.68	V		
-	-		-		-	-	103.04	104.12		60.10	60.10		V	
-	-		-		-	-	102.06	104.06		55.00	55.00		V	
-	-		-		-	-	103.05	104.12		21.00	21.00		V	
-	-		-		-	-	104.02	105.12		0.01	0.01		V	
-	-		-		-	-	104.02	105.12		0.20	0.20		V	
-	-	-	-		-	-	104.02	105.12		0.20	0.20		V	
-	-	-	-	-	-	-	104.02	105.12		0.30	0.30		V	
-	-	-	-	-	-	-	104.02	105.12		1.00	1.00		V	
-	-	-	-	-	-	-	104.02	105.12		0.03	0.03		V	

表12　污水下水道新建、改善工程(續2完)

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office	103	47. 萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程	2,073
	104	48. 北投、士林、南港、內湖、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(104年預約工程)	2,306
	104	49. 萬華、中正、大同、中山、大安及文山區用戶接管後巷配合美化工程(104年預約工程)	2,306
	97-101	50. 基隆河流域水質改善及污水疏流工程(101年士林主幹管、越基隆河聯絡管疏流及提升成美礫間進流量)	8,500
	100-104	51. 紓流、抽水站及站體改善及增設工程(第一標)	8,600
	98-103	52. 臺北市迪化運動公園跨堤景觀平臺新建工程含代辦河濱自行車道暨相關設施整建新建工程	12,978
	103	53. 內湖污水處理廠初沉池設備更新汰換工程及生物池攪拌機設備增設工程	4,543
	103	54. 內湖污水處理廠二期工程	28,428
	100-103	55. 第2期松山及信義區管線更新工程第1標(松山區民生社區新中街以西地區)	7,004
	100-103	56. 第2期松山及信義區管線更新工程第2標(松山區民生社區新中街以東地區)	8,258
	100-103	57. 第2期萬華及中正區管線更新工程(萬華區大理高中附近地區)	2,812
	103	58. 代辦捷運民權西路站污水接管工程(103年預約工程)	69
	104	59. 104年代辦本府教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程(預約工程)	2,346
	104	60. 104年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)	3,351
	104	61. 104年度萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約)	3,351
	104	62. 104年度設施及框蓋維護工程(預約式契約)	4,199
	104	63. 104年度管線清理檢視工程(預約式契約)	3,998
	104	64. 104年度場站維護工程	1,479
	103	65. 迪化污水處理廠排氣井功能提升及美化工程	241
	100	66. 臺北近郊系統與六堵系統間之污水紓流工程	5,758
	102-103	67. 迪化抽水站設備更新汰換工程第2期	5,772
	103	68. 龍形隧道全線檢視及緊急修繕工程	846

資料來源：衛生下水道工程處。

Table 12 Sewerage System Improvement and New Constructions (Cont.2 End)

March 2015

工程內容 Construction Content							工期 While Constructing			施工進度 Progress				
主幹管 Trunk (m)	次幹管 Sub-Trunk (m)	分支管 Branch Pipeline (m)	抽揚水站 Pumping Station (座) No.	人孔 Manhole (座) No.	清除孔 Cleanout (座) No.	截流設施 Interception Facilities (個) No.	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Sche-duled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	-	-	-	-	-	103.04	104.04		76.32	76.32		∨	
							104.02	104.12		0.02	0.02		∨	
							104.02	104.12		0.03	0.03		∨	
-	-	293	-	2	-	-	102.01	104.05		78.00	78.20	∨		
-	-	-	-	-	-	-	103.02	104.04		83.70	82.75			∨
-	-	-	-	-	-	-	102.02	103.08		100.00	99.99			∨
-	-	-	-	-	-	-	103.10	104.10		15.32	15.56	∨		
-	-	-	-	-	-	-	103.11	105.06		2.50	2.54	∨		
-	-	-	-	-	-	-	102.03	104.05		65.10	65.21	∨		
-	-	-	-	-	-	-	102.03	104.11		24.50	24.96	∨		
-	-	-	-	-	-	-	102.04	104.04		55.00	55.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	103.05	104.12		9.30	9.30		∨	
							104.03	104.07		0.01	0.01		∨	
-	-	-	-	-	-	-	104.02	104.12		6.00	6.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	104.01	104.12		9.00	9.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	104.02	104.12		12.99	12.99		∨	
							104.02	104.12		5.57	5.57		∨	
-	-	-	-	-	-	-	104.02	104.10		0.00	0.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	103.12	104.04		75.50	76.50	∨		
-	-	-	-	-	-	-	100.10	104.04		99.44	99.44		∨	
-	-	-	-	-	-	-	103.07	104.04		71.47	93.40	∨		
-	-	-	-	-	-	-	103.07	104.05		48.00	99.64	∨		

Source：Sewerage Systems Office

表13　治山防災整體治理工程

104年3月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) (NT$10,000)	工程內容 防砂壩 Against Granulated Substance Dam (座) (Set)	潛壩 Sub-merged Dam (座) (Set)	丁壩 Spur Dam (座) (Set)	堤防 Embank-ment (公尺) (m)
大地工程處 Geotechnical Engineering Office		總 計	7,144	-	-	-	-
	103	1. 103年度「土石流災害緊急處理工程」(單價發包)(文山士林內湖南港區)	2,179	-	-	-	-
	103	2. 103年度「山坡地災害緊急處理工程」(北投中山內湖信義文山區)	1,768	整形塊石擋土牆72m、土釘561支、落石防護網1,125平方公尺			
	103	2. 103年度「臺北市山區道路緊急處理工程(臺北市全區)」	1,714	山區道路改善93公里、維護10公里，砌整型塊石駁坎，造型護欄、溝蓋更新，既有水池改善，混凝土護坡			
	103	4. 103年度「登山步道緊急處理工程(單價發包)」	1,484	信義區虎山峰步道改善，內湖東湖路113巷117號對面新設階梯，內湖安泰街164巷龍虎亭毀損修繕，文山區樟樹步道轉轉穀倉傾斜，橫嶺古道路口卵石鋪面改善，市容查報			

資料來源：大地工程處。

Table 13 Watershed Management and Disaster Prevention

March 2015

Construction Content							工期 While Constructing			施工進度 Progress				
整流 Rectification (公尺) (m)	固床工 Groundsill Works (座) (Set)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	魚道 Fish Way (座) (Set)	蝕溝控制 Gully Control (公尺) (m)	崩塌地處理 Protection for collapse (公頃) (hectare)	植生綠美化 Greening Beautification (平方公尺) (m²)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	13	488	-	58	-	430	--	--	--	--	--	3	-	1
-	13	488	-	-	-	80	103.10	104.04		51.50	53.85	∨		
-	-	-	-	58	-	350	103.09	104.04		48.00	59.97	∨		
-	-	-	-	-	-	-	103.12	104.04		56.92	71.77	∨		
-	-	-	-	-	-	-	103.12	104.04		52.74	47.82			∨

Source：Geotechnical Engineering Office

表14　污水下水道用戶接管概況

年（月）別 Year (Month)		當月接管戶數 Number of Connected Household in Each Month			
		總計 Grend Total	公共污水下水道 Public Sanitary Sewers	專用污水下水道 Specific Sanitary Sewers	建築物污水處理設施設置戶數 Households of Building Sewage Processing Facilities
民國 89 年底	End of 2000	36 246	…	…	…
民國 90 年底	End of 2001	33 367	28 065	1 617	3 685
民國 91 年底	End of 2002	41 852	37 885	1 478	2 489
民國 92 年底	End of 2003	34 718	31 928	1 684	1 106
民國 93 年底	End of 2004	39 930	37 991	1 081	858
民國 94 年底	End of 2005	47 585	44 936	1 251	1 398
民國 95 年底	End of 2006	29 132	25 798	1 224	2 110
民國 96 年底	End of 2007	34 430	32 513	-960	2 877
民國 97 年底	End of 2008	42 775	40 010	1 172	1 593
民國 98 年底	End of 2009	34 635	33 300	216	1 119
民國 99 年底	End of 2010	41 663	40 902	163	598
民國 100 年底	End of 2011	31 993	31 237	3	753
民國 101 年底	End of 2012	31 442	30 822	1	619
民國 102 年底	End of 2013	24 543	24 145	2	396
民國 103 年底	End of 2014	21 825	21 638	-	187
3月底	End of Mar.	796	795	-	1
4月底	End of Apr.	1 505	1 467	-	38
5月底	End of May	1 261	1 223	-	38
6月底	End of June	996	975	-	21
7月底	End of July	1 840	1 826	-	14
8月底	End of Aug.	2 871	2 865	-	6
9月底	End of Sep.	2 002	2 000	-	2
10月底	End of Oct.	3 196	3 191	-	5
11月底	End of Nov.	1 945	1 943	-	2
12月底	End of Dec.	3 838	3 800	-	38
民國104年	2015				
1月底	End of Jan.	1 061	1 049	-	12
2月底	End of Feb.	1 008	1 007	-	1
3月底	End of Mar.	1 167	1 110	-	57

資料來源：衛生下水道工程處。

說明：(1)全市計畫接管總服務戶數665,000戶，係依據84年1月底全市人口數為基準每戶以4人計得。

(2)計畫用戶接管普及率 f=(b+c)/665,000×100；門牌數接管普及率 g=(b+c)/d×100。

(3)96年清查資料，其中專用污水下水道重複計列2,371戶，於96年接管戶數中扣除，致該年專用下水道用戶當年接管戶數為負值。

(4)自99年1月起各項普及率超過100%者，以100%表示。

Table 14 Overview of Household Sewerage System Connections

截至當月底累計接管戶數 Accumulated Number of Connection Household				門牌數	計畫用戶接管普及率	門牌數接管普及率
總計 Grend Total a	公共污水下水道 Public Sanitary Sewers b	專用污水下水道 Special Sanitary Sewers c	建築物污水處理設施設置戶數 Households of Building Sewage Processing Facilities	No. of Plates (戶) (No.) d	Planned Sewer Connection Rate (%) f	Household Sewer Connection Rate (%) g
337 526	...	...	...	...	...	...
370 893	345 943	21 391	3 559	943 876	55.24	38.92
412 745	383 828	22 869	6 048	943 876	61.16	43.09
447 463	415 756	24 553	7 154	981 847	66.21	44.84
487 393	453 747	25 634	8 012	988 693	72.09	48.49
534 978	498 683	26 885	9 410	987 274	79.03	53.16
564 110	524 481	28 109	11 520	987 274	83.10	55.97
598 540	556 994	27 149	14 397	1 033 315	87.84	56.53
641 315	597 004	28 321	15 990	1 035 299	94.03	60.40
675 950	630 304	28 537	17 109	1 062 320	99.07	62.02
717 613	671 206	28 700	17 707	1 068 561	100.00	65.50
749 606	702 443	28 703	18 460	1 076 178	100.00	67.94
781 048	733 265	28 704	19 079	1 082 773	100.00	70.37
805 591	757 410	28 706	19 475	1087 747	100.00	72.27
827 416	779 048	28 706	19 662	1 094 032	100.00	73.83
807 962	759 758	28 706	19 498	1 088 635	100.00	72.43
809 467	761 225	28 706	19 536	1 089 513	100.00	72.50
810 728	762 448	28 706	19 574	1 089 674	100.00	72.60
811 724	763 423	28 706	19 595	1 090 428	100.00	72.64
813 564	765 249	28 706	19 609	1 090 814	100.00	72.79
816 435	768 114	28 706	19 615	1 091 685	100.00	72.99
818 437	770 114	28 706	19 617	1 092 165	100.00	73.14
821 633	773 305	28 706	19 622	1 093 056	100.00	73.37
823 578	775 248	28 706	19 624	1 093 384	100.00	73.53
827 416	779 048	28 706	19 662	1 094 032	100.00	73.83
828 477	780 097	28 706	19 674	1 094 778	100.00	73.88
829 485	781 104	28 706	19 675	1 094 929	100.00	73.96
830 652	782 214	28 706	19 732	1 095 187	100.00	74.04

Source：Sewerage Systems Office

Explanation：1.The total population to be served by city authority was 665,000 household, which was based on the figures in January 1995 and 4 members for each household.

2.Planned Sewer Connection Rate f =(b+c)/d×100 ；Household Sewer Connection Rate g=(b+c)/d×100 ；

3.During 2007 material checking, 2,371 households of Special Sanitary Sewer were found to be repeated calculation. The number was deducted from 2007 connected households, as a result the number of connected households was below zero.

4.From 2010 onward, the connection rates exceeding 100% were showed 100%.

表15　公園綠地①

面積單位：平方公尺

年底及區別		公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、河濱公園座數、面積					
		總計 Grand Total		公　園 Parks		綠　地 Green Fields	
		座數 No.	面積 Area	座數 No.	面積 Area	座數 No.	面積 Area
民　國　85　年　底	End of 1996	798	11 023 705	426	9 794 207	354	1 091 101
民　國　86　年　底	End of 1997	832	11 084 831	434	9 823 519	379	1 119 477
民　國　87　年　底	End of 1998②	660	11 375 178	452	6 398 546	156	497 422
民　國　88　年　底	End of 1999	683	11 765 710	463	6 628 170	168	653 065
民　國　89　年　底	End of 2000	702	12 201 274	470	6 746 291	174	690 698
民　國　90　年　底	End of 2001	726	12 643 384	484	7 144 069	184	729 714
民　國　91　年　底	End of 2002	745	12 723 060	496	7 210 701	188	733 779
民　國　92　年　底	End of 2003	757	12 773 055	504	7 237 804	191	743 565
民　國　93　年　底	End of 2004	765	12 983 800	512	7 362 764	188	712 630
民　國　94　年　底	End of 2005	773	13 098 871	518	7 421 787	190	711 236
民　國　95　年　底	End of 2006	784	13 246 975	524	7 522 538	192	712 296
民　國　96　年　底	End of 2007	794	13 441 988	531	7 682 047	192	712 796
民　國　97　年　底	End of 2008	804	13 525 134	536	7 773 009	195	690 415
民　國　98　年　底	End of 2009	813	13 508 871	542	7 772 495	198	673 026
民　國　99　年　底	End of 2010	821	13 529 929	547	7 782 650	200	683 749
民　國　100　年　底	End of 2011	833	13 643 094	551	7 898 079	206	676 185
民　國　101　年　底	End of 2012	838	13 667 760	556	7 932 743	206	668 463
民　國　102　年　底	End of 2013	843	13 687 731	564	7 955 002	203	666 175
民　國　103　年　底	End of 2014	851	13 748 610	569	8 000 077	205	680 430
民國104年3月底	**End of Mar. 2015**	855	13 761 998	572	8 027 902	205	665 123
松山區	SongShan	49	1 058 117	43	180 282	2	4 336
信義區	XinYi	83	558 207	54	423 898	20	45 698
大安區	DaAn	66	595 012	59	586 112	7	8 900
中山區	ZhongShan	98	1 737 702	70	805 688	23	32 235
中正區	ZhongZheng	29	867 952	19	567 224	2	20 720
大同區	DaTong	31	234 223	19	125 346	4	4 681
萬華區	WanHua	37	1 393 410	27	298 325	2	1 734
文山區	WenShan	94	2 596 939	73	2 061 198	17	22 888
南港區	NanGang	55	583 432	29	402 153	16	77 411
內湖區	NeiHu	96	1 309 473	78	767 550	11	58 732
士林區	ShiLin	96	1 425 806	42	751 456	44	139 083
北投區	BeiTou	121	1 401 725	59	1 058 670	57	248 705

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

附　　註：①係為本局已開闢之公園綠地，不含本府其他局處所開闢之公園綠地。

②87年本局公園處依都市計畫規劃屬性重新整理詮釋都市計畫及非都市計畫公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、河濱公園資料，故自87年度起資料無法與以前年度銜接。

Table 15 Parks and Green Fields

Unit：m^2

Parks、Green Fields、Sport Spots for Children、Plaza＆Riverside Parks						平均每一市民享有公園綠地面積 Per Capita Area of Parks and Green Fields (平方公尺/人) (m^2/person)
兒童遊樂場 Sport Spots for Children		廣場 Plaza		河濱公園 Riverside Parks		
座數 No.	面積 Area	座數 No.	面積 Area	座數 No.	面積 Area	
…	…	18	138 397	…	…	4.23
…	…	19	141 835	…	…	4.27
11	15 552	19	128 708	22	4 334 950	4.31
11	15 552	19	128 501	22	4 340 422	4.45
11	15 552	23	141 777	24	4 606 956	4.61
11	15 874	23	146 771	24	4 606 956	4.80
11	15 874	26	155 750	24	4 606 956	4.82
11	15 874	26	157 156	25	4 618 656	4.86
11	15 874	29	174 980	25	4 717 552	4.95
11	16 030	29	152 429	25	4 797 389	5.01
11	16 030	29	152 382	28	4 843 729	5.03
11	16 030	32	173 641	28	4 857 474	5.11
11	16 030	34	188 206	28	4 857 474	5.16
10	15 080	35	190 796	28	4 857 474	5.18
10	15 080	36	190 976	28	4 857 474	5.17
10	15 080	38	196 276	28	4 857 474	5.15
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	5.11
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	5.09
10	15 080	39	195 549	28	4 857 474	5.09
10	15 080	40	196 419	28	4 857 474	5.09
1	468	1	870	2	872 161	5.02
-	-	9	88 611	-	-	2.43
-	-	-	-	-	-	1.89
-	-	2	4 246	3	895 533	7.53
-	-	7	46 502	1	233 506	5.31
-	-	7	9 846	1	94 350	1.79
1	1 000	2	14 671	5	1 077 680	7.16
-	-	-	-	4	512 853	9.46
6	11 927	2	3 941	2	88 000	4.80
-	-	4	5 489	3	477 702	4.57
1	908	4	10 570	5	523 789	4.90
1	777	2	11 673	2	81 900	5.44

Source： Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office

Note：②Data were compiled by the Parks and Lights Office, Public Works Department in accordance with the attributes of various urban development plans.The data covered all parks,green fields,sport spots for children,plaza and riverside parks under the urban development plans, etc.

表16　現有路燈盞數
Table 16　Number of Street Lamps

單位：盞　　　　Unit：Set

年(月)底別 End of Year(Month)		總計 Grend Total	水銀燈 Mercury Vapour Light	鈉光燈 Sodium Light	日光燈 Fluorescent Light	LED燈 LED Light	其他 Others
民國 89 年底	End of 2000	114 213	84 114	24 347	5 740	-	12
民國 90 年底	End of 2001	117 559	85 327	26 369	5 851	-	12
民國 91 年底	End of 2002	124 493	84 458	32 435	7 598	-	2
民國 92 年底	End of 2003	131 044	73 680	48 415	8 865	-	84
民國 93 年底	End of 2004	134 828	75 006	50 075	9 204	55	488
民國 94 年底	End of 2005	135 823	75 273	50 816	9 188	58	488
民國 95 年底	End of 2006	140 320	76 095	54 320	9 469	58	378
民國 96 年底	End of 2007	143 345	76 470	55 929	10 102	724	120
民國 97 年底	End of 2008	144 145	79 085	53 394	8 212	1 250	2 204
民國 98 年底	End of 2009	145 508	79 758	54 123	8 230	1 285	2 112
民國 99 年底	End of 2010	146 791	80 198	54 966	8 230	1 285	2 112
民國 100 年底	End of 2011	148 213	80 931	55 716	8 169	1 285	2 112
民國 101 年底	End of 2012	149 535	76 803	56 049	8 066	1 897	6 720
民國 102 年底	End of 2013	151 248	38 647	61 997	7 196	41 452	1 956
民國 103 年底	End of 2014	154 305	11 328	61 859	7 899	70 400	2 819
3月底	End of Mar.	152 044	33 527	63 149	7 424	45 952	1 992
4月底	End of Apr.	152 044	33 527	63 149	7 424	45 952	1 992
5月底	End of May	152 044	33 527	63 149	7 424	45 952	1 992
6月底	End of June	152 044	33 527	63 149	7 424	45 952	1 992
7月底	End of July	152 044	33 527	63 149	7 424	45 952	1 992
8月底	End of Aug.	152 720	33 592	63 142	7 884	45 952	2 150
9月底	End of Sep.	152 720	33 592	63 142	7 884	45 952	2 150
10月底	End of Oct.	153 500	33 592	63 142	7 884	46 732	2 150
11月底	End of Nov.	154 305	33 592	63 515	7 884	47 164	2 150
12月底	End of Dec.	154 305	11 328	61 859	7 899	70 400	2 819
民國103年	2014						
1月底	End of Jan.	154 305	11 328	61 859	7 899	70 400	2 819
2月底	End of Feb.	154 305	11 328	61 859	7 899	70 400	2 819
3月底	End of Mar.	154 305	11 328	61 859	7 899	70 400	2 819
104年3月底較103年3月底增減% Annual Change Rate(%)		1.49	- 66.21	- 2.04	6.40	53.20	41.52

資料來源：公園路燈工程管理處。

說明：1.本表以台灣電力公司供電之盞數計列。

2.本表數字包含其他單位裝設後移交公園處維護之數字。

3.97年起路燈種類重新歸類計算，無法銜接。

Explanation：1.This table is calculated based on lamps powered by Taiwan Power Company.

2.The figures in this table include the number of facilities built by other units and then transferred to the Parks and Street Lights Office for maintenance.

3.The figures have been reclassified since 2008.Therefore, we cannot compare them with previous years.

表17　登山步道

104年3月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
總計		130 條	--	100 930
信義區小計		22 條	--	12 140
(XY-401)	虎山溪步道	慈惠堂→真光禪寺→復興園	水泥鵝卵石木棧道花崗石	950
(XY-402)	虎山山腰步道	復興園→山神廟叉路	花崗石	527
(XY-403)	虎山自然步道	慈惠堂→山神廟→南港山稜線叉路口	花崗石	1 100
(XY-404)	虎山復興園步道	復興園→瑤池宮	水泥植草磚	580
(XY-405)	美的世界社區步道	瑤池宮→松山路673號美的世界社區	花崗石枕木碎石	500
(XY-406)	虎山120高地步道	福德街221巷→虎山120高地	花崗石	238
(XY-407)	虎山峰下方步道	福德街221巷→虎山峰下涼亭	花崗石	157
(XY-408)	虎山峰前方步道	福德街221巷→虎山峰前涼亭	花崗石	220
(XY-409)	虎山奉天宮步道	奉天宮→松山路679-1號	花崗石砂岩塊石	890
(XY-410)	虎山吉福宮步道	福德街51巷→虎山120高地	花崗石枕木碎石	509
(XY-411)	象山北星寶宮步道	靈雲宮→山頂→北星寶宮叉路	花崗石	824
(XY-412)	天寶聖道宮步道	北星寶宮→天寶聖道宮	水泥	408
(XY-413)	北台慈惠堂步道	北台慈惠堂→南港山親山步道三叉路	砂岩塊石	150
(XY-414)	永春崗顏子廟步道	永春崗公園→顏子廟	花崗石	220
(XY-415)	象山永春崗步道(含入口意象範圍)	松山路650巷超市旁→象山頂前南港山叉路口	花崗石	850
(XY-416)	象山一線天步道	象山990m巨石叉路→一線天→75m叉路口	花崗石	822
(XY-417)	市立療養院步道(含入口意象範圍)	療養院→稜線(象山親山460m)	花崗石	233
(XY-418)	石泉巖步道	石泉巖→中正巖	水泥	289
(XY-419)	糶米古道	吳興街600巷→極樂公墓	大理石磚	446
(XY-420)	吉福宮叉路步道	吉福宮上方右叉路→涼亭右轉下福德街51巷	水泥	322
(XY-421)	姆指山步道	姆指山登山口→北星寶宮	花崗石砂岩塊石	1 355
(XY-422)	虎山生態步道	虎山400m涼亭→王家土雞城叉路口	花崗石木棧道	550
中山區小計		2 條	--	2 274
(CS-701)	復興電台線步道	中山北路5段282巷→劍潭山稜線	花崗石土徑枕木碎石水泥混凝土	700
(CS-702)	劍潭山稜線步道	劍潭山打印台經老地方→通北街叉路口→軍營門口	固化土	1 574
文山區小計		20 條	--	14 429
(WS-601)	試院支線步道	考試院上方涼亭→仙跡岩足跡步道叉路(含木柵路1段23號旁入口路段)	花崗石水泥	452

Table 17 Hiking Trails (Cont. 1)

End of March 2015

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(WS-602)	景興國小支線步道	親山步道915m景興國小叉路口→景興國小	花崗石磚	368
(WS-603)	溝子口支線步道	親山步道1300m海巡署叉路口→(往光輝路口)樓梯盡頭	花崗石	568
(WS-604)	麥田支線步道	麥田山莊→仙跡岩稜線(含福德宮304巷支線)	花崗石	413
(WS-605)	指南慈惠堂步道	指南路三段→指南慈惠堂再接商店街至獅子亭前方涼亭	水泥混凝土	750
(WS-606)	大成殿步道	指南路三段→大成殿步道口	水泥枕木	605
(WS-607)	茶展中心步道	茶業推廣中心停車場→指南路三段	水泥混凝土	760
(WS-608)	猴山岳步道	指南宮後山猴山岳步道口→新光路	水泥混凝土木棧道	602
(WS-609)	健康步道	茶業推廣中心步道口→私人工寮旁	安山石木棧道	414
(WS-610)	救千宮步道	樟山寺→混元宮前高速公路涵洞下步道口	水泥混凝土	1 029
(WS-611)	指南國小步道	指南國小→樟山寺前叉路口	水泥混凝土花崗石	686
(WS-612)	飛龍步道	環山二道→樟山寺	砂岩塊石	960
(WS-613)	三玄宮步道	指南國小→三玄宮	水泥混凝土砂岩塊石花崗石磚	1 320
(WS-614)	樟湖步道	指南路3段38巷涵鈺軒→指南路3段34巷瓦厝	花崗石碎石	2 500
(WS-615)	待老坑步道	樟湖步道待老坑叉路→待老坑山至老泉街26巷優人神鼓	枕木枕木碎石	522
(WS-616)	樟樹步道(含談茶支線160m)	三墩石步道口→大觀園後方停車場	花崗石枕木碎石	1 100
(WS-617)	貓空越嶺步道(含入口意象範圍)	貓空纜車站對面步道口→稜線上十字路口	花崗石	800
(WS-618)	楓林步道(含涼亭範圍)	樟樹步道楓林支線叉路口→指南路談天園對面步道口	水泥混凝土	160
(WS-619)	老樟樹步道	樟樹步道老樟樹叉路口→指南路口	花崗石	70
(WS-620)	石獅腳步道(含入口意象範圍)	高振盛茶農步道道口→樟樹步道德隆茶行叉路口	花崗石木棧道	350
南港區小計		**11 條**	--	10 565
(NG-501)	南港山(一)中華技術學院	中華技術學院→南港山鞍部→分界點	花崗石砂岩塊石	1 970
(NG-502)	南港山(二)北興宮(含入口意象範圍)	南港山鞍部→北興宮	花崗石	685
(NG-503)	南港山(三)麗山橋口(含入口意象範圍)	研究院路四段50巷→南港山鞍部	花崗石土徑	1 175

表17　登山步道(續2)

104年3月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(NG-504)	九五峰	南港山鞍部→姆指山山頂陵線	花崗石	2 165
(NG-505)	更寮步道	舊莊街二段122巷→土庫岳→大豐產業道路	花崗石砂岩塊石	2 450
(NG-506)	栳寮步道(含入口意象範圍)	舊莊街二段232巷→魏靜時故居	花崗石枕木碎石	440
(NG-507)	桂花林步道＋2條支線	舊莊街二段添進茶園→南港茶葉製造示範廠第2停車場	花崗石木棧道水泥	495
(NG-508)	桂花吊橋步道＋支線	舊莊街二段寶豐庭茶莊→舊莊路2段328號	花崗石	305
(NG-509)	桂花吊橋親水步道	舊莊街二段寶樹橋旁→桂花吊橋	花崗石	170
(NG-510)	示範廠環山步道	舊莊街二段南港茶葉製造示範廠第1停車場→環山步道口	木棧道	510
(NG-511)	桂花亭步道(含入口意象範圍)	桂花亭入口意象→舊莊街二段步道口	水泥枕木碎石	200
內湖區小計		33 條	--	31 247
(NH-101)	圓覺寺步道	鯉魚山叉路→瀑布潭→圓覺寺步道口→峰碧塔門口	安山石	1 185
(NH-102)	鯉魚山步道(含入口意象範圍)	碧山路→葉氏祖廟	花崗石安山石	1 065
(NH-103)	大崙頭山步道	碧山路→山頂	砂岩塊石	515
(NH-104)	忠勇山步道	慈聖宮→忠勇山頂	砂岩塊石	800
(NH-105)	碧山露營場步道	碧山工作站→露營場	砂岩塊石	86
(NH-106)	碧山露營場下方木棧道	碧山工作站→露營場＋串連道(枕木步道交會)	木棧道	272
(NH-107)	碧山露營場枕木步道	碧山工作站→自然生態教室→營地側門	仿木水泥框碎石	1 088
(NH-108)	大崙尾山中社路支線	中社路二段→山頂	花崗石柏油路砂岩塊石	870
(NH-109)	白鷺鷥山步道(含入口意象範圍)	老公祠福佑宮→白鷺鷥山→金湖路268號進入	花崗石砂岩塊石	1 845
(NH-110)	龍船岩步道碧山路支線	碧山路62號→龍船岩叉路口(福德宮)	砂岩塊石	368
(NH-111)	金面山步道(剪刀石→小金面)	內湖步道叉路→金龍里福德宮	土徑	2 786
(NH-112)	康樂街步道(含支線)	康樂街236號內溝里民活動中心→六角木造涼亭	花崗石	383
(NH-113)	碧山巖步道(二段)	碧山路23號→碧山巖	砂岩塊石	346
(NH-114)	忠勇山越嶺步道	碧山巖→忠勇山→林氏墓園→金龍產業道路	砂岩塊石	1 660

Table 17 Hiking Trails (Cont. 3)

End of March 2015

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(NH-115)	大崙尾山步道(碧山路支線)	碧山路→大崙尾山頂	碎石水泥砂岩塊石	740
(NH-116)	大崙尾山步道(圓明寺支線)	大崙尾山打印台→湧泉寺(圓明寺門前)	砂岩塊石	3 180
(NH-117)	龍船岩步道(開眼山支線)	開眼山→龍船岩	砂岩塊石	554
(NH-118)	龍船岩步道(五路財神廟支線)	龍船岩叉路(福德宮)→五路財神廟	砂岩塊石	1 330
(NH-119)	婆婆橋步道	至善路二段266巷底→劍南路口圓明寺前	花崗石砂岩塊石	555
(NH-120)	鄭成功廟步道	劍南路鄭成功廟旁→上方九蓮寺叉路	砂岩塊石	312
(NH-121)	大崙頭森林步道(風衝林支線)(含入口意	碧溪產業道路1.7K森林步道口→稜線步道	木棧道	833
(NH-122)	大崙頭自然步道(含入口意象範圍)	碧溪產業道路2.4K枕木步道口→稜線步道	枕木碎石	620
(NH-123)	碧溪步道(含枕木支線、靶場支線)	碧溪產業道路1.5K石頭屋→大崙尾山步道2120m(含枕木支線)(靶場支線88m)	安山石木棧道枕木碎石	1 450
(NH-124)	大崙頭北面步道(含埤頭附近)	大崙頭山頂→碧山路50號民宅前	砂岩塊石	960
(NH-125)	康樂山步道	成功路5段山海寺牌樓→安泰街水源頭福德宮	水泥土徑	1 470
(NH-126)	明舉山步道	安泰街打印台→內溝溪生態展示館前	土徑	1 450
(NH-127)	採石場步道(含入口意象範圍)	環山路一段136巷底→打印台前叉路(論劍亭上方)	砂岩塊石泥徑	700
(NH-128)	竹月寺步道	採石場步道40m叉路右經竹月寺→金面山稜線	土徑	1 080
(NH-129)	金面山68巷支線步道	環山路二段68巷底→金面山稜線泰安亭	土徑	464
(NH-130)	大溝溪溪畔步道	大湖山莊街底大溝溪公園涼亭外→鯉魚山50m處相接	水泥鵝卵石	680
(NH-131)	瞭望台步道(含瞭望台下方休憩平台)	碧溪產道2.25K下方碎石步道→高架瞭望台(2.45K)	圓木碎石	200
(NH-132)	碧湖步道(含步道兩端的入口意象範圍)	內湖路三段碧湖步道口→新福本坑出口(葉氏祖廟前)	花崗石木棧道枕木碎石	1 300
(NH-133)	郭氏古厝步道	內湖文德路步道口→郭氏古厝	木棧道	100
士林區小計		13 條	--	11 725
(SL-201)	鵝尾山步道礁坑橋支線(平溪步道)	至善路3段181巷5弄→平等國小旁平菁路105巷底	花崗石砂岩塊石	1 345

表17　登山步道(續4)

104年3月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(SL-202)	鵝尾山步道簡厝支線	至善路三段277巷→至善路3段371巷20弄	花崗石	303
(SL-203)	平菁步道	至善路三段71巷步道口→平菁街140號	花崗石	929
(SL-204)	水管路步道(含入口意象範圍)	中山北路七段232巷1弄→愛富三街	花崗石碎石	2 600
(SL-205)	下竹林步道	中山北路七段190巷112號→仁民路	花崗石安山石砂岩塊石	1 034
(SL-206)	風櫃嘴步道	溪山里至善路三段336巷51號至風櫃嘴步道口	花崗石砂岩塊石	614
(SL-207)	大崎頭步道	至善路三段370巷步道口至坪頂古圳清風亭	安山石	1 030
(SL-208)	坪頂古圳步道	至善路三段370巷29號步道口至平菁街95巷步道口	花崗石	1 350
(SL-209)	竹林步道	平菁路42巷禾豐餐廳停車場旁至公平橋	安山石	525
(SL-210)	翠山街步道	中社路2段公車終點站旁至翠山街口雙福宮	花崗石	200
(SL-211)	雙溪國小步道	雙溪國小旁步道口至中社路2段明溪街口	水泥	330
(SL-212)	永圳步道	永公路350巷反射境後直行到路底至圳溝邊(距公平橋300m)	安山石	320
(SL-213)	翠山(靶場)步道	中社路二段路底至碧溪步道交會處	透水磚土徑	1 145
北投區小計		29 條	--	18 550
(BT-301)	忠義山步道	忠義廟→親山步道打印台	水泥砂岩塊石安山石	850
(BT-302)	中正山(一)郵政訓練所步道(含入口意象範圍)	登山路61號→郵政訓練中心	安山石	906
(BT-303)	丹鳳山步道	照明寺旁丹鳳山入口→陳濟堂墓園門口	水泥	830
(BT-304)	大屯山(一)下青礐步道	貴子坑水保教室前→下青礐(復興三路)	安山石木棧道花崗石砂岩	1 727
(BT-305)	大屯山(二)貴子坑步道	親山步道打印台→貴子坑露營場對面步道口	安山石	1 330
(BT-306)	軍艦岩步道	陽明醫學院步道口→軍艦岩前叉路	花崗石磚	500
(BT-307)	中正山(二)法雨寺步道	泉源產業道路→法雨寺＋墓園支線(登山路40號至墓園邊)200m	安山石	724
(BT-308)	中和里白宮山莊步道	復興四路105巷10號→復興三路白宮山莊	安山石	520
(BT-309)	中和里上清宮步道	復興三路212號→中清礐	花崗石	880

Table 17 Hiking Trails (Cont. 5 End)

End of March 2015

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	步道鋪面 Trail Paver	總長(公尺) Length (m)
(BT-310)	中和里永春寮步道(增長322m)	復興三路300巷底→中正山產業道路中段(增長至上清宮對面水泥橋)	安山石	760
(BT-311)	泉源里紗帽步道（對面至山谷下步道）	泉源路232號上方路口至紗帽路10號巷口（對面至山谷下步道）	水泥混凝土花崗石	684
(BT-312)	湖山里鼎筆橋步道	鼎筆橋→東昇路(頂湖福德宮)	安山石	363
(BT-313)	湖山里湖山國小步道	湖底路48號湖山國小旁→湖山路25之1號	花崗石	568
(BT-314)	水尾巴拉卡步道	竹子湖水尾公車站～巴拉卡公路	砂岩塊石	518
(BT-315)	猴崁湖田國小步道	竹子湖9號→猴崁產業道路(1K＋100)	砂岩塊石	650
(BT-316)	楓丹白露步道(含入口意象範圍)	忠義山打印台→楓丹白露社區前入口意象	土徑	450
(BT-317)	照明寺步道	軍艦岩下泥土步道→照明禪寺	土徑	1 230
(BT-318)	中正山親山步道	登山路立祥商店步道口→前行180m	安山石	180
(BT-319)	永春寮溪步道	上清宮'旁步道口→復興三路310巷步道口	花崗石	350
(BT-320)	半嶺步道	(向前延伸至湖底路)紅檀前方30m步道口→欄杆橋頭福德宮	花崗石水泥混凝土	1 200
(BT-321)	橫嶺古道	湖山路一段步道口→紅檀停車場	土徑	800
(BT-322)	猴崁步道	竹子湖路下切左轉→猴崁產業道路	安山石碎石	350
(BT-323)	頂湖海芋步道	名陽匍農場旁步道口→海芋田景觀木橋	安山石	160
(BT-324)	登泉步道	登山路17-2號→登山路28號(泉源產業道路)	水泥混凝土	218
(BT-325)	三楓步道	東昇路31號→登山路161號	砂岩塊石	79
(BT-326)	風尾步道	東昇路38號前步道口→東昇路68-15號	安山石	291
(BT-327)	淨水廠步道	泉源路260號淨水廠旁步道口→水圳步道邊	水泥混凝土	132
(BT-328)	水車寮步道	湖田國小停車場旁步道口→大樹下土雞城步道口	安山石	550
(BT-329)	磺溪溫泉步道	行義路260巷天祥溫泉前步道口→行義路402巷皇池溫泉停車場旁步道口	水泥混凝土	750

資料來源：大地工程處。 Source：Geotechnical Engineering Office

表18　土地人口概況

Table 18　Land and Population

年（月）底別 End of Year(Month)	土地面積 Land (平方公里) (Km²)	戶籍戶數 No. of Households (戶) (No.)	人口數(人) Population (person) 總計 Grend Total	男 Male	女 Female	人口密度 Population Density (人/平方公里) (Person/ km²)
民國87年底 End of 1998	271.7997	869 803	2 639 939	1 311 789	1 328 150	9 712
民國88年底 End of 1999	271.7997	879 156	2 641 312	1 309 434	1 331 878	9 718
民國89年底 End of 2000	271.7997	888 560	2 646 474	1 309 308	1 337 166	9 737
民國90年底 End of 2001	271.7997	894 763	2 633 802	1 300 179	1 333 623	9 690
民國91年底 End of 2002	271.7997	906 988	2 641 856	1 301 458	1 340 398	9 720
民國92年底 End of 2003	271.7997	914 716	2 627 138	1 291 742	1 335 396	9 666
民國93年底 End of 2004	271.7997	923 325	2 622 472	1 286 303	1 336 169	9 649
民國94年底 End of 2005	271.7997	933 110	2 616 375	1 279 513	1 336 862	9 626
民國95年底 End of 2006	271.7997	941 317	2 632 242	1 282 691	1 349 551	9 684
民國96年底 End of 2007	271.7997	947 745	2 629 269	1 277 556	1 351 713	9 674
民國97年底 End of 2008	271.7997	958 433	2 622 923	1 270 948	1 351 975	9 650
民國98年底 End of 2009	271.7997	969 418	2 607 428	1 260 450	1 346 978	9 593
民國99年底 End of 2010	271.7997	983 237	2 618 772	1 262 554	1 356 218	9 635
民國100年底 End of 2011	271.7997	999 879	2 650 968	1 276 343	1 374 625	9 753
民國101年底 End of 2012	271.7997	1 017 063	2 673 226	1 285 361	1 387 865	9 835
民國102年底 End of 2013	271.7997	1 026 738	2 686 516	1 289 945	1 396 571	9 884
民國103年底 End of 2014	271.7997	1 037 402	2 702 315	1 295 636	1 406 679	9 942
3月底 End of Mar.	271.7997	1 027 984	2 690 232	1 291 306	1 398 926	9 898
4月底 End of Apr.	271.7997	1 028 991	2 691 331	1 291 738	1 399 593	9 902
5月底 End of May	271.7997	1 030 335	2 692 138	1 291 858	1 400 280	9 905
6月底 End of June	271.7997	1 031 465	2 693 672	1 292 391	1 401 281	9 911
7月底 End of July	271.7997	1 032 751	2 695 027	1 292 989	1 402 038	9 915
8月底 End of Aug.	271.7997	1 034 296	2 695 007	1 292 896	1 402 111	9 915
9月底 End of Sep.	271.7997	1 036 877	2 695 649	1 293 032	1 402 617	9 918
10月底 End of Oct.	271.7997	1 037 047	2 697 644	1 293 884	1 403 760	9 925
11月底 End of Nov.	271.7997	1 037 206	2 700 091	1 294 867	1 405 224	9 934
12月底 End of Dec.	271.7997	1 037 402	2 702 315	1 295 636	1 406 679	9 942
民國104年 2015						
1月底 End of Jan.	271.7997	1 037 834	2 704 133	1 296 292	1 407 841	9 949
2月底 End of Feb.	271.7997	1 038 197	2 705 113	1 296 676	1 408 437	9 953
3月底 End of Mar.	271.7997	1 039 180	2 705 958	1 297 022	1 408 936	9 956

資料來源：本府地政局、民政局。

Source：Department of Land , Department of Civil Affairs

表19　臺灣地區營造工程物價指數

公式：採用拉式公式之變式

年(月)別 Year（Month）		總指數 General Index	水泥及其製品類 Cement & Related Products	砂石及級配類 Sand & Crashed Stone	磚瓦瓷類 Bricks & Tiles	金屬製品類 Metal Products	木材及其製品類 Timber & Related Products
項數 No of Items		115	7	3	5	21	5
權數(千分比)Weights		1,000	158.85	17.24	12.37	213.87	17.81
基期：民國100年平均＝100				定　基　指　數			
民國 98 年	2009	93.79	111.28	115.06	99.88	81.47	78.47
民國 99 年	2010	96.78	100.43	103.18	97.91	93.18	90.17
民國100年	2011	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
民國101年	2012	100.83	104.78	103.84	105.18	95.49	97.83
民國102年	2013	100.49	106.57	105.36	108.38	90.21	99.66
民國103年	2014	102.33	113.54	119.30	111.38	88.17	104.30
3月	Mar.	101.49	110.34	114.17	111.13	88.58	103.73
4月	Apr.	102.12	113.26	117.91	111.16	89.20	104.62
5月	May	102.38	114.14	120.10	111.38	88.95	104.82
6月	June	102.84	114.65	121.88	111.38	89.09	104.81
7月	July	103.08	114.90	122.09	111.50	89.43	104.99
8月	Aug.	103.20	114.94	122.14	111.78	89.31	104.99
9月	Sep.	103.06	115.03	122.05	111.78	88.59	104.77
10月	Oct.	102.57	115.00	122.05	111.74	86.40	104.70
11月	Nov.	102.30	115.20	122.05	111.73	85.30	104.79
12月	Dec.	102.04	115.27	122.25	111.84	84.18	104.99
民國104年	2015						
1月	Jan.	101.66	115.14	122.48	111.86	82.97	105.51
2月	Feb.	101.07	114.98	121.98	111.74	81.31	105.66
3月	Mar.	100.78	114.87	121.86	111.75	79.84	105.75
				年　增　率　(%)			
民國 98 年	2009	- 8.85	- 4.55	- 9.78	- 0.72	- 29.92	- 3.84
民國 99 年	2010	3.19	- 9.75	- 10.33	- 1.97	14.37	14.91
民國100年	2011	3.33	- 0.43	- 3.08	2.13	7.32	10.90
民國101年	2012	0.83	4.78	3.84	5.18	- 4.51	- 2.17
民國102年	2013	- 0.34	1.71	1.46	3.04	- 5.53	1.87
民國103年	2014	1.83	6.54	13.23	2.77	- 2.26	4.66
3月	Mar.	0.48	4.30	9.61	3.17	- 4.41	4.66
4月	Apr.	1.58	7.05	13.39	2.40	- 1.96	4.99
5月	May	2.25	7.68	15.51	2.38	- 0.84	5.21
6月	June	2.97	7.99	17.35	2.38	1.34	5.39
7月	July	3.17	7.92	16.87	2.88	1.72	5.41
8月	Aug.	3.12	7.80	16.11	3.19	0.88	4.69
9月	Sep.	2.51	7.92	14.86	3.23	- 1.34	4.30
10月	Oct.	2.03	7.42	14.34	3.01	- 3.55	4.02
11月	Nov.	1.51	6.89	13.10	2.53	- 5.18	4.01
12月	Dec.	1.02	5.87	11.92	2.04	- 6.71	3.90
民國104年	2015						
1月	Jan.	0.28	4.81	9.50	1.55	- 7.83	3.63
2月	Feb.	- 0.38	4.59	7.89	0.69	- 8.65	2.98
3月	Mar.	- 0.70	4.11	6.74	0.56	- 9.87	1.95

資料來源：物價統計月報。

說　　明：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正。

Table 19　Indices of Construction Cost in Taiwan Area

Formula：Laspeyres's Formula

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類 Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
8	4	16	2	15	29
30.46	8.72	123.54	31.54	43.55	342.07
Fixed Index					Base Period：2011=100
86.72	88.60	88.73	87.35	94.15	98.21
94.07	91.37	94.46	96.68	96.31	98.76
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
103.88	105.63	99.39	106.66	103.08	101.38
108.56	107.67	98.36	108.64	104.99	102.33
111.57	108.92	98.40	108.60	106.93	104.14
111.89	108.97	98.73	108.66	105.87	103.21
111.07	108.97	97.46	108.66	105.83	103.60
111.22	109.01	97.42	108.66	106.00	103.94
112.27	109.01	98.10	108.81	108.37	104.22
112.56	109.01	98.23	108.81	108.48	104.49
112.60	109.01	99.14	108.86	108.52	104.56
112.58	109.01	98.97	109.02	108.42	104.62
111.75	109.08	98.58	108.71	106.73	105.06
110.87	109.08	98.33	107.91	106.71	105.09
109.78	108.80	98.23	107.54	106.74	105.15
107.80	108.66	97.80	107.51	107.01	105.13
107.52	108.66	96.09	107.45	106.98	105.18
108.37	108.66	95.84	107.06	106.94	105.39
Annual Change Rate (%)					
0.23	1.69	- 2.76	6.15	2.38	0.36
8.48	3.13	6.46	10.68	2.29	0.56
6.30	9.45	5.86	3.43	3.83	1.26
3.88	5.63	- 0.61	6.66	3.08	1.38
4.51	1.93	- 1.04	1.86	1.85	0.94
2.77	1.16	0.04	- 0.04	1.85	1.77
2.57	1.48	- 1.53	0.03	1.71	1.00
2.73	1.69	- 1.69	0.03	1.52	1.30
3.68	1.73	- 0.70	0.03	1.68	1.65
3.74	1.41	0.06	0.17	2.20	1.94
3.57	1.22	0.79	0.17	2.64	2.04
3.54	1.01	2.11	0.16	2.63	2.03
2.39	1.01	0.91	0.27	2.41	2.07
1.47	0.79	0.85	- 0.02	1.64	2.46
1.33	0.61	0.58	- 0.75	1.03	2.43
0.25	0.22	0.70	- 1.09	0.97	2.55
- 2.51	0.09	- 0.72	- 1.19	1.34	2.39
- 3.72	0.09	- 2.99	- 1.24	1.06	2.05
- 3.15	- 0.28	- 2.93	- 1.47	1.01	2.11

Source： Price Statistics Monthly

Explanation：All data are subject to revision 3 months after original publication due to late reports and corrections by respondents.

表20　臺北市營造工程物價指數

公式：價比基期值加權算術平均式

年(月)別 Year（Month）		總指數 General Index	水泥及其製品類 Cement & Related Products	砂石及級配類 Sand & Crashed Stone	磚瓦瓷類 Bricks & Tiles	金屬製品類 Metal Products	木材及其製品類 Timber & Related Products
項數 No of Items		115	7	3	5	21	5
權數(千分比) Weights		1,000.00	153.73	15.64	13.97	203.18	19.64
基期：民國100年平均＝100		定基指數					
民國98年	2009	94.62	111.37	101.35	101.53	83.56	86.26
民國99年	2010	97.26	101.41	100.51	99.01	93.41	94.94
民國100年	2011	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
民國101年	2012	100.64	102.80	100.54	103.40	95.25	95.62
民國102年	2013	99.98	103.91	103.52	104.65	89.46	95.71
民國103年	2014	101.38	111.15	114.16	104.86	87.98	99.07
3月	Mar.	100.71	106.87	111.50	104.54	88.05	98.59
4月	Apr.	101.56	112.59	112.02	104.54	88.64	99.53
5月	May	101.64	113.13	113.08	104.54	88.40	99.61
6月	June	101.90	113.13	115.34	104.54	88.75	99.61
7月	July	101.97	113.10	116.08	105.04	89.00	99.51
8月	Aug.	102.17	113.10	116.08	105.30	89.30	99.51
9月	Sep.	102.17	113.23	116.08	105.30	88.86	99.35
10月	Oct.	101.54	113.23	116.08	105.30	86.61	99.15
11月	Nov.	101.11	112.00	116.08	105.06	85.82	99.11
12月	Dec.	100.80	112.00	116.08	105.06	84.86	99.09
民國104年	2015						
1月	Jan.	100.69	111.82	116.08	104.89	84.29	99.87
2月	Feb.	100.06	111.46	116.08	104.31	82.61	99.95
3月	Mar.	99.97	111.16	116.08	104.31	80.81	99.99
		年增率(%)					
民國98年	2009	- 7.98	- 3.81	- 10.79	1.84	- 28.64	- 4.24
民國99年	2010	2.79	- 8.94	- 0.83	- 2.48	11.79	10.06
民國100年	2011	2.82	- 1.39	- 0.51	1.00	7.05	5.33
民國101年	2012	0.64	2.80	0.54	3.40	- 4.75	- 4.38
民國102年	2013	- 0.66	1.08	2.96	1.21	- 6.08	0.09
民國103年	2014	1.40	6.97	10.28	0.20	- 1.65	3.51
3月	Mar.	0.21	2.88	9.29	0.00	- 3.59	3.03
4月	Apr.	1.46	8.42	9.80	- 0.40	- 1.69	4.06
5月	May	2.02	8.94	10.84	- 0.40	- 0.69	4.18
6月	June	2.39	8.94	13.06	- 0.40	1.27	3.88
7月	July	2.50	8.93	13.78	- 0.44	1.60	4.32
8月	Aug.	2.49	8.94	11.37	0.73	1.09	4.25
9月	Sep.	2.11	9.06	9.54	0.73	- 0.39	3.76
10月	Oct.	1.51	8.91	9.54	0.73	- 2.72	3.40
11月	Nov.	1.06	7.72	9.54	0.50	- 3.81	3.20
12月	Dec.	0.67	7.33	9.54	0.50	- 5.12	2.92
民國104年	2015						
1月	Jan.	0.23	5.76	5.51	0.33	- 5.44	2.26
2月	Feb.	- 0.42	5.42	4.80	- 0.22	- 6.41	1.89
3月	Mar.	- 0.73	4.01	4.11	- 0.22	- 8.22	1.42

資料來源：臺北市物價統計月報。

附　　註：①原95基期營造工程材料類之「電梯與電器用品類」於100年基期修訂為「機電設備類」。

Table 20 Indices of Construction Cost in Taipei City

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類① Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項材料類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
8	4	16	2	15	29
28.85	11.66	137.40	31.98	44.59	339.37
Fixed Index					Base Period：2011=100
86.44	93.05	92.89	85.48	97.66	98.50
92.74	94.36	96.67	97.40	98.17	98.38
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
103.15	104.77	99.83	104.44	102.00	102.64
107.00	109.28	99.02	105.63	102.88	103.67
109.20	109.45	98.54	105.02	105.19	104.49
110.96	109.45	98.86	105.45	104.45	104.36
108.99	109.45	98.08	105.45	104.44	104.33
108.99	109.45	98.13	105.45	104.51	104.39
109.91	109.45	98.27	105.45	106.95	104.39
109.91	109.45	98.08	105.45	106.97	104.48
109.91	109.45	98.90	105.45	106.97	104.53
109.91	109.45	98.84	105.45	106.97	104.77
108.99	109.45	98.75	105.13	104.53	104.77
108.07	109.45	98.68	103.78	104.53	104.77
106.46	109.45	98.70	101.87	104.44	104.77
103.90	109.45	98.53	101.87	107.24	104.77
102.92	109.45	97.10	101.87	107.29	104.77
103.84	109.45	96.95	101.50	107.30	105.75
Annual Change Rate (%)					
0.79	0.74	- 4.84	17.58	4.39	- 0.57
7.29	1.41	4.07	13.94	0.52	- 0.12
7.83	5.98	3.44	2.67	1.86	1.65
3.15	4.77	- 0.17	4.44	2.00	2.64
3.73	4.30	- 0.81	1.14	0.86	1.00
2.06	0.16	- 0.48	-0.58	2.25	0.79
2.26	0.00	- 1.93	-0.17	2.75	0.87
1.97	0.00	- 1.83	-0.17	2.74	0.80
3.75	0.00	- 0.38	-0.17	2.83	0.84
3.68	0.00	- 0.25	-0.17	3.00	0.72
2.65	0.00	- 0.11	-0.17	3.02	0.81
2.65	0.00	1.15	-0.17	3.04	0.62
1.54	0.00	0.39	-0.17	3.04	0.77
0.59	0.00	0.38	-0.47	0.82	0.77
0.35	0.00	0.36	-1.75	0.82	0.77
- 1.14	0.00	0.56	-3.56	0.69	0.79
- 4.28	0.00	0.08	-3.56	3.36	0.71
- 6.26	0.00	- 1.63	-3.56	3.41	0.42
- 6.42	0.00	- 1.93	-3.75	2.73	1.33

Source：Commodity-Price Statistics Monthly, Taipei City

Note：①The "Electrical Equipment and Apparatus" replace the item "Elevator and Electrical Apparatus" used for the 2006 base period.

臺北市工務統計月報

出 版 機 關	： 臺北市政府工務局
地 址	： 11008 臺北市信義區市府路1號4樓西南區
電 話	： 1999(外縣市02-27208889)轉1404
網 址	： http://pwd.gov.taipei
發 行 人	： 彭振聲
編 輯	： 臺北市政府工務局統計室
出 版 年 月	： 中華民國 104年4月
創 刊 年 月	： 中華民國 73年 1月
刊 期 頻 率	： 月刊

THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN OF PUBLIC WORKS

Published by the Public Works Department,Taipei City Goverment

Address：Southwest Wing, 4F., No.1, City Hall Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11008, Taiwan (R.O.C.)

Telephone No：Please dial the 1999 Citizen Hotline (02-2720-8889 for out of Taipei) ext. 1404

Publisher：Cheng-sheng Pong

Edited by the Statistics Office of PWD, TCG

Website ：http://pwd.gov.taipei

Publishing Date：April 2015

First Edition：January 1984
