臺 北 市
工務統計月報

THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN OF PUBLIC WORKS

中華民國108年5月
May 2019

臺北市政府工務局編製
中華民國 108 年 6月
Public Works Department
Taipei City Government, June 2019

臺北市政府工務局業務職掌

工務局	局本部	
	土木建築科	綜合企劃及工程相關法規之制定，道路、橋梁、隧道與公共建築等相關工程之監辦及督導考核及其他有關事項。
	水利科	辦理本局災害防救綜合業務、水利與衛生下水道工程處查核金額以上工程之監辦作業及所轄廠站營運督導管理、本府淡水河流域管理委員會幕僚作業、主管下水道及纜線附掛法規修訂與核釋、專案執行及交辦事項等綜合業務及其他有關事項。
	公園大地科	督導本局公園路燈工程處、大地工程處業務及制（修）訂、核釋公共工程拆遷、勘估、補償、安置、整建等相關法規與其他有關事項。
	採購管理科	有關本府採購法規及採購契約、投標須知等招標文件範本之訂定、修訂、疑義釋示、諮詢及契約協助審查與教育訓練，本府採購稽核之事務及廠商檢舉、民意關切及媒體報導等採購案之處理，本府各一級機關查核金額以上採購案之監辦業務，本府各機關採購內部控制之稽查作業，本府公共工程督導會報之採購稽核幕僚業務，本府採購發包中心幕僚業務及其他有關事項。
	品管及勞安科	辦理本府公共工程施工之查核、本局工程材料試驗及其他有關事項。
	資訊室	研擬年度資訊推展計畫、資訊管理、電腦設備購置、電腦軟硬體維護、電腦教育訓練、本局所屬處資訊設施維護管理之督導、本局所屬各處資訊業務之督導及其他有關事項。
	秘書室	辦理研考、文書、事務、出納及其他有關事項。
	會計室	辦理本局及督導所屬工程處預算、會計業務。
	統計室	依法辦理統計及其他有關事項。
	人事室	辦理人員任免遷調、考核獎懲、差勤管理、員工訓練、待遇福利、退休撫卹及其他有關事項。
	政風室	負責政風法令之擬訂、政風法令之宣導、員工貪瀆不法之預防、發掘及處理檢舉事項、政風興革建議、政風考核獎懲建議、公務機密維護及其他有關政風事項。
	新建工程處	辦理新建道路及道路養護、橋梁、廣場及市有建築物工程之規劃、勘測、設計、施工及研究規劃設計、改善等工作。
	水利工程處	全市河川及雨水下水道、抽水站等公共設施之興建、管理與維護，包括所有河濱高灘地（河濱公園）之管理。
	公園路燈工程管理處	掌理臺北市公園、綠地、廣場、行道樹、遊樂設施及路燈等之規劃、設計施工與管理維護，以及花木培植事宜。
	衛生下水道工程處	掌理大臺北地區污水下水道之規劃、設計、施工、維護、營運管理及污水處理廠設施之操作、管理、水質檢驗、分析等事項。
	大地工程處	本市山坡地安全管理及災害復舊，產業道路與登山步道闢建維護，森林與保安林調查開發利用，山坡地野溪、山溝、土石流潛勢溪流治理規劃，農村新風貌調查規劃，山坡地開發利用與違法之取締。

Duties of the Public Works Department, Taipei City Government

		Unit	Duties
Public Woks Department	Department Headquarters	Civil Engineering Division	Combining the formulation and writing of planning- and engineering-related codes; the initiation, supervision and quality review of construction of roads, bridges, tunnels, and public buildings.
		Hydraulicus Division	Supervising construction on, and disaster relief / emergency repair of: river engineering, river management, rainwater drainage and sewage drainage.
		Parks and Geotechnical Engineering Division	Supervision of engineering related to parks and streetlights; the move or removal of legal buildings and related compensation measures.
		Procurement Administration Division	The formation, supervision and verification of the City Government’s purchasing laws.
		Ouality Control Division	Handles testing, analysis, and assessment of project materials, and project quality control affairs.
		Systems Administration	Handles the overall planning, development, coordination, promotion, management, maintenance, training, and supervision of the public works information system.
		Administrative Services	Handles research and development, control and inspection, public relations, press relations and meetings, documentation, filing, and payment for public works administration; as well as affairs that are not the duties of other sections or offices.
		Accounting Office	Handles annual bookkeeping and accounting affairs.
		Statistics Office	Handles statistical affairs.
		Personnel Office	Handles human resource affairs.
		Government Ethics	Handles ethics related affairs.
	New Construction Office		Manage planning, surveying, designing, engineering, and improving of new roads, bridges, plazas and city buildings, as well as maintaining existing roads.
	Hydraulic Engineering Office		Construction, management and maintenance of all rivers, rainwater drainage, water pumps, and other water-related public structures, including all river flood banks (riverside parks).
	Parks and Street Lights Office		Handles the planning, design, construction, management and maintenance of Taipei City parks, grassy areas, plazas, sidewalks trees, playgrounds, and street lamps as well as
	Sewerage Systems Office		Handles the planning, design, construction, maintenance and management of wastewater drainage in the greater Taipei area.
	Geotechnical Engineering Office		Our city’s hillside safety management and disaster reaction, industrial path and hiking path construction and maintaining, forest and protection forest investigation development and using, Hill land valley, gully, mudslides potential valley administer and plan. Countryside new style investigation planning, hillside development and ban illegal development.

目　次

CONTENTS

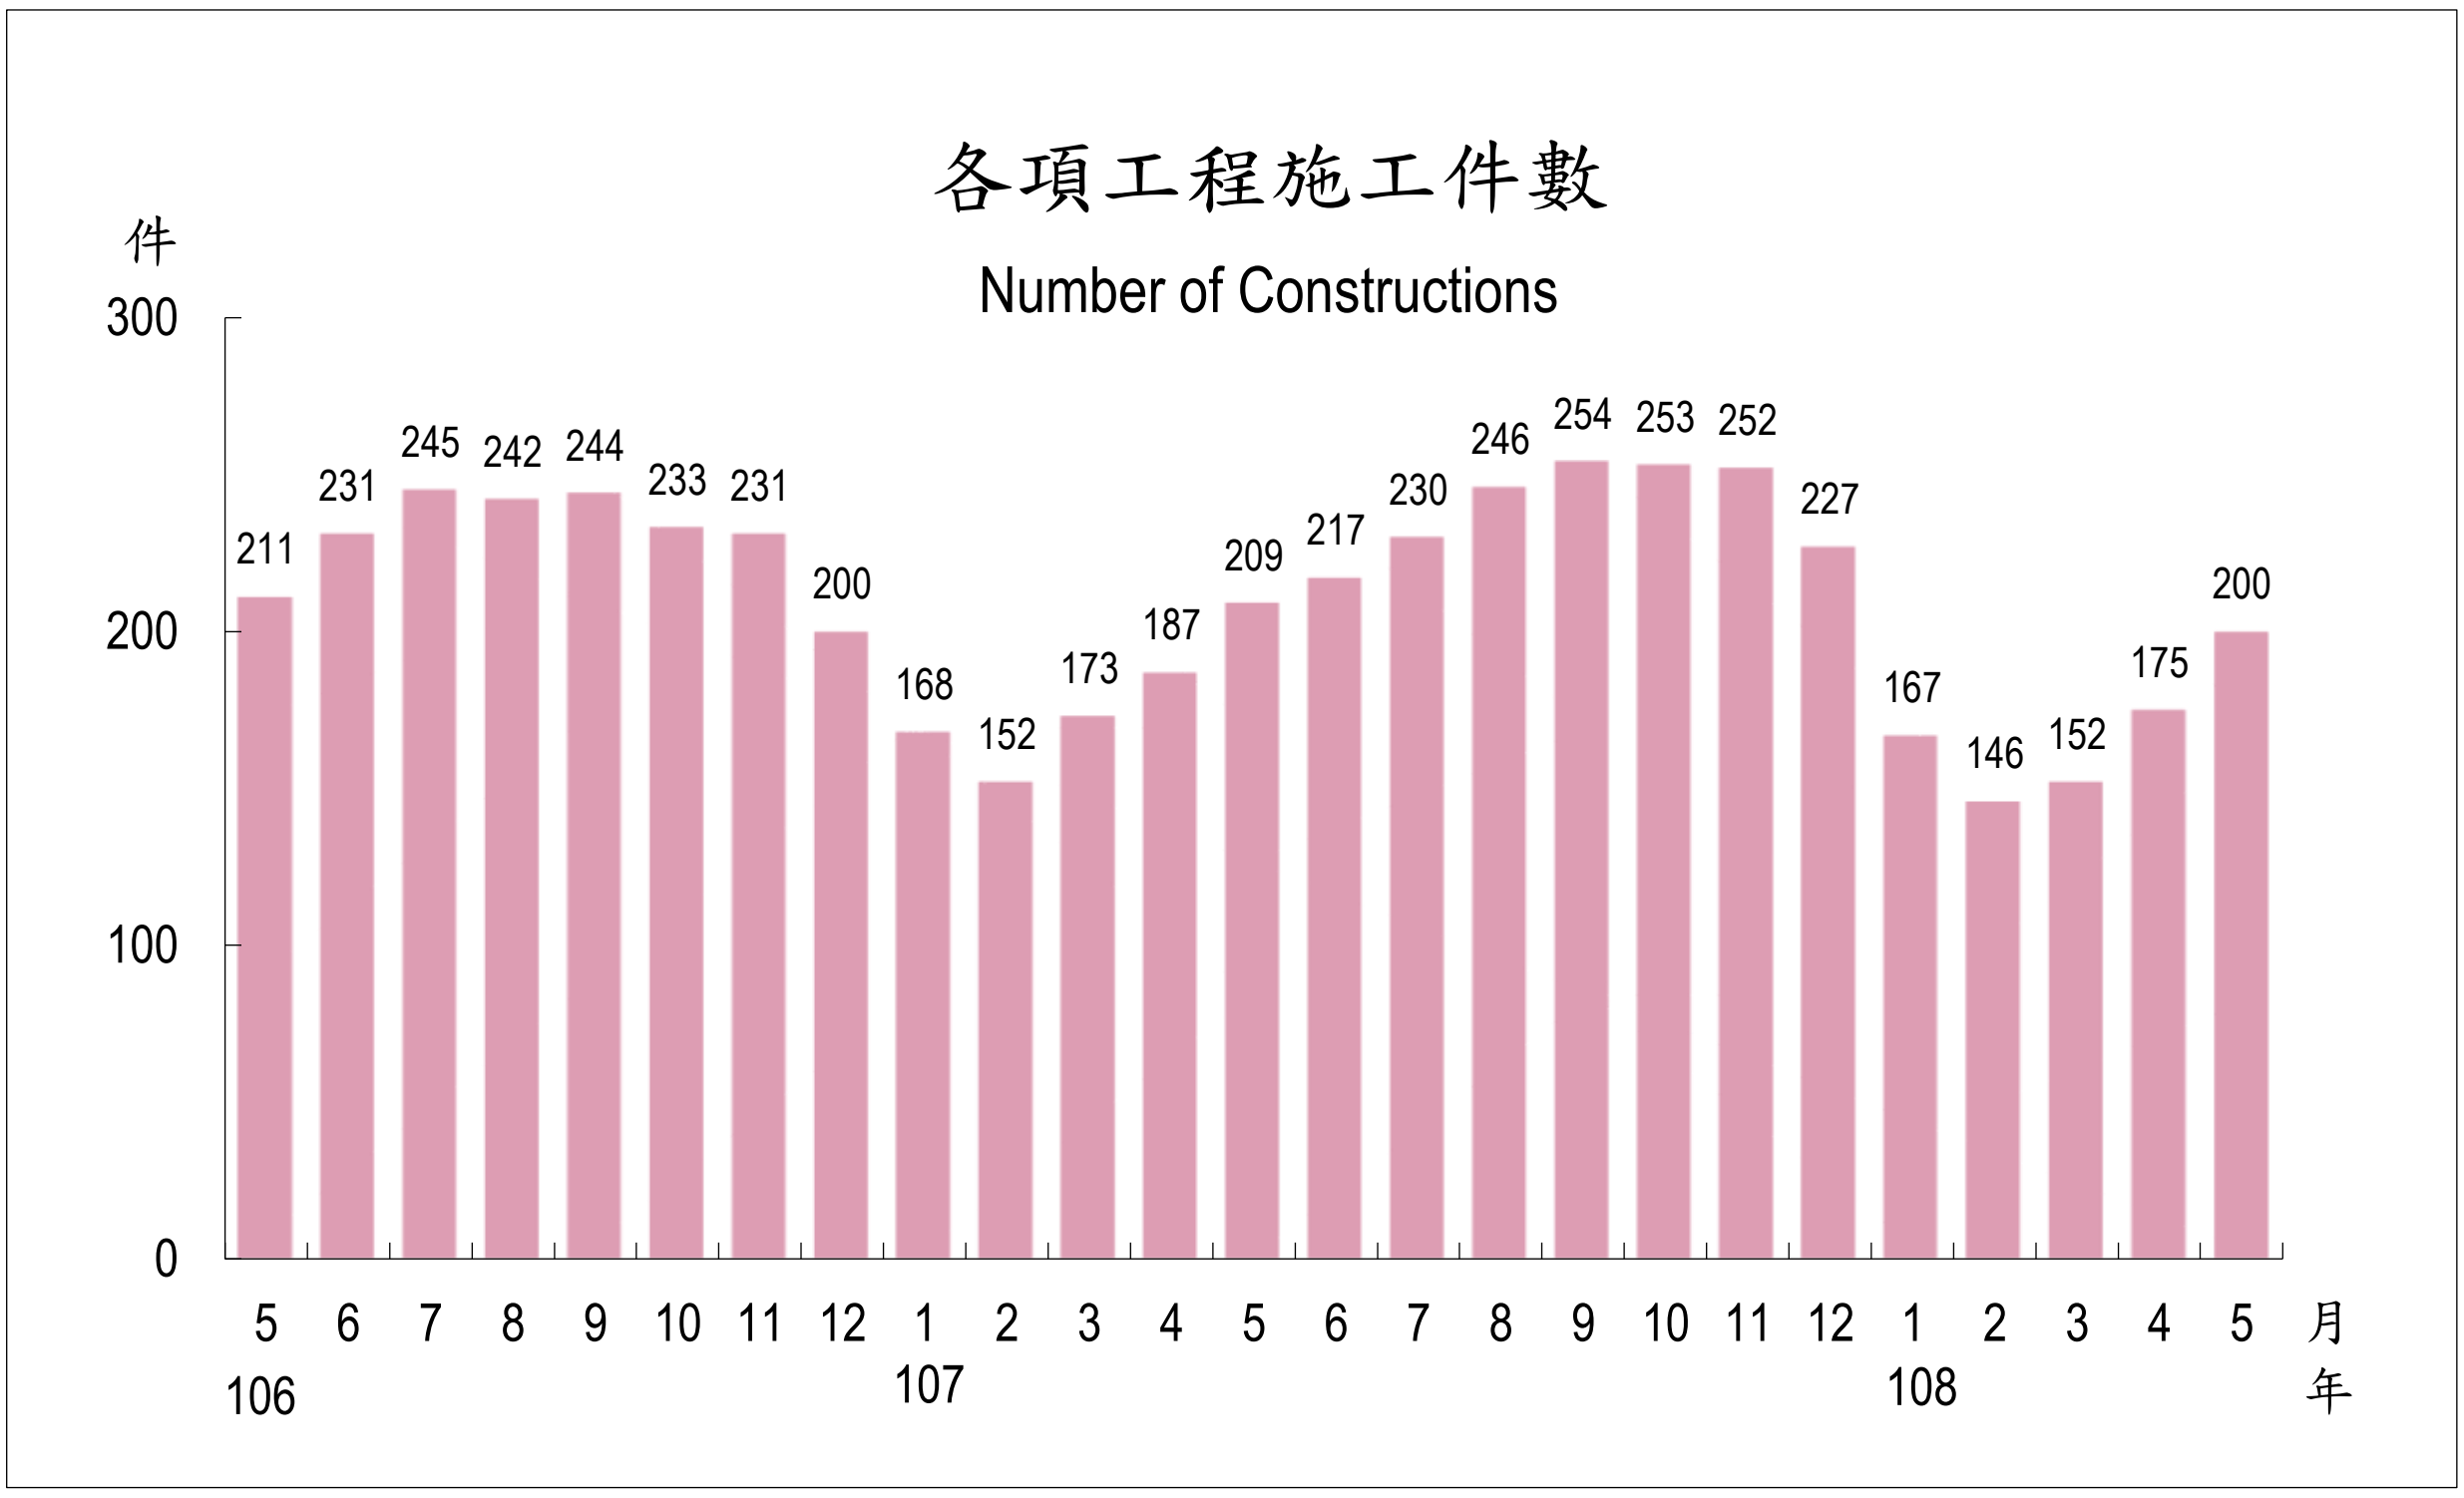
各項工程施工件數
Number of Constructions
件
300
200
100
0
211
231
245
242
244
233
231
200
168
152
173
187
209
217
230
246
254
253
252
227
167
146
152
175
200
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
月
106
107
108
年

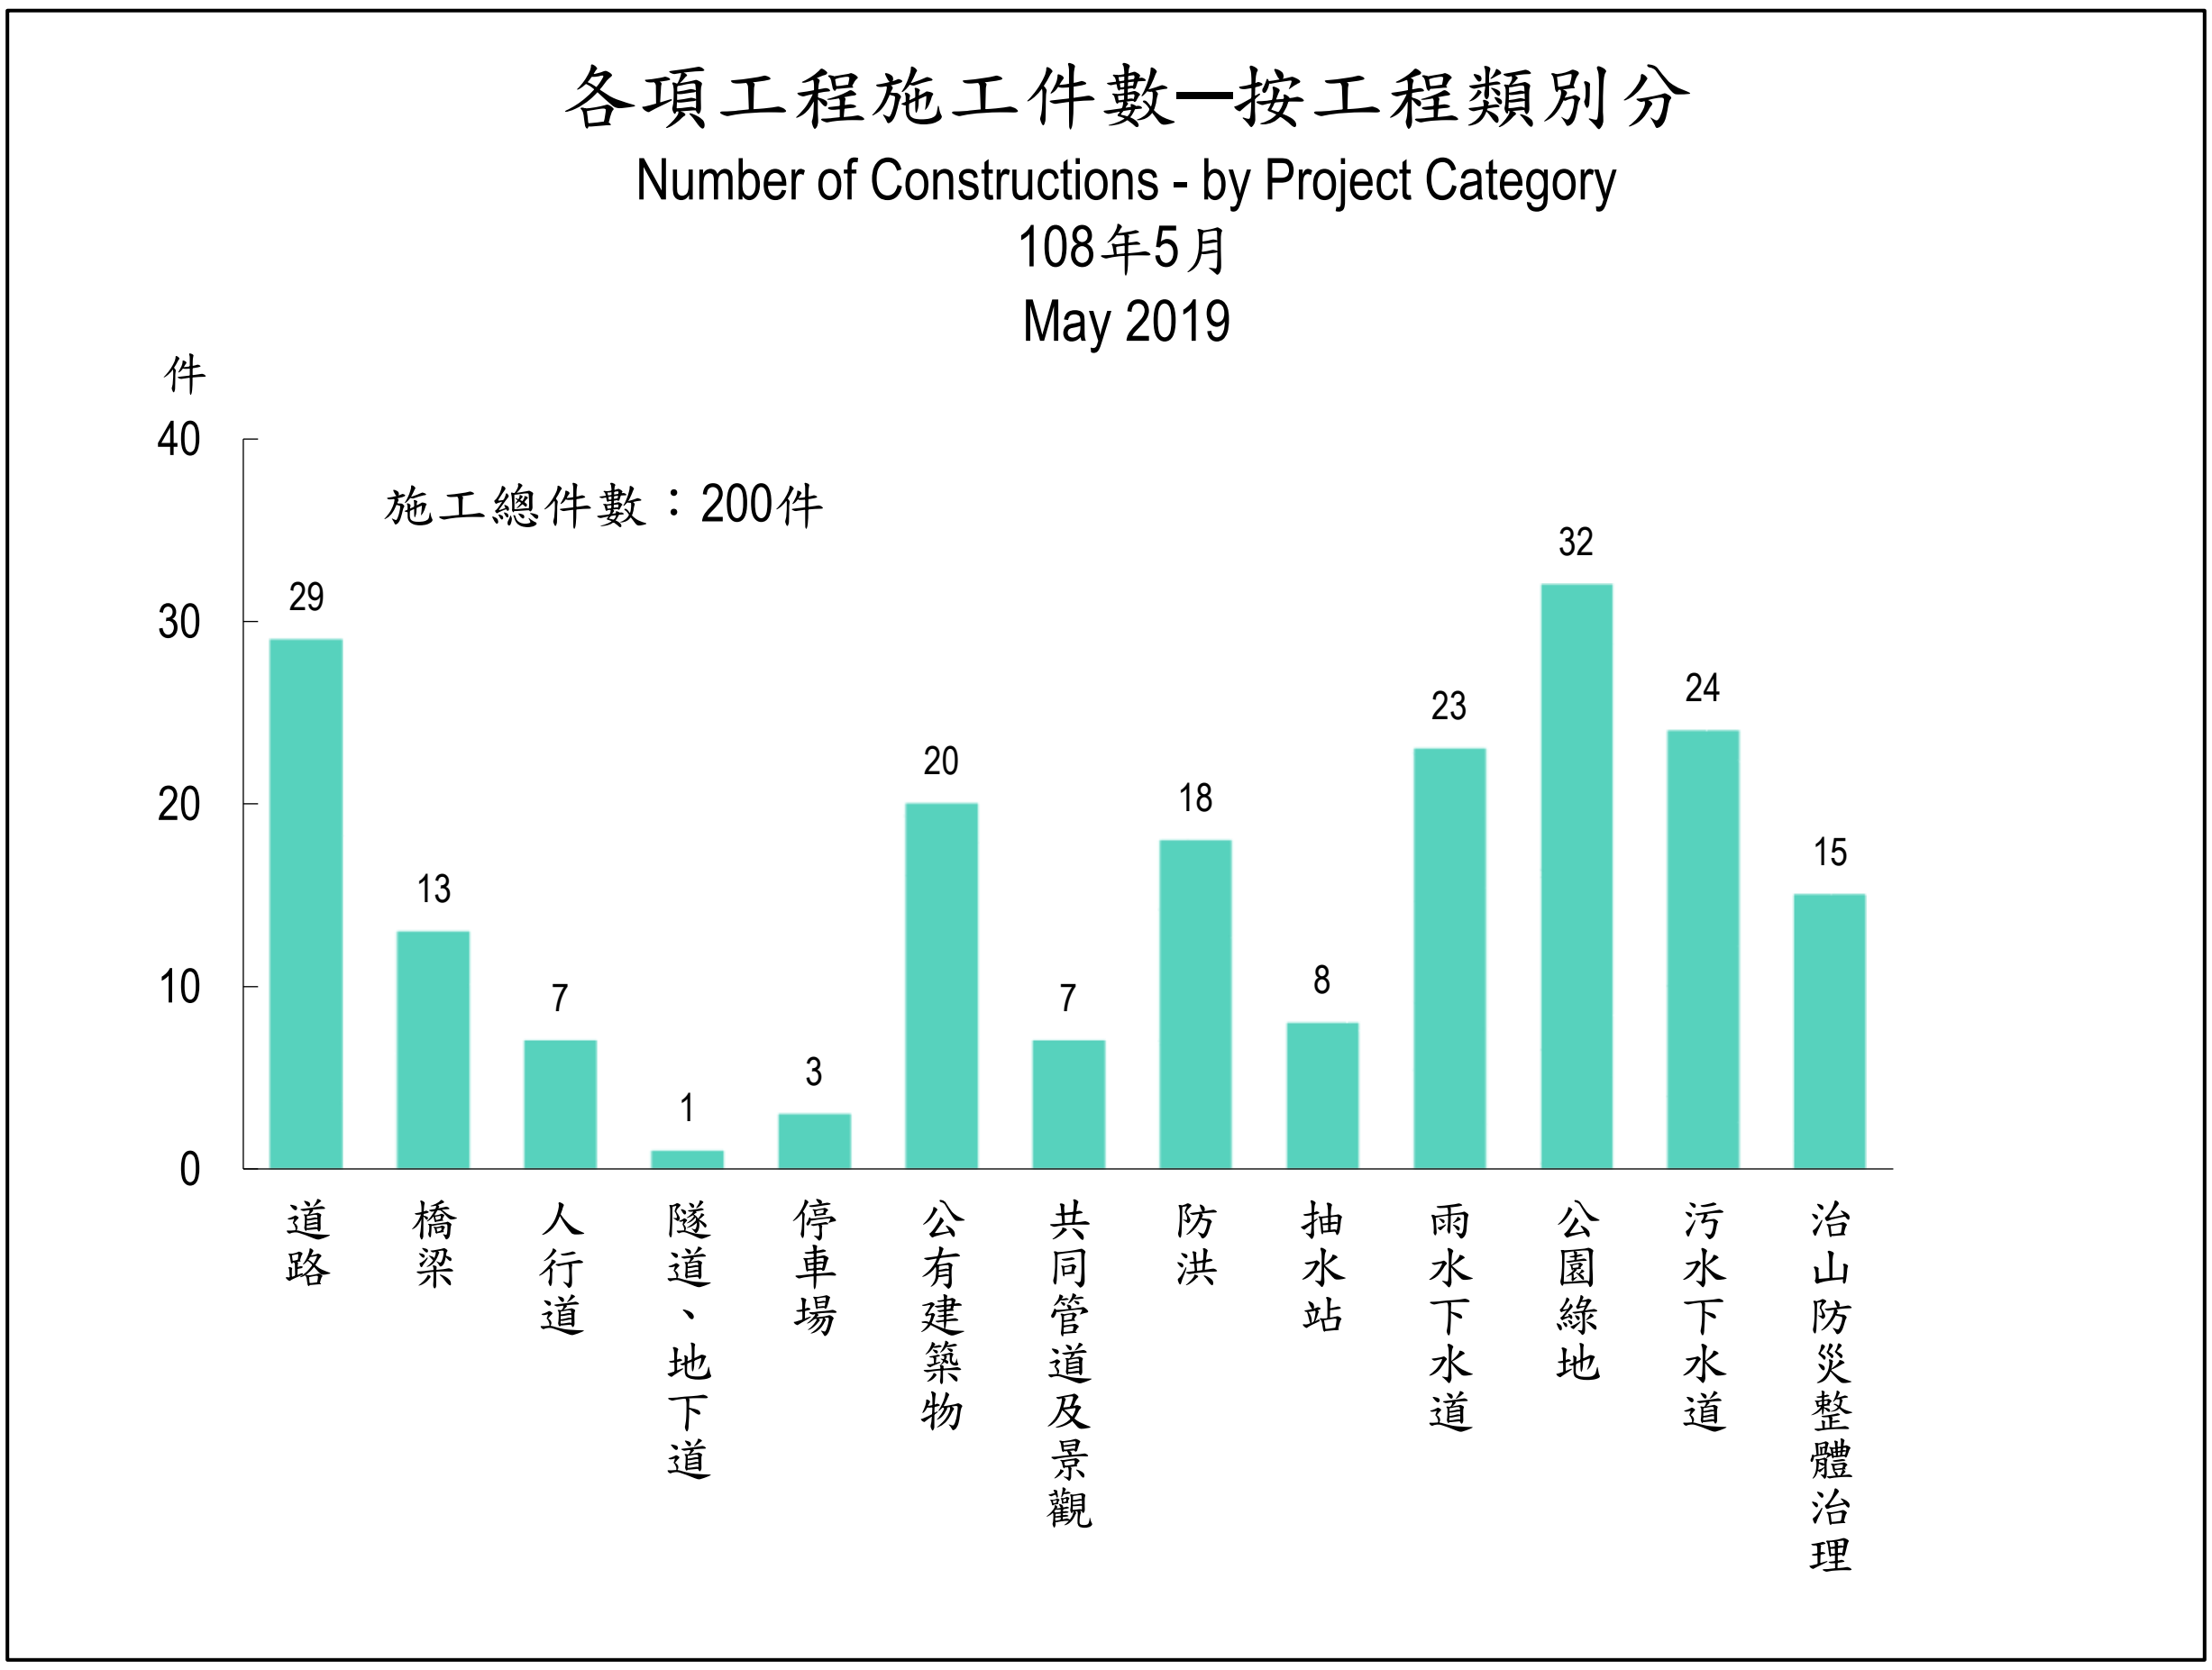
各項工程施工件數—按工程類別分
Number of Constructions - by Project Category
108年5月
May 2019
件
40
30
20
10
0
施工總件數：200件
29
13
7
1
3
20
7
18
8
23
32
24
15
道路
橋梁
人行道
隧道、地下道
停車場
公有建築物
共同管道及景觀
防洪
抽水站
雨水下水道
公園綠地
污水下水道
治山防災整體治理

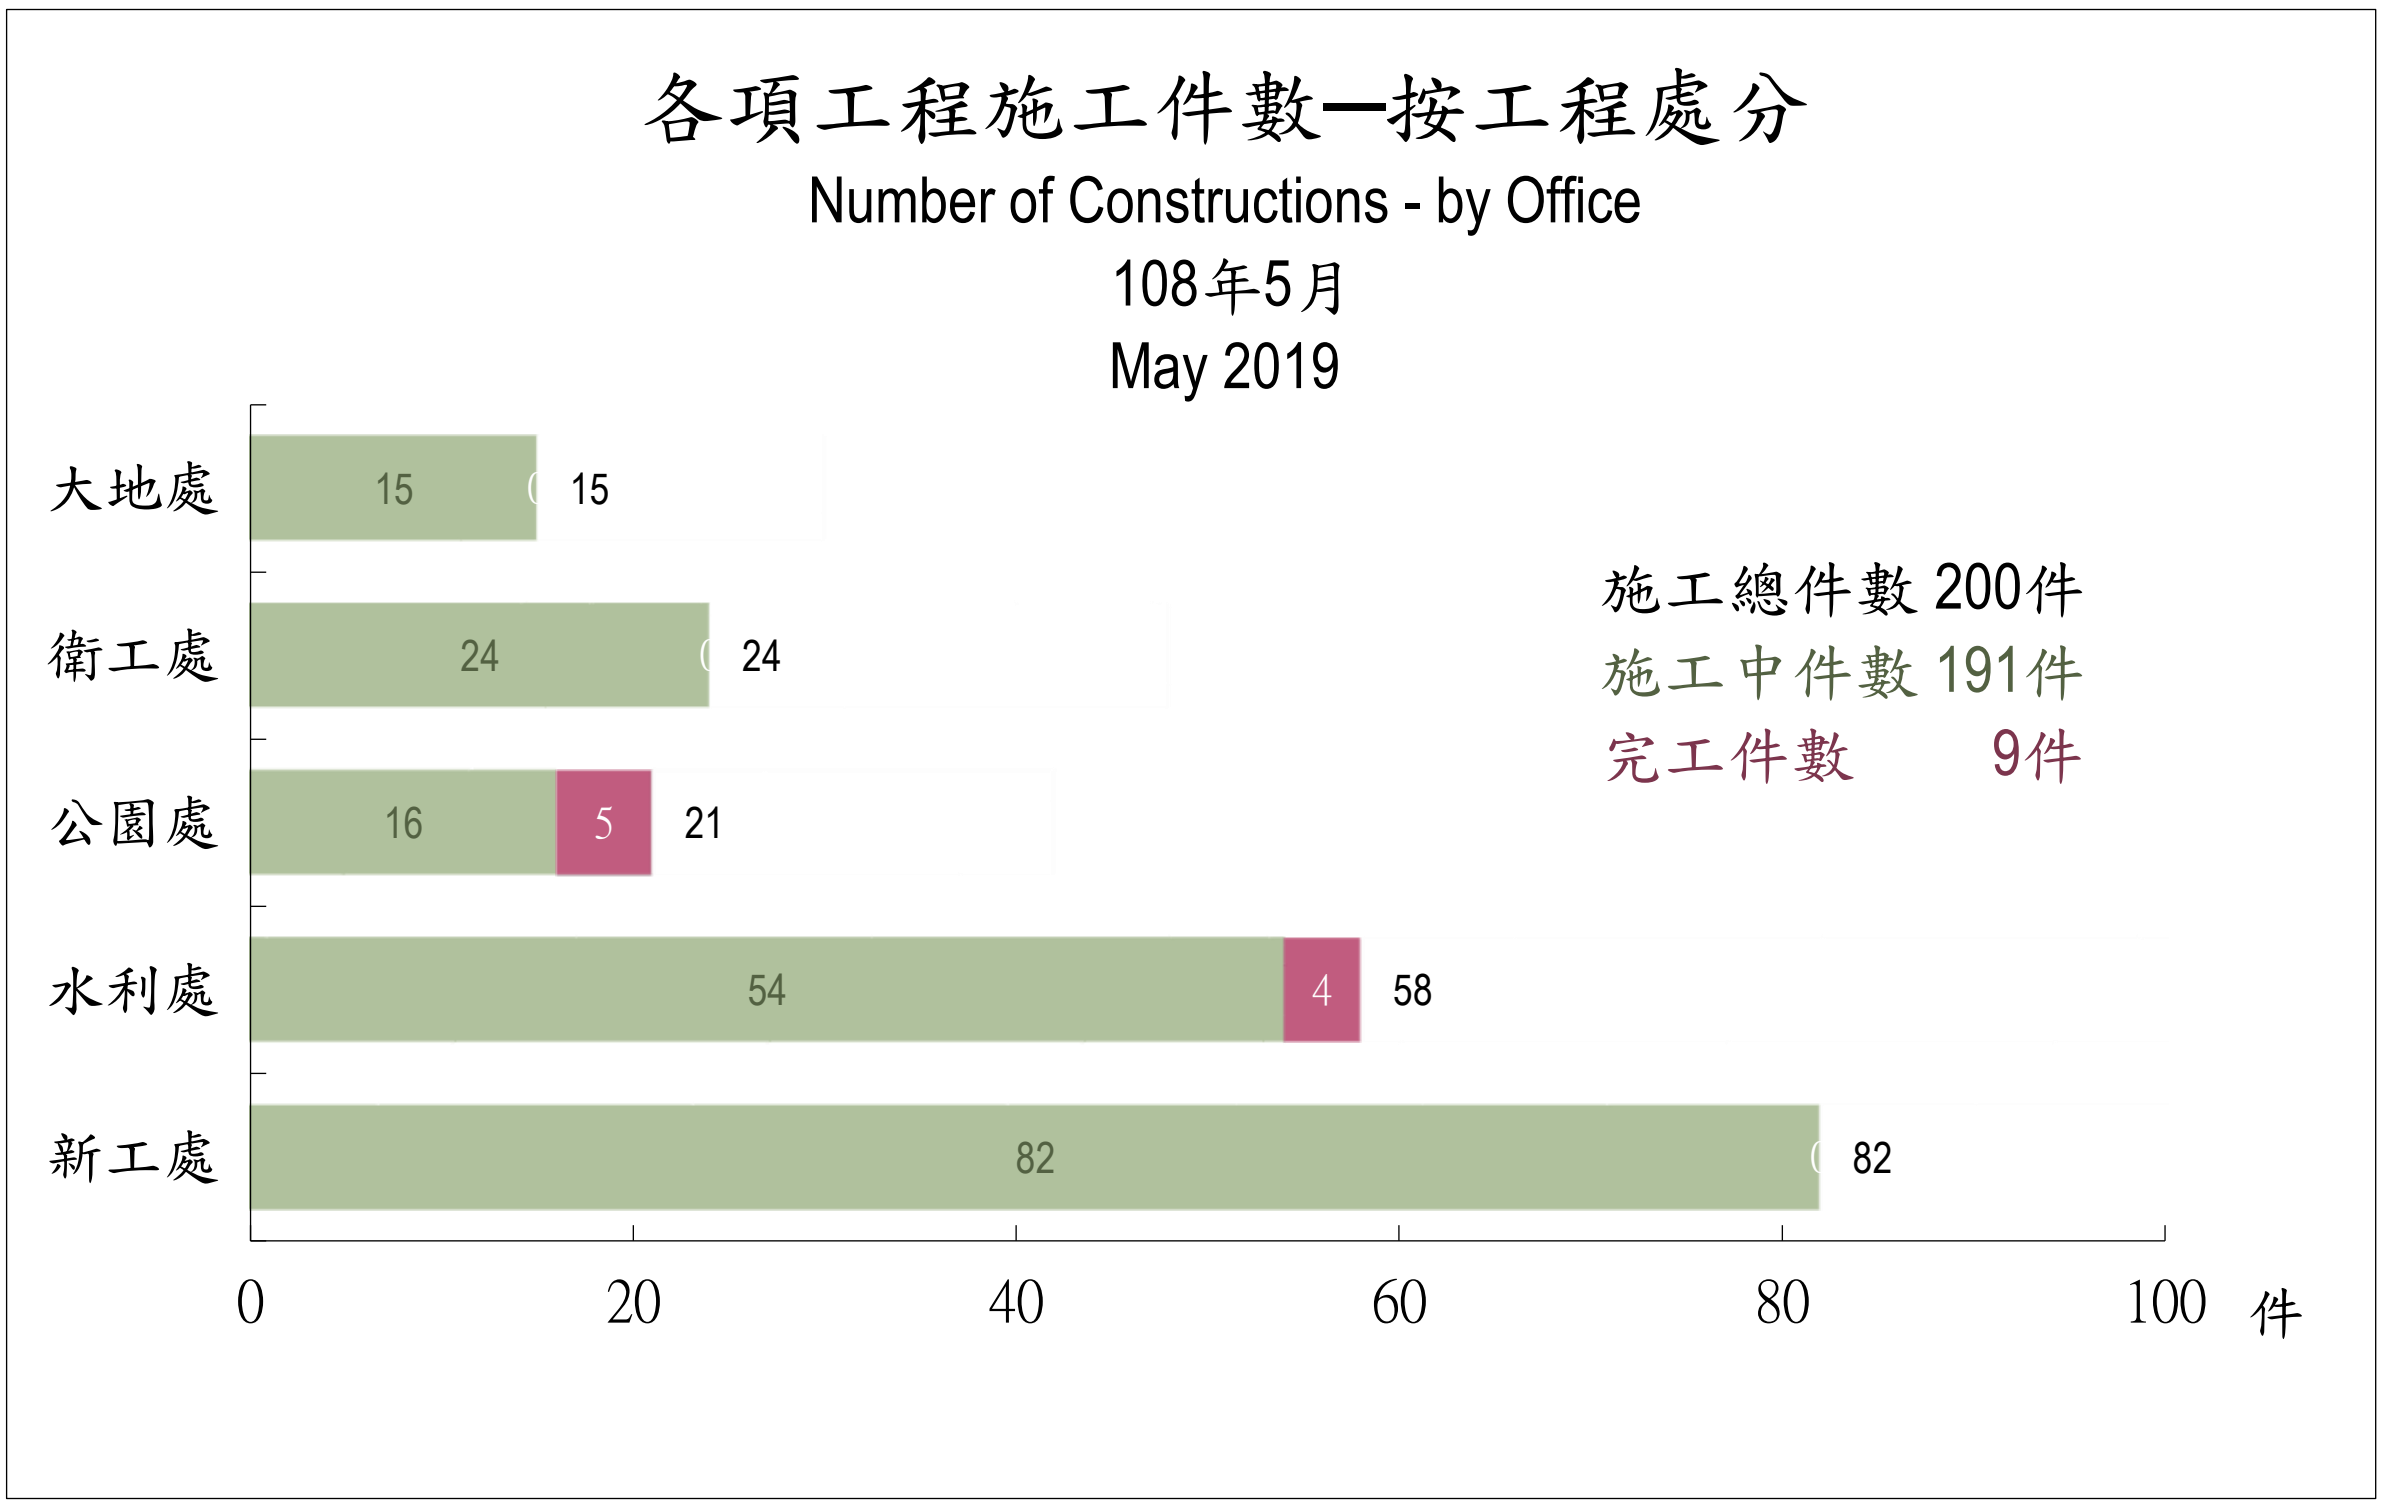
各項工程施工件數─按工程處分
Number of Constructions - by Office
108年5月
May 2019
大地處
15
15
衛工處
24
24
公園處
16
5
21
水利處
54
4
58
新工處
82
82
0
20
40
60
80
100
件
施工總件數 200件
施工中件數 191件
完工件數 9件

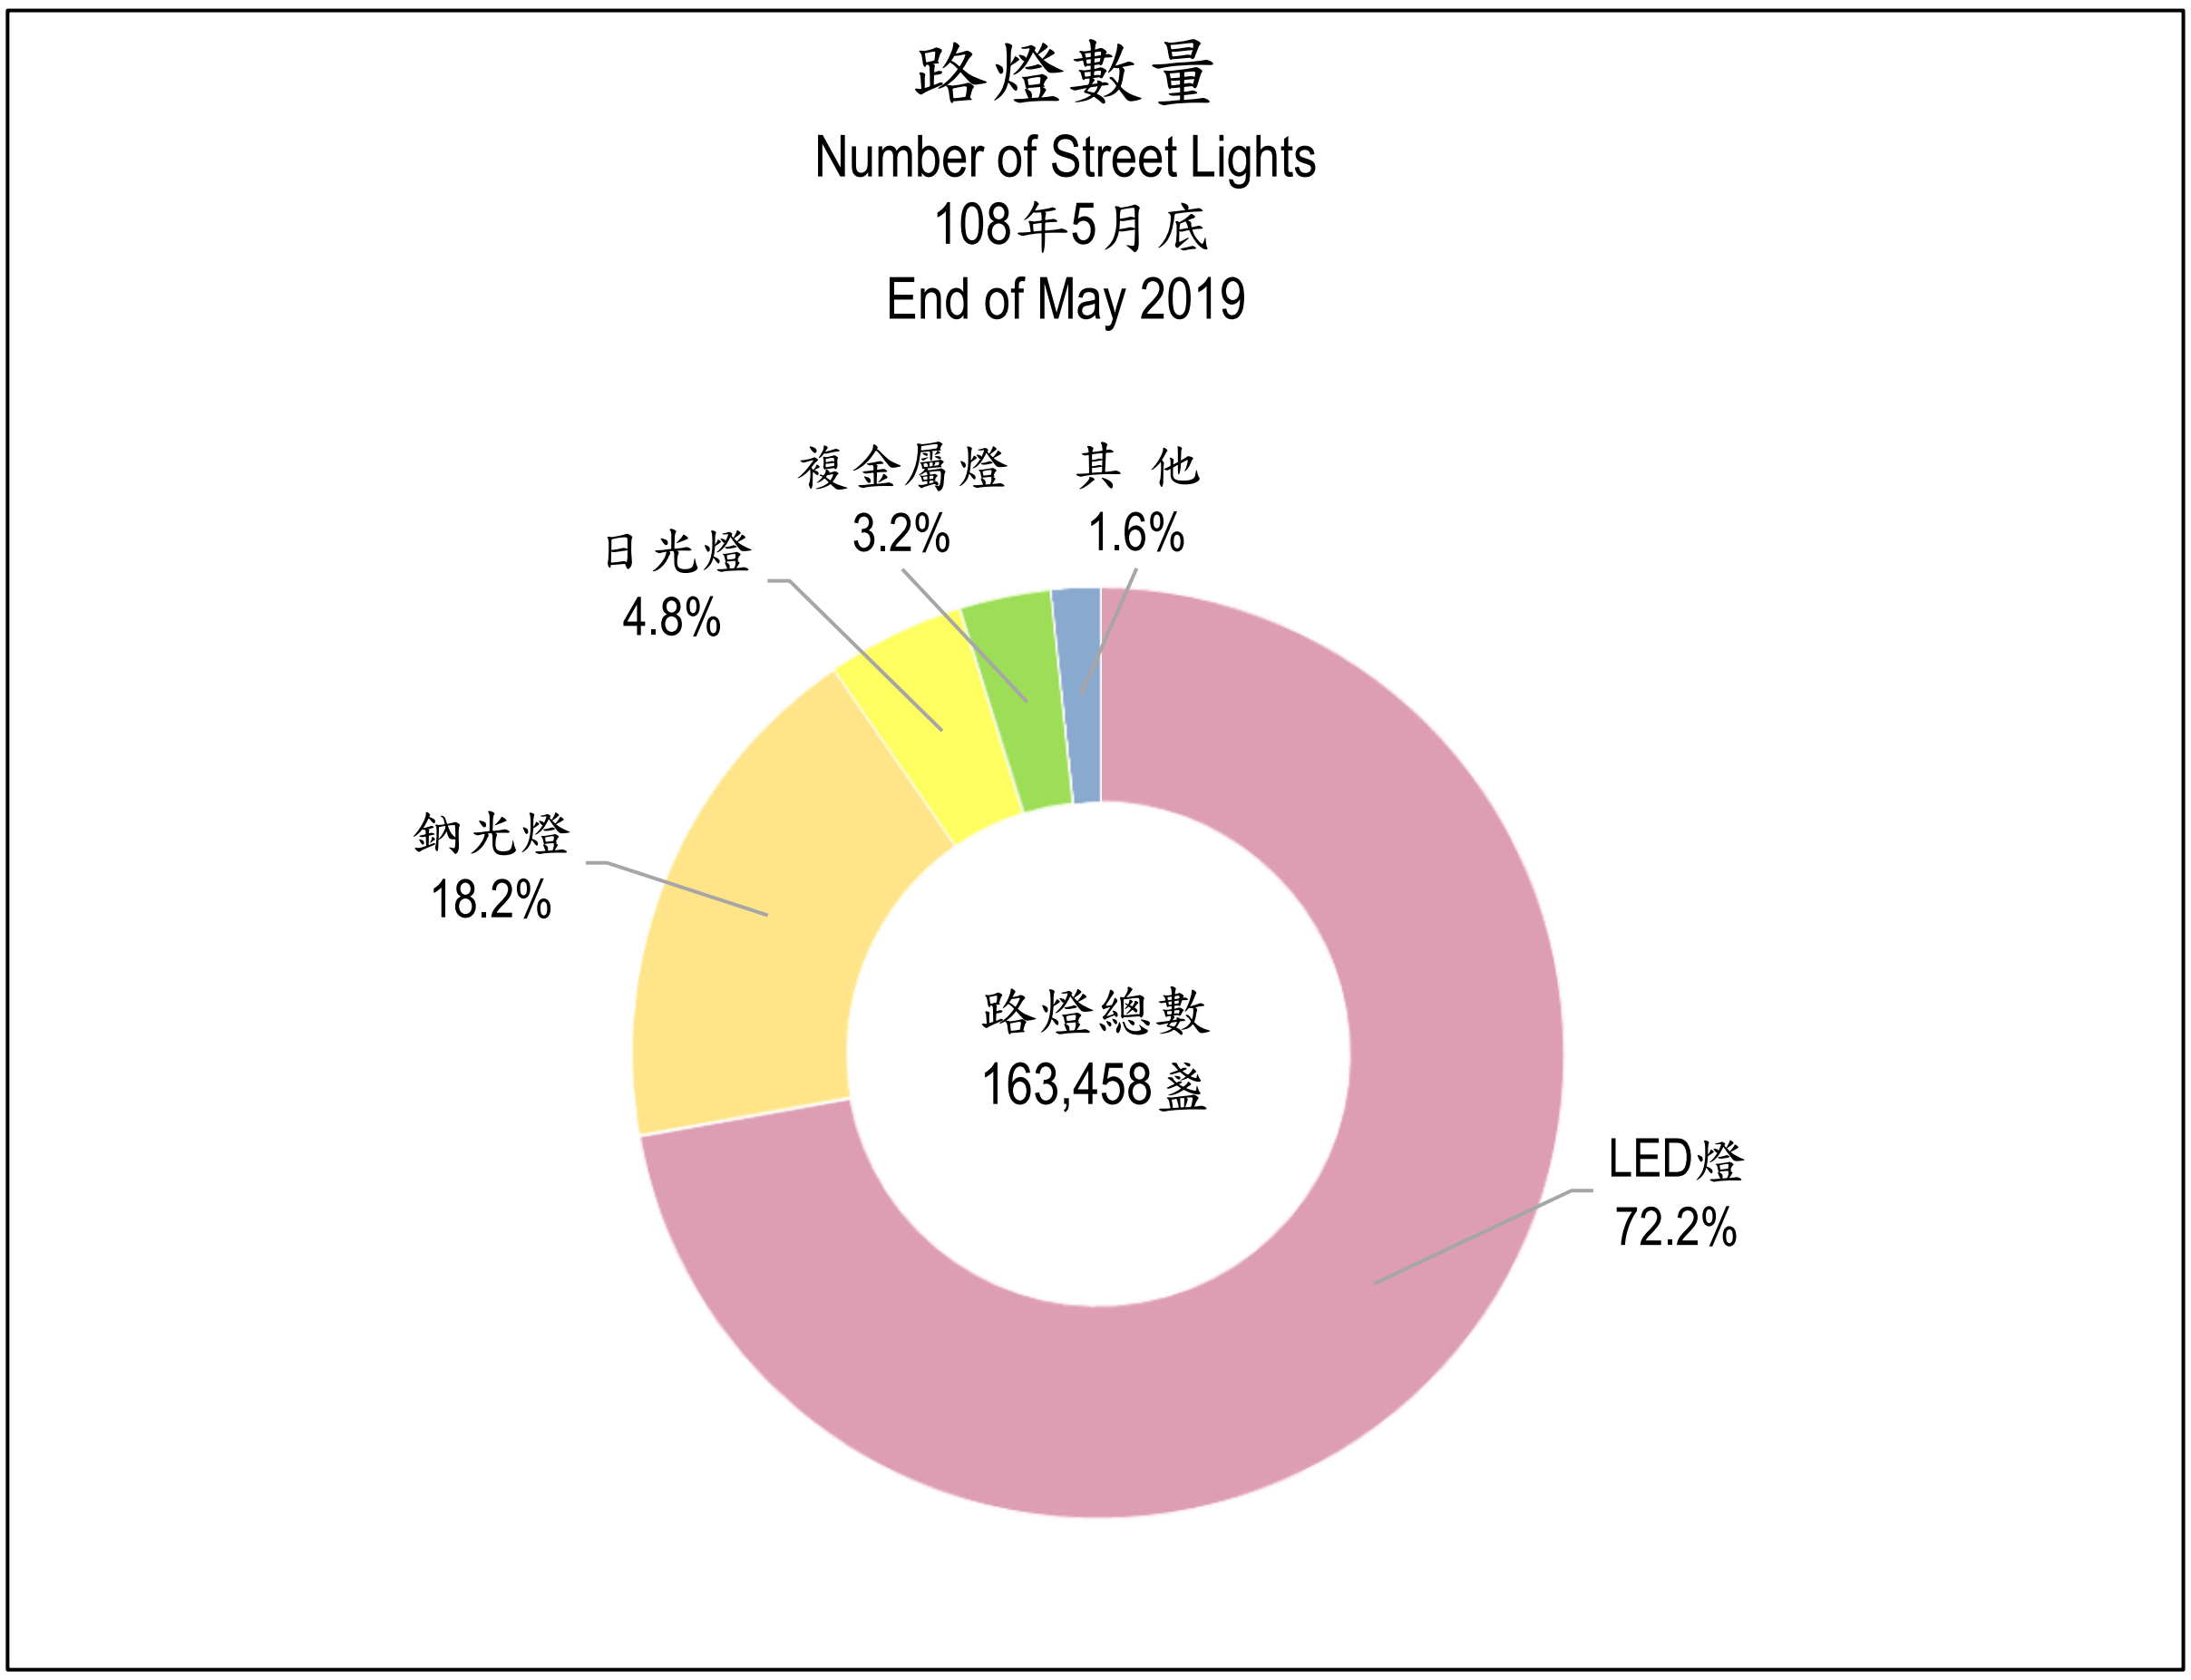
路燈數量
Number of Street Lights
108年5月底
End of May 2019
複金屬燈
3.2%
其 他
1.6%
日光燈
4.8%
鈉光燈
18.2%
路燈總數
163,458盞
LED燈
72.2%

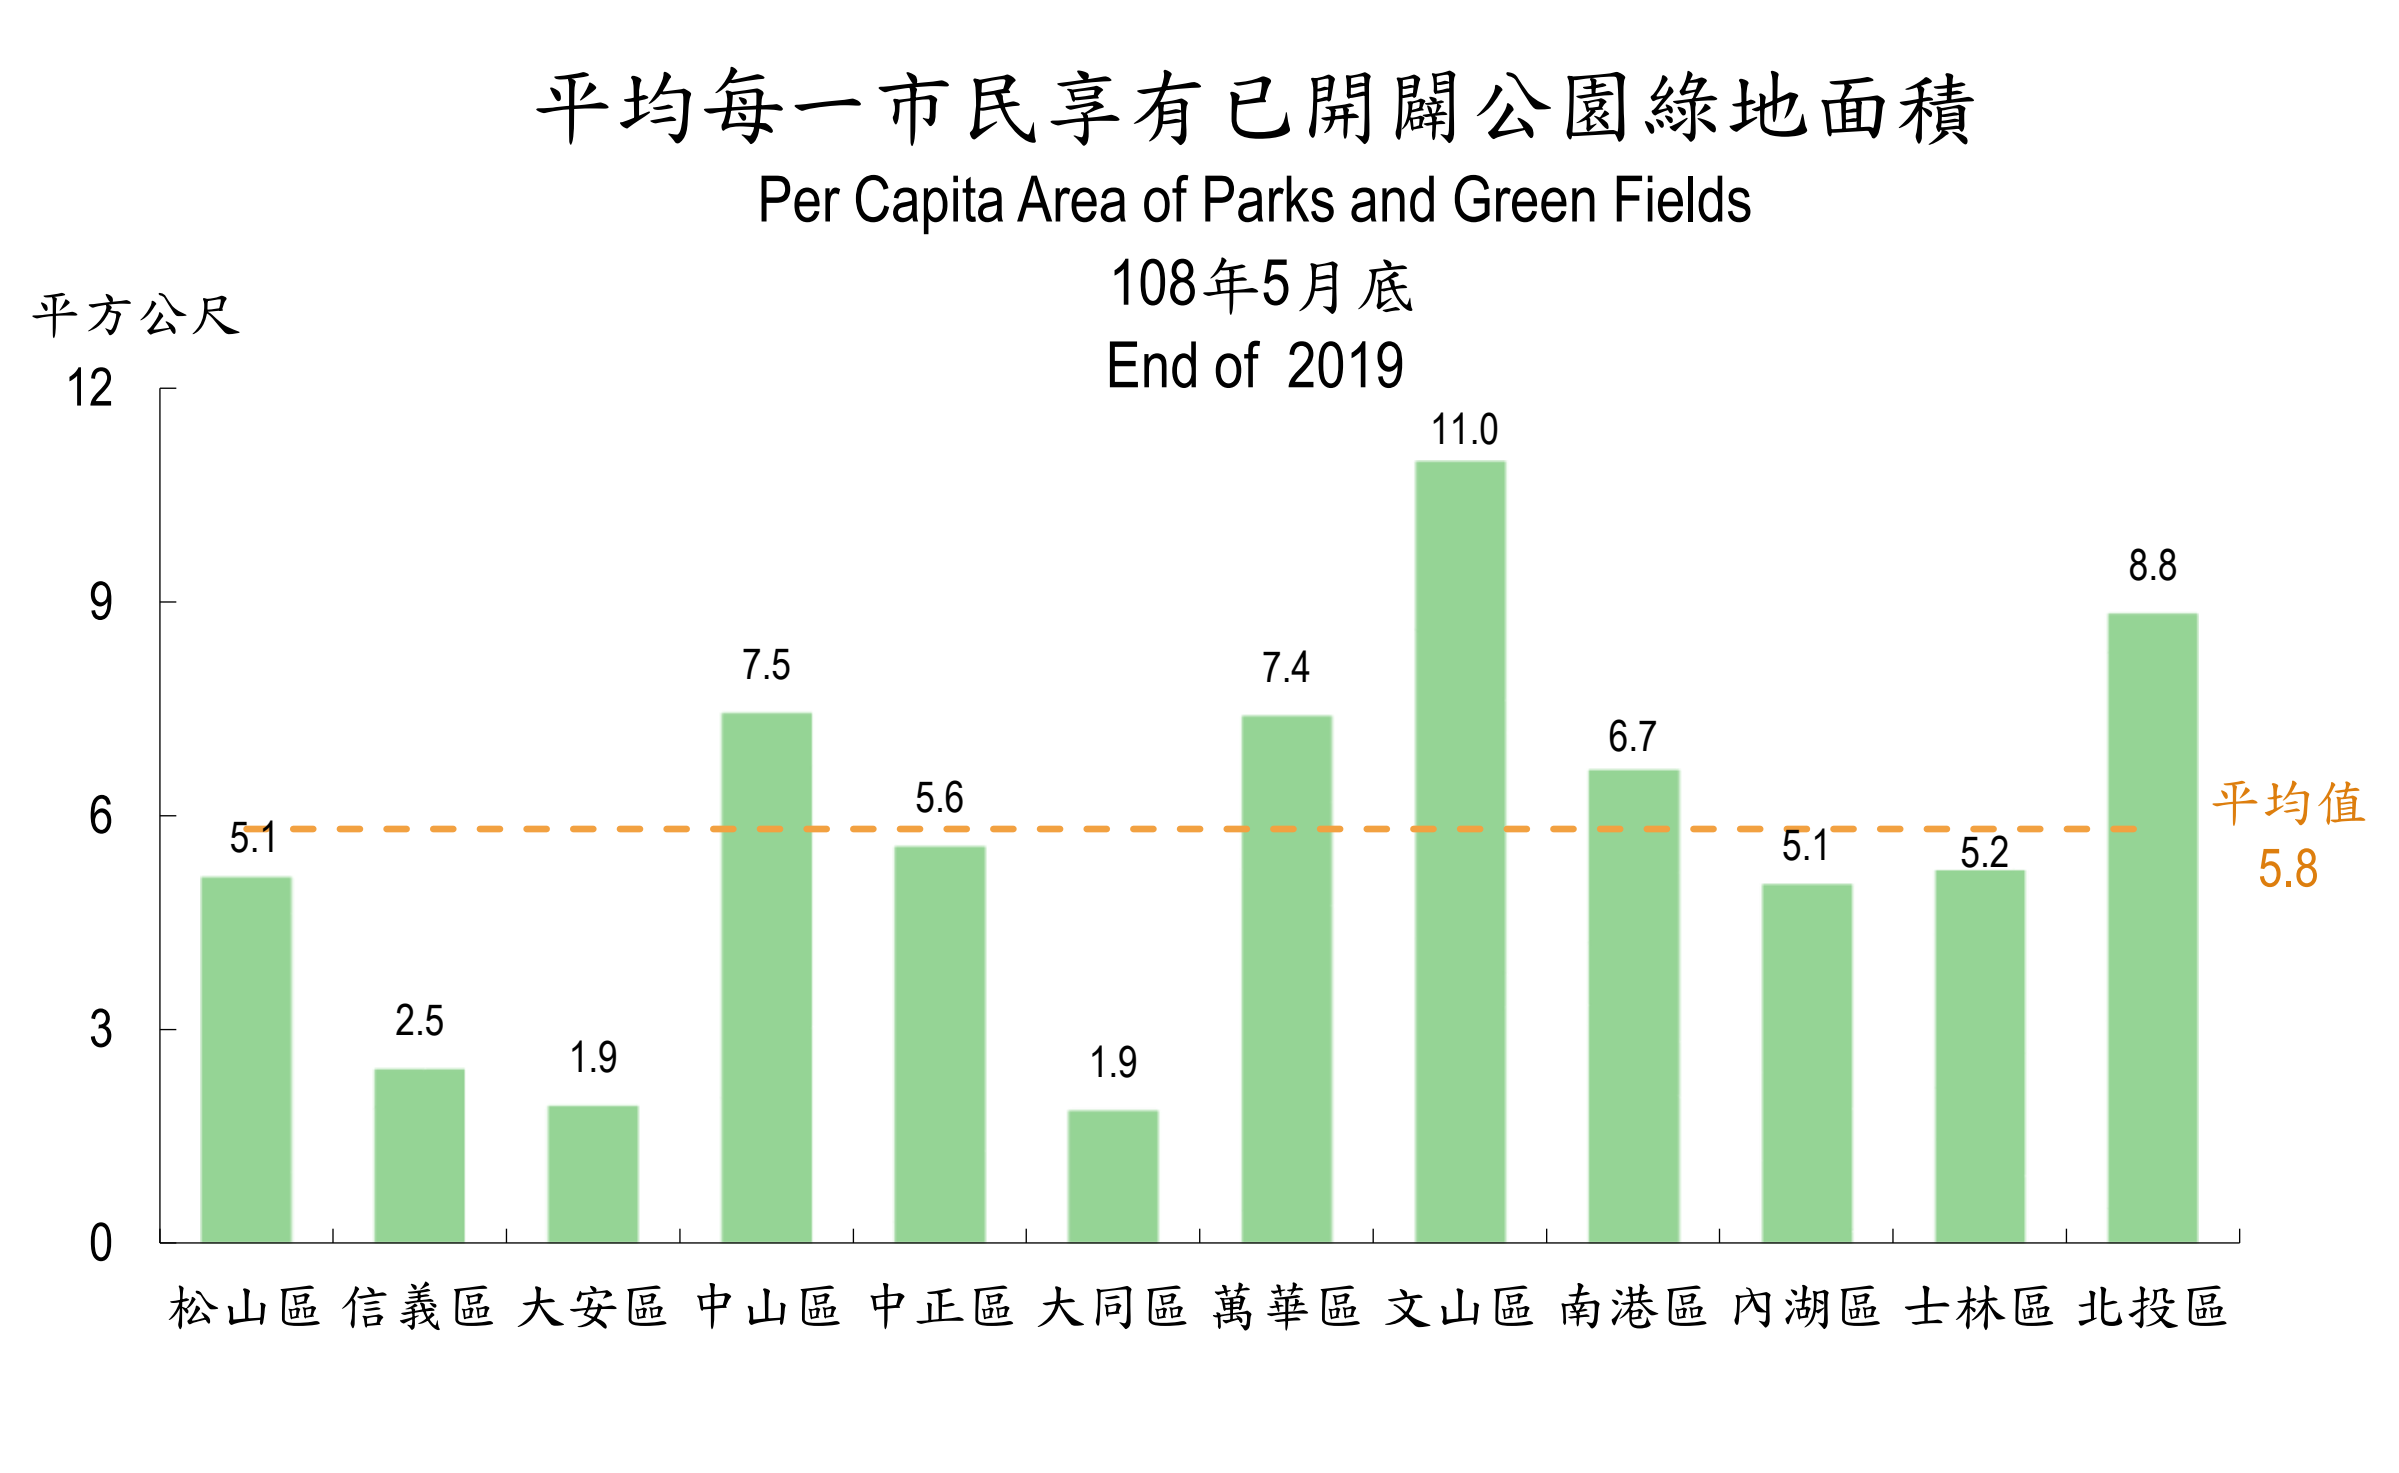

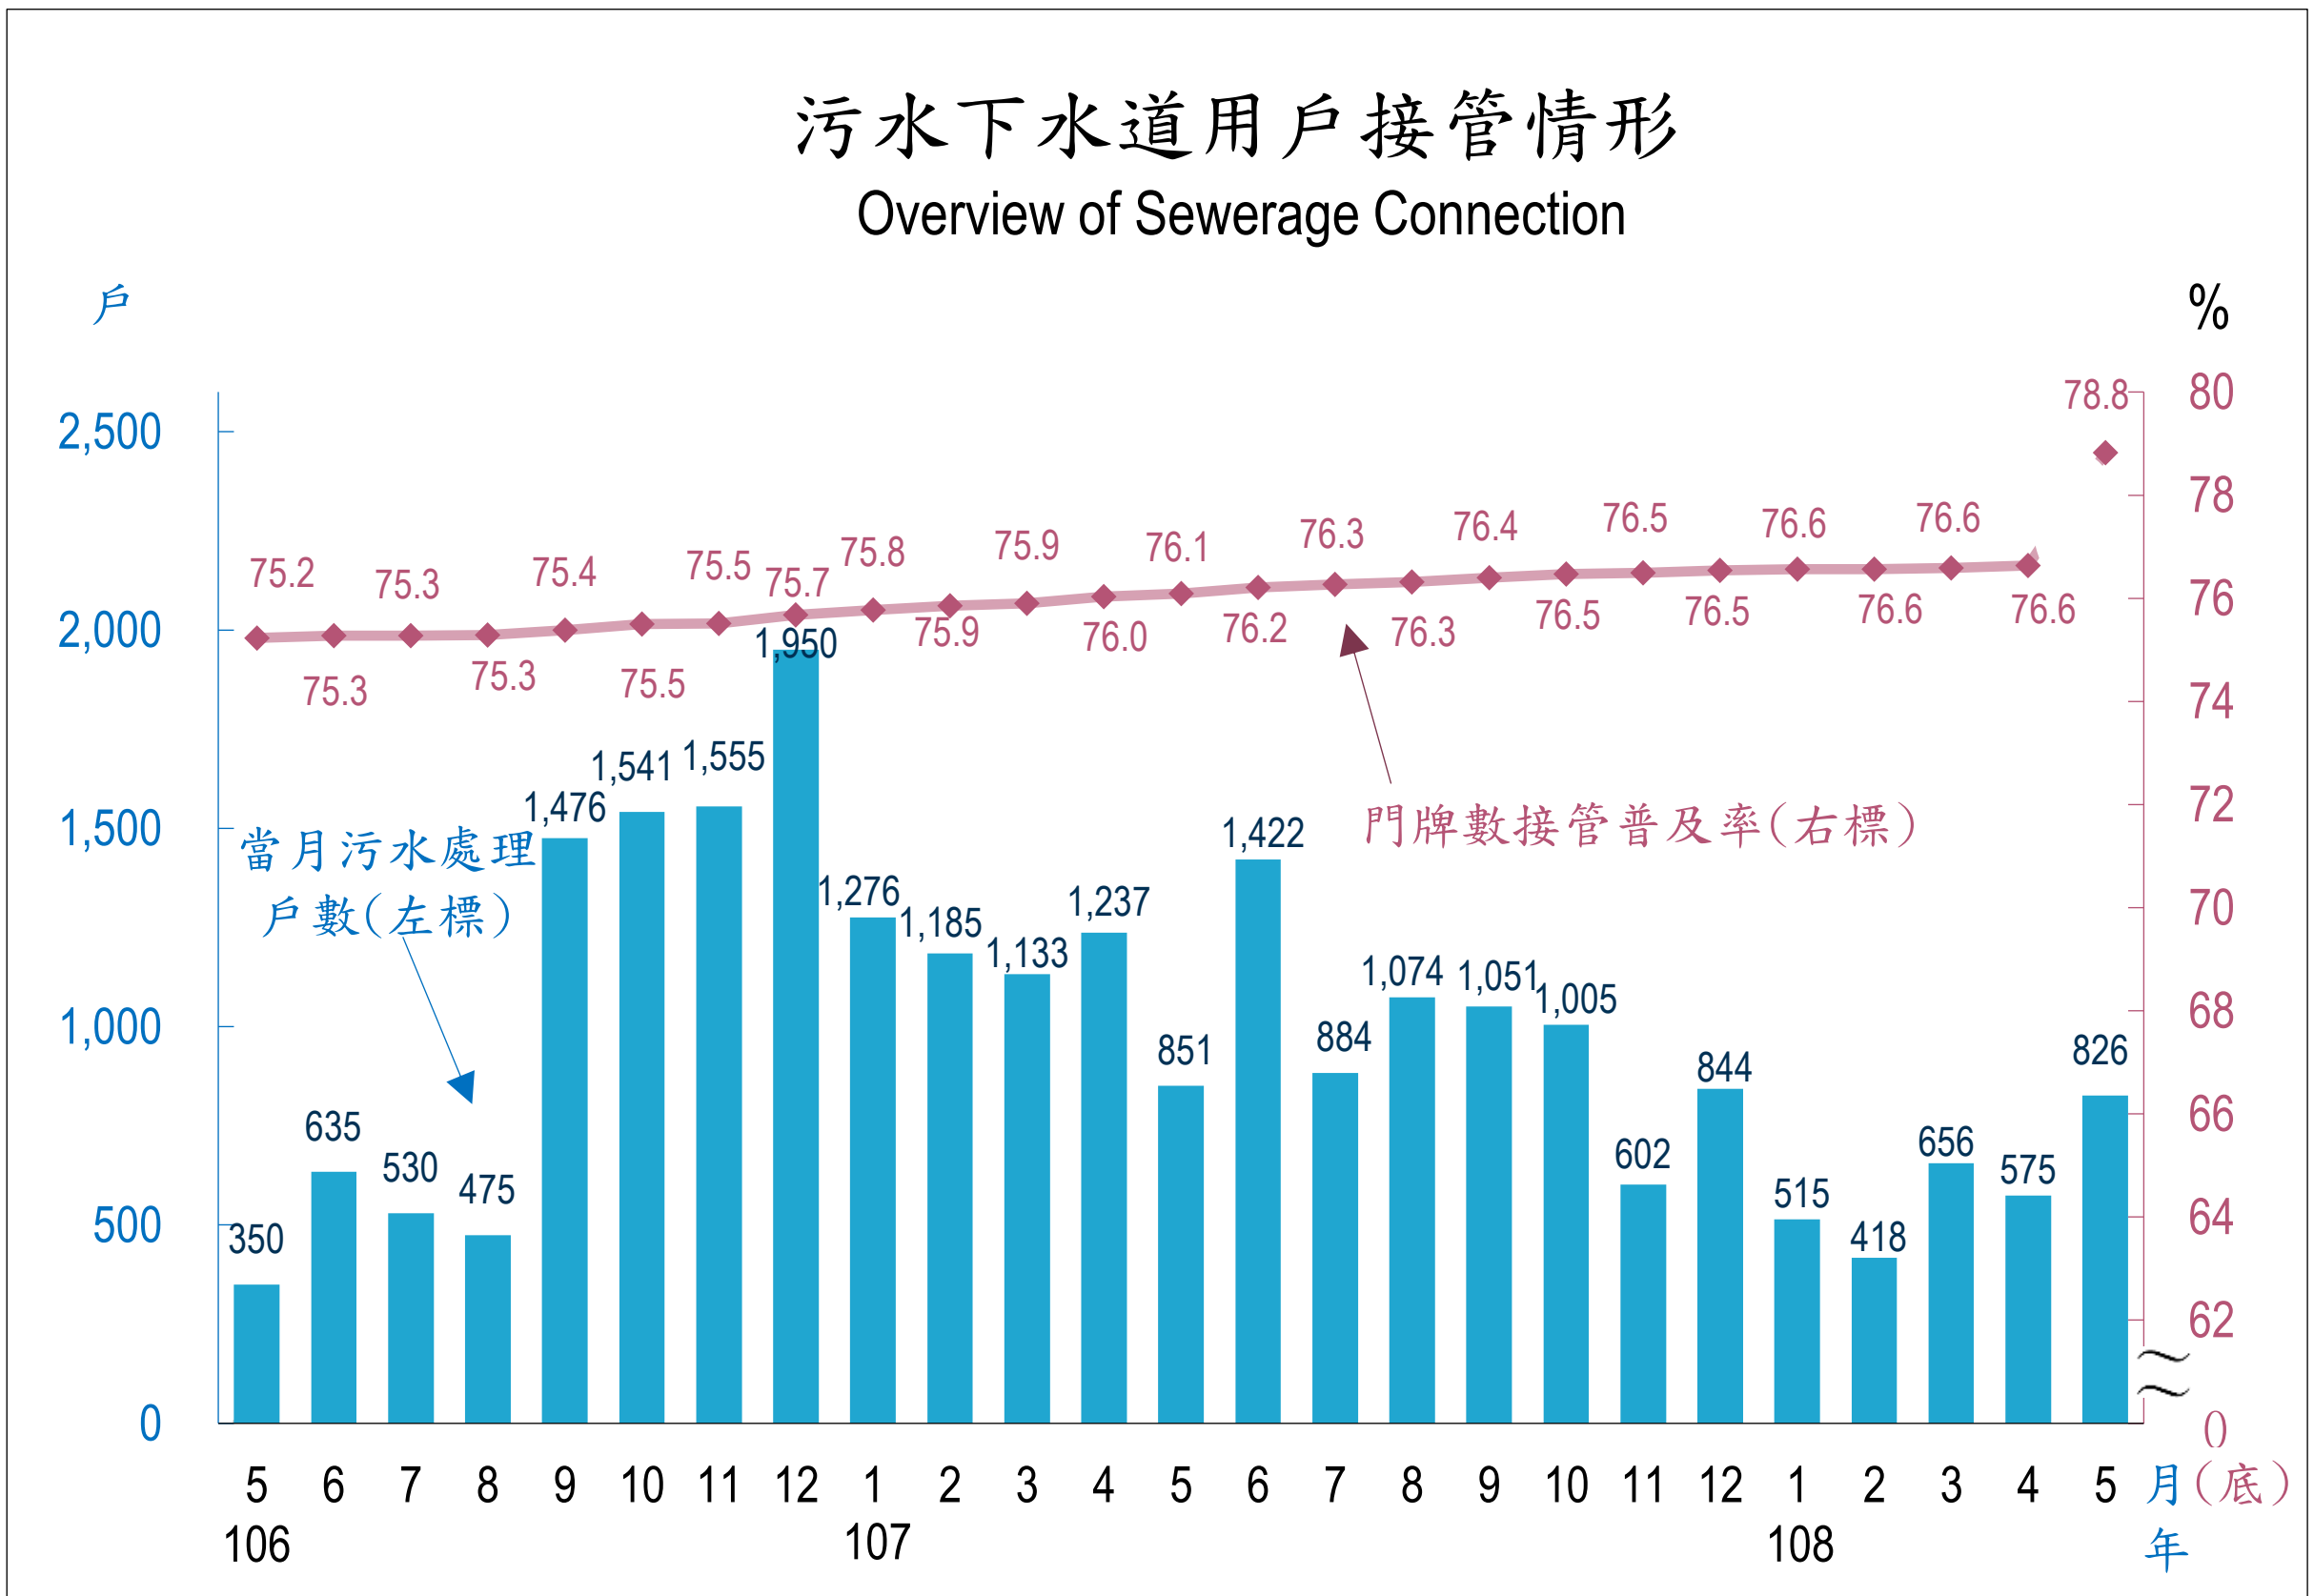

備註：108年5月起，門牌數接管普及率不計入建築物自設專用污水下水道設置戶數。

施工工程摘要

108年5月

Summary in May 2019

單位：件 unit：case

工程類別 Construction Category	總計 Total	完工 Completed 合計 Sub-total	完工 超前 Lead	完工 符合 Accord	完工 落後 Delay	施工中 Under Construction 合計 Sub-total	施工中 超前 Lead	施工中 符合 Accord	施工中 落後 Delay	施工中 停工 Work Suspension	備註 Note
總計 Total	**200**	**9**	**1**	**8**	**-**	**191**	**56**	**103**	**32**	**-**	
百分比 %	**100.0**	**4.5**	**0.5**	**4.0**	**-**	**95.5**	**28.0**	**51.5**	**16.0**	**-**	
1. 道路新建、拓寬、改善 Road Expansion, Improvement and New Constructions	**29**	-	-	-	-	29	2	21	6	-	詳表1
2. 橋梁新建、拓建、改善 Bridge Expansion, Improvement and New Constructions	**13**	-	-	-	-	13	3	9	1	-	詳表2
3. 人行道改善工程 Sidewalk Improvement Work	**7**	-	-	-	-	7	-	5	2	-	詳表3
4. 隧道、地下道工程 Tunnel Constructions	**1**	-	-	-	-	1	1	-	-	-	詳表4
5. 停車場新建 New Parking Lots Constructions	**3**	-	-	-	-	3	2	-	1	-	詳表5
6. 公有建築物工程 Public Building Constructions	**20**	-	-	-	-	20	11	2	7	-	詳表6
7. 共同管道及景觀工程 Communal Pipeline and Landscape Constructions	**7**	-	-	-	-	7	1	5	1	-	詳表7
8. 防洪工程 Flood Protection Constructions	**18**	-	-	-	-	18	4	12	2	-	詳表8
9. 抽水站新建、擴建 Rainwater Pump Station Expansion and New Constructions	**8**	-	-	-	-	8	4	3	1	-	詳表9
10. 雨水下水道新建、改善 Rainwater Drainage System Improvement and New Constructions	**23**	3	-	3	-	20	2	15	3	-	詳表10
11. 公園綠地新建、改善 Park Improvement and New Constructions	**32**	6	1	5	-	26	8	15	3	-	詳表11
12. 污水下水道新建、改善 Sewerage System Improvement and New Constructions	**24**	-	-	-	-	24	5	16	3	-	詳表12
13. 治山防災整體治理工程 Watershed Management and Disaster Prevention	**15**	-	-	-	-	15	13	-	2	-	詳表13

資料來源：工務局。
Source: Public Works Department.

施工中工程

Under Construction

單位：件 unit：case

年(月)別／機關別 Year (Month)／Sponsor Institution		總計 Total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	停工 Work Suspension
民國107年	**2018**					
1月	Jan.	155	59	61	35	-
2月	Feb.	144	56	65	23	-
3月	Mar.	157	63	63	31	-
4月	Apr.	177	65	74	38	-
5月	May	197	78	93	26	-
6月	June	205	79	106	20	-
7月	July	223	80	111	32	-
8月	Agu.	238	78	128	32	-
9月	Sep.	248	86	138	24	-
10月	Oct.	244	76	134	34	-
11月	Nov.	219	68	121	30	-
12月	Dec.	163	54	52	57	-
民國108年	**2019**					
1月	Jan.	153	52	50	51	-
2月	Feb.	131	46	47	38	-
3月	Mar.	144	46	64	34	-
4月	Apr.	164	61	81	22	-
5月	**May**	**191**	**56**	**103**	**32**	**-**
新建工程處 New Construction Office		82	22	41	19	-
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		54	8	41	5	-
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office		16	8	5	3	-
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		24	5	16	3	-
大地工程處 Geotechnical Engineering Office		15	13	-	2	-

資料來源：工務局。
Source: Public Works Department.

表1　道路新建、拓寬、改善工程

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**200,418**
新建工程處 New Construction Office	107	1. 107年度道路附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	1,958
	107	2. 107年度寬度8公尺以下一般道路更新及道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	4,260
	106-107	3. 基河路(兒童新樂園段)及兒童新樂園南側道路縫合工程	3,799
	108	4. 108年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	7,933
	108	5. 108年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	7,827
	108	6. 108年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	5,444
	108	7. 108年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	10,985
	108	8. 108年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	8,546
	108	9. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	1,943
	108	10. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	2,588
	108	11. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	2,139
	108	12. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	1,884
	108	13. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	3,984
	108	14. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	2,042

Table 1 Road Expansion, Improvement and New Constructions

May 2019

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
2,486	**5-40**	**46,327**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2**	**21**	**6**
預約維護			107.05	107.12		100.00	90.00			V
預約維護			107.03	107.12		100.00	98.43			V
270	13-14	3,780	107.11	108.07		67.00	67.00		V	
預約維護			108.04	109.03		4.50	4.50		V	
預約維護			108.05	109..05		0.00	0.00		V	
預約維護			108.05	108.12		0.10	0.10		V	
預約維護			108.04	108.12		10.00	10.00		V	
預約維護			108.04	109.03		1.50	1.50		V	
預約維護			108.04	109.03		0.00	0.00		V	
預約維護			108.04	108.12		4.85	4.85		V	
預約維護			108.04	108.12		0.00	0.00		V	
預約維護			108.05	108.12		2.00	2.00		V	
預約維護			108.04	108.12		2.00	2.00		V	
預約維護			108.04	108.12		0.00	0.00		V	

表1　道路新建、拓寬、改善工程（續）

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
	108	15. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	4,953
	108	16. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	4,240
	108	17. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	4,603
	108	18. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	3,698
	108	19. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	5,767
	108	20. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	8,739
	108	21. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(抵費地基金)	2,156
	108	22. 108年度災害搶修工程開口契約(第1標)(士林北投、中山大同)	1,493
	108	23. 108年度災害搶修工程開口契約(第2標)(大安文山、中正萬華)	552
	106-108	24. 福興公園南側道路新築工程	6,474
	104-108	25. 福國路延伸工程(第2期)	86,644
	107-108	26. 木柵路3段102巷6弄道路新築工程	991
	107-108	27. 吳興街220巷(信安街67巷)道路拓寬工程	3,493
	107-108	28. 開明街道路拓寬工程	858
	107-108	29. 興寧街66巷道路拓寬工程	427
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處。

Table 1 Road Expansion, Improvement and New Constructions (Cont.)

May 2019

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (m^2)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
預約維護			108.04	108.12		8.00	8.00		∨	
預約維護			108.04	108.12		0.00	0.00		∨	
預約維護			108.04	108.12		8.54	8.54		∨	
預約維護			108.04	108.12		2.77	2.77		∨	
預約維護			108.04	108.12		28.14	21.54			∨
預約維護			108.04	108.12		12.25	12.25		∨	
預約維護			108.04	108.12		12.25	12.25		∨	
預約維護			108.04	108.12		3.50	3.50		∨	
預約維護			108.04	108.12		0.00	0.00		∨	
102	12-14	1,331	107.07	109.01		37.90	82.10	∨		
1,420	10-40	31,546	107.11	110.11		3.01	3.01		∨	
200	5-6	1,200	107.12	108.05		100.00	70.30			∨
350	19-20	7,000	107.09	108.07		43.00	41.00			∨
69	7-8	549	107.11	108.05		100.00	61.58			∨
75	6-20	922	108.04	108.08		4.23	8.12	∨		

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

表2 橋梁新建、拓建、改善工程

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**284,320**
新建工程處 New Construction Office	107-108	1. 復興橋西側人行景觀橋暨自行車牽引道新築工程	6,263
	104-108	2. 福國路延伸工程(第2期)	①…
	105-111	3. 中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	231,898
	106-108	4. 成功橋拓寬工程	17,397
	106-108	5. 建國高架橋及舊環南高架耐震補強改善工程(第一標)	6,477
	107-109	6. 福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程	11,169
	108	7. 108年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第1標)(士林北投、中山大同區)	3,235
	108	8. 108年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第2標)(內湖南港、松山信義區)	3,235
	108	9. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第1標)(中山大同區)	929
	108	10. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第2標)(松山信義區)	929
	108	11. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第3標)(中正萬華區)	929
	108	12. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第4標)(內湖南港區)	929
	108	13. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第6標)(大安文山區)	929
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

Table 2 Bridge Expansion, Improvement and New Constructions

May 2019

工程內容 Construction Project						工期 Project Period			施工進度 Progress				
主橋 Main Span			引道 Lead Road			開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (㎡)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (㎡)								
1,094	**4-35.4**	**12,691**	**1,684**	**3-35**	**22,173**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3**	**9**	**1**
112	4-7	425	182	3-5	663	108.01	109.03		6.70	9.80	∨		
190	16	3,040	1,104	9-16	11,313	107.11	110.11		3.01	3.01		∨	
190	35.4	6,726	398	6-35	10,197	108.05	112.05		0.01	0.01		∨	
拓寬工程						106.10	108.11		75.86	73.36			∨
耐震補強改善						107.02	108.08		58.50	71.99	∨		
602	4-4.5	2,500	-	-	-	108.02	109.10		1.50	2.60	∨		
預約維護						108.04	108.12		7.81	7.81		∨	
預約維護						108.05	108.12		2.00	2.00		∨	
預約維護						108.04	109.03		0.00	0.00		∨	
預約維護						108.05	108.12		3.75	3.75		∨	
預約維護						108.05	108.12		1.40	1.40		∨	
預約維護						108.05	108.12		4.40	4.40		∨	
預約維護						108.04	108.12		0.10	0.10		∨	

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the road project expenditure.

表3　人行道改善工程

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
新建工程處 New Construction Office		**總　計**	**20,952**
	107	1. 107年度臺北市人行道改善工程開口契約(第三標)(中正、萬華區)	2,739
	107	2. 107年度臺北市人行道改善工程開口契約(第四標)(內湖、南港區)	2,739
	108	3. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第二標)(松山、信義區)	2,756
	108	4. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第三標)(中正、萬華區)	2,756
	108	5. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第四標)	2,756
	108	6. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第五標)(士林、北投區)	2,756
	108	7. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)(大安、文山區)	4,450

資料來源：新建工程處。

Table 3　Sidewalk Improvement Work

May 2019

工程內容　Construction Project			工期　Project Period			施工進度　Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**-**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-**	**5**	**2**
	預約維護		107.04	108.03		100.00	82.58			V
	預約維護		107.04	107.12		100.00	96.00			V
	預約維護		108.05	108.12		1.00	1.00		V	
	預約維護		108.04	108.12		6.00	6.00		V	
	預約維護		108.04	108.12		9.00	9.00		V	
	預約維護		108.04	108.12		15.00	15.00		V	
	預約維護		108.04	108.12		2.30	2.30		V	

Source: New Construction Office.

表4　隧道、地下道工程

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**10,677**
新建工程處 New Construction Office	107	1. 臺北市車(人)行地下道隧道智慧巡檢圖控整合系統暨機電汰換統包工程	10,677

資料來源：新建工程處。

表5　停車場工程

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**-**
新建工程處 New Construction Office	104-108	1. 臺北市大龍社區及市場重建工程(附設地下停車場)	①…
	106-111	2. 臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程(附設地下停車場)	①…
	103-111	3. 中山國中綜合大樓新建工程(附設地下停車場)	①…
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於公有建築工程內。

Table 4 Tunnel Constructions

May 2019

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**-**	**-**	--	--	--	--	--	**1**	**-**	**-**
-	-	-	107.09	108.06		65.85	66.32	v		

Source: New Construction Office.

Table 5 Parking Lots Constructions

May 2019

工程內容 Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
總面積 Area (平方公尺) (㎡)	大型車停車位 (格位) (sites)	小型車停車位 (格位) (sites)	機車停車位 (格位) (sites)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
49,703	**282**	**514**	**260**	--	--	--	--	--	**2**	**-**	**1**
11,400	5	199	204	106.03	108.07		82.07	74.56			v
28,975	277	27	56	106.12	111.07		23.01	25.27	v		
9,328	-	288	-	107.08	110.10		14.13	14.26	v		

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the Public Building project expenditure.

表6　公有建築物工程

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱① Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**1,665,910**
新建工程處 New Construction Office	97-108	1. 北部流行音樂中心興建工程(南基地)	83,528
	104-108	2. 臺北市立明倫高級中學多功能大樓新建工程	73,933
	104-108	3. 臺北市政府警察局刑事警察大隊辦公大樓新建工程(建築工程)	125,713
	104-108	4. 臺北市大龍社區及市場重建工程	112,654
	104-108	5. 臺北市政府警察局南港分局南港派出所新建工程(建築工程)	48,308
	105-109	6. 臺北市市立大學圖書館改建工程	52,145
	106-111	7. 臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程	135,285
	100-109	8. 臺北藝術中心接續工程(第二標-昇降設備工程)	5,208
	101-108	9. 臺北市政府警察局士林分局社子派出所新建工程	75,097
	107-108	10. 「南門市場臨時攤棚工程」設計施工統包工程	16,237
	103-111	11. 中山國中綜合大樓新建工程	75,436
	100-109	12. 臺北藝術中心接續工程(第二標)	144,937
	102-110	13. 臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	116,037
	107-112	14. 臺北市敦化國小校舍拆除改建工程案-臨時教室(中繼教室)	6,519
	107	15. 養護工程隊第三分隊辦公房舍整修統包工程	667
	107	16. 臺北市北投區稻香市場拆除工程	1,290
	107	17. 臺北市立南港高級中學科學大樓及宿舍建築物拆除工程	936
	107-110	18. 臺北市政府消防局劍潭分隊重建工程	40,679
	108	19. 「北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)-專案住宅新建工程」修繕工程	500
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	88下半年-105	20. 代辦臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程	550,800

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①工程名稱如加註(建築工程)或(水電工程)者，係為利表達該細項工程之工期及施工進度，惟工程費仍係代辦該案之總經費(包含建築、水電、空調等細項工程)。

Table 6 Public Building Constructions

May 2019

工程內容 Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
棟數 No. of Buildings (棟) (building)	層數 Storeies 地上 Ground (層) (storey)	層數 Storeies 地下 Under-ground (層) (storey)	總面積 Area (平方公尺) (m²)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
29	**--**	**--**	**448,348**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11**	**2**	**7**
4	6	1	24,335	105.04	108.06		76.64	76.66	∨		
1	5	1	16,195	105.06	108.07		98.55	98.65	∨		
1	17	5	25,984	105.10	109.07		48.99	50.67	∨		
1	13	4	32,032	106.03	108.07		82.07	74.56			∨
1	14	3	9,431	106.04	108.07		73.35	73.22			∨
1	-	-	11,752	106.04	108.06		75.03	75.98	∨		
5	5	3	34,228	106.12	111.07		23.01	25.27	∨		
1	-	-	-	107.04	109.01		46.84	28.91			∨
1	11	3	12,045	107.06	109.11		17.09	16.75			∨
1	2	-	7,386	107.08	108.06		86.77	81.21			∨
1	4	1	6,413	107.08	110.10		14.13	14.26	∨		
1	-	-	58,658	107.09	109.05		20.74	22.96	∨		
1	4	2	30,288	107.10	110.04		8.95	24.39	∨		
1	-	-	2,941	108.01	108.07		24.08	25.36	∨		
1	-	-	542	107.11	108.07		5.00	5.00		∨	
1	-	-	9,068	108.02	108.05		100.00	90.62			∨
3	-	-	3,097	108.02	108.08		65.00	85.00	∨		
1	10	2	8,608	108.03	110.05		1.48	1.58	∨		
-	-	-	-	108.05	108.08		0.50	0.50		∨	
2	-	-	155,346	105.11	111.08		45.10	43.25			∨

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The construction name adding (construction work) or (plumbing/electrical wiring work), is to clearly express this project's construction period and progress. The construction expense is the total funds (including construction, plumbing/electrical wiring, air conditioning and so on.)

表7　共同管道及景觀工程

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**68,553**
新建工程處 New Construction Office	104-108	1. 福國路共同管道第二期工程	57,676
	106-107	2. 基河路(兒童新樂園段)及兒童新樂園南側道路縫合工程	3,799
	106-108	3. 臺北市共同管道監控整合系統工程	1,852
	108	4. 108年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程開口契約	3,391
	108	5. 108年度代辦人民申請設置斜坡道施作預約工程	413
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	107	6. 107年度水利處轄管濕地及滯洪池等棲地預約維護工程	906
	108	7. 金瑞治水園區蜻蜓棲地復育工程	515

資料來源：新建工程處、水利工程處。

Table 7 Communal Pipeline and Landscape Constructions

May 2019

工程內容 Construction Project	工期 Project Period 開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	施工進度 Progress 預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
--	--	--	--	--	--	1	5	1
1.共同管道工程：幹管1,273公尺、支管845公尺、推管78公尺。 2.其他工程：纜線管路等。	106.11	107.11		100.00	21.08			v
1.新建人行步道。 2.休憩設施。 3.植栽綠美化。 4.照明設施。	107.11	108.07		67.00	67.00		v	
整合本市目前營運中共同管道（東西向、基隆河截彎取直、南港經貿園區、洲美快速道路、地鐵東延、大度路、捷運信義線及捷運松山線）監控訊號	108.01	109.01		4.94	4.95	v		
改善本市建築基地內騎樓及沿街面人行空間高低不平	108.05	108.12		0.00	0.00		v	
108年度代辦人民申請設置斜坡道工程	108.05	108.12		0.00	0.00		v	
辦理本市河川濕地及滯洪池棲地生態保育維護工作	107.06	108.12		67.79	67.79		v	
辦理水域環境生態營造、生態廊道連繫營造、道路鋪面生態改善、入口意象、導覽設施系統等	108.04	108.09		20.00	20.00		v	

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

表8　防洪工程

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		**總　　計**	**164,572**
	104	1. 北投士林科技園區區段徵收公共工程-填土整地工程(第2期-T16、T17、T18工區)	29,508
	105	2. 北投士林科技園區區段徵收公共工程-填土整地工程（第2期-T16、T17、T18以外工區）	82,147
	105-107	3. 洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤防新建工程	36,385
	107	4. 雙溪右岸福林橋下護岸改善工程	760
	108	5. 士林區富光里葫蘆街61巷等5處側溝更新工程	743
	108	6. 108年度南區水利建造物預約維護檢修改善工程	595
	108	7. 108年度沉沙池清疏及維護工程	432
	105-107	8. 北投洲美堤防外灘地整建工程	7,100
	108	9. 108年度北區水利建造物預約維護檢修改善工程	595
	108	10. 108年度全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程	189

Table 8 Flood Protection Constructions

May 2019

工程內容 Construction Project					工期 Project Period			施工進度 Progress				
堤防 Embank-ment (公尺) (m)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	閘門 Gate (座) (set)	其他 Others	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	-	-	-	--	--	--	--	--	**4**	**12**	**2**
北投士林科技園區區段徵收公共工程-填土整地工程					104.10	109.01		88.49	87.11			V
北投士林科技園區區段徵收公共工程-填土整地工程(T16、T17、T18以外工區)					107.07	109.05		42.16	41.48			V
洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤防新建工程					107.12	109.06		31.27	40.96	V		
低水護岸改善L=96m					108.02	108.06		86.20	88.20	V		
更新既有側溝、集水井、暗溝和AC銑鋪					108.03	108.07		49.00	49.00		V	
南區水利建造物預約維護檢修改善工程					108.03	108.12		39.10	39.10		V	
辦理全市公私有沉沙池清疏					108.03	108.12		56.00	56.00		V	
自行車道、人行道、低水護岸整建、景觀高燈、獨木舟碼頭景觀工程					108.03	109.01		6.04	6.04		V	
基隆河：右岸雙溪匯流口至淡水河關渡省市交界處、磺溪：左、右岸、磺港溪、貴子坑溪、水磨坑溪之水利建造物預約維護檢修改善					108.03	108.12		73.10	73.10		V	
全市河濱公園疏散門及堤頂擋水門等維護檢修工程					108.03	108.12		1.00	1.00		V	

表8　防洪工程(續)

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
	108	11. 108年度西區水利建造物預約維護檢修改善工程	595
	108	12. 108年度東區水利建造物預約維護檢修改善工程	595
	108	13. 景美溪右岸恆光橋至道南橋段堤坡改建工程	1,065
	108	14. 基隆河河道(含圓山河支流)疏浚工程	3,380
	108	15. 108年度淡水河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(淡水河淡1號疏散門至淡5號疏散門段)	121
	108	16. 108年度基隆河系災後淤土、樹木復原維護工程(基隆河右岸高速公路內湖橋上游，內溝、大溝溪及金瑞園區)	121
	108	17. 108年度基隆河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(基隆河左岸高速公路內湖橋至中山橋段)	121
	108	18. 108年度基隆河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(基隆河右岸高速公路內湖橋至雙溪匯流口及雙溪左岸)	121

資料來源：水利工程處。

Table 8 Flood Protection Constructions (Cont.)

May 2019

工程內容 Construction Project					工期 Project Period			施工進度 Progress				
堤防 Embank-ment (公尺) (m)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	閘門 Gate (座) (set)	其他 Others	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
基隆河：左岸-高速公路內湖橋至社子島頭；右岸-高速公路內湖橋至雙溪匯流口、雙溪：左、右岸、淡水河：台北橋至社子島頭					108.04	108.12		15.00	15.00		V	
基隆河：左岸-高速公路內湖橋至大坑溪匯流口；右岸-高速公路內湖橋至內溝溪匯流口、內溝溪、大坑溪、四分溪					108.04	108.12		14.50	14.50		V	
景美溪堤坡補強及鋪設蜂巢格調					108.04	108.07		37.00	47.00	V		
辦理基隆河雙溪部分河道及中山區圓山河河道清淤					108.04	108.08		14.50	15.20	V		
淡水河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(淡水河淡1號疏散門至淡5號疏散門段)					108.04	108.12		99.00	99.00		V	
基隆河系災後淤土、樹木復原維護工程(基隆河右岸高速公路內湖橋上游，內溝、大溝溪及金瑞園區)					108.05	108.12		45.00	45.00		V	
基隆河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(基隆河左岸高速公路內湖橋至中山橋段)					108.05	108.12		10.00	10.00		V	
基隆河系災後淤土、樹木復原預約維護工程(基隆河右岸高速公路內湖橋至雙溪匯流口及雙溪左岸)					108.05	108.12		10.00	10.00		V	

Source: Hydraulic Engineering Office

表9　抽水站新建、擴建工程

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	工程內容 抽水機 Pump Set 數量 Number (座) (set)	口徑 caliber (吋) -	抽水量 Pumping Capacity (立方公尺/秒) (m³/sec)
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		**總　計**	**126,817**	**-**	**-**	**-**
	105-108	1. 抽水站第六分區暨總二管理中心自動化監控系統建置工程	20,860	-	-	-
	105-108	2. 玉成抽水站機組更新工程	76,485	-	-	-
	107	3. 大直二抽水站新建工程	26,540	-	-	-
	108	4. 全市抽水站站房及閘門房結構檢修工程(洲美一及福德抽水站)	949	-	-	-
	108	5. 抽水站監視系統更新工程	182	-	-	-
	108	6. 108年度抽水站機組維修及更新工程	326	-	-	-
	108	7. 108年度抽水站機房整修鐵件更新工程	328	-	-	-
	108	8. (108)抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程	1,148	-	-	-

資料來源：水利工程處。

Table 9 Rainwater Pump Station Expansion and New Constructions

May 2019

Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
發電機 Electric Generator		抽水機房 Pump Set Room		開工日期	預定完工日期	實際完工日期	預定	實際	超前	符合	落後
數量 Number (座)	馬力 Horse-power (匹)	數量 Number (座)	面積 Area (平方公尺)				Scheduled	Actual	Lead (件)	Accord (件)	Delay (件)
(set)	(hp)	(set)	(㎡)	Starting Date	Scheduled Completion Date	Actual Completed Date	(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	**-**	**-**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4**	**3**	**1**
抽水站第六分區暨總二管理中心自動化監控系統建置工程				105.09	108.07		99.40	97.00			V
抽水站機組更新				105.11	108.11		70.71	72.96	V		
建置大直二抽水站一座，包含抽水站體、前池5部4cms豎軸式抽水機組、柴油引擎、冷卻系統、電動攔污柵、儀控設備及自動化系統等				107.12	109.04		5.15	20.75	V		
洲美一抽水站以鋼構型式重建管理房及發電機室，設置臨時貨櫃屋並遷移水情設備及更新圍牆，福德抽水站更新重力吊門機一座				108.02	108.06		77.00	80.30	V		
抽水站獨立閘門監視系統更新工程				108.03	108.06		0.50	0.50		V	
本市抽水站機組維修及更新工程				108.03	108.07		26.00	26.77	V		
本市各抽水站機房整修及設施修復、更新或增設				108.03	108.12		0.10	0.10		V	
辦理抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程				108.04	108.12		9.57	9.57		V	

Source: Hydraulic Engineering Office.

表10　雨水下水道新建、改善工程

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**18,263**
新建工程處 New Construction Office		**新工處主辦工程計**	**-**
	106-108	1. 福興公園南側道路新築工程	①…
	107-108	2. 開明街道路拓寬工程	①…
	104-108	3. 福國路延伸工程(第2期)	①…
	107-108	4. 木柵路3段102巷6弄道路新築工程	①…
	107-108	5. 興寧街66巷道路拓寬工程	①…
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		**水利處主辦工程計**	**18,263**
	107	6. 107年度雨水下水道預約維護工程(中山、松山區)	1,466
	107	7. 107年度雨水下水道預約維護工程(文山、萬華區)	1,466
	107	8. 107年度雨水下水道預約維護工程(士林、大同區)(第二標)	732
	107	9. 107年度雨水下水道預約維護工程(大安、中正區)(第二標)	1,104
	108	10. (108)雨水下水道人孔調升降工程(北區工區)	818
	108	11. 108年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(南區)	597
	108	12. 108年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(北區)	597
	108	13. (108)雨水下水道人孔調升降工程(南區工區)	1,008
	108	14. (108)雨水下水道人孔調升降工程(北投工區)	659
	108	15. (108)雨水下水道人孔調升降工程(南內工區)	575
	108	16. 108年度雨水下水道預約維護工程（南港、內湖區)	1,373
	108	17. 108年度雨水下水道預約維護工程（北投區)	1,194
	108	18. 108年度雨水下水道預約維護工程（大安、中正區)	1,373
	108	19. 108年度雨水下水道預約維護工程（士林、大同區)	1,373
	108	20. 108年度雨水下水道預約維護工程(中山、松山區)	1,373
	108	21. 108年度雨水下水道預約維護工程(信義區)	597
	108	22. 108年度雨水下水道預約維護工程（文山、萬華區)	1,194
	108	23. (108)雨水下水道人孔調升降緊急搶修工程	766

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

Table 10 New and Improvement Constructions of Rainwater Drainage System

May 2019

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
側溝 Side Ditch (公尺) (m)	箱涵 Box Culvet (公尺) (m)	管涵 Pipe Culvet (公尺) (m)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
1,324	**1,206**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2**	**18**	**3**
1,324	**1,206**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2**	**1**	**2**
92	-	-	107.07	109.01		37.90	82.10	∨		
100	-	-	107.11	108.05		100.00	61.58			∨
633	1,206	-	107.11	110.11		3.01	3.01		∨	
364	-	-	107.12	108.05		100.00	70.30			∨
135	-	-	108.04	108.08		4.23	8.12	∨		
-	**-**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-**	**17**	**1**
預約維護工程			107.03	108.05	108.05	100.00	100.00		∨	
預約維護工程			107.04	108.05	108.05	100.00	100.00		∨	
預約維護工程			107.07	108.05		100.00	78.00			∨
預約維護工程			107.08	108.05	108.05	100.00	100.00		∨	
人孔調升降緊急搶修工程			108.02	108.12		40.00	40.00		∨	
緊急搶修預約維護工程			108.02	108.12		72.00	72.00		∨	
緊急搶修預約維護工程			108.03	108.12		16.00	16.00		∨	
人孔調升降緊急搶修工程			108.03	108.12		33.00	33.00		∨	
人孔調升降緊急搶修工程			108.03	108.12		21.43	21.43		∨	
人孔調升降緊急搶修工程			108.03	108.12		17.00	17.00		∨	
預約維護工程			108.03	108.12		20.00	20.00		∨	
預約維護工程			108.03	108.12		6.00	6.00		∨	
預約維護工程			108.03	108.12		35.50	35.50		∨	
預約維護工程			108.03	108.12		23.00	23.00		∨	
預約維護工程			108.03	108.12		16.00	16.00		∨	
預約維護工程			108.04	108.12		15.50	15.50		∨	
預約維護工程			108.04	108.12		17.00	17.00		∨	
人孔調升降緊急搶修工程			108.05	108.12		7.00	7.00		∨	

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the road project expenditure.

表11　公園綠地新建、改善工程

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	總面積 Total Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Side-walk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (no.)	涼亭 Arbor (座) (no.)	花架 Flower Shelf (處) (no.)	欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
		總　計	**50,142**	**39,839**	**11,956**	**5,592**	**8,498**	**238**	**1**	**3**	**1,520**
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office		**公園處主辦工程計**	**43,527**	**39,839**	**11,956**	**5,592**	**8,498**	**238**	**1**	**3**	**1,520**
	107	1. 金杭公園及金山公園新建工程(G-107-09-107168)	2,378	6,107	952	397	952	-	-	-	-
	107	2. 新新公園新建工程(G-107-09-107169)	6,788	25,373	1,948	-	449	-	-	2	491
	108	3. 日善(萬華411號)公園新建工程(G-108-108102)	1,360	2,247	733	-	-	39	-	1	-
	108	4. 景勤1號(信義415)公園新建工程	3,590	6,112	2,573	-	-	16	-	-	-
	107	5. 大安森林公園美化工程(107-164)	2,299	…	-	-	-	-	-	-	67
	107	6. 107年度兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第2期)(107-126)	2,372	…	-	1,300	-	-	-	-	-
	108	7. 108年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所所轄園路改善工程(107-174)	333	…	829	-	307	-	-	-	139
	108	8. 108年度本市公園、廣場園路整平改善工程-青年公園管理所所轄園路改善工程(107-175)	256	…		-	1,196	18	-	-	-
	108	9. 108年度本市公園、廣場園路整平改善工程-園藝工程隊所轄園路改善工程(107-178)	262	…	-	-	752	-	-	-	-
	107	10. 107年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第1期)(107-137)	1,572	…	-	1,205	-	-	-	-	45
	107	11. 107年度實驗性公園兒童遊戲場改善工程(107-157)	2,222	…	292	292	-	7	-	-	57

Table 11 Park Improvement and New Constructions

May 2019

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swim-ming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facility (公尺) (m)	球場(運動場) Sta-dium (處) (lot)	無障礙坡道 Barrier-free Ramp (座) (set)	舖植草皮 Turfing (平方公尺) (m²)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定進度 Sche-duled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
2,366	**-**	**651**	**67**	**3**	**-**	**1**	**18,987**	**86,660**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9**	**20**	**3**
2,366	**-**	**651**	**67**	**3**	**-**	**1**	**18,987**	**86,660**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9**	**9**	**3**
111	-	17	6	1	-	-	1,392	26,970	107.12	108.07		41.00	42.50	v		
343	-	248	-	-	-	-	8,092	45,590	107.11	108.08		30.88	43.40	v		
131	-	28	-	-	-	-	1,228	850	108.04	108.10		5.14	25.47	v		
581		196	-	-	-	-	3,534	9,136	108.04	108.11		8.36	8.09			v
-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.11	108.06	108.05	100.00	100.00	v		
-	-	-	7	-	-	-	-	-	107.11	108.05	108.05	100.00	100.00		v	
101	-	-	-	-	-	-	-	-	108.01	108.05	108.05	100.00	100.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.01	108.05	108.05	100.00	100.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.02	108.05	108.05	100.00	100.00		v	
-	-	-	16	-	-	1	5	-	107.11	108.06		96.02	94.20			v
-	-	-	10	-	-	-	-	-	107.08	108.08		89.72	99.40	v		

表11　公園綠地新建、改善工程（續1）

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	總面積 Total Area (平方公尺) (㎡)	土木工程						
					廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Side-walk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (no.)	涼亭 Arbor (座) (no.)	花架 Flower Shelf (處) (no.)	欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office	107	12. 107年度景觀公廁設置工程(107-155)	717	…	-	-	-	-	-	-	-
	108	13. 108年度本市公園、廣場園路整平改善工程-花卉試驗中心所轄園路改善工程(107-176)	536	…	-	-	1,715	28	-	-	-
	108	14. 108年度本市公園、廣場園路整平改善工程-陽明山公園管理所暨園藝管理所所轄園路改善工程(107-177)	585	…	-	-	53	-	-	-	258
	108	15. 108年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所所轄園路改善工程(107-179)	5,996	…	-	-	1,820	-	-	-	
	108	16. 圓山公園管理所辦公室氣密窗更新相關工程(G-108-123)	124	…	-	-	-	-	-	-	-
	107	17. 南港公園更新工程(第二期)(107-097)	7,195	…	425	1,683	800	_	1	_	82
	108	18. 108年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程(108-124)	928	…	1,521	200	-	15	-	-	-
	108	19. 興隆公園更新工程(108-113)	2,289	…	1,537	295	-	36	-	-	-
	108	20. 108年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、松山區、大同區公園整建工程(108-132)	670	…	878	-	-	3	-	-	71
	108	21. 108年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(108-131)	1,056	…	269	221	454	76	-	-	310

Table 11 Park Improvement and New Constructions (Cont. 1)

May 2019

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swim-ming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facility (公尺) (m)	球場(運動場) Sta-dium (處) (lot)	無障礙坡道 Barrier-free Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (㎡)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定進度 Sche-duled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.08	108.05		100.00	76.50			v
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.02	108.06		69.73	76.35	v		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.01	108.06		75.00	75.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.01	108.06		67.88	67.88		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.05	108.07		8.76	9.12	v		
853	_	110	15	_	_	_	2,189	3,874	107.04	108.08		69.38	69.53	v		
-	-	-	8	2	-	-	-	-	108.05	108.10		6.67	6.67		v	
230	-	52	-	-	-	-	2,547	240	108.04	108.10		5.83	6.41	v		
15	-	-	-	-	-	-	-	-	108.05	108.10		0.12	0.12		v	
-	-	-	5	-	-	-	-	-	108.05	108.11		0.00	0.00		v	

表11　公園綠地新建、改善工程（續2完）

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	總面積 Total Area (平方公尺) (m²)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (m²)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (m²)	園路人行道 Side-walk (平方公尺) (m²)	座椅 Chair (座) (no.)	涼亭 Arbor (座) (no.)	花架 Flower Shelf (處) (no.)	欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		**水利處主辦工程計**	**6,615**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	107	22. 107年度全市河濱公園水電設施預約維護工程	574	…	-	-	-	-	-	-	-
	107	23. 107年度全市河濱公園花海工程	854	…	-	-	-	-	-	-	-
	108	24. 108年度全市河濱公園綠化預約維護工程	800	…	-	-	-	-	-	-	-
	108	25. 108年度基隆河美堤河濱公園颱風豪雨碼頭、廁所等設施撤離工程	203	…	-	-	-	-	-	-	-
	108	26. 108年度北區河濱公園土木預約維護工程	670	…	-	-	-	-	-	-	-
	108	27. 108年度東區河濱公園土木預約維護工程	670	…	-	-	-	-	-	-	-
	108	28. 108年度東區河濱公園路面整建預約維護工程	658	…	-	-	-	-	-	-	-
	108	29. 108年度南區河濱公園土木預約維護工程	670	…	-	-	-	-	-	-	-
	108	30. 108年度基隆河美堤河濱公園颱風豪雨碼頭、廁所等設施撤離工程	203	…	-	-	-	-	-	-	-
	108	31. 108年度北區河濱公園路面整建預約維護工程	657	…	-	-	-	-	-	-	-
	108	32. 108年度南區河濱公園路面整建預約維護工程	657	…	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

Table 11 Park Improvement and New Constructions (Cont. 2 End)

May 2019

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swim-ming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facility (公尺) (m)	球場(運動場) Sta-dium (處) (lot)	無障礙坡道 Barrier-free Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m²)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定進度 Sche-duled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-**	**11**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.05	108.12		66.14	66.14		V	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.07	108.05	108.05	100.00	100.00		V	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		17.50	17.50		V	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		32.11	32.11		V	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		12.00	12.00		V	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		2.00	2.00		V	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		30.00	30.00		V	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		9.00	9.00		V	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		32.11	32.11		V	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		28.00	28.00		V	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.05	108.12		7.00	7.00		V	

Source: Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office.

表12　污水下水道新建、改善工程

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		**總　計**	**121,357**
	101-107	1. 格致路及東山路附近地區分管網工程（湖山路附近地區）	16,927
	105-108	2. 106年度中山區中山北路2段及林森北路附近地區污水接管工程	4,392
	105-108	3. 第5期大安及文山區分管網工程（107年預約工程）	2,770
	105-108	4. 第5期北投及士林區分管網工程（107年預約工程）	4,641
	105-108	5. 第5期松山信義及南港內湖區分管網工程(107年預約工程)	2,795
	105-108	6. 第5期萬華中正及大同中山區分管網工程（107年預約工程）	4,215
	105-108	7. 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程（107年預約工程）	2,322
	105-108	8. 106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程	16,120
	105-108	9. 第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程（107年預約工程）	3,057
	107	10. 107年度臺北市東區管渠修繕及配合拆遷預約工程	1,250
	107	11. 107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程	1,250
	107	12. 107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程	1,250
	107	13. 107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程	1,250
	107	14. 107年度南區污水設施及框蓋維護預約式工程	1,553
	107	15. 107年度北區污水設施及框蓋維護預約式工程	1,553

Table 12 Sewerage System Improvement and New Constructions

May 2019

工程內容 Construction Project							工期 Project Period			施工進度 Progress				
主幹管 Trunk (m)	次幹管 Sub-Trunk (m)	分支管 Branch Pipeline (m)	抽揚水站 Pumping Station (座) (no.)	人孔 Man-hole (座) (no.)	清除孔 Cleanout (座) (no.)	截流設施 Interception Facilities (個) (no.)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**182**	**9,079**	**1**	**213**	**-**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5**	**16**	**3**
	182	2,797	1	64			105.02	108.06		94.00	98.10	∨		
		1,897		17			107.01	108.09		51.05	54.85	∨		
							107.04	108.09		43.72	43.72		∨	
							107.04	108.09		55.34	55.34		∨	
							107.05	108.12		68.88	68.88		∨	
							107.03	108.09		37.41	37.41		∨	
							107.03	108.09		81.20	81.20		∨	
		4,385		132			106.09	108.11		76.00	76.00		∨	
							107.03	108.09		33.00	33.00		∨	
							107.05	108.12		98.95	98.95		∨	
							107.06	108.12		95.95	95.95		∨	
							107.05	108.12		96.00	96.00		∨	
							107.06	108.12		90.00	90.00		∨	
							107.04	108.05		100.00	92.00			∨
							107.04	108.05		100.00	98.90			∨

表12　污水下水道新建、改善工程（續）

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office	107	16. 107年度南區污水管渠檢視清理預約工程	900
	107	17. 107年度北區污水管渠檢視清理預約工程	900
	107-109	18. 迪化污水處理廠設備更新工程（第一期）—消防系統更新	2,893
	107-109	19. 迪化污水處理廠設備更新工程（第一期）—固體處理大樓客、貨梯更新	1,100
	107-109	20. 迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)-脫水機及濃縮機等設備更新	19,989
	106	21. 八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程-綜合標	8,742
	108	22. 108年度災害預防耐揚壓人孔框蓋更新預約式工程	2,894
	107	23. 淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期	17,153
	108	24. 代辦臺北市職能發展學院「衛生下水道納管工程」	1,442

資料來源：衛生下水道工程處。

Table 12　Sewerage System Improvement and New Constructions (Cont.)

May 2019

工程內容 Construction Project							工期 Project Period			施工進度 Progress				
主幹管 Trunk (m)	次幹管 Sub-Trunk (m)	分支管 Branch Pipeline (m)	抽揚水站 Pumping Station (座) (no.)	人孔 Man-hole (座) (no.)	清除孔 Cleanout (座) (no.)	截流設施 Interception Facilities (個) (no.)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
							107.04	108.06		74.00	74.00		V	
							107.04	108.06		75.00	75.00		V	
							107.11	108.07		63.30	65.71	V		
							107.11	108.07		86.05	96.00	V		
							108.01	109.04		0.38	0.36			V
							108.02	109.02		0.16	0.20	V		
							108.03	108.12		1.00	1.00		V	
							108.03	109.06		0.19	0.19		V	
							108.05	108.11		3.72	3.72		V	

Source: Sewerage Systems Office.

表13　治山防災整體治理工程

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	工程內容 防砂壩 Against Granulated Substance Dam (座) (set)	潛壩 Sub-merged Dam (座) (set)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	堤防 Embank-ment (公尺) (m)
大地工程處 Geotechnical Engineering Office		**總 計**	**39,378**	**-**	**-**	**-**	**-**
	108	1. 108年度臺北市山坡地邊坡（北區）維護預約式工程	3,710	-	-	-	-
	108	2. 108年度臺北市山坡地邊坡（南區）暨農業環境維護預約式工程	3,710	-	-	-	-
	108	3. 108年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落緊急水土保持工程	907	-	-	-	-
	108	4. 108年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)	2,038	-	-	-	-
	108	5. 108年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區)	2,038	-	-	-	-
	108	6. 107年度山區道路AC路面銑鋪及改善維護預約式工程	4,800	-	-	-	-
	108	7. 108年度臺北市山區道路緊急處理工程(北投及信義區)	4,870	-	-	-	-

Table 13 Watershed Management and Disaster Prevention

May 2019

Construction Project							工期 Project Period			施工進度 Progress				
整流 Rectifi-cation (公尺) (m)	固床工 Groundsill Works (座) (set)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	魚道 Fish Way (座) (set)	蝕溝控制 Gully Control (公尺) (m)	崩塌地處理 Protec-tion for collapse (公頃) (hectare)	植生綠美化 Greening Beautifi-cation (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定 Sche-duled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**14**	**130**	**-**	**-**	**0.10**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**13**	**-**	**2**
-	14	70	-	-	0	-	108.04	108.12		2.04	16.20	V		
-	-	20	-	-	-	-	108.04	108.12		5.78	26.43	V		
-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		17.50	37.85	V		
-	-	-	-	-	-	-	108.03	108.12		20.65	26.13	V		
-	-	40	-	-	-	-	108.03	108.12		4.11	22.97	V		
工區05-1-士林區冷水坑主線(0+000-0+300) 工區05-2-士林區冷水坑主線(1+600-2+200) 工區05-3-士林區冷水坑主線(2+550-2+650) 工區05-3-士林區冷水坑主線(3+100-3+600) 工區05-4-士林區冷水坑主線(4+000-4+210)							108.02	108.12		59.69	71.79	V		
通報單點位施作(坑洞修補、倒樹移除、除草等)，列管道路全線清淤							108.04	108.08		2.93	5.89	V		

表13　治山防災整體治理工程（續）

108年5月

主辦工程機關 Sponsor Institution	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	工程內容 防砂壩 Against Granulated Substance Dam (座) (set)	潛壩 Sub-merged Dam (座) (set)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	堤防 Embank-ment (公尺) (m)
	108	8. 108年度臺北市山區道路緊急處理工程(內湖區)	2,980	-	-	-	-
	108	9. 108年度臺北市山區道路緊急處理工程(中山區)	795	-	-	-	-
	108	10. 108年度臺北市山區道路緊急處理工程(大安及文山區)	2,980	-	-	-	-
	108	11. 108年度臺北市山區道路緊急處理工程(士林及南港區)	3,150	-	-	-	-
	108	12. 108年度4m以下山區道路AC路面銑鋪及改善維護預約式工程	2,926	-	-	-	-
	108	13. 108年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程	1,338	-	-	-	-
	108	14. 108年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程	1,338	-	-	-	-
	108	15. 108年度休閒遊憩設施緊急處理預約式工程	1,798	-	-	-	-

資料來源：大地工程處。

Table 13　Watershed Management and Disaster Prevention (Cont.)

May 2019

Construction Project							工期　Project Period			施工進度　Progress				
整流 Rectifi-cation (公尺) (m)	固床工 Groundsill Works (座) (set)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	魚道 Fish Way (座) (set)	蝕溝控制 Gully Control (公尺) (m)	崩塌地處理 Protec-tion for collapse (公頃) (hectare)	植生綠美化 Greening Beautifi-cation (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定 Sche-duled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	-	-	-	-	-	108.04	108.12		1.90	7.35	V		
1.劍南路及通北街之道路維護改善工作 2.劍南路648巷北側沉砂池清淤 3.中山區枯倒樹清除及廢棄物清除							108.04	108.12		3.62	3.35			V
1.文山區萬壽路往萬壽路67-1及71-1號道路邊坡：邊坡改善 2.文山區指南路3段157巷185號道路邊坡 (往指南宮)：邊坡改善 3.文山區指南路3段167巷道路邊坡 (映月茶坊)：邊坡改善 4.文山區指南路三段38巷33之6號道路側溝 (雙橡園):側溝更新							108.04	108.12		8.00	33.00	V		
1.微型樁打設31支(15米/支) 2.駁坎18.35m 3.市容查報修枝、清淤、除草路面及溝蓋修補							108.04	108.12		6.44	34.48	V		
-	-	-	-	-	-	-	108.05	108.12		0.10	0.00			V
登山步道、休憩平台、扶手欄杆							108.04	108.12		2.36	8.16	V		
登山步道、休憩平台、扶手欄杆							108.04	108.12		1.49	18.54	V		
露營場、風景區及轄管休閒場域等設施平時維護及緊急修復，包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、路燈修繕、木平台木椅修繕、樹洞拓寬、木棧道上警示黃漆、廢棄水管移除、設置緊急標誌等							108.04	108.12		1.56	3.39	V		

Source: Geotechnical Engineering Office.

表14　污水下水道用戶接管概況

年（月）別 Year (Month)		當年(月)污水處理戶數 (戶) No. of Households Served by Wastewater Collection in Each Year (Month) (no.)			
		總計 Grend Total	公共污水下水道 Public Sanitary Sewers	專用污水下水道 Specific Sanitary Sewers	建築物污水處理設施設置戶數 Households with Building Sewage Processing Facilities
民國 91 年	**2002**	**41 852**	**37 885**	**1 478**	**2,489**
民國 92 年	**2003**	**34 718**	**31 928**	**1 684**	**1 106**
民國 93 年	**2004**	**39 930**	**37 991**	**1 081**	**858**
民國 94 年	**2005**	**47 585**	**44 936**	**1 251**	**1 398**
民國 95 年	**2006**	**29 132**	**25 798**	**1 224**	**2 110**
民國 96 年	**2007**	**34 430**	**32 513**	**-960**	**2 877**
民國 97 年	**2008**	**42 775**	**40 010**	**1 172**	**1 593**
民國 98 年	**2009**	**34 635**	**33 300**	**216**	**1 119**
民國 99 年	**2010**	**41 663**	**40 902**	**163**	**598**
民國 100 年	**2011**	**31 993**	**31 237**	**3**	**753**
民國 101 年	**2012**	**31 442**	**30 822**	**1**	**619**
民國 102 年	**2013**	**24 543**	**24 145**	**2**	**396**
民國 103 年	**2014**	**21 825**	**21 638**	**-**	**187**
民國 104 年	**2015**	**12 391**	**12 265**	**-**	**126**
民國 105 年	**2016**	**10 584**	**10 475**	**-**	**109**
民國 106 年	**2017**	**10 468**	**10 357**	**-**	**111**
民國 107 年	**2018**	**12 564**	**12 528**	**-**	**36**
5月	May	851	851	-	-
6月	June	1 422	1 419	-	3
7月	July	884	883	-	1
8月	Aug.	1 074	1 052	-	22
9月	Sep.	1 051	1 051	-	-
10月	Oct.	1 005	1 004	-	1
11月	Nov.	602	601	-	1
12月	Dec.	844	843	-	1
民國 108 年	**2019**				
1月	Jan.	515	515	-1	1
2月	Feb.	418	418	-	-
3月	Mar.	656	655	-	1
4月	Apr.	575	572	-	3
5月	May	826	818	-	8

資料來源：衛生下水道工程處。

說明：(1)污水處理率=累計污水處理戶數×戶量/人口數×100，103年以前戶量以4計算。自99年起比率超過100%者，以100%表示。

(2))門牌數接管普及率 g=b/d×100，108年4月以前 g=(b+c)/d×100。

(3)96年、108年清查資料，扣除專用污水下水道重複列計者，致用戶數為負值或減少。

Table 14 Overview of Household Sewerage System Connections

截至當年(月)底累計污水處理戶數 (戶) Accumulated No. of Households Served by Wastewater Collection (no.)				門牌數	污水處理率	門牌數 接管普及率
總計 Grend Total a	公共污水下水道 Public Sanitary Sewers b	專用污水下水道 Special Sanitary Sewers c	建築物污水處理設施設置戶數 Households with Building Sewage Processing Facilities	No. of Doorplates (戶) (no.) d	Percentage of Population Served by Wastewater Collection (%)	Doorplate Sewer Connection Rate (%) g
412,745	**383,828**	**22 869**	**6 048**	**943 876**	**62.49**	**43.09**
447 463	**415 756**	**24 553**	**7 154**	**981 847**	**68.13**	**44.84**
487 393	**453 747**	**25 634**	**8 012**	**988 693**	**74.34**	**48.49**
534 978	**498 683**	**26 885**	**9 410**	**987 274**	**81.79**	**53.23**
564 110	**524 481**	**28 109**	**11 520**	**987 274**	**85.72**	**55.97**
598 540	**556 994**	**27 149**	**14 397**	**1 033 315**	**91.06**	**56.53**
641 315	**597 004**	**28 321**	**15 990**	**1 035 299**	**97.80**	**60.40**
675 950	**630 304**	**28 537**	**17 109**	**1 062 320**	**103.70**	**62.02**
717 613	**671 206**	**28 700**	**17 707**	**1 068 561**	**100.00**	**65.50**
749 606	**702 443**	**28 703**	**18 460**	**1 076 178**	**100.00**	**67.94**
781 048	**733 265**	**28 704**	**19 079**	**1 082 773**	**100.00**	**70.37**
805 591	**757 410**	**28 706**	**19 475**	**1 087 747**	**100.00**	**72.27**
827 416	**779 048**	**28 706**	**19 662**	**1 094 032**	**100.00**	**73.83**
839 807	**791 313**	**28 706**	**19 788**	**1 099 882**	**80.42**	**74.56**
850 391	**801 788**	**28 706**	**19 897**	**1 104 774**	**81.07**	**75.17**
860 859	**812 145**	**28 706**	**20 008**	**1 111 127**	**81.81**	**75.68**
873 423	**824 673**	**28 706**	**20 044**	**1 114 906**	**82.81**	**76.54**
866 541	817 820	28 706	20 015	1 112 499	82.23	76.09
867 963	819 239	28 706	20 018	1 112 667	82.39	76.21
868 847	820 122	28 706	20 019	1 112 988	82.53	76.27
869 921	821 174	28 706	20 041	1 113 556	82.31	76.32
870 972	822 225	28 706	20 041	1 113 749	82.54	76.40
871 977	823 229	28 706	20 042	1 114 118	82.63	76.47
872 579	823 830	28 706	20 043	1 114 598	82.69	76.49
873 423	824 673	28 706	20 044	1 114 906	82.81	76.54
873 938	825 188	28 705	20 045	1 115 348	82.58	76.56
874 356	825 606	28 705	20 045	1 115 735	82.68	76.57
875 012	826 261	28 705	20 046	1 116 384	82.79	76.58
875 587	826 833	28 705	20 049	1 116 464	82.91	76.63
894 116	880 398	3 755	9 963	1 116 991	84.41	78.82

Source: Sewerage Systems Office.

Explanation: 1.Percentage of Population Served by Wastewater Collection = Accumulated No. of Households Served by Wastewater Collection × Household Mean Size / Population × 100. Before 2014, Household Mean Size was 4. From 2010 onward , the figures exceeding 100% were showed 100%.

2.Doorplate Sewer Connection Rate g= b/d×100. Before April 2019, g=(b+c)/d×100.

3. In 2007 and 2019, repeated calculation numbers were deducted from the number of Special Sanitary Sewer connected households, which results a negative number or a decrease in the amount.

表15　公園綠地

單位：處、平方公尺

年底及區別 End of Year & District		公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、河濱公園、線形公園處數、面積					
		總計 Grand Total		公　園 Parks		綠　地 Green Fields	
		處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area
民 國 87 年 底	End of 1998	660	11 375 178	452	6 398 546	156	497 422
民 國 88 年 底	End of 1999	683	11 765 710	463	6 628 170	168	653 065
民 國 89 年 底	End of 2000	702	12 201 274	470	6 746 291	174	690 698
民 國 90 年 底	End of 2001	726	12 643 384	484	7 144 069	184	729 714
民 國 91 年 底	End of 2002	745	12 723 060	496	7 210 701	188	733 779
民 國 92 年 底	End of 2003	757	12 773 055	504	7 237 804	191	743 565
民 國 93 年 底	End of 2004	765	12 983 800	512	7 362 764	188	712 630
民 國 94 年 底	End of 2005	773	13 098 871	518	7 421 787	190	711 236
民 國 95 年 底	End of 2006	784	13 246 975	524	7 522 538	192	712 296
民 國 96 年 底	End of 2007	794	13 441 988	531	7 682 047	192	712 796
民 國 97 年 底	End of 2008	804	13 525 134	536	7 773 009	195	690 415
民 國 98 年 底	End of 2009	813	13 508 871	542	7 772 495	198	673 026
民 國 99 年 底	End of 2010	821	13 529 929	547	7 782 650	200	683 749
民 國 100 年 底	End of 2011	833	13 643 094	551	7 898 079	206	676 185
民 國 101 年 底	End of 2012	838	13 667 760	556	7 932 743	206	668 463
民 國 102 年 底	End of 2013	843	13 687 731	564	7 955 002	203	666 175
民 國 103 年 底	End of 2014	851	13 748 610	569	8 000 077	205	680 430
民 國 104 年 底	End of 2015	857	13 805 960	573	8 062 480	206	674 507
民 國 105 年 底	End of 2016	861	14 329 914	576	8 582 016	207	678 257
民 國 106 年 底	End of 2017	871	14 352 093	581	8 586 192	211	684 639
民 國 107 年 底	End of 2018	930	15 440 822	601	9 422 086	212	682 141
民國 108 年 5 月底	**End of May 2019**	**932**	**15 466 861**	**603**	**9 445 824**	**212**	**680 150**
松山區	SongShan	52	1 057 900	46	180 411	3	4 464
信義區	XinYi	84	545 448	54	414 730	20	43 122
大安區	DaAn	67	596 367	61	587 683	6	8 684
中山區	ZhongShan	98	1 704 149	70	764 668	23	39 419
中正區	ZhongZheng	30	886 073	19	567 224	2	20 720
大同區	DaTong	33	238 010	20	126 974	4	4 681
萬華區	WanHua	38	1 396 800	29	302 048	2	2 012
文山區	WenShan	98	2 998 987	78	2 463 524	16	22 610
南港區	NanGang	60	804 994	36	633 713	14	67 413
內湖區	NeiHu	100	1 449 727	82	907 804	11	58 732
士林區	ShiLin	104	1 498 178	42	774 828	44	138 358
北投區	BeiTou	162	2 251 364	66	1 722 217	67	269 935
跨區域	Others	6	38 864	-	-	-	-

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

Table 15 Parks and Green Fields

Unit: number; m^2

Parks, Green Fields, Sport Spots for Children, Plaza, Riverside Parks & Linear Parks								平均每一市民享有公園綠地面積 Per Capita Area of Parks and Green Fields
兒童遊樂場 Sport Spots for Children		廣　場 Plaza		河濱公園 Riverside Parks		線形公園 Linear Parks		
處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	
11	15 552	19	128 708	22	4 334 950	-	-	4.31
11	15 552	19	128 501	22	4 340 422	-	-	4.45
11	15 552	23	141 777	24	4 606 956	-	-	4.61
11	15 874	23	146 771	24	4 606 956	-	-	4.80
11	15 874	26	155 750	24	4 606 956	-	-	4.82
11	15 874	26	157 156	25	4 618 656	-	-	4.86
11	15 874	29	174 980	25	4 717 552	-	-	4.95
11	16 030	29	152 429	25	4 797 389	-	-	5.01
11	16 030	29	152 382	28	4 843 729	-	-	5.03
11	16 030	32	173 641	28	4 857 474	-	-	5.11
11	16 030	34	188 206	28	4 857 474	-	-	5.16
10	15 080	35	190 796	28	4 857 474	-	-	5.18
10	15 080	36	190 976	28	4 857 474	-	-	5.17
10	15 080	38	196 276	28	4 857 474	-	-	5.15
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	-	-	5.11
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	-	-	5.09
10	15 080	39	195 549	28	4 857 474	-	-	5.09
10	15 080	40	196 419	28	4 857 474	-	-	5.10
10	15 082	40	197 085	28	4 857 474	-	-	5.32
10	15 082	41	208 706	28	4 857 474	-	-	5.35
8	13 612	44	212 828	28	4 857 474	37	252 681	5.79
8	**13 612**	**44**	**217 120**	**28**	**4 857 474**	**37**	**252 681**	**5.81**
-	-	1	864	2	872 161	-	-	5.15
-	-	10	87 596	-	-	-	-	2.45
-	-	-	-	-	-	-	-	1.93
-	-	2	4 529	3	895 533	-	-	7.45
-	-	8	64 623	1	233 506	-	-	5.58
-	-	8	12 005	1	94 350	-	-	1.87
-	-	2	15 060	5	1 077 680	-	-	7.41
-	-	-	-	4	512 853	-	-	10.97
6	11 927	2	3 941	2	88 000	-	-	6.65
-	-	4	5 489	3	477 702	-	-	5.05
1	908	4	10 570	5	523 789	8	49 725	5.25
1	777	3	12 443	2	81 900	23	164 092	8.84
-	-	-	-	-	-	6	38 864	…

Source: Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office.

表16　現有路燈盞數

Table 16　Number of Street Lights

單位：盞　　Unit：set

年(月)底別 End of Year(Month)		總計 Grend Total	複金屬燈（含水銀燈） Metal Halide Light (Include Mercury Vapour Light)	鈉光燈 Sodium Light	日光燈 Fluorescent Light	LED燈 LED Light	其他 Others
民國91年底	**End of 2002**	**124 493**	**84 458**	**32 435**	**7 598**	**-**	**2**
民國92年底	**End of 2003**	**131 044**	**73 680**	**48 415**	**8 865**	**-**	**84**
民國93年底	**End of 2004**	**134 828**	**75 006**	**50 075**	**9 204**	**55**	**488**
民國94年底	**End of 2005**	**135 823**	**75 273**	**50 816**	**9 188**	**58**	**488**
民國95年底	**End of 2006**	**140 320**	**76 095**	**54 320**	**9 469**	**58**	**378**
民國96年底	**End of 2007**	**143 345**	**76 470**	**55 929**	**10 102**	**724**	**120**
民國97年底	**End of 2008**	**144 145**	**79 085**	**53 394**	**8 212**	**1 250**	**2 204**
民國98年底	**End of 2009**	**145 508**	**79 758**	**54 123**	**8 230**	**1 285**	**2 112**
民國99年底	**End of 2010**	**146 791**	**80 198**	**54 966**	**8 230**	**1 285**	**2 112**
民國100年底	**End of 2011**	**148 213**	**80 931**	**55 716**	**8 169**	**1 285**	**2 112**
民國101年底	**End of 2012**	**149 535**	**76 803**	**56 049**	**8 066**	**1 897**	**6 720**
民國102年底	**End of 2013**	**151 248**	**38 647**	**61 997**	**7 196**	**41 452**	**1 956**
民國103年底	**End of 2014**	**154 305**	**11 328**	**61 859**	**7 899**	**70 400**	**2 819**
民國104年底	**End of 2015**	**155 501**	**10 148**	**61 845**	**7 846**	**73 323**	**2 339**
民國105年底	**End of 2016**	**157 696**	**6 836**	**60 898**	**7 587**	**80 036**	**2 339**
民國106年底	**End of 2017**	**159 546**	**4 948**	**56 808**	**7 587**	**87 864**	**2 339**
民國107年底	**End of 2018**	**162 834**	**5 168**	**32 209**	**7 869**	**114 921**	**2 667**
5月底	End of May	161 078	5 314	44 144	7 869	101 112	2 639
6月底	End of June	161 078	5 314	44 144	7 869	101 112	2 639
7月底	End of July	161 078	5 314	44 144	7 869	101 112	2 639
8月底	End of Aug.	161 078	5 314	44 144	7 869	101 112	2 639
9月底	End of Sep.	161 078	5 314	44 144	7 869	101 112	2 639
10月底	End of Oct.	161 078	5 314	44 144	7 869	101 112	2 639
11月底	End of Nov.	161 762	5 168	36 074	7 869	110 004	2 647
12月底	End of Dec.	162 834	5 168	32 209	7 869	114 921	2 667
民國108年	**2019**						
1月底	End of Jan.	162 834	5 168	32 209	7 869	114 921	2 667
2月底	End of Feb.	163 458	5 168	29 759	7 869	117 995	2 667
3月底	End of Mar.	163 458	5 168	29 759	7 869	117 995	2 667
4月底	End of Apr.	163 458	5 168	29 759	7 869	117 995	2 667
5月底	End of May	163 458	5 168	29 759	7 869	117 995	2 667
108年5月底較上年同期增減% Annual Change Rate(%)		1.48	- 2.75	- 32.59	-	16.70	1.06

資料來源：公園路燈工程管理處。

說明：1.本表以台灣電力公司供電之盞數計列。

2.97年起路燈種類重新歸類計算，無法銜接。

Explanation: 1.This table is calculated based on lamps powered by Taiwan Power Company.

2.Street lights were reclassified since 2008, figures are not directly comparable to previous years.

表17　登山步道

108年5月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	總長(公尺) Length (m)
總計		**135 條**	**104 310**
信義區小計		**23 條**	**12 470**
(XY-01)	虎山溪步道	慈惠堂→真光禪寺→復興園	950
(XY-02)	虎山山腰步道	復興園→山神廟叉路	527
(XY-03)	虎山自然步道	慈惠堂→山神廟→南港山稜線叉路口	1 100
(XY-04)	虎山生態步道	虎山400m涼亭→王家土雞城叉路口	480
(XY-05)	虎山復興園步道	復興園→瑤池宮	580
(XY-06)	美的世界社區步道	瑤池宮→松山路673號美的世界社區(增長180m)	500
(XY-07)	虎山120高地步道	福德街221巷→虎山120高地	238
(XY-08)	虎山峰下方步道	福德街221巷→虎山峰下涼亭	157
(XY-09)	虎山峰前方步道	福德街221巷→虎山峰前涼亭	220
(XY-10)	虎山奉天宮步道	奉天宮→松山路679-1號	890
(XY-11)	虎山吉福宮步道	福德街51巷→虎山120高地	509
(XY-12)	吉福宮叉路步道	吉福宮上方右叉路→涼亭右轉下福德街51巷	322
(XY-13)	象山北星寶宮步道	靈雲宮→山頂→北星寶宮叉路	824
(XY-14)	天寶聖道宮步道	北星寶宮→天寶聖道宮	408
(XY-15)	拇指山步道	拇指山登山口→北星寶宮	1 355
(XY-16)	北台慈惠堂步道	北台慈惠堂→南港山親山步道三叉路	150
(XY-17)	永春崗顏子廟步道	永春崗公園→顏子廟	220
(XY-18)	象山永春崗步道	松山路650巷超市旁→象山頂前南港山叉路口(含入口意象範圍)	850
(XY-19)	象山一線天步道	象山990m巨石叉路→一線天→75m叉路口	822
(XY-20)	市立療養院步道	療養院→稜線(象山親山460m)(含入口意象範圍)	233
(XY-21)	象山自然步道	市療羽球場→象山煙火平台	400
(XY-22)	石泉巖步道	石泉巖→中正巖	289
(XY-23)	糶米古道	吳興街600巷→極樂公墓	446
中山區小計		**2 條**	**2 274**
(CS-01)	復興電台線步道	中山北路5段282巷→劍潭山稜線	700
(CS-02)	劍潭山稜線步道	劍潭山打印台經老地方→通北街叉路口→軍營門口(延伸374m至軍營前)	1 574

資料來源：大地工程處。

Source: Geotechnical Engineering Office.

Table 17　Hiking Trails (Cont. 1)

End of May 2019

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	總長(公尺) Length (m)
文山區小計		**22 條**	**15 379**
(WS-01)	試院支線步道	考試院上方涼亭→仙跡岩足跡步道叉路(含木柵路1段23號旁入口路段)	452
(WS-02)	景興國小支線步道	親山步道915m景興國小叉路口→景興國小	368
(WS-03)	溝子口支線步道	親山步道1300m海巡署叉路口→(往光輝路口)樓梯盡頭	568
(WS-04)	麥田支線步道	麥田山莊→仙跡岩稜線(含福德宮304巷支線)	413
(WS-05)	海巡署支線	興隆路三段304巷25號勞保局倉庫前→溝子口步道上方指向牌	400
(WS-06)	指南慈惠堂步道	指南路三段→指南慈惠堂再接商店街至獅子亭前方涼亭	750
(WS-07)	大成殿步道	指南路三段→大成殿步道口	605
(WS-08)	猴山岳步道	指南宮後山猴山岳步道口→新光路	602
(WS-09)	茶展中心步道	茶業推廣中心停車場→指南路三段	760
(WS-10)	健康步道	茶業推廣中心步道口→私人工寮旁	414
(WS-11)	壺穴步道	茶壺站對面寒舍入口→壺穴吊橋	550
(WS-13)	飛龍步道	環山二道→樟山寺	960
(WS-14)	救千宮步道	樟山寺→混元宮前高速公路涵洞下步道口	1 029
(WS-15)	指南國小步道	指南國小→樟山寺前叉路口	686
(WS-16)	三玄宮步道	指南國小→三玄宮	1 320
(WS-17)	貓空越嶺步道	貓空纜車站對面步道口→稜線上十字路口(含入口意象範圍)	800
(WS-18)	樟樹步道	三墩石步道口→大觀園後方停車場(┼談茶支線160m)	1 100
(WS-19)	楓林步道	樟樹步道楓林支線叉路口→指南路談天園對面步道口(含涼亭範圍)	160
(WS-20)	石獅腳步道	高振盛茶農步道道口→樟樹步道德隆茶行叉路口(含入口意象範圍)	350
(WS-21)	老樟樹步道	樟樹步道老樟樹叉路口→繞一圈至前方80m出口	70
(WS-22)	樟湖步道	指南路3段38巷涵鈺軒→指南路3段34巷瓦厝	2 500
(WS-23)	待老坑步道	樟湖步道待老坑叉路→待老坑山至老泉街26巷優人神鼓	522

表17 登山步道(續2)

108年5月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	總長(公尺) Length (m)
南港區小計		**11 條**	**10 565**
(NG-01)	南港山(一)中華技術學院	中華技術學院→南港山鞍部→分界點	1 970
(NG-02)	南港山(二)北興宮	南港山鞍部→北興宮(含入口意象範圍)	685
(NG-03)	南港山(三)麗山橋口	研究院路四段50巷→南港山鞍部(含入口意象範圍)	1 175
(NG-04)	九五峰	南港山鞍部→姆指山山頂陵線	2 165
(NG-05)	更寮步道	舊莊街二段122巷→土庫岳→大豐產業道路	2 450
(NG-06)	栳寮步道	舊莊街二段232巷→魏靜時故居(含入口意象範圍)	440
(NG-07)	桂花林步道＋2條支線	舊莊街二段添進茶園→南港茶葉製造示範廠第2停車場	495
(NG-08)	桂花吊橋步道＋支線	舊莊街二段寶豐庭茶莊→舊莊路2段328號	305
(NG-09)	桂花吊橋親水步道	舊莊街二段寶樹橋旁→桂花吊橋	170
(NG-10)	示範廠環山步道	舊莊街二段南港茶葉製造示範廠第1停車場→環山步道口	510
(NG-11)	桂花亭步道	桂花亭入口意象→舊莊街二段步道口(含入口意象範圍)	200
內湖區小計		**23 條**	**24 192**
(NH-01)	碧湖步道	內湖路三段碧湖步道口→新福本坑出口(葉氏祖廟前)(含步道兩端的入口意象範圍)	1 300
(NH-02)	大溝溪溪畔步道	大湖山莊街底大溝溪公園涼亭外→鯉魚山50m處相接	680
(NH-03)	圓覺寺步道	鯉魚山叉路→瀑布潭→圓覺寺步道口→峰碧塔門口	1 185
(NH-04)	鯉魚山步道	碧山路→葉氏祖廟(含入口意象範圍)	1 065
(NH-05)	碧山巖步道	碧山路23號→碧山巖	346
(NH-06)	忠勇山步道	慈聖宮→忠勇山頂	800
(NH-07)	忠勇山越嶺步道	碧山巖→忠勇山→林氏墓園→金龍產業道路	1 660
(NH-08)	大崙尾山步道圓明寺支線	大崙尾山打印台→湧泉寺(圓明寺門前)	3 180
(NH-09)	碧山露營場步道	碧山工作站→露營場	86
(NH-10)	碧山露營場下方木棧道	碧山工作站→露營場＋串連道(枕木步道交會)	272
(NH-11)	碧山露營場枕木步道	碧山工作站→自然生態教室→營地側門	1 088
(NH-12)	白鷺鷥山步道	老公祠福佑宮→白鷺鷥山→金湖路268號進入(含入口意象範圍)	1 845

Table 17 Hiking Trails (Cont. 3)

End of May 2019

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	總長(公尺) Length (m)
(NH-13)	康樂山步道	成功路5段山海寺牌樓→安泰街水源頭福德宮	1 470
(NH-14)	明舉山步道	安泰街打印台→內溝溪生態展示館前	1 450
(NH-15)	康樂街步道	康樂街236號內溝里民活動中心→六角木造涼亭	383
(NH-16)	龍船岩步道碧山路支線	碧山路62號→龍船岩叉路口(福德宮)	368
(NH-17)	龍船岩步道開眼山支線	開眼山→龍船岩	554
(NH-18)	龍船岩步道五路財神廟支線	龍船岩叉路(福德宮)→五路財神廟	1 330
(NH-19)	金面山步道	內湖步道叉路→金龍里福德宮(剪刀石→小金面)	2 786
(NH-20)	採石場步道	環山路一段136巷底→打印台前叉路(論劍亭上方)(含入口意象範圍)	700
(NH-21)	竹月寺步道	採石場步道40m叉路右經竹月寺→金面山稜線	1 080
(NH-22)	金面山68巷支線步道	環山路二段68巷底→金面山稜線泰安亭	464
(NH-23)	郭氏古厝步道	內湖文德路步道口→郭氏古厝	100
士林區小計		**23 條**	**18 780**
(SL-01)	風櫃嘴步道	溪山里至善路三段336巷51號至風櫃嘴步道口	614
(SL-02)	大崎頭步道	至善路三段370巷步道口至坪頂古圳清風亭	1 030
(SL-03)	坪頂古圳步道	至善路三段370巷29號步道口至平菁街95巷步道口	1 350
(SL-04)	鵝尾山步道礁坑橋支線(平溪步道)	至善路3段181巷5弄→平等國小旁平菁路105巷底	1 345
(SL-05)	鵝尾山步道簡厝支線	至善路三段277巷→至善路3段371巷20弄	303
(SL-06)	平菁步道	至善路三段71巷步道口→平菁街140號	929
(SL-07)	竹林步道	平菁路42巷禾豐餐廳停車場旁至公平橋	525
(SL-08)	永圳步道	永公路350巷反射境後直行到路底至圳溝邊(距公平橋300m)	320
(SL-09)	水管路步道	中山北路七段232巷1弄→愛富三街(含入口意象範圍)	2 600
(SL-10)	下竹林步道	中山北路七段190巷112號→仁民路	1 034
(SL-11)	婆婆橋步道	至善路二段266巷底→劍南路口圓明寺前(舊路200M)	555
(SL-12)	鄭成功廟步道	劍南路鄭成功廟旁→上方九蓮寺叉路	312
(SL-13)	大崙頭山步道	碧山路→山頂	515
(SL-14)	大崙頭森林步道	碧溪產業道路1.7K森林步道口→稜線步道(含入口意象範圍)	833

表17　登山步道(續4)

108年5月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	總長(公尺) Length (m)
(SL-15)	大崙頭自然步道	碧溪產業道路2.4K枕木步道口→稜線步道(含入口意象範圍)	620
(SL-16)	大崙頭北面步道	大崙頭山頂→碧山路50號民宅前	960
(SL-18)	瞭望台步道	碧溪產道2.25K下方碎石步道→高架瞭望台(2.45K)(含瞭望台下方休憩平台)	200
(SL-19)	碧溪步道	碧溪產業道路1.5K石頭屋→大崙尾山步道2120m+新增枕木步道390m+舊枕木70m+(靶場支線88m)	1 450
(SL-20)	翠山(靶場)步道	中社路二段路底至碧溪步道交會處	1 145
(SL-21)	大崙尾山中社路支線	中社路二段→山頂	870
(SL-22)	大崙尾山步道碧山路支線	碧山路→大崙尾山頂	740
(SL-23)	翠山街步道	中社路2段公車終點站旁至翠山街口雙福宮	200
(SL-24)	雙溪國小步道	雙溪國小旁步道口至中社路2段明溪街口	330
北投區		**31 條**	**20 650**
(BT-01)	忠義山步道	忠義廟→親山步道打印台	850
(BT-02)	楓丹白露步道	忠義山打印台→楓丹白露社區前入口意象(含入口意象範圍)	450
(BT-03)	大屯山(一)下青礐步道	貴子坑水保教室前→下青礐(復興三路)	1 727
(BT-04)	大屯山(二)貴子坑步道	親山步道打印台→貴子坑露營場對面步道口	1 330
(BT-05)	中和里上清宮步道	復興三路212號→中清礐	880
(BT-06)	中和里永春寮步道	復興三路300巷底→中正山產業道路中段(增長至上清宮對面水泥橋)(增長322m)	760
(BT-07)	永春寮溪步道	上清宮'旁步道口→復興三路310巷步道口	350
(BT-08)	中和里白宮山莊步道	復興四路105巷10號→復興三路白宮山莊	520
(BT-09)	中正山(一)郵政訓練所步道	登山路61號→郵政訓練中心(含入口意象範圍)	906
(BT-10)	中正山(二)法雨寺步道	泉源產業道路→法雨寺┼墓園支線(登山路40號至墓園邊200m)	924
(BT-11)	中正山親山步道	登山路立祥商店步道口→前行180m	180
(BT-13)	登泉步道	登山路17-2號→登山路28號(泉源產業道路)	218
(BT-14)	三楓步道	東昇路31號→登山路161號	79
(BT-15)	青楓步道	大梯田旁步道口→竹子湖產業道路2K+650	800

Table 17 Hiking Trails (Cont. 5 End)

End of May 2019

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point / End Point	總長(公尺) Length (m)
(BT-16)	頂湖海芋步道	名陽匐農場旁步道口→海芋田景觀木橋	160
(BT-17)	猴崁步道	竹子湖路下切左轉→猴崁產業道路	350
(BT-18)	水尾巴拉卡步道	竹子湖水尾公車站→巴拉卡公路	518
(BT-19)	猴崁湖田國小步道	竹子湖9號→猴崁產業道路(1K＋100)	650
(BT-20)	水車寮步道	湖田國小停車場旁步道口→大樹下土雞城步道口	550
(BT-21)	軍艦岩步道	陽明醫學院步道口→軍艦岩前叉路	500
(BT-22)	照明寺步道	軍艦岩下泥土步道→照明禪寺	1 230
(BT-23)	丹鳳山步道	照明寺旁丹鳳山入口→陳濟堂墓園門口	830
(BT-24)	半嶺步道	(向前延伸至湖底路)紅檀前方30m步道口→欄杆橋頭福德宮	1 200
(BT-25)	橫嶺古道	湖山路一段步道口→紅檀停車場	800
(BT-26)	湖山里湖山國小步道	湖底路48號湖山國小旁→湖山路25之1號	568
(BT-27)	風尾步道	東昇路38號前步道口→東昇路68-15號	291
(BT-28)	泉源里紗帽步道	泉源路232號上方路口至紗帽路10號巷口（對面至山谷下步道）	684
(BT-29)	淨水廠步道	泉源路260號淨水廠旁步道口→水圳步道邊	132
(BT-30)	湖山里鼎筆橋步道	鼎筆橋→東昇路(頂湖福德宮)	363
(BT-31)	陽峰古道	陽峰古道入口→鼎筆橋旁	1 100
(BT-32)	磺溪溫泉步道	行義路260巷天祥溫泉前步道口→行義路402巷皇池溫泉停車場旁步道口	750

表18　土地人口概況

Table 18　Land and Population

年（月）底別 End of Year(Month)	土地面積 Land (平方公里) (k㎡)	戶籍戶數 No. of Households (戶) (no.)	人口數(人) Population (person) 總計 Grend Total	男 Male	女 Female	人口密度 Population Density (人/平方公里) (person/ k㎡)
民國88年底 End of 1999	**271.7997**	**879 156**	**2 641 312**	**1 309 434**	**1 331 878**	**9 718**
民國89年底 End of 2000	**271.7997**	**888 560**	**2 646 474**	**1,309,308**	**1,337,166**	**9,737**
民國90年底 End of 2001	**271.7997**	**894 763**	**2 633 802**	**1 300 179**	**1 333 623**	**9 690**
民國91年底 End of 2002	**271.7997**	**906 988**	**2 641 856**	**1 301 458**	**1 340 398**	**9 720**
民國92年底 End of 2003	**271.7997**	**914 716**	**2 627 138**	**1 291 742**	**1 335 396**	**9 666**
民國93年底 End of 2004	**271.7997**	**923 325**	**2 622 472**	**1 286 303**	**1 336 169**	**9 649**
民國94年底 End of 2005	**271.7997**	**933 110**	**2 616 375**	**1 279 513**	**1 336 862**	**9 626**
民國95年底 End of 2006	**271.7997**	**941 317**	**2 632 242**	**1 282 691**	**1 349 551**	**9 684**
民國96年底 End of 2007	**271.7997**	**947 745**	**2 629 269**	**1 277 556**	**1 351 713**	**9 674**
民國97年底 End of 2008	**271.7997**	**958 433**	**2 622 923**	**1 270 948**	**1 351 975**	**9 650**
民國98年底 End of 2009	**271.7997**	**969 418**	**2 607 428**	**1 260 450**	**1 346 978**	**9 593**
民國99年底 End of 2010	**271.7997**	**983 237**	**2 618 772**	**1 262 554**	**1 356 218**	**9 635**
民國100年底 End of 2011	**271.7997**	**999 879**	**2 650 968**	**1 276 343**	**1 374 625**	**9 753**
民國101年底 End of 2012	**271.7997**	**1 017 063**	**2 673 226**	**1 285 361**	**1 387 865**	**9 835**
民國102年底 End of 2013	**271.7997**	**1 026 738**	**2 686 516**	**1 289 945**	**1 396 571**	**9 884**
民國103年底 End of 2014	**271.7997**	**1 037 402**	**2 702 315**	**1 295 636**	**1 406 679**	**9 942**
民國104年底 End of 2015	**271.7997**	**1 043 948**	**2 704 810**	**1 295 462**	**1 409 348**	**9 951**
民國105年底 End of 2016	**271.7997**	**1 047 284**	**2 695 704**	**1 289 510**	**1 406 194**	**9 918**
民國106年底 End of 2017	**271.7997**	**1 050 755**	**2 683 257**	**1 281 917**	**1 401 340**	**9 872**
民國107年底 End of 2018	**271.7997**	**1 056 233**	**2 668 572**	**1 273 375**	**1 395 197**	**9 818**
5月底 End of May	271.7997	1 053 113	2 676 767	1 278 241	1 398 526	9 848
6月底 End of June	271.7997	1 053 741	2 675 713	1 277 544	1 398 169	9 844
7月底 End of July	271.7997	1 053 885	2 674 063	1 276 592	1 397 471	9 838
8月底 End of Aug.	271.7997	1 055 497	2 672 092	1 275 635	1 396 457	9 831
9月底 End of Sep.	271.7997	1 056 715	2 669 639	1 274 341	1 395 298	9 822
10月底 End of Oct.	271.7997	1 056 354	2 669 874	1 274 295	1 395 579	9 823
11月底 End of Nov.	271.7997	1 056 190	2 669 634	1 274 089	1 395 545	9 822
12月底 End of Dec.	271.7997	1 056 233	2 668 572	1 273 375	1 395 197	9 818
民國108年 2019						
1月底 End of Jan.	271.7997	1 056 328	2 666 908	1 272 385	1 394 523	9 812
2月底 End of Feb.	271.7997	1 056 439	2 664 983	1 271 327	1 393 656	9 805
3月底 End of Mar.	271.7997	1 057 137	2 663 425	1 270 279	1 393 146	9 799
4月底 End of Apr.	271.7997	1 057 682	2 661 317	1 269 117	1 392 200	9 791
5月底 End of May	271.7997	1 058 272	2 658 615	1 267 542	1 391 073	9 782

資料來源：本府地政局、民政局。

Source: Department of Land , Department of Civil Affairs.

表19　臺灣地區營造工程物價指數

公式：採用拉式公式之變式

年(月)別 Year（Month）		總指數 General Index	水泥及其製品類 Cement & Related Products	砂石及級配類 Sand & Crashed Stone	磚瓦瓷類 Bricks & Tiles	金屬製品類 Metal Products	木材及其製品類 Timber & Related Products
項數 No of Items		115	7	3	5	21	5
權數(千分比) Weights		1,000	150.48	21.44	15.87	195.04	30.14
基期：民國105年＝100		定基指數					
民國100年	**2011**	**102.29**	**92.89**	**84.54**	**90.10**	**134.22**	**100.08**
民國101年	**2012**	**103.14**	**97.34**	**87.78**	**94.77**	**128.17**	**97.91**
民國102年	**2013**	**102.79**	**98.99**	**89.07**	**97.65**	**121.07**	**99.74**
民國103年	**2014**	**104.67**	**105.47**	**100.86**	**100.35**	**118.34**	**104.38**
民國104年	**2015**	**101.71**	**105.62**	**102.10**	**100.79**	**100.84**	**104.52**
民國105年	**2016**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
民國106年	**2017**	**102.40**	**96.80**	**99.12**	**98.93**	**113.34**	**99.92**
民國107年	**2018**	**105.84**	**99.81**	**99.56**	**97.82**	**125.36**	**106.12**
5月	May	105.25	96.61	99.74	98.09	125.03	106.34
6月	June	105.63	98.42	99.75	98.12	124.94	106.62
7月	July	106.26	99.83	99.76	97.86	126.74	106.71
8月	Aug.	106.50	100.43	99.56	97.62	127.46	107.00
9月	Sep.	106.90	102.05	99.32	97.70	128.27	107.16
10月	Oct.	107.28	103.90	99.32	97.55	129.03	107.50
11月	Nov.	107.05	105.09	99.54	97.68	126.76	107.61
12月	Dec.	106.80	106.61	99.87	97.71	123.87	107.65
民國108年	**2019**						
1月	Jan.	106.92	108.88	102.67	97.92	122.21	107.19
2月	Feb.	107.81	110.07	103.33	97.34	125.73	107.29
3月	Mar.	ⓡ 108.38	111.90	103.40	97.33	126.61	ⓡ 107.68
4月	Apr.	108.47	113.56	103.58	97.17	125.40	ⓡ 107.57
5月	May	108.25	113.69	103.74	97.28	123.68	107.70
		年增率(%)					
民國100年	**2011**	**3.33**	**- 0.43**	**- 3.08**	**2.13**	**7.32**	**10.89**
民國101年	**2012**	**0.83**	**4.79**	**3.83**	**5.18**	**- 4.51**	**- 2.17**
民國102年	**2013**	**- 0.34**	**1.70**	**1.47**	**3.04**	**- 5.54**	**1.87**
民國103年	**2014**	**1.83**	**6.55**	**13.24**	**2.76**	**- 2.25**	**4.65**
民國104年	**2015**	**-2.83**	**0.14**	**1.23**	**0.44**	**-14.79**	**0.13**
民國105年	**2016**	**- 1.68**	**- 5.32**	**- 2.06**	**- 0.78**	**- 0.83**	**- 4.32**
民國106年	**2017**	**2.40**	**-3.20**	**-0.88**	**-1.07**	**13.34**	**-0.08**
民國107年	**2018**	**3.36**	**3.11**	**0.44**	**-1.12**	**10.61**	**6.20**
5月	May	3.92	-0.29	0.92	-1.36	16.04	7.24
6月	June	4.20	1.66	0.95	-1.11	15.28	7.73
7月	July	4.55	3.35	0.83	-1.25	15.64	7.82
8月	Aug.	3.69	3.92	0.60	-1.24	10.83	7.39
9月	Sep.	3.35	5.70	0.12	-0.78	8.36	7.10
10月	Oct.	3.82	7.70	0.12	-0.68	9.70	6.23
11月	Nov.	3.28	8.87	0.14	-0.53	6.68	5.69
12月	Dec.	2.82	10.56	0.67	-0.57	2.93	5.20
民國108年	**2019**						
1月	Jan.	2.37	12.99	3.38	0.12	-0.45	4.13
2月	Feb.	3.45	14.44	3.92	-0.47	3.58	3.93
3月	Mar.	ⓡ 3.44	16.47	3.99	-0.45	2.11	ⓡ 2.90
4月	Apr.	3.35	18.05	3.85	-0.94	1.07	ⓡ 1.48
5月	May	2.85	17.68	4.01	-0.83	-1.08	1.28

資料來源：物價統計月報。

說　　明：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正。

Table 19 Indices of Construction Cost in Taiwan Area

Formula：Laspeyres's Formula

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類 Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
8	4	16	2	15	29
15.54	7.63	86.82	21.48	56.96	398.61
		Fixed Index			Base Period：2016=100
92.35	**92.21**	**107.63**	**100.43**	**93.36**	**94.78**
95.94	**97.39**	**106.97**	**107.13**	**96.24**	**96.09**
100.26	**99.28**	**105.87**	**109.11**	**98.02**	**96.98**
103.03	**100.43**	**105.91**	**109.07**	**99.82**	**98.70**
100.16	**100.23**	**103.04**	**103.73**	**99.79**	**99.96**
100.00	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
104.29	**99.64**	**104.13**	**99.21**	**101.07**	**100.44**
107.31	**100.93**	**107.23**	**99.98**	**102.49**	**101.00**
107.51	101.11	107.68	98.71	102.11	100.87
106.82	101.38	107.92	98.99	103.81	100.89
107.27	101.45	107.76	99.26	103.89	101.03
107.93	101.55	106.95	99.98	103.89	101.17
107.55	101.57	106.54	101.47	103.82	101.21
107.30	101.61	106.53	101.96	102.23	101.27
106.62	101.57	106.95	102.18	102.24	101.26
107.15	101.57	107.00	102.38	102.30	101.41
108.34	101.57	106.90	102.47	102.36	101.50
109.04	101.57	106.81	102.71	102.31	101.53
109.24	101.57	ⓡ 107.58	103.20	102.35	101.60
108.52	101.57	108.09	103.20	102.43	101.72
107.91	101.57	108.07	103.30	103.45	101.81
		Annual Change Rate (%)			
6.31	**9.45**	**5.86**	**3.43**	**3.83**	**1.25**
3.89	**5.62**	**- 0.61**	**6.67**	**3.08**	**1.38**
4.50	**1.94**	**- 1.03**	**1.85**	**1.85**	**0.93**
2.76	**1.16**	**0.04**	**- 0.04**	**1.84**	**1.77**
-2.79	**-0.20**	**-2.71**	**-4.90**	**-0.03**	**1.28**
- 0.16	**- 0.23**	**- 2.95**	**- 3.60**	**0.21**	**0.04**
4.29	**-0.36**	**4.13**	**-0.79**	**1.07**	**0.44**
2.90	**1.29**	**2.98**	**0.78**	**1.40**	**0.56**
3.19	1.54	4.62	-0.55	1.37	0.58
2.75	1.75	5.30	-0.27	1.87	0.58
3.58	1.82	4.79	0.00	2.00	0.46
3.74	1.92	2.88	0.73	1.87	0.61
2.61	1.94	1.38	2.23	1.78	0.56
1.84	1.87	0.84	2.72	1.33	0.65
1.21	1.83	0.39	2.94	1.31	0.66
2.37	1.83	0.31	3.72	1.24	0.82
1.85	1.79	-0.24	3.81	1.21	0.85
1.89	1.79	-0.54	4.05	1.13	0.84
1.16	1.74	ⓡ 0.08	4.55	1.05	0.87
0.27	1.57	0.71	4.55	0.46	0.84
0.37	0.45	0.36	4.65	1.31	0.93

Source: Price Statistics Monthly.

Explanation: All data are subject to revision 3 months after original publication due to late reports and corrections by respondents.

表20 臺北市營造工程物價指數

公式：價比基期值加權算術平均式

年(月)別 Year（Month）		總指數 General Index	水泥及其製品類 Cement & Related Products	砂石及級配類 Sand & Crashed Stone	磚瓦瓷類 Bricks & Tiles	金屬製品類 Metal Products	木材及其製品類 Timber & Related Products
項數 No of Items		115	7	3	5	21	5
權數(千分比) Weights		1,000.00	144.70	18.16	16.61	199.11	30.56
基期：民國105年＝100				定基指數			
民國100年	**2011**	**103.27**	**97.58**	**88.01**	**98.70**	**131.73**	**108.65**
民國101年	**2012**	**103.93**	**100.31**	**88.48**	**102.05**	**125.48**	**103.90**
民國102年	**2013**	**103.25**	**101.39**	**91.10**	**103.28**	**117.85**	**103.99**
民國103年	**2014**	**104.69**	**108.46**	**100.47**	**103.49**	**115.89**	**107.64**
民國104年	**2015**	**101.84**	**106.86**	**101.55**	**102.89**	**101.04**	**106.77**
民國105年	**2016**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
民國106年	**2017**	**101.81**	**97.92**	**100.24**	**97.79**	**111.52**	**98.49**
民國107年	**2018**	**105.11**	**104.10**	**100.30**	**95.07**	**122.42**	**101.97**
5月	May	104.00	98.86	100.94	94.91	121.38	101.61
6月	June	104.47	100.80	100.94	95.03	121.40	102.57
7月	July	105.51	104.52	100.94	95.03	123.20	102.57
8月	Aug.	105.74	104.89	99.82	95.03	123.69	102.87
9月	Sep.	106.44	108.36	99.26	95.03	124.86	102.83
10月	Oct.	107.08	111.43	99.26	95.40	126.57	102.83
11月	Nov.	106.86	112.72	99.26	95.40	124.32	102.83
12月	Dec.	106.44	113.12	99.92	95.40	121.92	102.74
民國108年	**2019**						
1月	Jan.	106.39	114.68	99.92	96.32	120.11	102.74
2月	Feb.	107.15	115.28	99.92	94.35	122.97	102.74
3月	Mar.	107.72	117.63	99.92	94.35	123.47	103.57
4月	Apr.	108.29	120.20	99.92	94.22	122.03	103.57
5月	May	107.97	120.20	99.92	94.22	120.31	104.44
				年增率(%)			
民國100年	**2011**	**6.18**	**- 3.78**	**- 12.44**	**- 0.31**	**41.02**	**14.44**
民國101年	**2012**	**0.64**	**2.80**	**0.53**	**3.39**	**- 4.74**	**- 4.37**
民國102年	**2013**	**- 0.65**	**1.08**	**2.96**	**1.21**	**- 6.08**	**0.09**
民國103年	**2014**	**1.39**	**6.97**	**10.29**	**0.20**	**- 1.66**	**3.51**
民國104年	**2015**	**- 2.72**	**- 1.48**	**1.07**	**- 0.58**	**- 12.81**	**- 0.81**
民國105年	**2016**	**- 1.81**	**- 6.42**	**- 1.53**	**- 2.81**	**- 1.03**	**- 6.34**
民國106年	**2017**	**1.81**	**- 2.08**	**0.24**	**- 2.21**	**11.52**	**- 1.51**
民國107年	**2018**	**3.24**	**6.31**	**0.06**	**- 2.78**	**9.77**	**3.53**
5月	May	3.22	1.36	0.82	- 3.81	14.55	3.41
6月	June	3.53	3.27	0.82	- 2.65	13.69	5.57
7月	July	4.34	6.76	0.82	- 2.12	13.99	5.57
8月	Aug.	3.58	6.75	- 0.30	- 2.12	9.50	5.42
9月	Sep.	3.57	10.11	- 1.20	- 2.12	7.68	4.28
10月	Oct.	4.34	13.15	- 1.20	- 1.74	9.75	3.97
11月	Nov.	3.78	14.46	- 1.20	- 1.74	6.71	2.46
12月	Dec.	3.21	14.80	- 0.55	- 1.74	3.47	2.37
民國108年	**2019**						
1月	Jan.	2.68	16.37	- 0.55	1.49	- 0.07	2.32
2月	Feb.	3.72	16.93	- 1.01	- 0.59	3.38	2.32
3月	Mar.	3.63	19.18	- 1.01	- 0.59	1.76	3.15
4月	Apr.	4.18	21.78	- 1.01	- 0.73	0.69	1.93
5月	May	3.82	21.59	- 1.01	- 0.73	- 0.88	2.79

資料來源：臺北市物價統計月報。

Table 20　Indices of Construction Cost in Taipei City

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類① Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項材料類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
8	4	16	2	15	29
15.99	8.04	85.29	22.07	56.79	402.68
Fixed Index				Base Period：2016=100	
93.78	**91.79**	**105.62**	**109.56**	**91.40**	**94.81**
96.73	**96.17**	**105.44**	**114.43**	**93.23**	**97.31**
100.34	**100.30**	**104.58**	**115.73**	**94.03**	**98.29**
102.40	**100.46**	**104.08**	**115.06**	**96.14**	**99.07**
98.41	**100.46**	**102.11**	**104.71**	**98.97**	**100.09**
100.00	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
104.76	**97.94**	**102.34**	**98.24**	**98.92**	**100.03**
104.16	**97.93**	**104.58**	**100.01**	**99.77**	**100.24**
105.14	97.93	104.93	98.25	98.96	99.97
103.64	97.93	105.43	98.25	101.41	99.97
103.64	97.93	105.65	99.57	101.48	100.18
104.27	97.93	104.20	101.92	101.52	100.56
104.27	97.93	103.86	102.29	101.52	100.56
103.83	97.93	103.73	102.29	99.24	100.56
102.96	97.93	104.36	102.29	99.24	100.56
103.83	97.93	104.31	102.29	99.24	100.54
106.83	97.93	104.18	102.29	99.37	100.59
108.95	97.93	104.00	102.78	99.37	100.85
108.95	97.93	104.78	104.71	99.37	100.85
108.24	97.93	105.39	104.71	99.37	101.98
107.76	97.93	105.39	104.71	99.37	101.98
Annual Change Rate (%)					
1.12	**- 2.72**	**9.26**	**12.48**	**- 6.90**	**- 3.63**
3.15	**4.77**	**- 0.17**	**4.45**	**2.00**	**2.64**
3.73	**4.29**	**- 0.82**	**1.14**	**0.86**	**1.01**
2.05	**0.16**	**- 0.48**	**-0.58**	**2.24**	**0.79**
- 3.90	**0.00**	**- 1.89**	**-9.00**	**2.94**	**1.03**
1.62	**- 0.46**	**- 2.07**	**-4.50**	**1.04**	**-0.09**
4.76	**- 2.06**	**2.34**	**-1.76**	**-1.08**	**0.03**
- 0.57	**- 0.01**	**2.19**	**1.80**	**0.86**	**0.21**
- 0.64	- 0.01	3.31	0.01	0.76	-0.10
- 1.44	- 0.01	4.12	0.01	1.16	-0.10
- 0.14	- 0.01	4.21	1.35	1.20	0.16
0.04	- 0.01	1.96	3.75	1.22	0.57
- 0.40	- 0.01	0.70	4.12	1.20	0.57
- 1.83	- 0.01	0.47	4.12	0.92	0.57
- 2.28	- 0.01	0.25	4.12	0.79	0.53
0.74	- 0.01	0.13	4.12	0.79	0.51
3.85	-	- 0.09	4.11	0.84	0.50
5.26	-	- 0.26	4.61	0.84	0.94
2.82	-	- 0.36	6.58	0.76	0.88
2.15	-	0.53	6.58	0.42	2.01
2.49	-	0.44	6.58	0.41	2.01

Source: Price Statistics Monthly Taipei City.

臺北市工務統計月報

出　版　機　關 ： 臺北市政府工務局

地　　　　　址 ： 11008 臺北市信義區市府路1號4樓西南區

電　　　　　話 ： 1999(外縣市02-27208889)轉1404

網　　　　　址 ： https://pwd.gov.taipei

發　　行　　人 ： 林志峯

編　　　　　輯 ： 臺北市政府工務局統計室

出　版　年　月 ： 中華民國 108年6月

創　刊　年　月 ： 中華民國 73年 1月

刊　期　頻　率 ： 月刊

THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN OF PUBLIC WORKS

Published by the Public Works Department, Taipei City Goverment

Address: Southwest Wing, 4F., No.1, City Hall Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11008, Taiwan (R.O.C.)

Telephone No: Please dial the 1999 Citizen Hotline (02-2720-8889 for out of Taipei) ext. 1404

Publisher: Chih-Feng LIN

Edited by the Statistics Office of PWD, TCG

Website: https://pwd.gov.taipei

Publishing Date: June 2019

First Edition: January 1984
