臺 北 市

工務統計月報

THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN OF PUBLIC WORKS

中華民國109年8月

August 2020

臺北市政府工務局編製

中華民國 109 年 9 月出版

Public Works Department

Taipei City Government, September 2020

臺北市政府工務局業務職掌

工務局

單位		業務職掌
局本部	土木建築科	綜合企劃及工程相關法規之制定，道路、橋梁、隧道與公共建築等相關工程之監辦及督導考核及其他有關事項。
局本部	水利科	辦理本局災害防救綜合業務、水利與衛生下水道工程處查核金額以上工程之監辦作業及所轄廠站營運督導管理、本府淡水河流域管理委員會幕僚作業、主管下水道及纜線附掛法規修訂與核釋、專案執行及交辦事項等綜合業務及其他有關事項。
局本部	公園大地科	督導本局公園路燈工程處、大地工程處業務及制（修）訂、核釋公共工程拆遷、勘估、補償、安置、整建等相關法規與其他有關事項。
局本部	採購管理科	有關本府採購法規及採購契約、投標須知等招標文件範本之訂定、修訂、疑義釋示、諮詢及契約協助審查與教育訓練，本府採購稽核之事務及廠商檢舉、民意關切及媒體報導等採購案之處理，本府各一級機關查核金額以上採購案之監辦業務，本府各機關採購內部控制之稽查作業，本府公共工程督導會報之採購稽核幕僚業務，本府採購發包中心幕僚業務及其他有關事項。
局本部	品管及勞安科	辦理本府公共工程施工之查核、本局工程材料試驗及其他有關事項。
局本部	資訊室	研擬年度資訊推展計畫、資訊管理、電腦設備購置、電腦軟硬體維護、電腦教育訓練、本局所屬處資訊設施維護管理之督導、本局所屬各處資訊業務之督導及其他有關事項。
局本部	秘書室	辦理研考、文書、事務、出納及其他有關事項。
局本部	會計室	辦理本局及督導所屬工程處預算、會計業務。
局本部	統計室	依法辦理統計及其他有關事項。
局本部	人事室	辦理人員任免遷調、考核獎懲、差勤管理、員工訓練、待遇福利、退休撫卹及其他有關事項。
局本部	政風室	負責政風法令之擬訂、政風法令之宣導、員工貪瀆不法之預防、發掘及處理檢舉事項、政風興革建議、政風考核獎懲建議、公務機密維護及其他有關政風事項。
新建工程處		辦理新建道路及道路養護、橋梁、廣場及市有建築物工程之規劃、勘測、設計、施工及研究規劃設計、改善等工作。
水利工程處		全市河川及雨水下水道、抽水站等公共設施之興建、管理與維護，包括所有河濱高灘地（河濱公園）之管理。
公園路燈工程管理處		掌理臺北市公園、綠地、廣場、行道樹、遊樂設施及路燈等之規劃、設計施工與管理維護，以及花木培植事宜。
衛生下水道工程處		掌理大臺北地區污水下水道之規劃、設計、施工、維護、營運管理及污水處理廠設施之操作、管理、水質檢驗、分析等事項。
大地工程處		本市山坡地安全管理及災害復舊，產業道路與登山步道闢建維護，森林與保安林調查開發利用，山坡地野溪、山溝、土石流潛勢溪流治理規劃，農村新風貌調查規劃，山坡地開發利用與違法之取締。

Duties of the Public Works Department, Taipei City Government

Public Woks Department	Department Headquarters	
Department Headquarters	Civil Engineering Division	Combining the formulation and writing of planning- and engineering-related codes; the initiation, supervision and quality review of construction of roads, bridges, tunnels, and public buildings.
Department Headquarters	Hydraulicus Division	Supervising construction on, and disaster relief / emergency repair of: river engineering, river management, rainwater drainage and sewage drainage.
Department Headquarters	Parks and Geotechnical Engineering Division	Supervision of engineering related to parks and streetlights; the move or removal of legal buildings and related compensation measures.
Department Headquarters	Procurement Administration Division	The formation, supervision and verification of the City Government's purchasing laws.
Department Headquarters	Ouality Control Division	Handles testing, analysis, and assessment of project materials, and project quality control affairs.
Department Headquarters	Systems Administration	Handles the overall planning, development, coordination, promotion, management, maintenance, training, and supervision of the public works information system.
Department Headquarters	Administrative Services	Handles research and development, control and inspection, public relations, press relations and meetings, documentation, filing, and payment for public works administration; as well as affairs that are not the duties of other sections or offices.
Department Headquarters	Accounting Office	Handles annual bookkeeping and accounting affairs.
Department Headquarters	Statistics Office	Handles statistical affairs.
Department Headquarters	Personnel Office	Handles human resource affairs.
Department Headquarters	Government Ethics	Handles ethics related affairs.
Public Woks Department	New Construction Office	Manage planning, surveying, designing, engineering, and improving of new roads, bridges, plazas and city buildings, as well as maintaining existing roads.
Public Woks Department	Hydraulic Engineering Office	Construction, management and maintenance of all rivers, rainwater drainage, water pumps, and other water-related public structures, including all river flood banks (riverside parks).
Public Woks Department	Parks and Street Lights Office	Handles the planning, design, construction, management and maintenance of Taipei City parks, grassy areas, plazas, sidewalks trees, playgrounds, and street lamps as well as plantings.
Public Woks Department	Sewerage Systems Office	Handles the planning, design, construction, maintenance and management of wastewater drainage in the greater Taipei area.
Public Woks Department	Geotechnical Engineering Office	Our city's hillside safety management and disaster reaction, industrial path and hiking path construction and maintaining, forest and protection forest investigation development and using, Hill land valley, gully, mudslides potential valley administer and plan. Countryside new style investigation planning, hillside development and ban illegal development.

目　次

CONTENTS

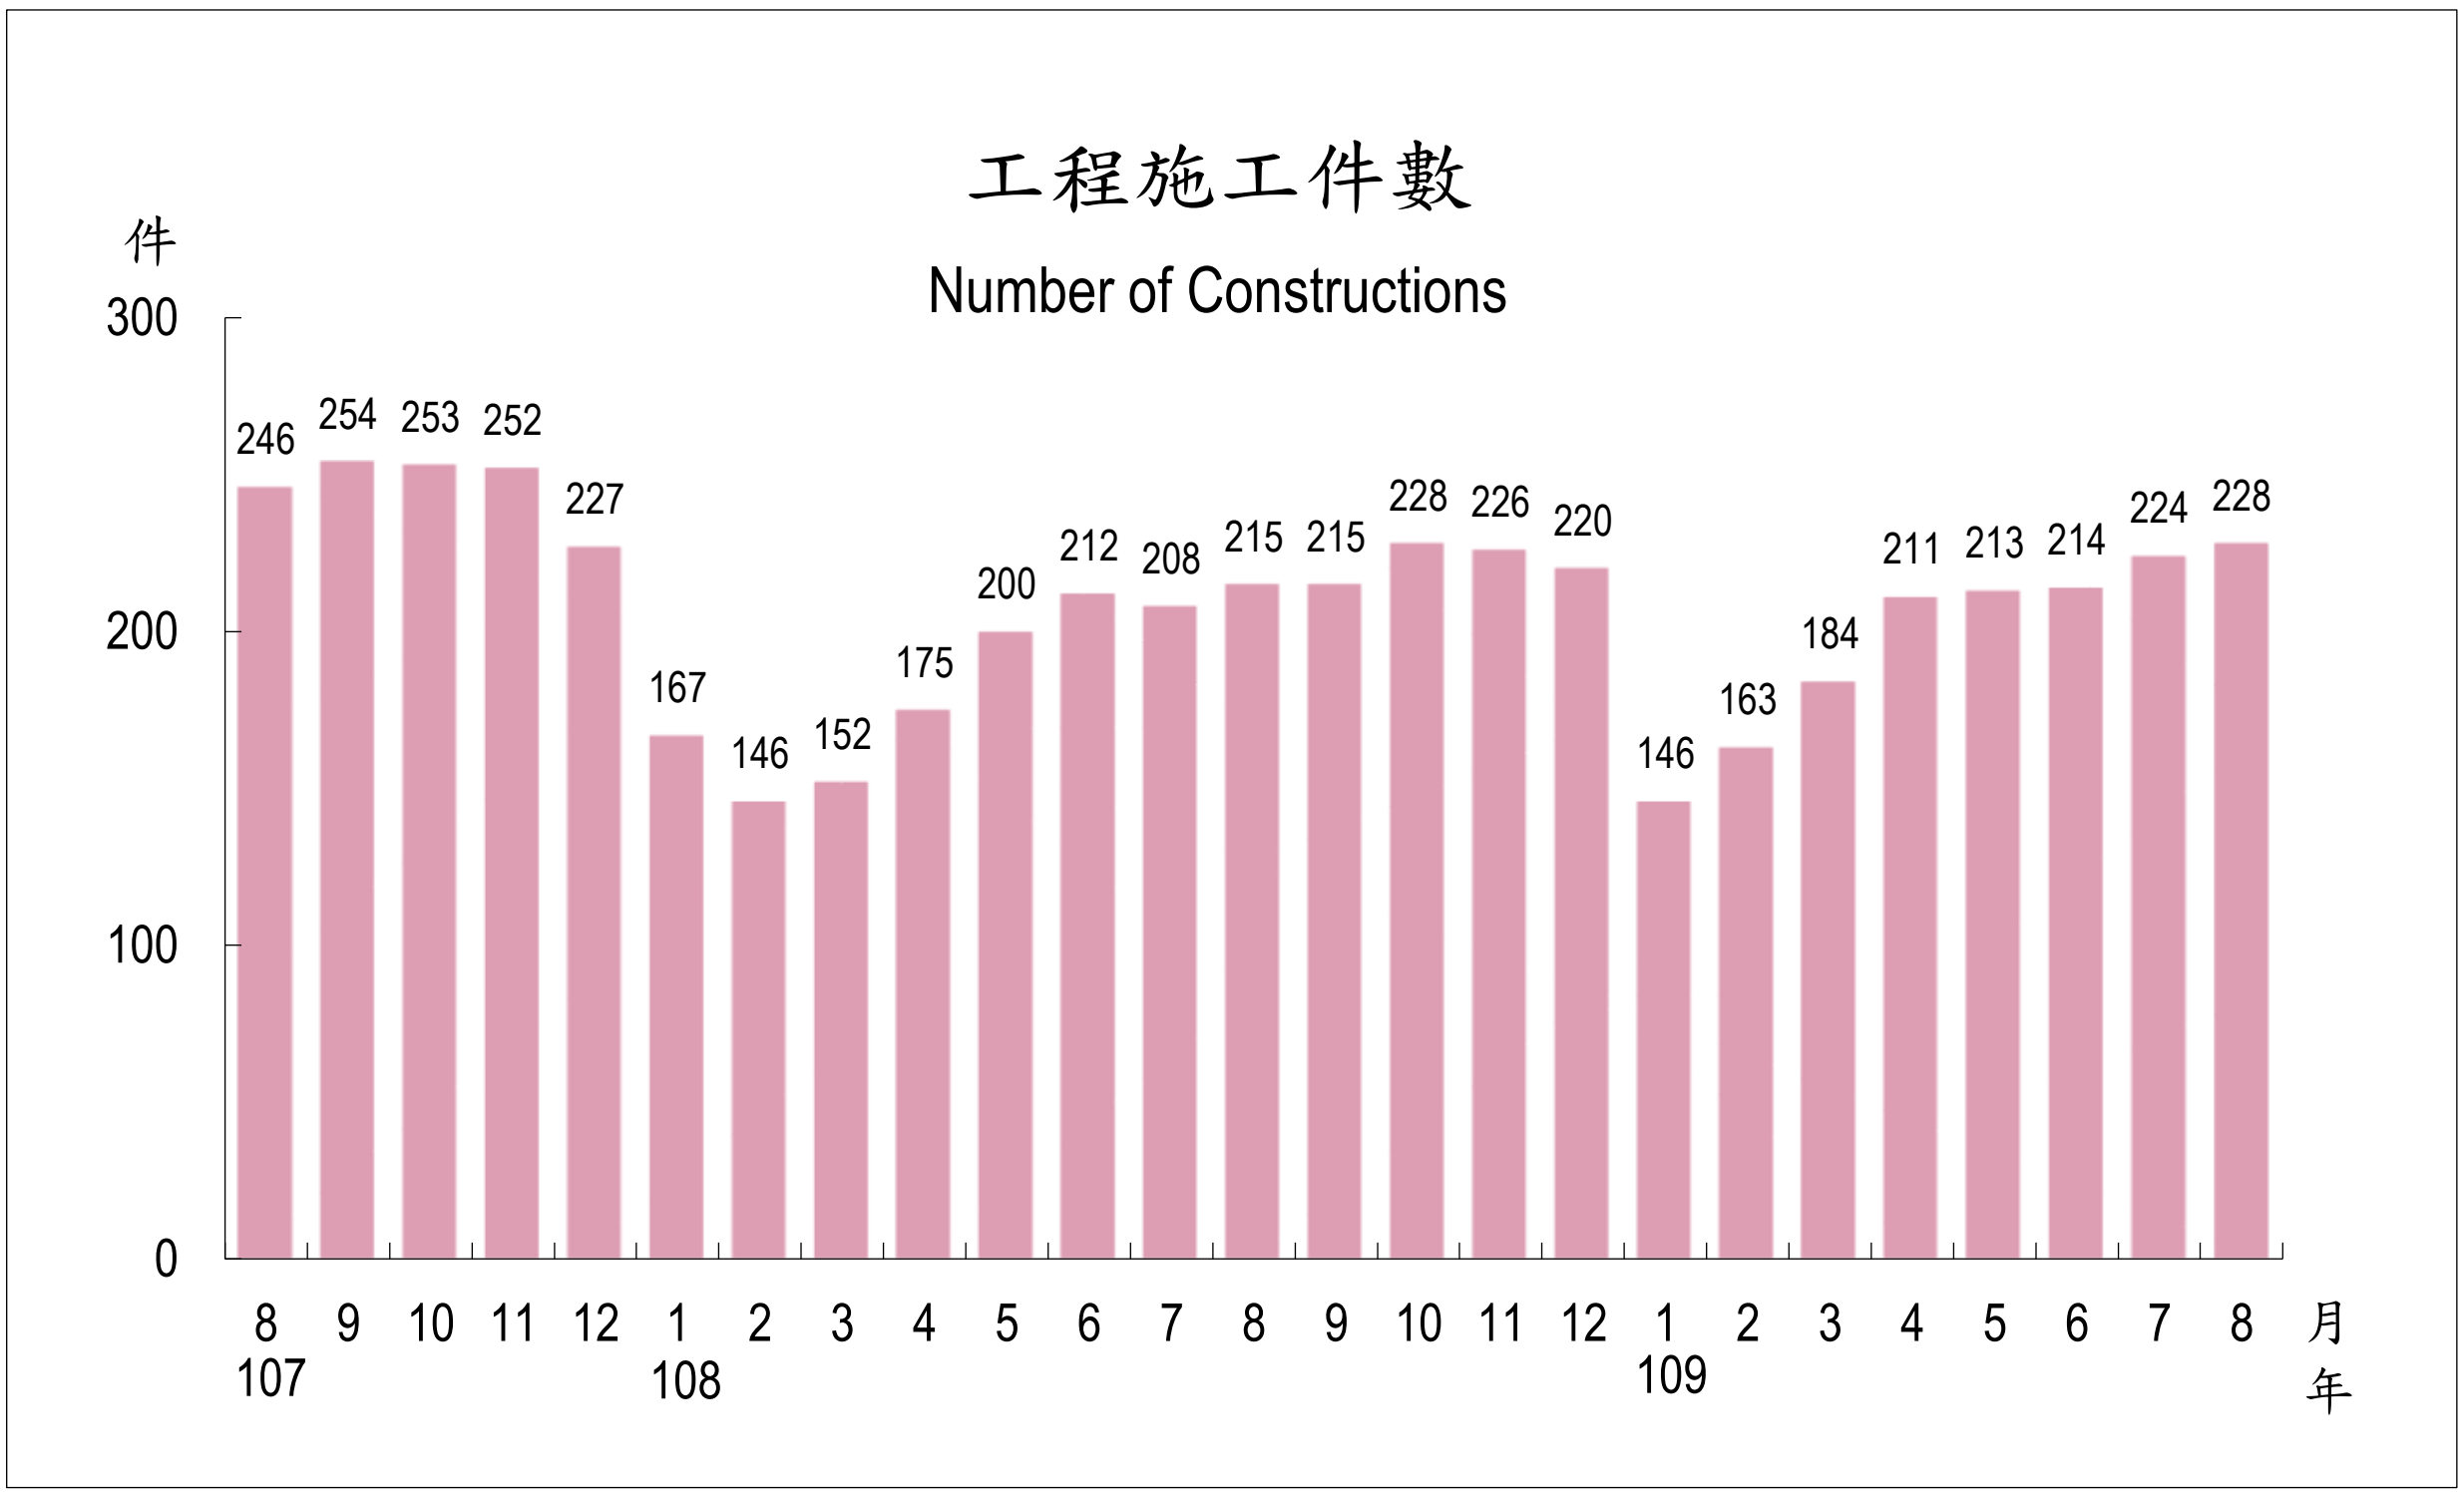

工程施工件數
Number of Constructions
件
300
200
100
0
246 254 253 252 227 167 146 152 175 200 212 208 215 215 228 226 220 146 163 184 211 213 214 224 228
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 月
107 108 109 年

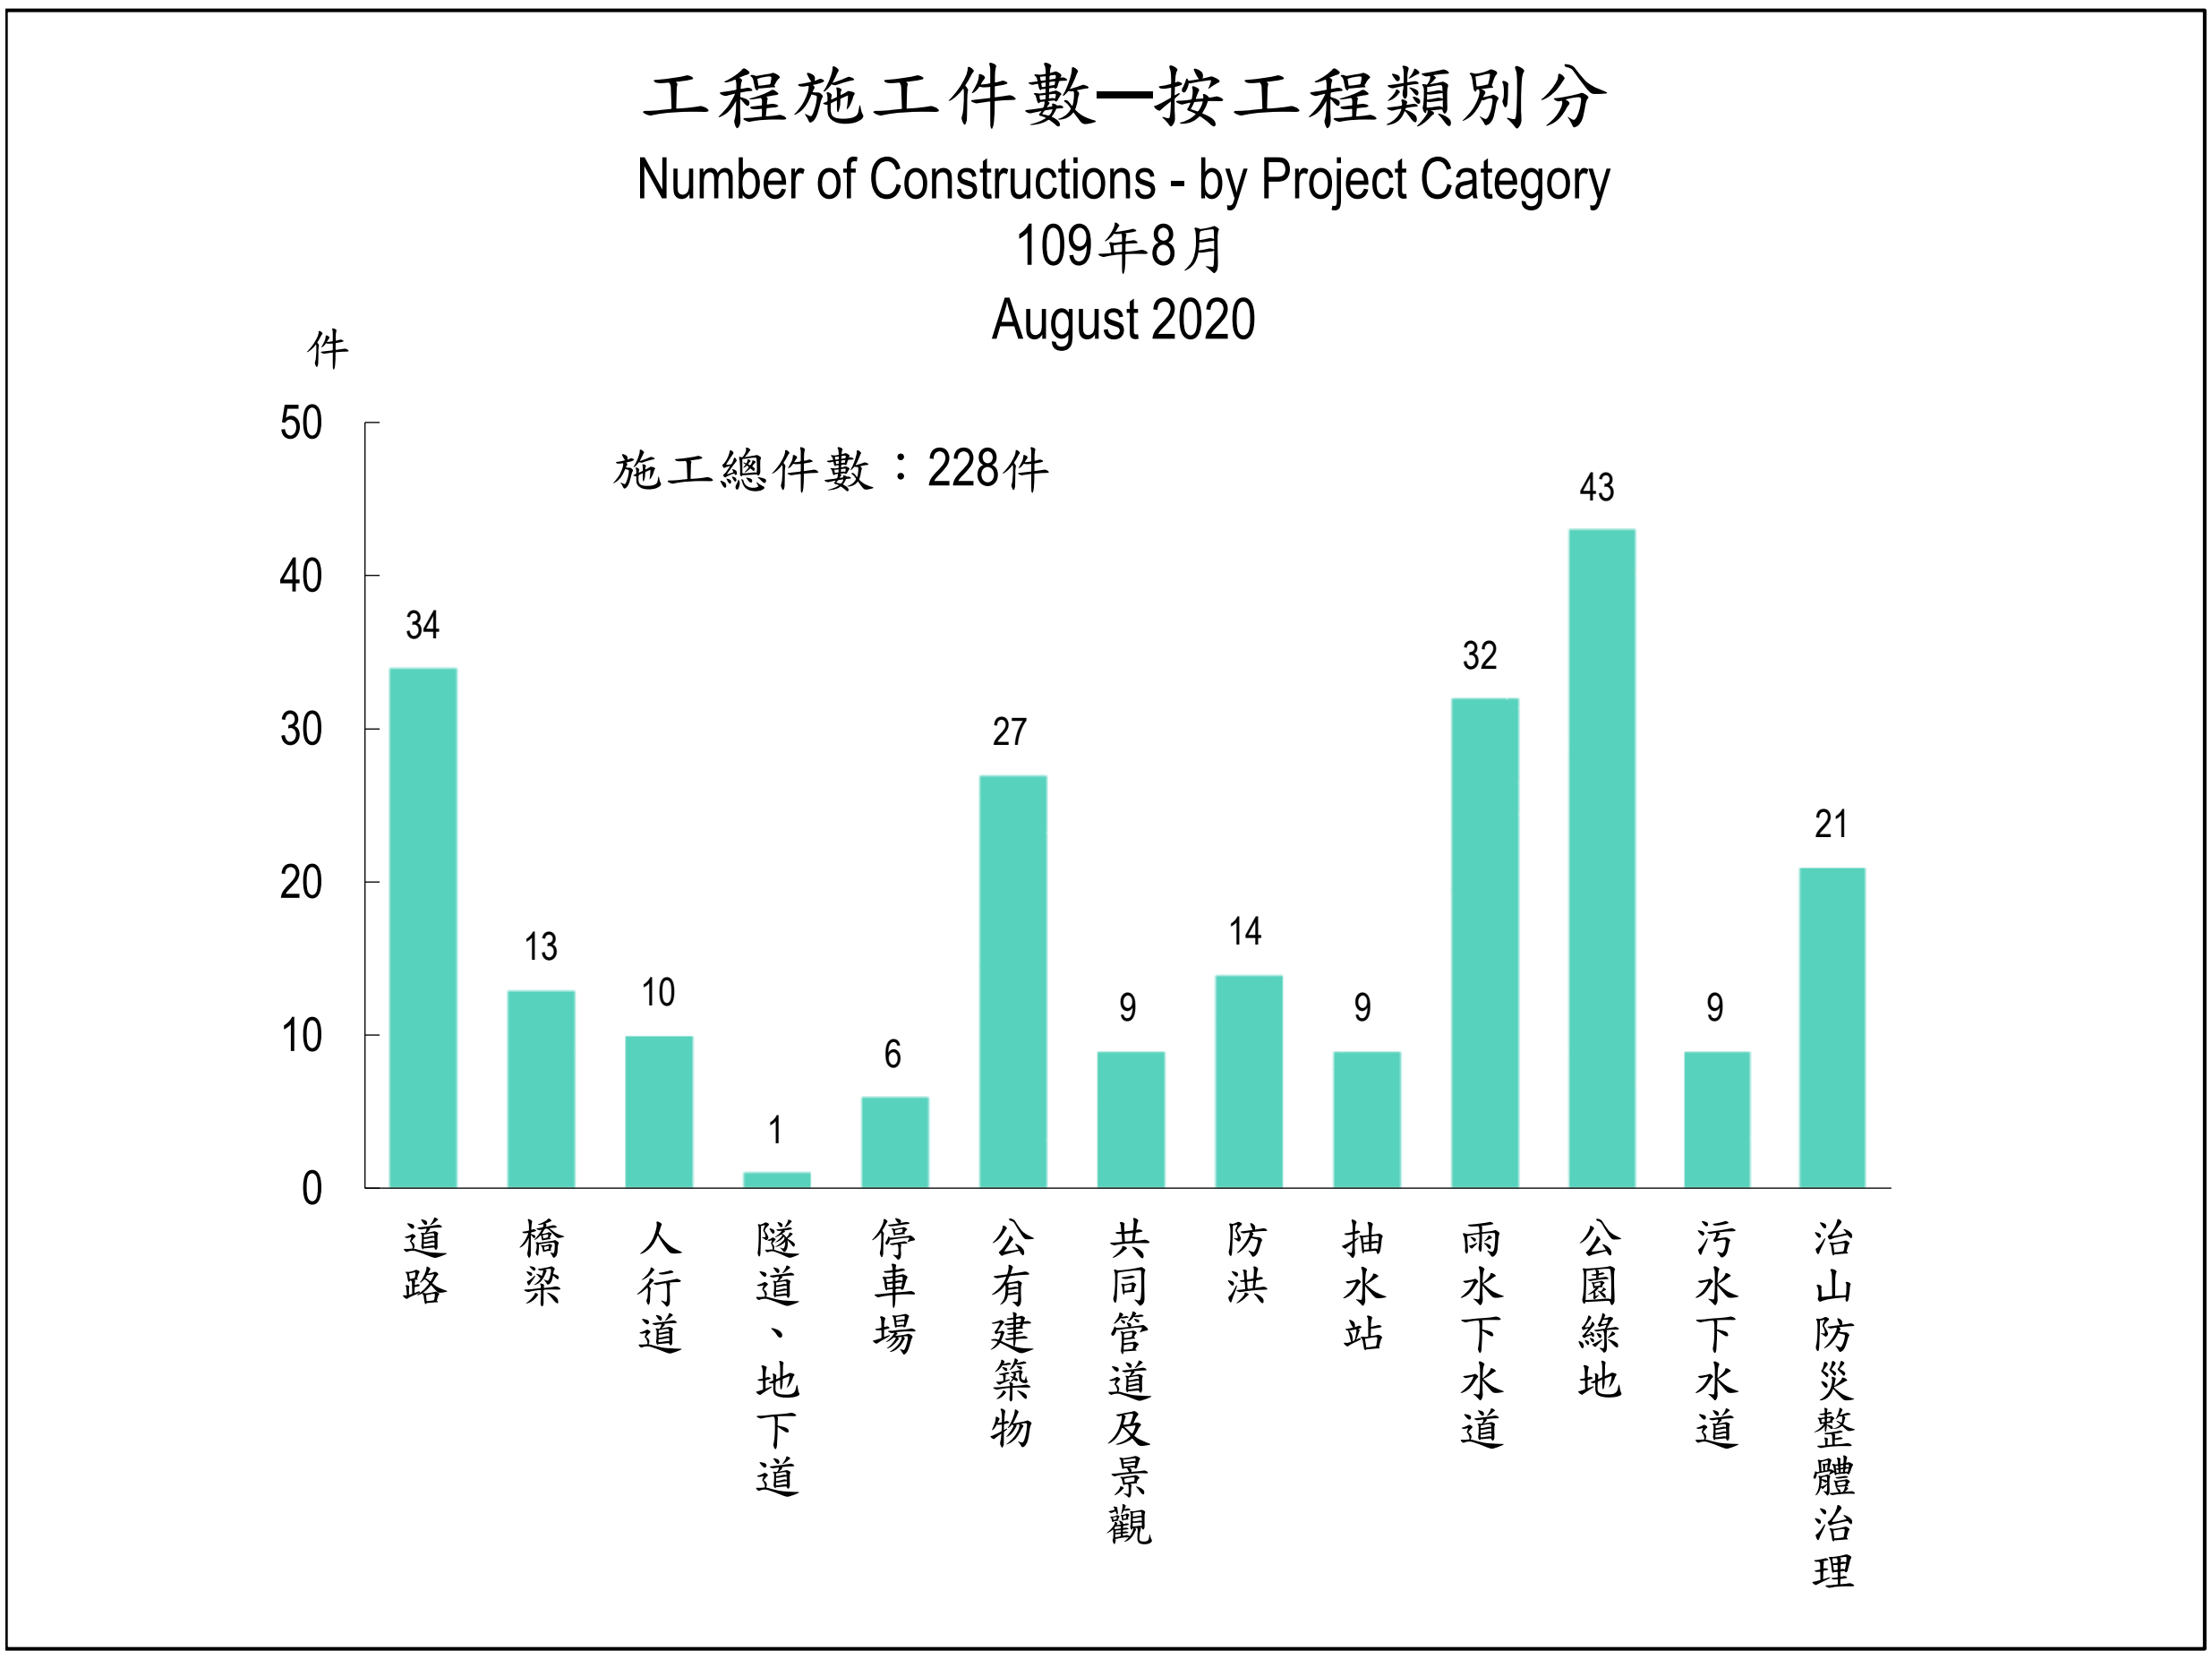

工程施工件數−按工程類別分
Number of Constructions - by Project Category
109年8月
August 2020
件
50
40
30
20
10
0
施工總件數：228件
34 13 10 1 6 27 9 14 9 32 43 9 21
道路
橋梁
人行道
隧道、地下道
停車場
公有建築物
共同管道及景觀
防洪
抽水站
雨水下水道
公園綠地
污水下水道
治山防災整體治理

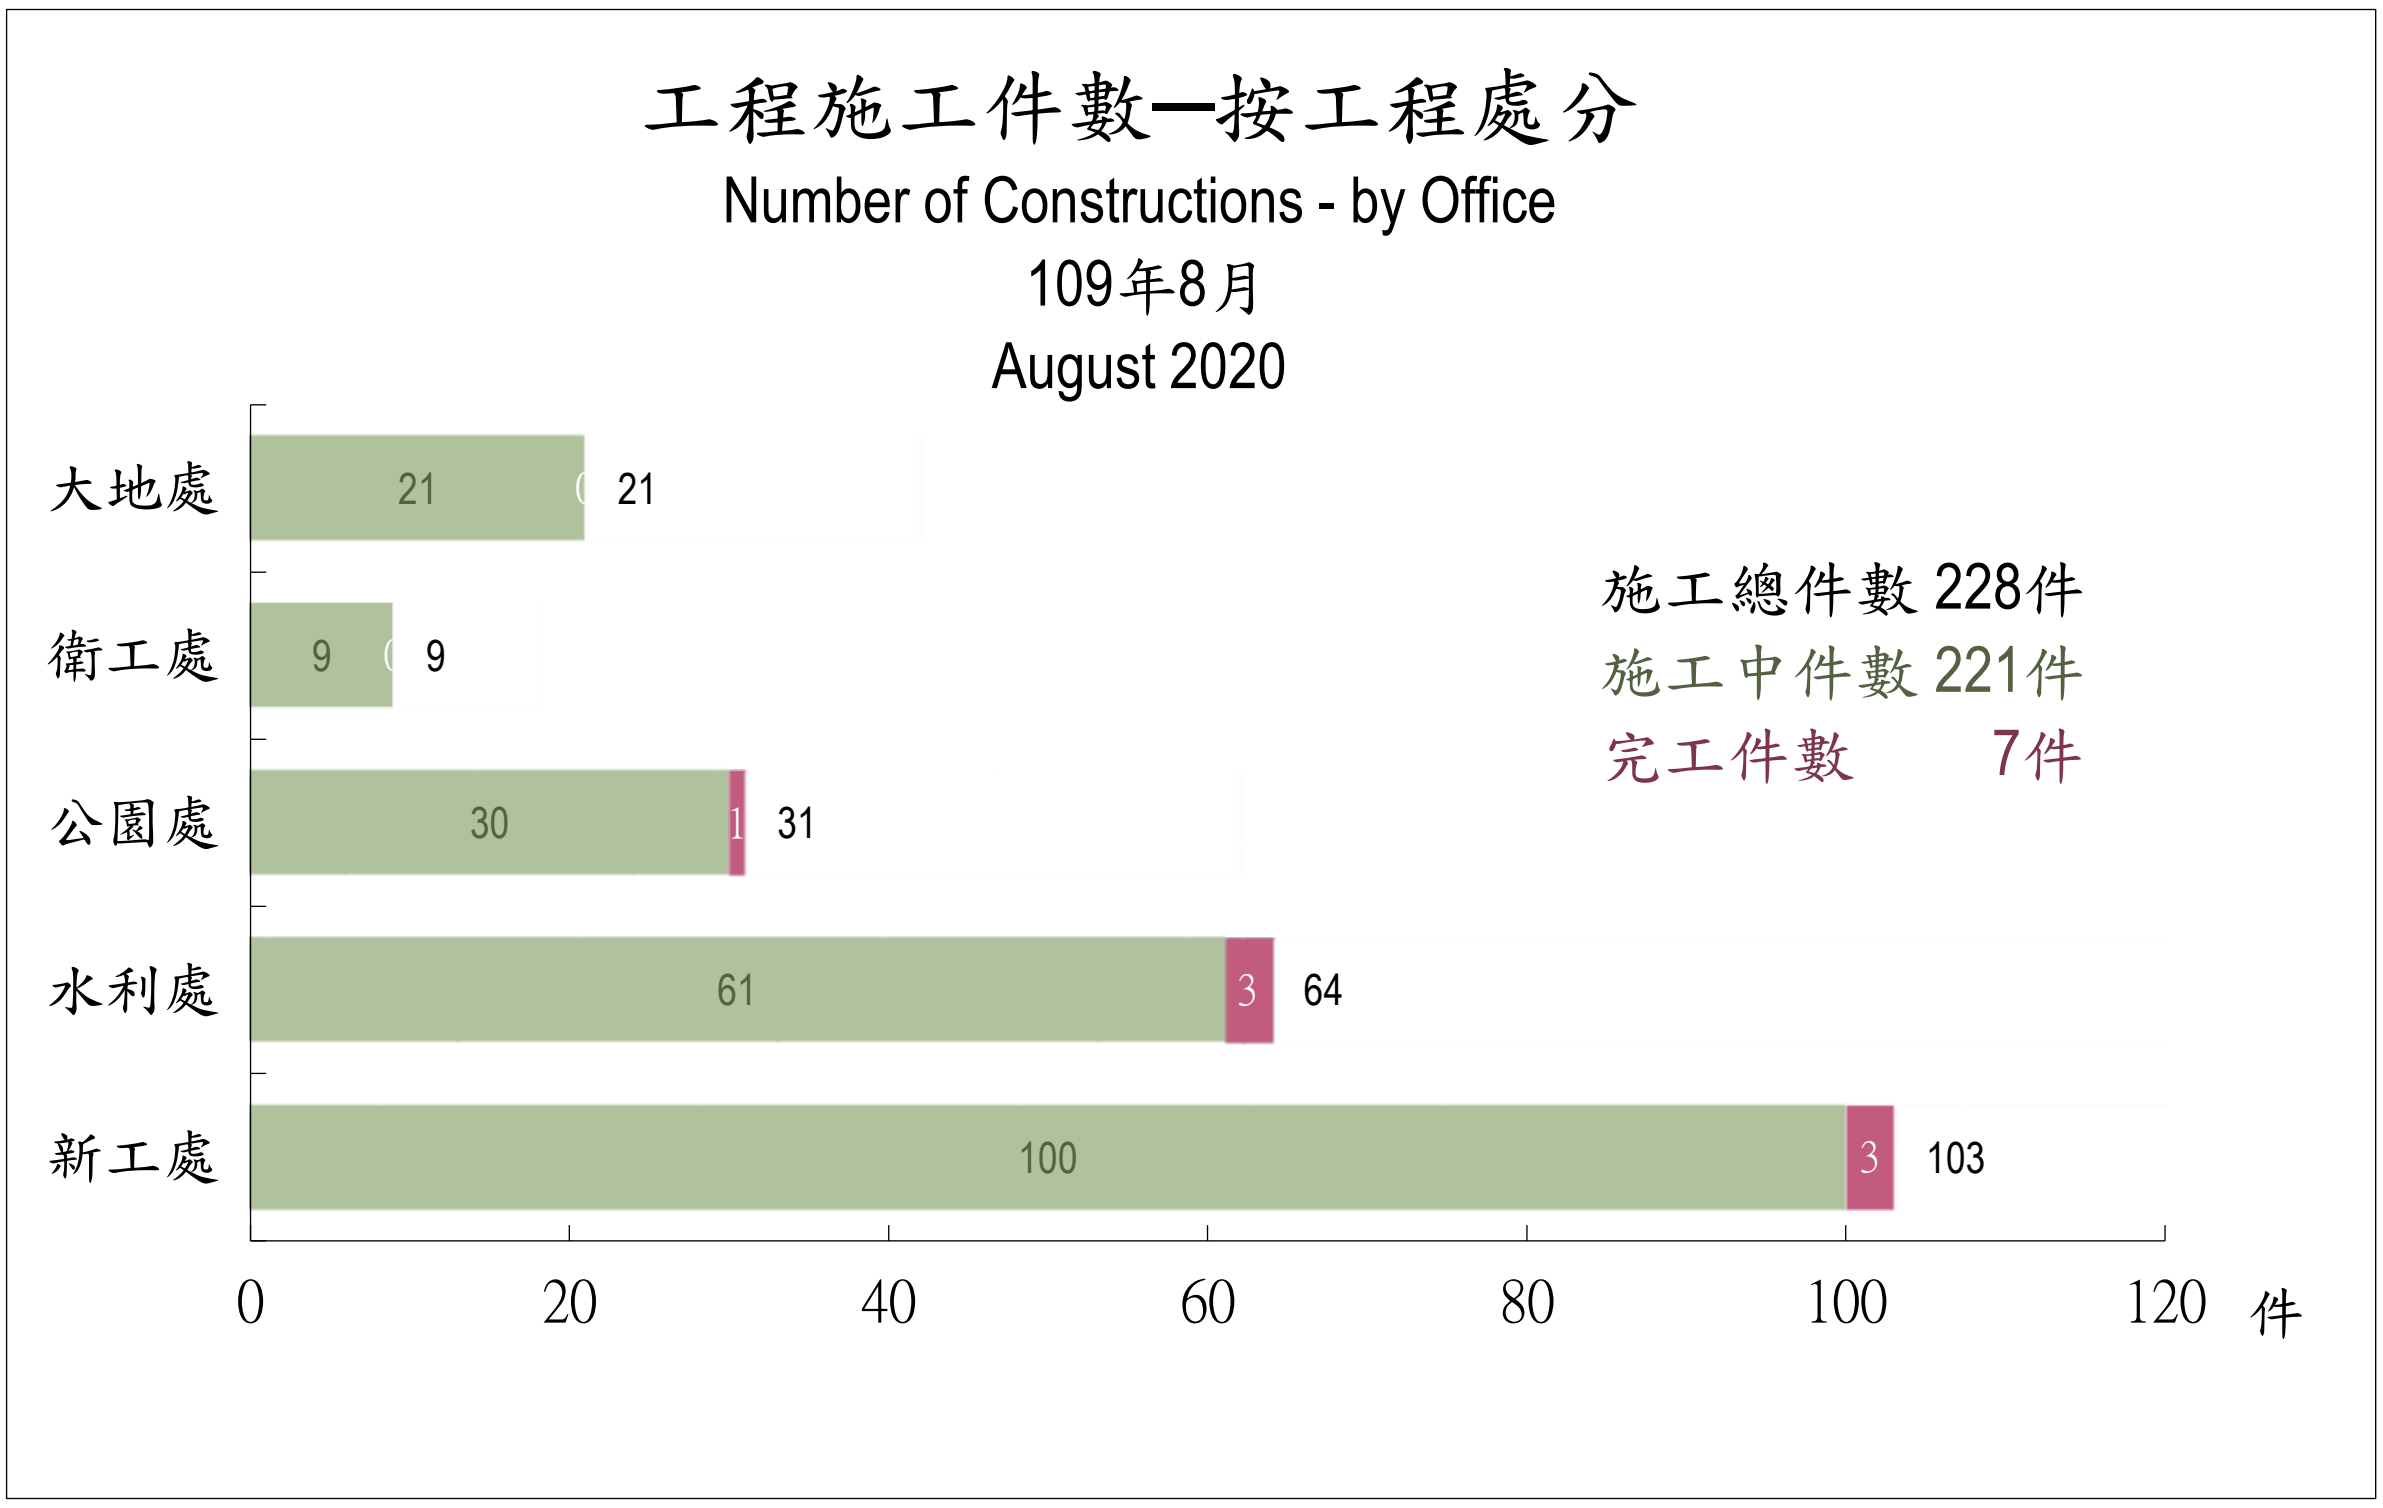
工程施工件數─按工程處分
Number of Constructions - by Office
109年8月
August 2020
大地處
衛工處
公園處
水利處
新工處
21
21
9
9
30
1
31
61
3
64
100
3
103
0
20
40
60
80
100
120
件
施工總件數 228件
施工中件數 221件
完工件數 7件

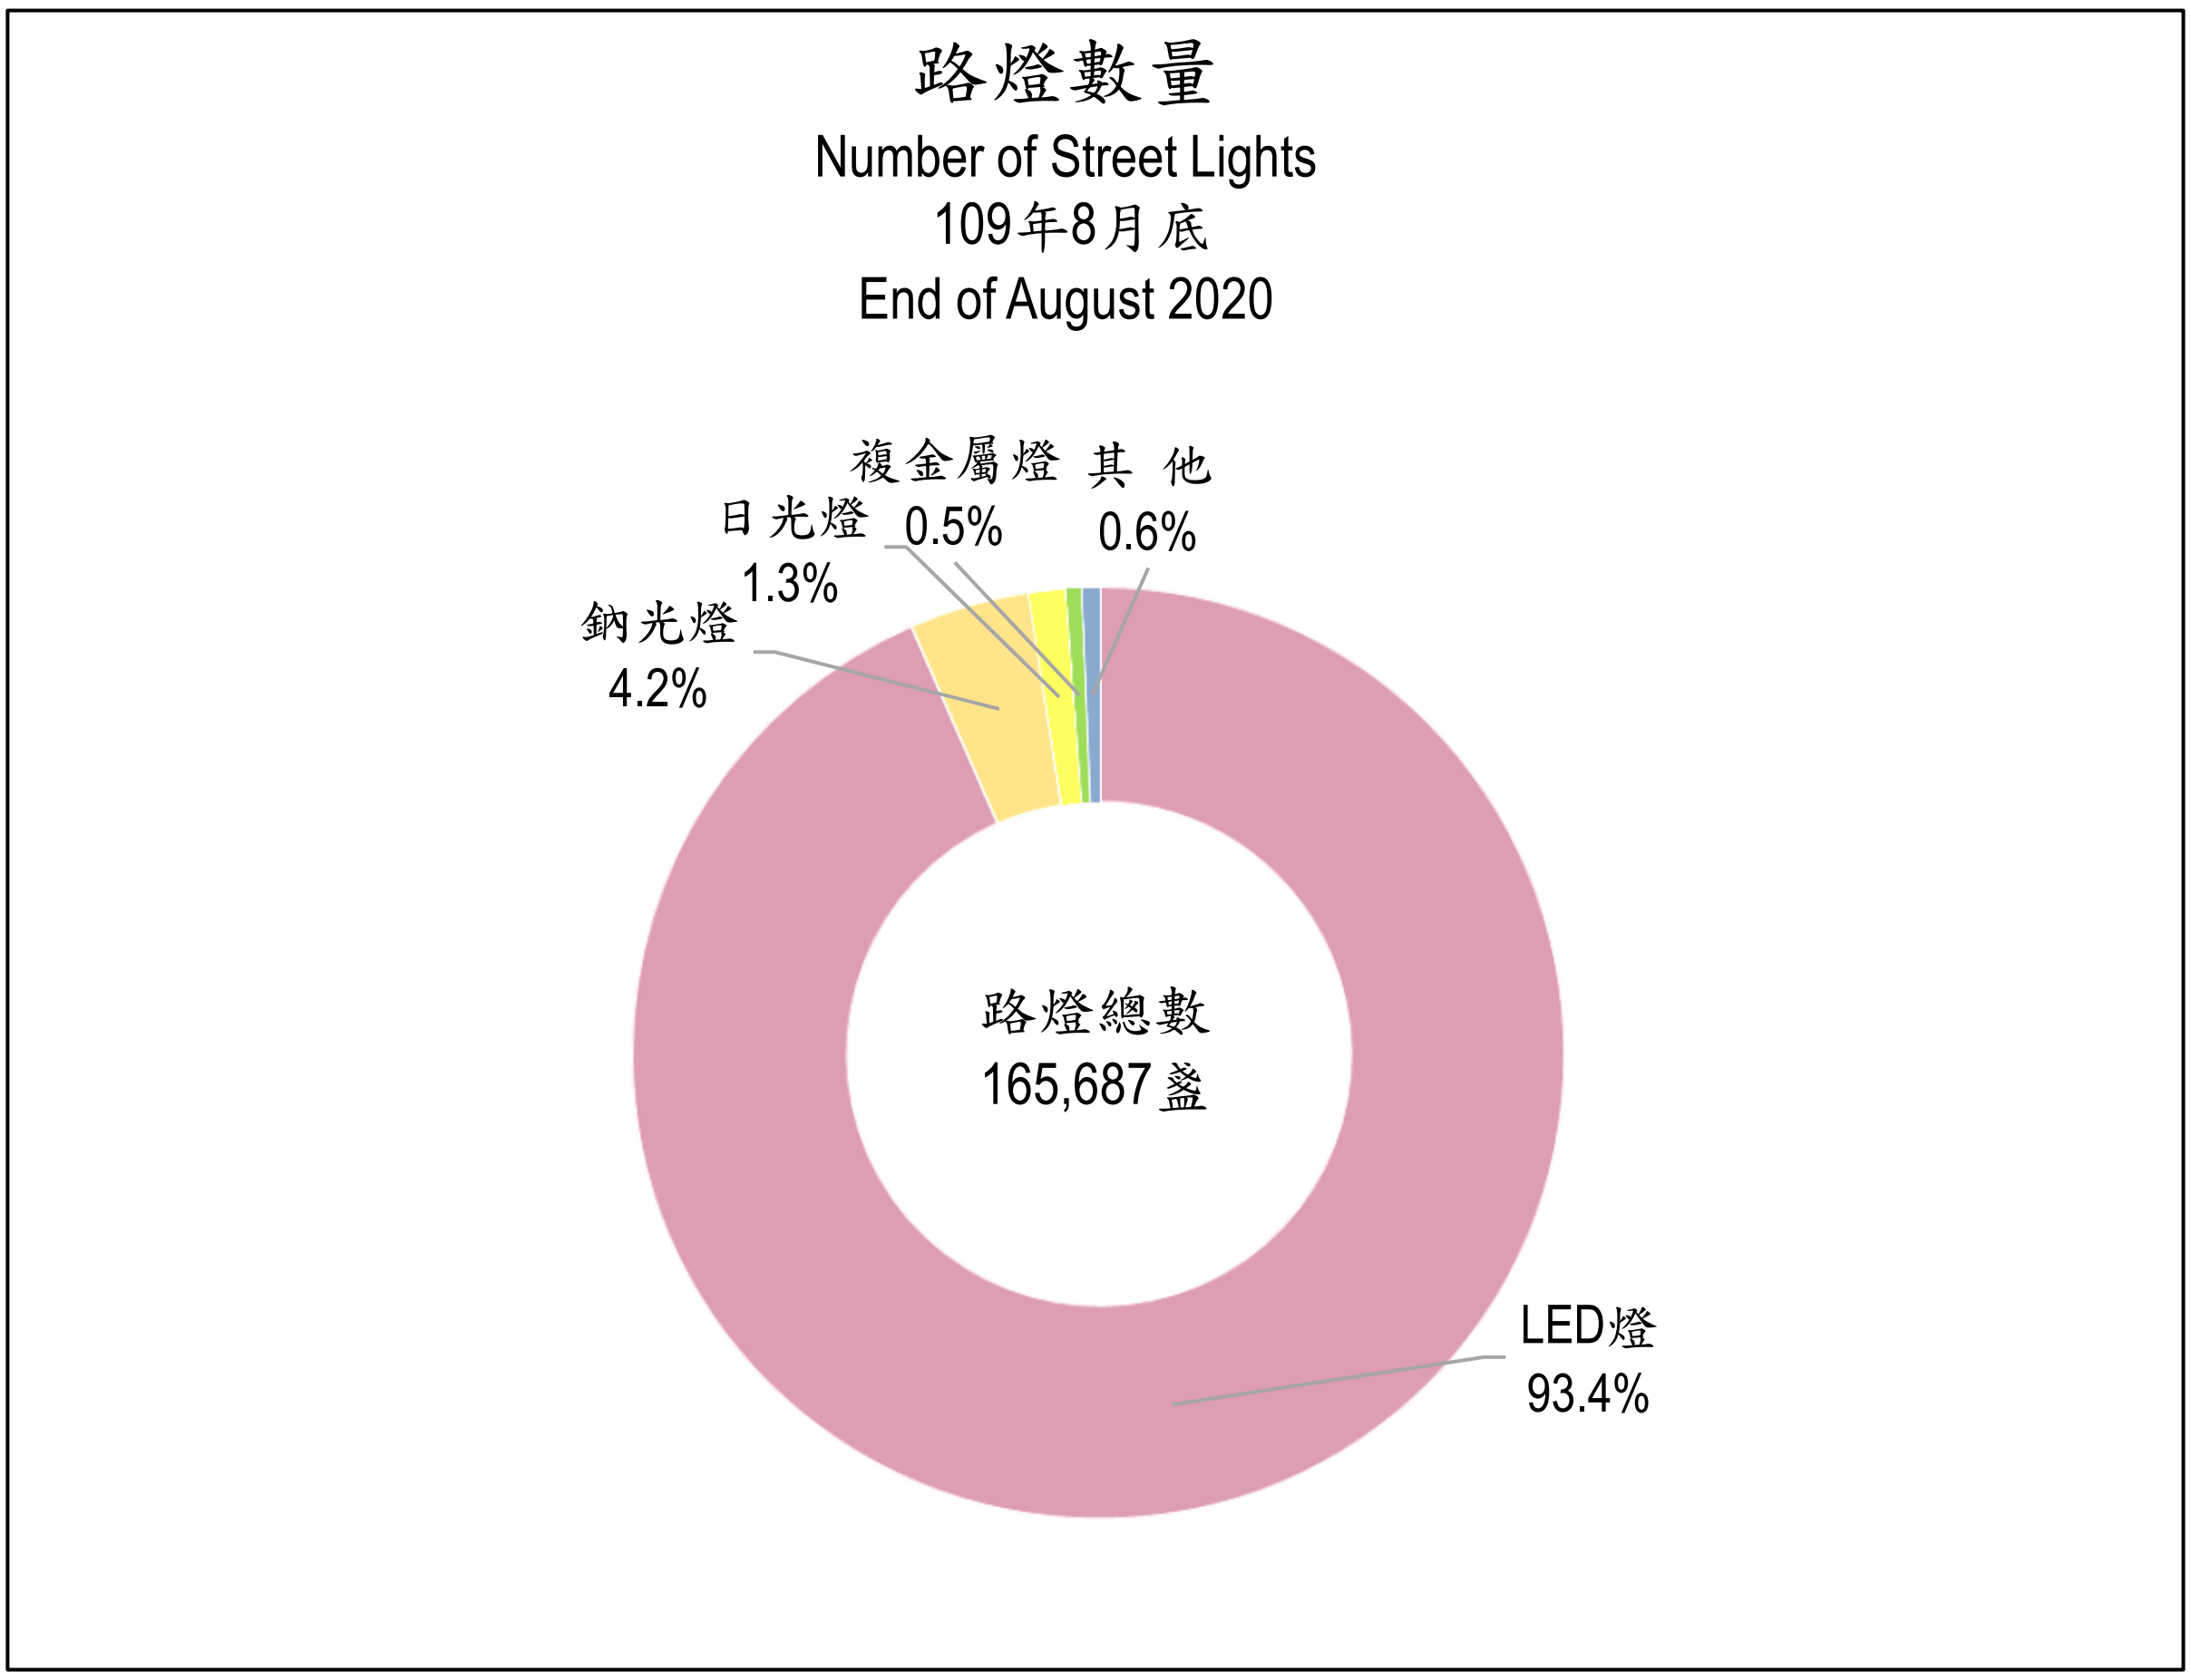
路燈數量
Number of Street Lights
109年8月底
End of August 2020
複金屬燈
0.5%
其 他
0.6%
日光燈
1.3%
鈉光燈
4.2%
路燈總數
165,687盞
LED燈
93.4%

每人享有公園綠地面積

Per Capita Area of Parks and Green Fields

109年6月底

End of June 2019

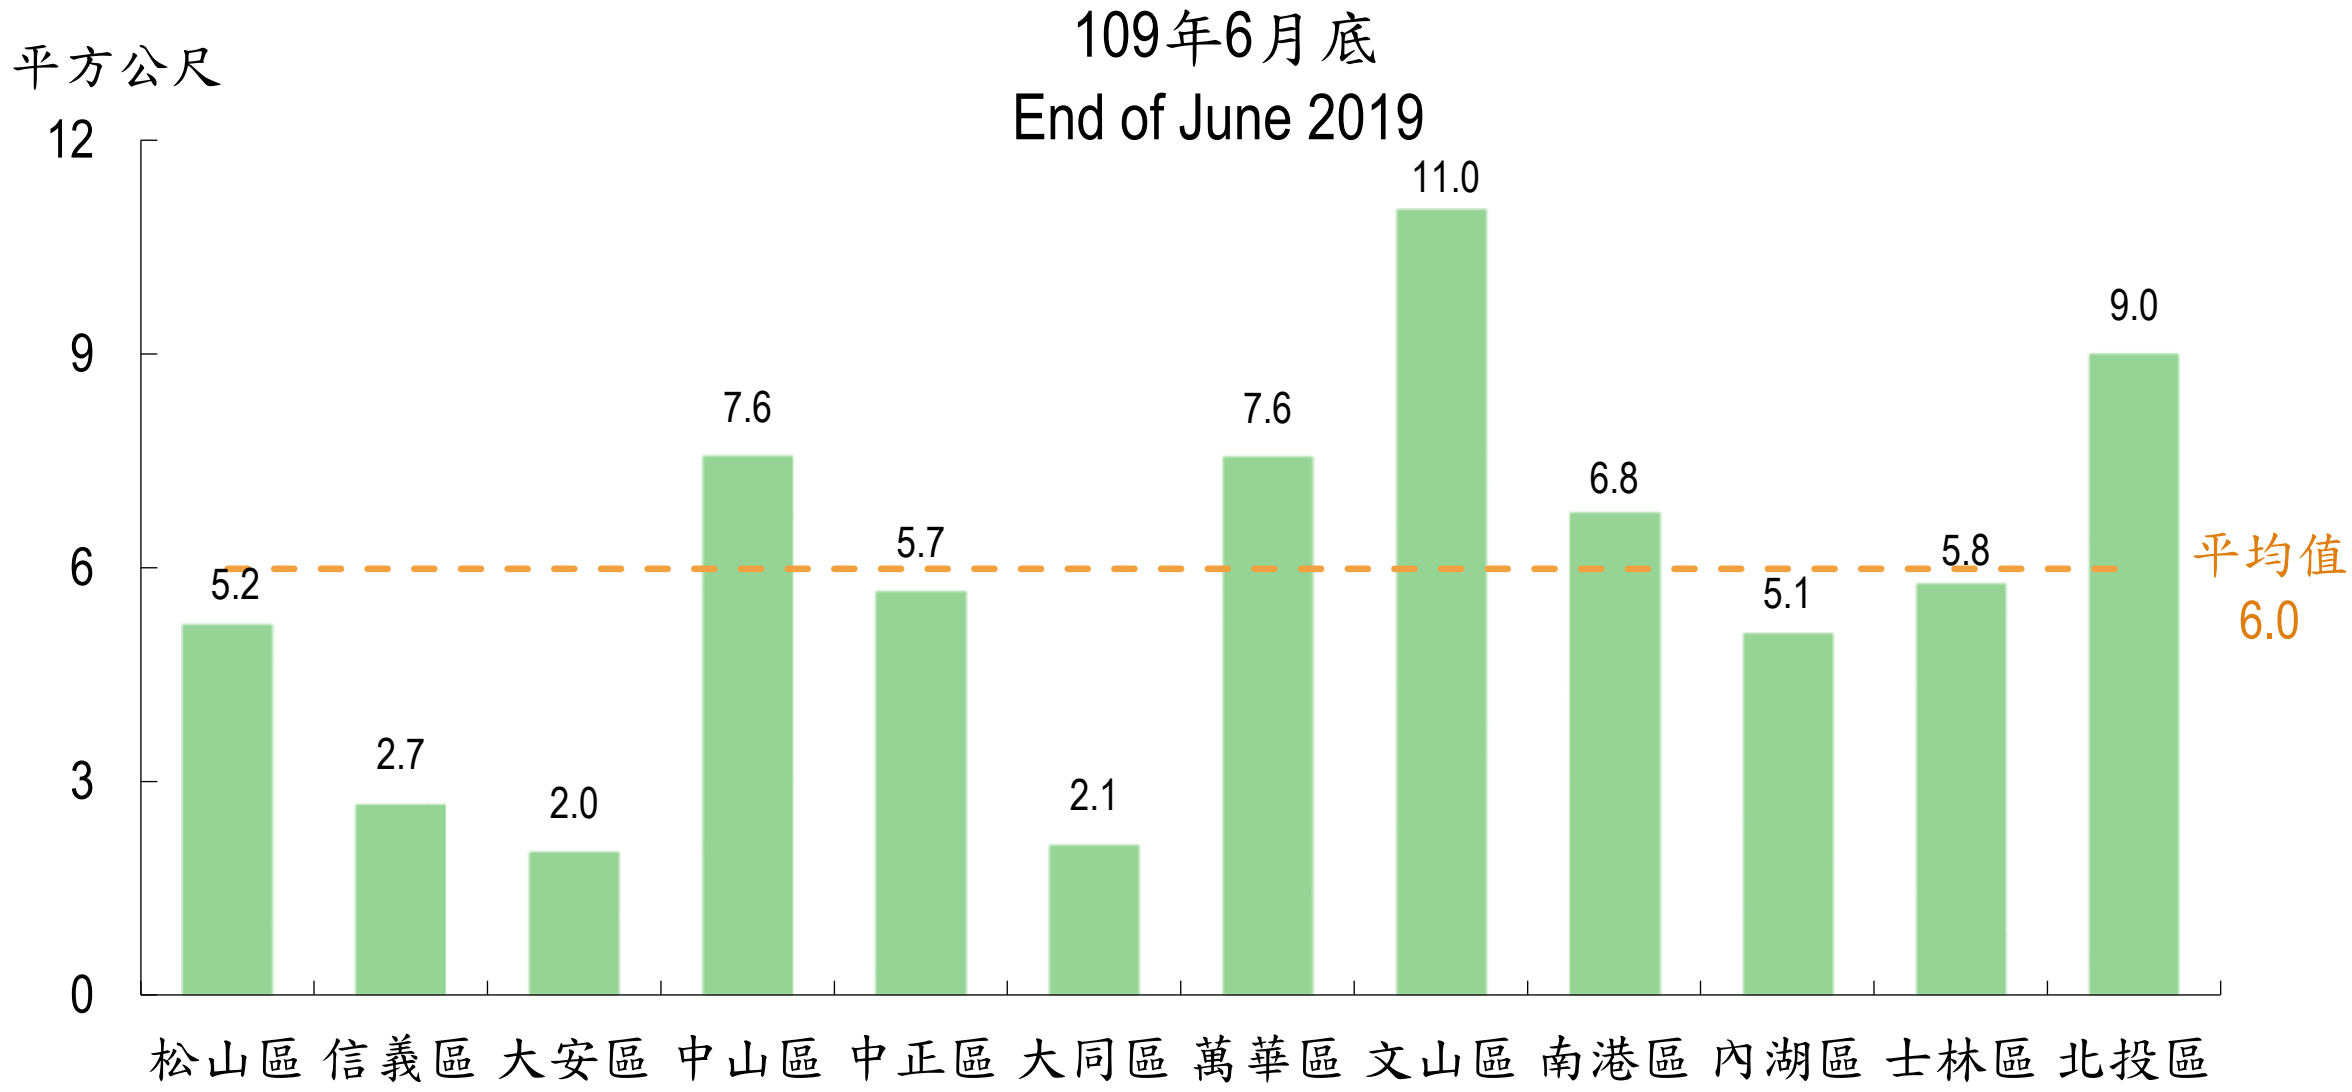

污水下水道用戶接管情形

Overview of Sewerage Connection

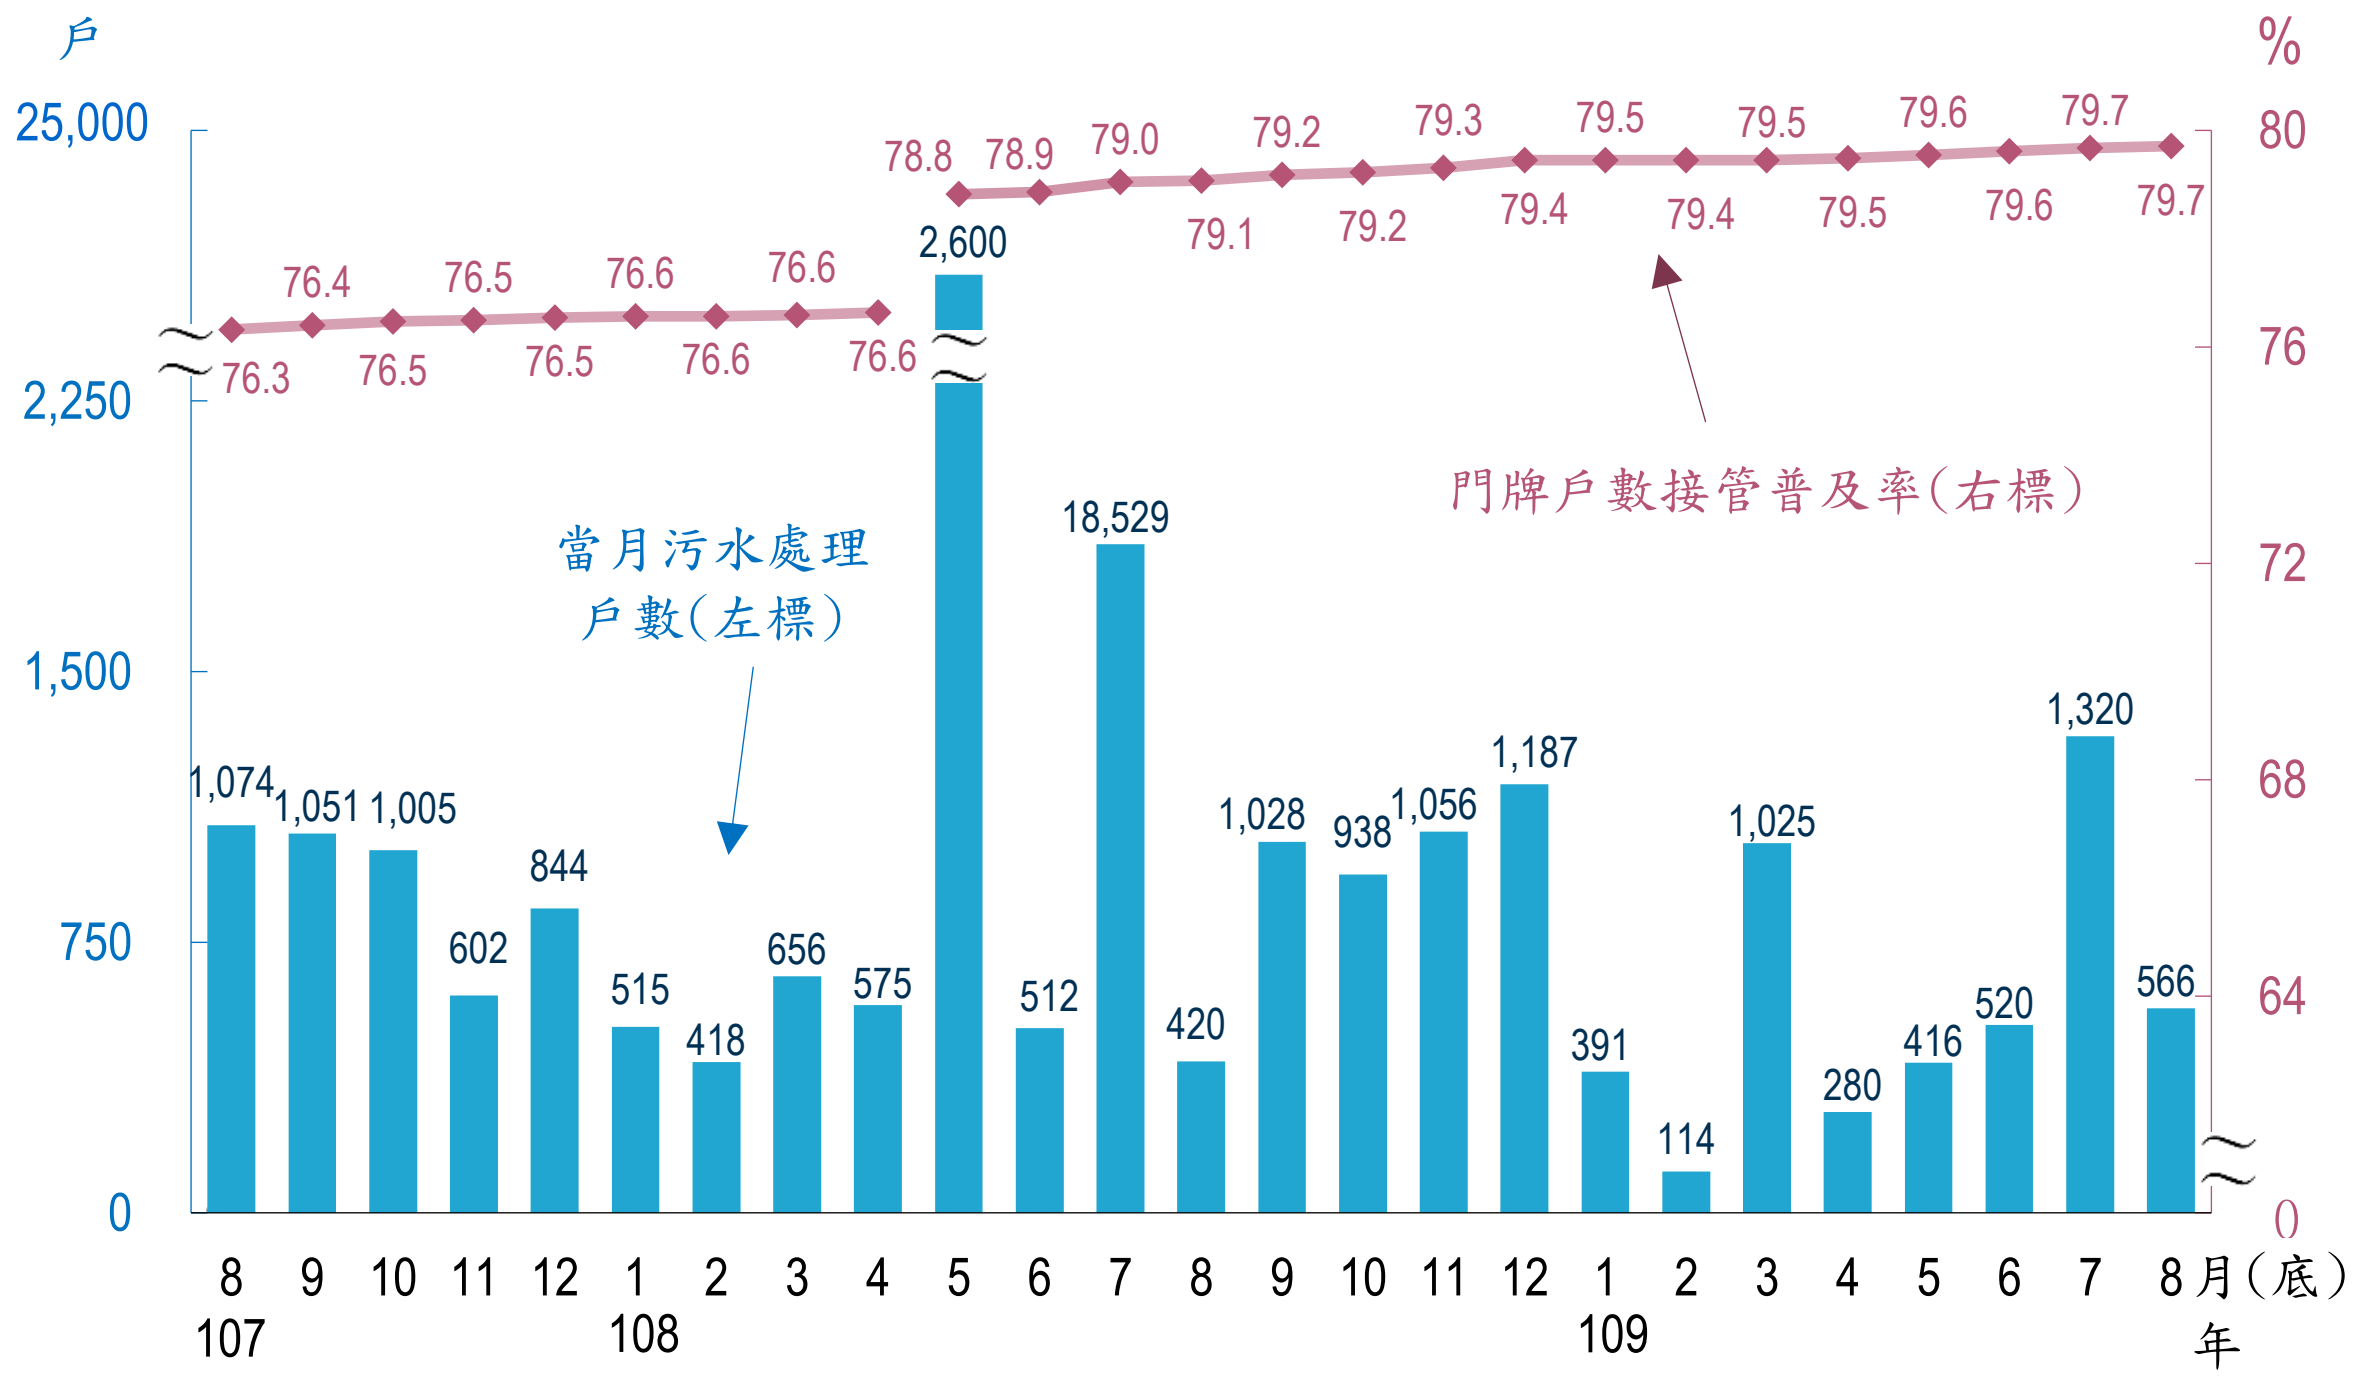

備註：1. 108年5月起，門牌戶數接管普及率不計入建築物自設專用污水下水道設置戶數。
2. 因辦理清查，致108年5月污水處理戶數數據大幅變動。

施工工程摘要

109年8月

Summary in August 2020

單位：件 unit：case

工程類別 Construction Category	施工件數 No. of Construction										備註 Note
	總計 Total	完工 Completed				施工中 Under Construction					
		合計 Sub-total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	合計 Sub-total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	停工 Work Suspension	
總計 Total	**228**	**7**	**2**	**5**	**-**	**221**	**89**	**110**	**22**	**-**	
百分比 %	**100.0**	**3.1**	**0.9**	**2.2**	**-**	**96.9**	**39.0**	**48.2**	**9.6**	**-**	
1. 道路新建、拓寬、改善 Road Expansion, Improvement and New Constructions	**34**	1	1	-	-	33	6	26	1	-	詳表1
2. 橋梁新建、拓建、改善 Bridge Expansion, Improvement and New Constructions	**13**	-	-	-	-	13	2	10	1	-	詳表2
3. 人行道改善工程 Sidewalk Improvement Work	**10**	-	-	-	-	10	1	9	-	-	詳表3
4. 隧道、地下道工程 Tunnel Constructions	**1**	-	-	-	-	1	-	-	1	-	詳表4
5. 停車場新建 New Parking Lots Constructions	**6**	-	-	-	-	6	2	2	2	-	詳表5
6. 公有建築物工程 Public Building Constructions	**27**	1	-	1	-	26	16	4	6	-	詳表6
7. 共同管道及景觀工程 Communal Pipeline and Landscape Constructions	**9**	-	-	-	-	9	4	4	1	-	詳表7
8. 防洪工程 Flood Protection Constructions	**14**	1	-	1	-	13	3	8	2	-	詳表8
9. 抽水站新建、擴建 Rainwater Pump Station Expansion and New Constructions	**9**	1	-	1	-	8	5	2	1	-	詳表9
10. 雨水下水道新建、改善 Rainwater Drainage System Improvement and New Constructions	**32**	2	1	1	-	30	4	23	3	-	詳表10
11. 公園綠地新建、改善 Park Improvement and New Constructions	**43**	1	-	1	-	42	25	14	3	-	詳表11
12. 污水下水道新建、改善 Sewerage System Improvement and New Constructions	**9**	-	-	-	-	9	1	8	-	-	詳表12
13. 治山防災整體治理工程 Watershed Management and Disaster Prevention	**21**	-	-	-	-	21	20	-	1	-	詳表13

資料來源：工務局。

Source: Public Works Department.

施工中工程

Under Construction

單位：件　　unit：case

年(月)別／機關別 Year (Month)／Sponsor		總計 Total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	停工 Work Suspension
民國108年	**2019**					
1月	Jan.	153	52	50	51	-
2月	Feb.	131	46	47	38	-
3月	Mar.	144	46	64	34	-
4月	Apr.	164	61	81	22	-
5月	May	191	56	103	32	-
6月	June	205	53	120	32	-
7月	July	198	72	97	29	-
8月	Agu.	211	69	111	31	-
9月	Sep.	208	73	116	19	-
10月	Oct.	220	79	119	22	-
11月	Nov.	205	68	117	20	-
12月	Dec.	146	55	31	60	-
民國109年	**2020**					
1月	Jan.	131	49	35	47	-
2月	Feb.	154	66	72	16	-
3月	Mar.	171	63	94	14	-
4月	Apr.	203	74	114	15	-
5月	May	206	76	109	21	-
6月	June	213	87	114	12	-
7月	July	213	79	116	18	-
8月	**Agu.**	**221**	**89**	**110**	**22**	**-**
新建工程處 New Construction Office		100	32	56	12	-
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		61	12	43	6	-
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office		30	24	3	3	-
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		9	1	8	-	-
大地工程處 Geotechnical Engineering Office		21	20	-	1	-

資料來源：工務局。

Source: Public Works Department.

表1　道路新建、拓寬、改善工程

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**384,298**
新建工程處 New Construction Office	108-109	1. 108年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	16,132
	108-109	2. 108年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	15,917
	108-109	3. 108年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	11,582
	108-109	4. 108年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	18,813
	108-109	5. 108年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	24,308
	108-109	6. 108年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	17,374
	108-109	7. 108年度一般道路更新工程開口契約(第7標)(抵費地基金)	6,381
	108-109	8. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	3,967
	108-109	9. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	5,282
	108-109	10. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	4,690
	108-109	11. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	8,123
	108-109	12. 108年度道路附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	4,169
	108-109	13. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	9,522
	108-109	14. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	8,151
	108-109	15. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	8,850
	108-109	16. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	7,111
	108-109	17. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	8,085

Table 1 Road Expansion, Improvement and New Constructions

August 2020

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
5,755	**4-40**	**127,484**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7**	**26**	**1**
預約維護			108.04	109.12		72.39	72.39		V	
預約維護			108.05	109.12		84.43	84.43		V	
預約維護			108.05	109.12		89.16	89.16		V	
預約維護			108.05	109.12		84.16	84.16		V	
預約維護			108.04	109.12		75.00	75.00		V	
預約維護			108.04	109.12		77.00	77.00		V	
預約維護			108.05	109.12		63.50	63.50		V	
預約維護			108.04	109.12		80.00	80.00		V	
預約維護			108.04	109.12		82.58	82.58		V	
預約維護			108.04	109.12		87.00	87.00		V	
預約維護			108.04	109.12		85.00	85.00		V	
預約維護			108.04	109.12		91.00	91.00		V	
預約維護			108.04	109.12		91.00	91.00		V	
預約維護			108.04	109.12		73.84	73.84		V	
預約維護			108.04	109.12		98.95	98.95		V	
預約維護			108.04	109.12		77.00	77.00		V	
預約維護			108.04	109.12		84.00	85.00	V		

表1　道路新建、拓寬、改善工程（續）

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
	108-109	18. 108年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第7標)(抵費地基金)	1,861
	108-109	19. 108年度災害搶修工程開口契約(第2標)(大安文山、中正萬華)	1,128
	108-109	20. 108年度災害搶修工程開口契約(第3標)(內湖南港、松山信義)	1,875
	109	21. 109年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	5,513
	109-110	22. 109年度臺北市道路改善工程開口契約	1,870
	109	23. 109年度道路附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中正、萬華、松山、信義、大安、文山區)	2,283
	109	24. 109年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(士林、北投、中山、大同、內湖、南港區)	2,283
	104-110	25. 福國路延伸工程(第2期)	86,644
	108-110	26. 北投士林科技園區徵收公共工程(第2期-東基地)	73,943
	108-109	27. 信義區福德街137巷道路新築工程	1,512
	108-109	28. 知行路292巷4弄、2弄及其連接道路新築暨拓寬工程	764
	108-109	29. 信安街15巷(六張犁營區A街廓北側)道路新築工程	1,094
	109	30. 斯文里二期整宅公辦都更基地東側8公尺計畫道路新築工程	632
	107-109	31. 莊敬路325巷道路拓寬工程	1,235
	108-110	32. 興德路66巷道路拓寬工程	1,925
	109	33. 興寧街西側道路拓寬工程	524
	109-110	34. 大度路3段南側貴子坑溪旁道路拓寬工程	20,756
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處。

Table 1 Road Expansion, Improvement and New Constructions (Cont.)

August 2020

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
預約維護			108.04	109.12		75.00	75.00		V	
預約維護			108.04	109.12		34.44	34.44		V	
預約維護			108.06	109.12		32.23	32.23		V	
預約維護			109.06	109.12		33.80	33.80		V	
預約維護			109.07	110.12		2.27	2.27		V	
預約維護			109.08	110.03		8.07	8.07		V	
預約維護			109.08	109.12		2.00	2.00		V	
1,420	10-40	31,546	107.11	110.11		22.71	28.31	V		
2,864	10-30	71,600	108.09	110.09		33.55	33.55		V	
132	7-8	1,060	108.12	109.08		100.00	40.00			V
150	4-8	1,077	109.02	109.10		70.00	70.00		V	
90	11-12	1,080	109.03	109.09		71.69	72.66	V		
60	7-8	480	109.06	109.12		5.00	5.00		V	
138	14-15	2,070	109.02	109.10	109.08	95.00	100.00	V		
81	11-12	1,275	109.02	109.10		65.84	71.84	V		
60	7-8	576	109.04	109.09		35.63	36.92	V		
760	21-23	16,720	109.04	110.07		11.65	16.20	V		

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

表2　橋梁新建、拓建、改善工程

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**279,780**
新建工程處 New Construction Office	104-108	1. 福國路延伸工程(第2期)	①--
	105-111	2. 中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	231,898
	106-108	3. 建國高架橋及舊環南高架耐震補強改善工程(第一標)	6,477
	107-109	4. 福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程	11,169
	108-109	5. 108年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第1標)(士林北投、中山大同區)	5,905
	108-109	6. 108年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第2標)(內湖南港、松山信義區)	5,999
	108-109	7. 108年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第3標)(中正萬華、大安文山區)	6,203
	108-109	8. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第1標)(中山大同區)	2,155
	108-109	9. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第2標)(松山信義區)	1,906
	108-109	10. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第3標)(中正萬華區)	1,883
	108-109	11. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第4標)(內湖南港區)	2,202
	108-109	12. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第5標)(士林北投區)	1,956
	108-109	13. 108年度全市橋涵維護工程開口契約(第6標)(大安文山區)	2,026
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

Table 2　Bridge Expansion, Improvement and New Constructions

August 2020

工程內容　Construction Project						工期　Project Period			施工進度　Progress				
主橋 Main Span			引道 Lead Road			開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (㎡)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (㎡)								
982	**4-35.4**	**12,266**	**1,502**	**6-35**	**21,510**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2**	**10**	**1**
190	16	3,040	1,104	9-16	11,313	107.11	110.11		22.71	28.31	V		
190	35.4	6,726	398	6-35	10,197	108.05	112.05		16.48	16.49	V		
耐震補強改善						107.02	110.03		71.52	71.36			V
602	4-4.5	2,500	-	-	-	108.02	109.10		56.60	56.60		V	
預約維護						108.04	109.12		50.00	50.00		V	
預約維護						108.05	109.12		50.83	50.83		V	
預約維護						108.06	109.12		58.50	58.50		V	
預約維護						108.04	109.12		62.00	62.00		V	
預約維護						108.05	109.12		72.70	72.70		V	
預約維護						108.05	109.12		75.90	75.90		V	
預約維護						108.05	109.12		99.95	99.95		V	
預約維護						108.06	109.12		58.60	58.60		V	
預約維護						108.04	109.12		62.33	62.33		V	

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the road project expenditure.

表3　人行道改善工程

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**61,902**
新建工程處 New Construction Office	108-109	1. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第一標)(中山、大同區)	5,873
	108-109	2. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第二標)(松山、信義區)	5,873
	108-109	3. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第三標)(中正、萬華區)	5,873
	108-109	4. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第四標)(內湖、南港區)	5,873
	108-109	5. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第五標)(士林、北投區)	7,930
	108-109	6. 108年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)(大安、文山區)	7,724
	109	7. 臺北市忠孝東路等東西軸線路段及周邊人行環境改善工程(第一標)	7,070
	109	8. 臺北市忠孝東路等東西軸線路段及周邊人行環境改善工程(第二標)	7,518
	109	9. 臺北市忠孝東路等東西軸線路段及周邊人行環境改善工程(第三標)	7,211
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	109	10. 士林區芝山國小南側退縮地及人行道更新等2項工程	959

資料來源：新建工程處、水利工程處。

Table 3　Sidewalk Improvement Work

August 2020

工程內容　Construction Project			工期　Project Period			施工進度　Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
365	**5**	**1,667**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1**	**9**	**-**
	預約維護		108.06	109.12		67.11	67.11		V	
	預約維護		108.05	109.12		75.00	75.00		V	
	預約維護		108.04	109.12		63.10	63.10		V	
	預約維護		108.04	109.12		83.90	83.90		V	
	預約維護		108.04	109.12		66.00	66.00		V	
	預約維護		108.04	109.12		72.60	72.60		V	
	預約維護		109.05	109.11		18.00	18.00		V	
	預約維護		109.05	109.11		28.20	28.20		V	
	預約維護		109.05	109.11		28.00	28.00		V	
365	5	1,667	109.07	109.09		65.00	68.00	V		

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

表4　隧道、地下道工程

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**12,679**
新建工程處 New Construction Office	108	1. 108年度臺北市車(人)行地下道及隧道機電設備(含電梯、電扶梯)老化修繕工程	12,679

資料來源：新建工程處。

表5　停車場工程

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**--**
新建工程處 New Construction Office	106-111	1. 臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程(附設地下停車場)	①--
	103-111	2. 中山國中綜合大樓新建工程(附設地下停車場)	①--
	107-112	3. 臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	①--
	104-110	4. 成功市場改建工程(地下停車場)	①--
	107-111	5. 南門大樓暨市場改建統包工程(地下停車場)	①--
	106-113	6. 第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程(停車場)	①--
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於公有建築工程內。

Table 4 Tunnel Constructions

August 2020

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**-**	**-**	--	--	--	--	--	**-**	**-**	**1**
-	-	-	108.09	109.08		100.00	99.13			v

Source: New Construction Office.

Table 5 Parking Lots Constructions

August 2020

工程內容 Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
總面積 Area (平方公尺) (㎡)	大型車停車位 (格位) (sites)	小型車停車位 (格位) (sites)	機車停車位 (格位) (sites)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
237,494	**339**	**4,074**	**4,704**	--	--	--	--	--	**2**	**2**	**2**
28,975	277	27	56	106.12	111.07		55.58	55.88	v		
9,328	-	288	-	107.08	111.01		44.71	44.71		v	
22,435	-	267	140	108.07	111.06		19.00	21.00	v		
16,138	-	369	140	108.07	112.09		10.77	10.74			v
34,295	12	211	333	108.12	112.01		2.08	2.08		v	
126,323	50	2,912	4,035	109.03	116.09		1.58	1.47			v

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the Public Building project expenditure.

表6　公有建築物工程

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱① Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　　計	**4,013,771**
新建工程處 New Construction Office	97-108	1. 北部流行音樂中心興建工程(南基地)	83,528
	104-108	2. 臺北市政府警察局刑事警察大隊辦公大樓新建工程(建築工程)	125,713
	106-111	3. 臺北市萬華區新和國民小學校舍整體改建工程	135,285
	100-109	4. 臺北藝術中心接續工程(第二標-昇降設備工程)	5,208
	101-108	5. 臺北市政府警察局士林分局社子派出所新建工程	75,097
	103-111	6. 中山國中綜合大樓新建工程	75,436
	100-109	7. 臺北藝術中心接續工程(第二標)	144,937
	102-110	8. 臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	116,037
	107-110	9. 臺北市政府消防局劍潭分隊重建工程	40,679
	106-111	10. 臺北市南港區東新國民小學校舍改建工程	63,586
	108	11. 萬大漁市新增臨時中繼設施(設備)工程	27,478
	103-112	12. 臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	101,625
	104-110	13. 成功市場改建工程	70,123
	107-111	14. 臺北市殯葬管理處第二殯儀館二期整建工程	164,817
	105-109	15. 臺北市內湖區南湖國民小學活動中心新建工程	28,819
	108-110	16. 臺北市北投區稻香合署大樓新建工程	76,622
	106-109	17. 華榮市場公辦都更新建工程	85,947
	107-111	18. 南門大樓暨市場改建統包工程	295,429
	106-112	19. 臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程	220,500
	107-110	20. 建成綜合大樓改建工程	45,447
	106-113	21. 第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程	1,339,934
	108	22. 潭美國小舊校舍整修為東區社福園區工程	7,948
	107-110	23. 臺北市內湖國小新孝悌樓新建工程接續工程	48,939
	109	24. 臺北市立內湖民中學綜合大樓新建工程(先期拆除工程)	255
	104-109	25. 臺北市大龍社區及市場重建工程(零星工程)	1,115
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	88下半年-105	26. 代辦臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程	550,800
	109	27. 臺北市中山區培英公共住宅新建工程	82,468

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①工程名稱如加註(建築工程)或(水電工程)者，係為利表達該細項工程之工期及施工進度，惟工程費仍係代辦該案之總經費(包含建築、水電、空調等細項工程)。

Table 6 Public Building Constructions

August 2020

工程內容 Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
棟數	層數 Storeies		總面積	開工	預定完	實際完	預定	實際	超前	符合	落後
No. of Buildings (棟) (building)	地上 Ground (層) (storey)	地下 Under-ground (層) (storey)	Area (平方公尺) (㎡)	日期 Starting Date	工日期 Scheduled Completion Date	工日期 Actual Completed Date	Scheduled (%)	Actual (%)	Lead (件) (case)	Accord (件) (case)	Delay (件) (case)
37	**--**	**--**	**984,177**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**16**	**5**	**6**
4	6	1	24,335	105.04	109.12		95.71	96.38	∨		
1	17	5	25,984	105.10	109.07		100.00	92.17			∨
5	5	3	34,228	106.12	111.07		55.58	55.88	∨		
1	-	-	-	107.04	110.03		69.67	73.90	∨		
1	11	3	12,045	107.06	109.12		73.33	73.55	∨		
1	4	1	6,413	107.08	111.01		44.71	44.71		∨	
1	12	1	58,658	107.09	110.03		63.84	64.74	∨		
1	4	2	30,288	107.10	110.04		74.96	86.30	∨		
1	10	2	8,608	108.03	110.05		40.63	40.63		∨	
3	1-4	1	16,927	108.06	110.12		27.05	27.50	∨		
-	-	-	-	108.07	109.10		73.50	74.50	∨		
2	2-4	0-2	25,624	108.07	111.06		19.00	21.00	∨		
1	1	5	24,494	108.07	112.09		10.77	10.74			∨
1	5	4	34,408	108.09	111.12		10.66	8.47			∨
1	4	1	5,156	108.12	110.07		19.54	24.62	∨		
1	9	3	17,594	108.11	111.03		12.99	13.45	∨		
1	11	3	20,131	108.05	111.12		19.23	19.90	∨		
1	12	5	48,471	108.12	112.01		2.08	2.08		∨	
2	20	4	45,766	109.02	112.10		3.91	1.82			∨
1	13	4	8,744	109.01	111.06		15.31	15.39	∨		
3	2-9	1	353,130	109.03	116.09		1.58	1.47			∨
-	-	-	-	109.04	109.10		33.34	34.28	∨		
1	5	1	27,829	109.06	111.10		1.63	4.18	∨		
-	-	-	-	109.07	109.08	109.08	100.00	100.00		∨	
-	-	-	-	109.08	109.10		20.00	99.00	∨		
2	6	2	155,346	105.11	112.02		55.11	55.11		∨	
1	14	3	--	109.02	112.03		5.98	2.23			∨

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The construction name adding (construction work) or (plumbing/electrical wiring work), is to clearly express this project's construction period and progress. The construction expense is the total funds (including construction, plumbing/electrical wiring, air conditioning and so on.)

表7　共同管道及景觀工程

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**77,204**
新建工程處 New Construction Office	104-108	1. 福國路共同管道第二期工程	57,676
	108-109	2. 108年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程開口契約	6,940
	109	3. 萬隆東營區社會福利設施用地新建工程-植栽移植工程	538
	109	4. 道南橋南側無障礙通行環境改善及興安段四小段259-2地號基地臨時排水設施二案工程	479
	109	5. 水源路增設隔音牆工程	1,305
	109	6. 新生南路3段水圳意象重現暨人行景觀美化工程	3,838
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	105-107	7. 洲美堤防景觀綠美化工程	4,340
	109	8. 109年度水利處轄管濕地及滯洪池等棲地預約維護工程	481
	109	9. 社子島濕地解說小築擴建及周邊環境改善工程	1,607

資料來源：新建工程處、水利工程處。

Table 7 Communal Pipeline and Landscape Constructions

August 2020

工程內容 Construction Project	工期 Project Period 開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	施工進度 Progress 預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
--	--	--	--	--	--	**4**	**4**	**1**
1.共同管道工程：幹管1,273公尺、支管845公尺、推管78公尺。 2.其他工程：纜線管路等。	106.11	109.12		36.80	37.32	V		
改善本市建築基地內騎樓及沿街面人行空間高低不平	108.05	109.12		60.10	60.10		V	
配合主體工程原有基地內樹木移植(含定植及假植)	109.03	109.08		100.00	93.52			V
1.道南橋南側無障礙通行環境改善工程部分係於道南橋南側新設2處斜坡道。 2.興安段四小段259-2地號基地臨時排水設施二案工程部分係於前揭地號基地範圍設置拍漿溝及沉砂井等地表截流排水設施，係為代辦國防部之工程。	109.04	109.09		72.83	76.85	V		
1.新設分隔島約276平方公尺。 2.路面銑刨加鋪5cm約2,151平方公尺。 3.新設金屬吸音板約470片。 4.新設H型鋼支柱約128處。	109.08	109.10		1.00	1.00		V	
拆除校園部份圍牆，鋪面更新美化，植栽整理與新植，以及施作水圳意象之水景設施。	109.07	110.03		4.49	4.49		V	
洲美堤防綠美化、休憩設施、照明設施	109.04	109.12		13.47	19.73	V		
辦理本市河川濕地及滯洪池棲地生態保育維護工作	109.05	109.12		56.85	56.85		V	
新建小築2館、新設平台、園區步道改建、新設人行步道、濕地環境整理	109.06	109.10		53.00	55.00	V		

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

表8　防洪工程

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		**總　計**	**137,067**
	105	1. 北投士林科技園區區段徵收公共工程-填土整地工程(第2期-T16、T17、T18以外工區)	82,147
	105-107	2. 洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤防新建工程	36,385
	108	3. 磺溪建德橋至福國路兩岸堤防改建工程	5,498
	108	4. 雙溪橡皮壩護坦及周邊護岸整建工程	3,072
	109	5. 臺北市野雁保護區內河道清疏工程	1,365
	109	6. 109年度南區水利建造物預約維護檢修改善工程	595
	109	7. 109年度西區水利建造物預約維護檢修改善工程	595
	109	8. 109年度北區水利建造物預約維護檢修改善工程	595
	109	9. 109年度東區水利建造物預約維護檢修改善工程	595
	109	10. 109年度全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程	190
	109	11. 109年度沉砂池清疏及維護工程	771
	109	12. 109至111年度抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程(第1標)	1,146
	109	13. 雙溪復興橋至雙溪橋段堤牆設施改善及堤坡綠化工程	2,870
	109	14. 臺北市CCTV河川水情監控設備建	1,243

資料來源：水利工程處。

Table 8 Flood Protection Constructions

August 2020

工程內容 Construction Project					工期 Project Period			施工進度 Progress				
堤防 Embank-ment (公尺) (m)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	閘門 Gate (座) (set)	其他 Others	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	-	-	-	--	--	--	--	--	**3**	**9**	**2**
北投士林科技園區區段徵收公共工程-填土整地工程(T16、T17、T18以外工區)					107.07	109.09		96.63	90.56			∨
洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤防新建工程					107.12	109.07		100.00	90.38			∨
磺溪建德橋至福國路兩岸堤防拆除及重建(打設基樁)					108.10	109.09		88.00	89.81	∨		
雙溪橡皮壩護坦打除、打設基樁、整建，並改善周邊護岸					108.11	109.09		85.96	92.90	∨		
活化野雁保護區內河道淤泥清理、自野雁保護區內河道上游入口起往下游至河道出口止之河槽淤積改善					109.03	109.08		100.00	100.00		∨	
淡水河(台北橋上游段)、新店溪、景美溪、指南溪					109.03	109.12		70.00	70.00		∨	
基隆河：左岸-高速公路內湖橋至社子島頭；右岸-高速公路內湖橋至雙溪匯流口；雙溪：左、右岸；淡水河：台北橋至社子島頭					109.03	109.12		99.00	99.00		∨	
基隆河：右岸雙溪匯流口至淡水河關渡省市交界處；磺溪：左、右岸；磺港溪、貴子坑溪、水磨坑溪					109.03	109.08	109.08	100.00	100.00		∨	
基隆河：左岸-高速公路內湖橋至大坑溪匯流口；右岸-高速公路內湖橋至內溝溪匯流口；內溝溪、大坑溪、四分溪					109.03	109.12		77.00	77.00		∨	
全市疏散門及堤頂擋水門等維護檢修工作					109.03	109.12		75.97	75.97		∨	
辦理全市公私有沉沙池清疏及維護					109.04	109.12		63.00	63.00		∨	
辦理本市抽水站前池及閘閥門周邊清疏					109.04	109.12		99.24	99.24		∨	
堤頂矮牆改善、堤外坡綠化					109.08	110.01		1.83	1.84	∨		
辦理堤外重點河濱公園、自行車道、碼頭與停車場之CCTV建置工程					109.08	110.01		0.70	0.70		∨	

Source: Hydraulic Engineering Office.

表9　抽水站新建、擴建工程

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	工程內容 抽水機 Pump Set 數量 Number (座) (set)	口徑 caliber (吋) -	抽水量 Pumping Capacity (立方公尺/秒) (m³/sec)
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		**總　計**	**115,121**	**-**	**-**	**-**
	107	1. 大直二抽水站新建工程	26,540	-	-	-
	108	2. 士林抽水站發電機及抽水機組更新工程	22,130	-	-	-
	108	3. 民生及士林抽水站抽水機組更新工程	15,173	-	-	-
	109	4. 109至111年度抽水站機組維修及更新工程(第1標)	335	-	-	-
	109	5. (108)全市沉水泵吊視檢修工程(109年續約)	668	-	-	-
	109	6. 108年度抽水站機房整修鐵件更新工程(109年續約)	328	-	-	-
	109	7. 撫遠及南京抽水站機組更新暨康樂等3座抽水站周邊設備更新工程	24,266	-	-	-
	109	8. 河川水情監測設備優化改善工程	2,140	-	-	-
	108	9. 萬芳、景美及奇岩抽水站機組更新暨埤腹等3座抽水站周邊設備更新工程	23,541	-	-	-

資料來源：水利工程處。

Table 9　Rainwater Pump Station Expansion and New Constructions

August 2020

Construction Project	發電機 Electric Generator 數量 Number (座) (set)	發電機 Electric Generator 馬力 Horse-power (匹) (hp)	抽水機房 Pump Set Room 數量 Number (座) (set)	抽水機房 Pump Set Room 面積 Area (平方公尺) (㎡)	工期 Project Period 開工日期 Starting Date	工期 Project Period 預定完工日期 Scheduled Completion Date	工期 Project Period 實際完工日期 Actual Completed Date	施工進度 Progress 預定 Scheduled (%)	施工進度 Progress 實際 Actual (%)	施工進度 Progress 超前 Lead (件) (case)	施工進度 Progress 符合 Accord (件) (case)	施工進度 Progress 落後 Delay (件) (case)
	-	-	-	-	--	--	--	--	--	5	3	1
建置大直二抽水站一座，包含抽水站體、前池5部4cms豎軸式抽水機組、柴油引擎、冷卻系統、電動攔污柵、儀控設備及自動化系統等					107.12	109.08		100.00	98.32			V
士林抽水站發電機及抽水機組更新工程					108.08	109.11		78.12	96.27	V		
民生抽水站：置換5部4cms抽水機組、冷卻水系統、燃油系統之汰換更新及廠房修繕工程、更新單梯桿式吊門機。士林抽水站：安裝10部5.5cms抽水機組，相關附屬設備更新					109.02	110.07		1.31	3.82	V		
忠孝、中山、圓山及社子抽水站機組維修及更新工程					109.03	109.08	109.08	100.00	100.00		V	
抽水站沉水泵拆除、吊運。沉水泵浦分解檢查、軸承機械軸封更新、線圈重繞及電力電纜線更新等。沉水泵安裝、運轉及功能測試					109.03	109.12		51.00	51.00		V	
辦理本市各抽水站機房整修及設施修復、更新或增設					109.04	109.12		90.50	90.50		V	
撫遠抽水站、南京抽水站、康樂抽水站、民權(舊)抽水站、南深左抽水站、總一/總二管理中心周邊設備更新工程					109.04	111.09		0.10	0.32	V		
本市水情監測資訊系統設備更新及建置自動化之資料介接、微波中繼站設備更新、系統配合增修及整體相關功能運轉測試等工程					109.06	110.01		29.19	42.60	V		
萬芳站、景美(舊)站、奇岩站、埤腹站、保儀站、古亭站、福德站等周邊設備更新工程					109.06	111.07		0.51	0.70	V		

Source: Hydraulic Engineering Office.

表10　雨水下水道新建、改善工程

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**32,210**
新建工程處 New Construction Office		**新工處主辦工程合計**	**--**
	104-110	1. 福國路延伸工程(第2期)	①--
	108-110	2. 北投士林科技園區徵收公共工程(第2期-東基地)	①--
	108-109	3. 信義區福德街137巷道路新築工程	①--
	108-109	4. 知行路292巷4弄、2弄及其連接道路新築暨拓寬工程	①--
	107-109	5. 莊敬路325巷道路拓寬工程	①--
	108-109	6. 興德路66巷道路拓寬工程	①--
	108-109	7. 信安街15巷(六張犁營區A街廓北側)道路新築工程	①--
	109	8. 斯文里二期整宅公辦都更基地東側8公尺計畫道路新築工程	①--
	109	9. 興寧街西側道路拓寬工程	①--
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		**水利處主辦工程合計**	**32,210**
	108	10. 108年雨水下水道結構修補預約維護工程(北區)	1,860
	108	11. (108)雨水下水道結構修補預約維護工程(南區)	1,860
	108	12. (108)雨水下水道結構修補預約維護工程(含人孔調升降-北區)	976
	108	13. 雨水下水道結構修補工程(新生等10集水區)	4,597
	108	14. 雨水下水道結構修補工程(芝山、故宮集水區)	2,125
	109	15. 109年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(南區)	1,017
	109	16. 109年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(北區)	1,017
	109	17. (109)雨水下水道人孔調升降工程(南區工區)	668

Table 10 New and Improvement Constructions of Rainwater Drainage System

August 2020

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
側溝 Side Ditch (公尺) (m)	箱涵 Box Culvert (公尺) (m)	管涵 Pipe Culvert (公尺) (m)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
8,443	**1,464**	**677**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5**	**24**	**3**
6,971	**1,447**	**677**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5**	**3**	**1**
633	1,206	-	107.11	110.11		22.71	28.31	V		
5,384	241	666	108.09	110.09		33.55	33.55		V	
124	-	11	108.12	109.08		100.00	40.00			V
140	-	-	109.02	109.10		70.00	70.00		V	
178	-	-	109.02	109.10	109.08	95.00	100.00	V		
155	-	-	109.02	109.10		65.84	71.84	V		
180	-	-	109.03	109.09		71.69	72.66	V		
94	-	-	109.06	109.12		5.00	5.00		V	
84	-	-	109.04	109.09		35.63	36.92	V		
1,472	**17**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-**	**21**	**2**
結構修補、管線橫越缺失處理			108.07	109.08	109.08	100.00	100.00		V	
結構修補、橫越缺失處理			108.10	109.12		65.00	65.00		V	
結構修補及配合人孔調升降工程			108.10	109.10		57.00	57.00		V	
結構修補工程			108.11	109.11		88.00	88.00		V	
結構修補工程			109.02	109.09		78.00	78.00		V	
緊急搶修預約維護工程			109.02	109.12		95.00	95.00		V	
緊急搶修預約維護工程			109.02	109.12		96.00	96.00		V	
人孔調升降工程			109.03	109.12		55.00	55.00		V	

表10　雨水下水道新建、改善工程（續）

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	109	18. 109年度雨水下水道預約維護工程(中正區)	1,386
	109	19. 109年度雨水下水道預約維護工程(大安區)	1,669
	109	20. 109年度雨水下水道預約維護工程(文山、萬華區)	1,202
	109	21. 109年度雨水下水道預約維護工程(中山、松山區)	1,669
	109	22. 109年度雨水下水道預約維護工程(士林、大同區)	1,669
	109	23. 109年度雨水下水道預約維護工程(北投區)	1,017
	109	24. (109)雨水下水道人孔調升降工程(南內工區)	668
	109	25. 109年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(東區)	1,017
	109	26. (109)雨水下水道人孔調升降工程(北投工區)	668
	109	27. 北投區大業路側(光明路至育人路間)等4處排水改善工程	1,787
	109	28. 士林區福港街37巷等3處側溝更新工程	835
	109	29. (109)雨水下水道人孔調升降工程(北區工區)	668
	109	30. 109年度雨水下水道預約維護工程(信義區)	1,017
	109	31. 109年度雨水下水道預約維護工程(南港、內湖區)	1,669
	109	32. (109)雨水下水道人孔調升降緊急搶修工程	1,152

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

Table 10 New and Improvement Constructions of Rainwater Drainage System (Cont.)

August 2020

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
側溝 Side Ditch (公尺) (m)	箱涵 Box Culvet (公尺) (m)	管涵 Pipe Culvet (公尺) (m)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
預約維護工程			109.03	109.12		72.00	72.00		V	
預約維護工程			109.03	109.12		75.00	75.00		V	
預約維護工程			109.03	109.12		40.00	40.00		V	
預約維護工程			109.03	109.12		73.00	73.00		V	
預約維護工程			109.03	109.12		78.00	78.00		V	
預約維護工程			109.03	109.12		98.81	98.81		V	
人孔調升降工程			109.03	109.12		51.00	51.00		V	
預約維護工程			109.03	109.12		60.00	60.00		V	
人孔調升降工程			109.04	109.12		43.00	43.00		V	
735	17	-	109.04	109.09		85.18	83.47			V
新築集水井：11座；新建弱電管路(共構型)：131.8m；道路銑鋪：3,894m^2										
737	-	-	109.04	109.09		93.00	90.00			V
新築集水井：16座；新建弱電管路(共構型)：215.4m；道路銑鋪：2,787m^2										
人孔調升降工程			109.04	109.12		69.00	69.00		V	
預約維護工程			109.04	109.12		60.00	60.00		V	
預約維護工程			109.04	109.12		48.00	48.00		V	
人孔調升降工程			109.04	109.12		35.00	35.00		V	

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the road project expenditure.

表11　公園綠地新建、改善工程

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	總面積 Total Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Side-walk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (no.)	涼亭 Arbor (座) (no.)	花架 Flower Shelf (處) (no.)	欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
		總　計	**74,691**	**53,230**	**6,984**	**9,843**	**43,234**	**366**	**17**	**86**	**2,238**
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office		**公園處主辦工程合計**	**64,863**	**53,230**	**6,984**	**9,843**	**43,234**	**366**	**17**	**86**	**2,238**
	108	1. 辛亥生態(文木91號)公園新建工程(108-151)	9,200	5,972	493	1,071	3,096	22	1	1	169
	108	2. 北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)公1公園及綠地1、2、5綠地新建工程(108-154)	9,268	26,592	330	795	6,320	73		3	76
	108	3. 興昌區民活動中心新建工程(108-163)	4,130	767	-	-	-	3	-	-	93
	108	4. 北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)公4公5(二期)及綠6綠地新建工程(108-165)	7,608	19,899	-	-	1,600	44	-	3	-
	108	5. 北投兒童樂園改善工程(108-158)	1,698	--	15	227	1,074	34	-	-	77
	109	6. 109年度本市公園、廣場園路整平改善工程-圓山公園管理所暨園藝工程隊所轄園路改善工程(G-109-09-109067)	590	--	-	-	2,137		-	-	-
	109	7. 109年度本市公園、廣場園路整平改善工程-南港公園管理所暨青年公園管理所所轄園路改善工程(G-109-09-109065)	632	--	-	-	1,906	13	-	-	-
	109	8. 109年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區、萬華區及大安區公園整建工程(G-109-09-109135)	383	--	-	214	941	-	-	-	191
	109	9. 109年度本市公園、廣場園路整平改善工程-陽明山公園管理所、花卉中心、園藝管理所所轄園路改善工程(G-109-09-109066)	1,027	--	-	-	5,069	-	-	-	19

Table 11 Park Improvement and New Constructions

August 2020

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facility (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Barrier-free Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (㎡)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定進度 Scheduled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
4,799	**-**	**461**	**128**	**53**	**24**	**16**	**38,544**	**377,255**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**25**	**15**	**3**
4,799	**-**	**461**	**128**	**53**	**24**	**16**	**38,544**	**377,255**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**24**	**4**	**3**
604	-	39	20	4	-	2	10,609	271	108.08	109.09		84.65	83.60			∨
1,020		60	12	4			9,431	236,200	108.12	109.12		59.91	61.19	∨		
33	-	-	-	-	-	-	137	3,073	109.02	109.10		48.73	49.49	∨		
		65	3	-	18	2	7,000	54,000	109.02	109.12		53.60	53.73	∨		
104	-	30	46	-	-	-	576	12,815	108.12	109.08	109.08	100.00	100.00		∨	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.03	109.09		92.68	92.79	∨		
-	-	-	2	3			-	-	109.04	109.09		83.26	83.80	∨		
-	-	-	2	-	-	-	-	-	109.06	109.09		53.82	55.63	∨		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.04	109.09		63.52	71.03	∨		

表11　公園綠地新建、改善工程（續1）

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	總面積 Total Area (平方公尺) (㎡)	土木工程						
					廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Side-walk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (no.)	涼亭 Arbor (座) (no.)	花架 Flower Shelf (處) (no.)	欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office	109	10. 遊戲場更新改善統包工程(G-109-09-109127)	648	--	468	514	540	-	2	-	-
	109	11. 萬華7號廣場裝置藝術統包工程(G-109-09-109131)	611	--	-	-	-	-	-	-	-
	108	12. 天母公園改善工程(108-09-108166)	6,328	--	1,674	939	3,886	78	9	-	698
	109	13. 109年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區景觀橋及湖岸改善工程(G-109-09-109142)	668	--	-	-	46	-	-	-	33
	109	14. 萬和公園景觀改造工程(G-109-09-109117)	150	--	302	-	-	4	1	-	230
	109	15. 109年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港、信義區公園整建工程(G-109-09-109123)	971	--	555	315	2,726	-	-	-	5
	109	16. 瑠公公園改善工程(G-109-09-109125)	1,099	--	-	152	2,078	10	-	-	-
	109	17. 109年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程(G-109-09-109134)	650	--	-	-	-	-	1	1	175
	109	18. 109年度南港公園管理所所轄公園整建工程-文山區公園整建工程(G-109-09-109138)	825	--	-	115	2,386	-	-	-	245
	109	19. 109年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、松山區、大同區公園整建工程(G-109-09-109141)	963	--	-	141	-	-	-	-	-

Table 11 Park Improvement and New Constructions (Cont. 1)

August 2020

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facility (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Barrier-free Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m^2)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Complet-ed Date	預定進度 Scheduled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	-	-	-	5	2		-	-	109.06	109.10		54.53	58.48	v		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.08	109.10		36.43	37.51	v		
1,547	-	113	11	21	2		4,750	16,489	109.02	109.11		43.18	43.22	v		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	109.07	109.11		5.94	21.39	v		
103	-	4	-	-	-	-	516	8	109.05	109.11		33.50	34.30	v		
49	-	-	-	5	-	-	-	-	109.06	109.11		17.51	17.51		v	
-	-	3	1	2	-	-	377	6,762	109.06	109.11		30.78	28.00			v
39	-	-	-	-	1	1	-	-	109.06	109.11		25.00	25.00		v	
-	-	-	1	-	-	4	-	-	109.06	109.11		19.07	19.07		v	
-	-	-	2	4	1	-	-	-	109.07	109.12		13.96	14.35	v		

表11 公園綠地新建、改善工程（續2）

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	總面積 Total Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Side-walk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (no.)	涼亭 Arbor (座) (no.)	花架 Flower Shelf (處) (no.)	欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office	109	20. 109年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(G-109-09-109140)	1,080	--	-	-	1,397	-	-	-	-
	109	21. 109年度景觀公廁統包工程(G-109-09-109137)	600	--	-	-	-	-	-	-	-
	109	22. 109年度青年公園管理所所轄公園整建工程-法治公園改善工程(G-109-09-109149)	780	--	-	148	649	12	1	1	35
	109	23. 109年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-陽明山區暨內湖區公園整建工程(G-109-09-109151)	599	--	-	-	1,031	-	-	-	9
	109	24. 臺北科學藝術園區美崙公園生態改善工程(G-109-09-109147)	1,588	--	496	47	740	5	2	1	-
	109	25. 109年度轄管公園公廁改善工程(G-109-09-109143)	637	--	-	-	-	-	-	-	-
	109	26. 陽明公園辛亥光復樓整建工程(G-109-09-109107)	1,650	--	-	-	-	-	-	-	-
	108	27. 108年青年、大安森林公園兒童遊戲場改善工程(108-09-108164)	3,718	--	594	4,161	382	-	-	1	125
	109	28. 大安區龍門國中及萬華區老松國小人行道空間鋪面更新工程(G-109-09-109145)	823	--	-	-	1,646	-	-	-	-
	109	29. 109自然兒童遊戲場改善工程(G-109-09-109146)	1,170	--	-	588	37	9	-	-	-
	109	30. 花博公園新生園區臺北玫瑰園區擴建工程-景觀案(G-109-09-109150)	2,137	--	-	-	2,381	30	-	75	-
	108	31. 七虎、七星等公園改善工程(108-159)	2,633	--	2,057	416	1,167	29	-	-	59

Table 11 Park Improvement and New Constructions (Cont. 2)

August 2020

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swim-ming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facility (公尺) (m)	球場(運動場) Sta-dium (處) (lot)	無障礙坡道 Barrier-free Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (㎡)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Complet-ion Date	實際完工 Actual Complet-ed Date	預定進度 Sche-duled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
253	-	-	-	-	-	-	-	-	109.07	109.12		15.89	15.94	∨		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.08	109.12		3.45	8.22	∨		
264	-	-	2	2	-	5	500	43	109.08	109.12		2.20	2.84	∨		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	109.08	109.12		0.80	1.29	∨		
18	-	92	-	3	-	-	2,166	15,117	109.08	109.12		4.37	8.16	∨		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.07	109.12		16.00	18.50	∨		
-	-	-	-	-	-	-			109.08	110.01		11.00	0.20			∨
84	-	-	13	-	-	-	-	-	109.02	110.01		25.17	41.45	∨		
204	-	-	-	-	-	-	-	-	109.08	110.02		10.80	19.11	∨		
-	-	5	6	-	-	-	-	-	109.08	110.02		0.66	0.78	∨		
-	-	-	-	-	-	-	450	-	109.1	110.01		3.79	3.82	∨		
476		50	7	-	-	-	2,031	32,477	109	110.03		36.94	38.08	∨		

表11　公園綠地新建、改善工程（續3完）

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	總面積 Total Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Side-walk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (no.)	涼亭 Arbor (座) (no.)	花架 Flower Shelf (處) (no.)	欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		**水利處主辦工程合計**	**9,828**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	109	32. 109年度南區河濱公園路面整建預約維護工程	963	--	-	-	-	-	-	-	-
	109	33. 109年度全市河濱公園水電設施預約維護工程	383	--	-	-	-	-	-	-	-
	109	34. 108年度全市河濱公園綠化預約維護工程(109年續約)	770	--	-	-	-	-	-	-	-
	109	35. 109年度北區河濱公園路面整建預約維護工程(1)	963	--	-	-	-	-	-	-	-
	109	36. 109年度基隆河大佳河濱公園颱風豪雨碼頭、廁所等設施撤離工程	144	--	-	-	-	-	-	-	-
	109	37. 109年度基隆河美堤河濱公園颱風豪雨碼頭、廁所等設施撤離工程	232	--	-	-	-	-	-	-	-
	109	38. 109年度北區河濱公園土木預約維護工程	958	--	-	-	-	-	-	-	-
	109	39. 109年度東區河濱公園路面整建預約維護工程	963	--	-	-	-	-	-	-	-
	109	40. 109年度東區河濱公園土木預約維護工程(2)	958	--	-	-	-	-	-	-	-
	109	41. 109年度南區河濱公園土木預約維護工程	958	--	-	-	-	-	-	-	-
	109	42. 109年度淡水河系河濱公園颱風豪雨碼頭、廁所等設施撤離工程	383	--	-	-	-	-	-	-	-
	109	43. 關渡碼頭周邊設施改善工程	2,153	--	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

Table 11 Park Improvement and New Constructions (Cont. 3 End)

August 2020

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swim-ming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facility (公尺) (m)	球場(運動場) Sta-dium (處) (lot)	無障礙坡道 Barrier-free Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (㎡)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Complet-ion Date	實際完工 Actual Complet-ed Date	預定進度 Sche-duled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1**	**11**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	109.12		85.50	85.50		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	109.12		57.91	57.91		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	109.12		72.18	72.18		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	109.12		41.00	41.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	109.12		3.00	3.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	109.12		40.00	40.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	109.12		99.00	99.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	109.12		74.00	74.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	109.12		83.00	83.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.04	109.12		82.00	82.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.04	109.12		13.50	13.50		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.1	110.01		2.09	11.60	v		

Source: Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office.

表12　污水下水道新建、改善工程

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		**總　計**	**64,836**
	109	1. 109-112年東區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	3,627
	109	2. 109年東區支管及用戶排水設備工程（預約式工程）	2,300
	109	3. 基隆河系特四幹線二標污水管渠修繕統包工程	2,997
	105-108	4. 106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程	12,333
	109	5. 109-112年西區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	18,879
	109	6. 109年西區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)	1,900
	109	7. 109-112年南區分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	19,400
	109	8. 109年南區支管及用戶排水設備工程(預約式工程)	1,900
	109	9. 109年北區支管及用戶排水設備工程（預約式工程）	1,500

資料來源：衛生下水道工程處。

Table 12 Sewerage System Improvement and New Constructions

August 2020

工程內容 Construction Project							工期 Project Period			施工進度 Progress				
主幹管 Trunk (m)	次幹管 Sub-Trunk (m)	分支管 Branch Pipeline (m)	抽揚水站 Pumping Station (座) (no.)	人孔 Man-hole (座) (no.)	清除孔 Cleanout (座) (no.)	截流設施 Interception Facilities (個) (no.)	開工日期 Starting Date	預定完工日期 Scheduled Completion Date	實際完工日期 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**-**	**4,385**	**-**	**132**	**-**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1**	**8**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	109.05	113.04		1.45	1.45		V	
-	-	-	-	-	-	-	109.03	110.06		55.00	55.00		V	
-	-	-	-	-	-	-	109.07	110.06		2.00	3.73	V		
-	-	4,385	-	132	-	-	106.09	109.09		95.06	95.06		V	
-	-	-	-	-	-	-	109.06	113.05		0.01	0.01		V	
-	-	-	-	-	-	-	109.04	110.06		72.62	72.62		V	
-	-	-	-	-	-	-	109.07	113.06		0.01	0.01		V	
-	-	-	-	-	-	-	109.04	110.06		76.33	76.33		V	
-	-	-	-	-	-	-	109.03	110.06		22.18	22.18		V	

Source: Sewerage Systems Office.

表13 治山防災整體治理工程

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	工程內容 防砂壩 Against Granulated Substance Dam (座) (set)	潛壩 Sub-merged Dam (座) (set)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	堤防 Embank-ment (公尺) (m)
大地工程處 Geotechnical Engineering Office		**總 計**	**62,841**	**-**	**-**	**-**	**-**
	109	1. 109年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區)	2,538	-	-	-	-
	109	2. 109年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)	2,538	-	-	-	-
	109	3. 109年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區)	1,273	-	-	-	-
	109	4. 109年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(南區)	572	-	-	-	-
	109	5. 109年度臺北市山坡地邊坡（北區）維護預約式工程	4,395	-	-	-	-
	109	6. 109年度臺北市山坡地邊坡（南區）暨農業環境維護預約式工程	4,260	-	-	-	-
	109	7. 109年度臺北市山坡地邊坡改善與設施維護工程	2,974	-	-	-	-
	109	8. 109年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落緊急水土保持工程	2,656	-	-	-	-
	108-109	9. 108年度臺北市山區道路緊急處理工程（士林及南港區）	9,184	-	-	-	-
	109	10. 109年度臺北市山區道路緊急處理工程(大安及文山區)	2,980	-	-	-	-

Table 13 Watershed Management and Disaster Prevention

August 2020

Construction Project							工期 Project Period			施工進度 Progress				
整流 Rectification (公尺) (m)	固床工 Groundsill Works (座) (set)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	魚道 Fish Way (座) (set)	蝕溝控制 Gully Control (公尺) (m)	崩塌地處理 Protection for collapse (公頃) (hectare)	植生綠美化 Greening Beautification (平方公尺) (m²)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**21**	**428**	**-**	**-**	**0**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20**	**-**	**1**
-	2	16	-	-	-	-	109.02	109.12		63.02	63.04	V		
-	6	197	-	-	-	-	109.02	109.12		59.92	77.52	V		
-	11	182	-	-	-	-	109.05	109.12		41.19	59.90	V		
-	2	33	-	-	-	-	109.05	109.09		83.35	92.09	V		
排水溝修補5m、矩形加蓋溝175m、漿砌整形塊石駁坎(H=2m)50m、排樁150支(11m*68, 10m*82)、護欄75m、PVC菱形網600M2、岩釘340支高拉力硬鋼線網340n2、噴漿溝40m、集水井1座							109.02	109.12		90.49	86.02			V
排水溝510m、鑽探20m、排樁300M、微型樁1000M、護欄100M、平台100M2、擋土牆40M、型框護坡100M2							109.02	109.12		40.57	84.61	V		
消能式防落石網260m							109.06	109.12		22.33	31.33	V		
除草40407m²、漿砌整形塊石駁坎：28.13m²、型框植生護坡：74.25m²、土釘：92 支、微型鋼管樁：18支					0	-	109.02	109.12		42.31	64.29	V		
地錨荷重計、半重力式擋土牆、格樑護坡、市容查報(側溝修補、路面修補、側溝清淤、擋土牆修補、里程牌修復、新設護欄、除草、倒樹移除及修枝)							108.04	109.12		70.07	85.05	V		
-	-	-	-	-	-	-	109.01	109.12		78.62	96.56	V		

表13 治山防災整體治理工程（續）

109年8月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	工程內容 防砂壩 Against Granulated Substance Dam (座) (set)	潛壩 Sub-merged Dam (座) (set)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	堤防 Embank-ment (公尺) (m)
大地工程處 Geotechnical Engineering Office	109	11. 109年度臺北市山區道路緊急處理工程（內湖區）	2,980	-	-	-	-
	109	12. 109年度臺北市山區道路緊急處理工程(中山區)	795	-	-	-	-
	109	13. 108年度臺北市山區道路緊急處理工程(北投及信義區)	4,870	-	-	-	-
	109	14. 109年度山區道路AC路面銑鋪及改善維護預約式工程	6,400	-	-	-	-
	109	15. 109年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程	1,338	-	-	-	-
	109	16. 108年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程	1,338	-	-	-	-
	109	17. 109年度臺北大縱走及四獸山登山步道維護更新預約式工程	2,980	-	-	-	-
	109	18. 109年度登山步道周邊改善工程	1,899	-	-	-	-
	109	19. 109年度休閒遊憩設施緊急處理預約式工程	1,485	-	-	-	-
	109-110	20. 109年度臺北市圓山風景區整體營造改善預約式工程	3,186	-	-	-	-
	109	21. 109年度貴子坑水土保持教學園區整建工程	2,200	-	-	-	-

資料來源：大地工程處。

Table 13 Watershed Management and Disaster Prevention (Cont.)

August 2020

Construction Project							工期 Project Period			施工進度 Progress				
整流 Rectifi-cation (公尺) (m)	固床工 Groundsill Works (座) (set)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	魚道 Fish Way (座) (set)	蝕溝控制 Gully Control (公尺) (m)	崩塌地處理 Protec-tion for collapse (公頃) (hectare)	植生綠美化 Greening Beautifi-cation (平方公尺) (㎡)	開工日期 Starting Date	預定完工 Scheduled Completion Date	實際完工 Actual Completed Date	預定 Sche-duled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
1.新設集水井 2 座 2.新設排水溝 340 m 3.新設掛立體網噴植綠化植生 150 m^2 4.路面銑鋪 7,900 m^2 5.新設溝蓋 520 m 6.新設駁坎 25 m 7.堆疊土袋包護坡 250 m^2 8.排水溝清淤 28.29 km							109.02	109.12		71.94	71.98	V		
1.劍南路及通北街之道路維護改善工作 2.劍南路明山寺邊坡改善 3.中山區枯倒樹清除及廢棄物清除							109.02	109.12		43.83	52.42	V		
鋼軌樁施作、通報單點位施作(坑洞修補、倒樹移除、除草等)							109.02	109.12		30.57	57.02	V		
北投區竹子湖主線產業道路(0K+400~1K+700)、北投區竹子湖支線產業道路(0K+400~0K+850)、竹子湖主線-1							109.03	109.12		26.80	44.98	V		
登山步道、休憩平台、扶手欄杆							109.02	109.12		59.92	85.07	V		
登山步道、休憩平台、扶手欄杆							109.02	109.12		50.66	84.65	V		
登山步道、指標示系統							109.03	109.12		30.65	31.65	V		
登山步道、休憩平台、排水設施							109.04	110.01		37.14	39.89	V		
露營場、風景區及轄管休閒場域等設施平時維護及緊急修復,包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、路燈修繕、木平台木椅修繕、樹洞拓寬、木棧道上警示黃漆、廢棄水管移除、設置緊急標誌等							109.02	109.12		44.94	51.34	V		
1.圓山風景區內林木疏伐 2.圓山風景區內閒置場域拆除及綠美化							109.02	110.12		10.09	36.05	V		
1.步道改善、花架及擋土牆美化及新植喬木等 2.新設排水溝、坡面工法、野溪整治、地錨解說模型等展示區 3.新設解說牌及導覽牌							109.05	110.01		33.04	34.32	V		

Source: Geotechnical Engineering Office.

表14　污水下水道用戶接管概況

年（月）別 Year (Month)	當年(月)污水處理戶數 (戶) No. of Households Served by Wastewater Collection in Each Year (Month) (no.)			
	總計 Grend Total	公共污水下水道門牌用戶接管戶數 Public Sanitary Sewers	建築物自設專用污水下水道設置戶數 Specific Sanitary Sewers	建築物自設污水處理設施設置戶數 Households with Building Sewage Processing Facilities
民國 91 年 2002	**41 852**	**37 885**	**1 478**	**2,489**
民國 92 年 2003	**34 718**	**31 928**	**1 684**	**1 106**
民國 93 年 2004	**39 930**	**37 991**	**1 081**	**858**
民國 94 年 2005	**47 585**	**44 936**	**1 251**	**1 398**
民國 95 年 2006	**29 132**	**25 798**	**1 224**	**2 110**
民國 96 年 2007	**34 430**	**32 513**	**-960**	**2 877**
民國 97 年 2008	**42 775**	**40 010**	**1 172**	**1 593**
民國 98 年 2009	**34 635**	**33 300**	**216**	**1 119**
民國 99 年 2010	**41 663**	**40 902**	**163**	**598**
民國 100 年 2011	**31 993**	**31 237**	**3**	**753**
民國 101 年 2012	**31 442**	**30 822**	**1**	**619**
民國 102 年 2013	**24 543**	**24 145**	**2**	**396**
民國 103 年 2014	**21 825**	**21 638**	**-**	**187**
民國 104 年 2015	**12 391**	**12 265**	**-**	**126**
民國 105 年 2016	**10 584**	**10 475**	**-**	**109**
民國 106 年 2017	**10 468**	**10 357**	**-**	**111**
民國 107 年 2018	**12 564**	**12 528**	**-**	**36**
民國 108 年 2019	**27 687**	**63 367**	**-25,232**	**-10,448**
8月 Aug.	420	419	-	1
9月 Sep.	1 028	1 434	-281	-125
10月 Oct.	938	937	-	1
11月 Nov.	1 056	1 053	-	3
12月 Dec.	1 187	1 510	-	-323
民國 109 年 2020				
1月 Jan.	391	390	-	1
2月 Feb.	114	112	-	2
3月 Mar.	1 025	1 025	-	-
4月 Apr.	280	279	-	1
5月 May	416	560	-1	-143
6月 June	520	518	-	2
7月 July	1 320	1 319	-	1
8月 Aug.	566	564	-	2

資料來源：衛生下水道工程處。

說明：(1)污水處理率=累計污水處理戶數×戶量/人口數×100，103年以前戶量以4計算。自99年起比率超過100%者，以100%表示。

(2)門牌戶數接管普及率 g=b/d×100，108年4月以前 g=(b+c)/d×100。

(3)96年、108年清查資料，扣除專用污水下水道重複列計者，致用戶數為負值或減少。

Table 14　Overview of Household Sewerage System Connections

截至當年(月)底累計污水處理戶數 (戶) Accumulated No. of Households Served by Wastewater Collection (no.)				門牌總戶數 No. of Doorplates (戶) (no.) d	污水處理率 Percentage of Population Served by Wastewater Collection (%)	門牌戶數接管普及率 Doorplate Sewer Connection Rate (%) g
總計 Grend Total a	公共污水下水道門牌用戶接管戶數 Public Sanitary Sewers b	建築物自設專用污水下水道設置戶數 Special Sanitary Sewers c	建築物自設污水處理設施設置戶數 Households with Building Sewage Processing Facilities			
412,745	**383,828**	**22 869**	**6 048**	**943 876**	**62.49**	**43.09**
447 463	**415 756**	**24 553**	**7 154**	**981 847**	**68.13**	**44.84**
487 393	**453 747**	**25 634**	**8 012**	**988 693**	**74.34**	**48.49**
534 978	**498 683**	**26 885**	**9 410**	**987 274**	**81.79**	**53.23**
564 110	**524 481**	**28 109**	**11 520**	**987 274**	**85.72**	**55.97**
598 540	**556 994**	**27 149**	**14 397**	**1 033 315**	**91.06**	**56.53**
641 315	**597 004**	**28 321**	**15 990**	**1 035 299**	**97.80**	**60.40**
675 950	**630 304**	**28 537**	**17 109**	**1 062 320**	**103.70**	**62.02**
717 613	**671 206**	**28 700**	**17 707**	**1 068 561**	**100.00**	**65.50**
749 606	**702 443**	**28 703**	**18 460**	**1 076 178**	**100.00**	**67.94**
781 048	**733 265**	**28 704**	**19 079**	**1 082 773**	**100.00**	**70.37**
805 591	**757 410**	**28 706**	**19 475**	**1 087 747**	**100.00**	**72.27**
827 416	**779 048**	**28 706**	**19 662**	**1 094 032**	**100.00**	**73.83**
839 807	**791 313**	**28 706**	**19 788**	**1 099 882**	**80.42**	**74.56**
850 391	**801 788**	**28 706**	**19 897**	**1 104 774**	**81.07**	**75.17**
860 859	**812 145**	**28 706**	**20 008**	**1 111 127**	**81.81**	**75.68**
873 423	**824 673**	**28 706**	**20 044**	**1 114 906**	**82.81**	**76.54**
901 110	**888 040**	**3 474**	**9 596**	**1 117 782**	**84.83**	**79.45**
896 901	883 106	3 755	10 040	1 116 879	84.61	79.07
897 929	884 540	3 474	9 915	1 117 213	84.46	79.17
898 867	885 477	3 474	9 916	1 117 746	84.58	79.22
899 923	886 530	3 474	9 919	1 117 834	84.71	79.31
901 110	888 040	3 474	9 596	1 117 782	84.83	79.45
901 501	888 430	3 474	9 597	1 118 156	84.94	79.45
901 615	888 542	3 474	9 599	1 118 429	85.07	79.45
902 640	889 567	3 474	9 599	1 119 584	85.29	79.46
902 920	889 846	3 474	9 600	1 119 514	85.11	79.49
903 336	890 406	3 473	9 457	1 119 336	85.30	79.55
903 856	890 924	3 473	9 459	1 119 156	85.08	79.61
905 176	892 243	3 473	9 460	1 119 969	85.33	79.67
905 742	892 807	3 473	9 462	1 120 028	85.33	79.71

Source: Sewerage Systems Office.

Explanation: 1.Percentage of Population Served by Wastewater Collection = Accumulated No. of Households Served by Wastewater Collection × Household Mean Size / Population × 100. Before 2014, Household Mean Size was 4. From 2010 onward , the figures exceeding 100% were showed 100%.

2.Doorplate Sewer Connection Rate g= b/d×100. Before April 2019, g=(b+c)/d×100.

3. In 2007 and 2019, repeated calculation numbers were deducted from the number of Special Sanitary Sewer connected households, which results a negative number or a decrease in the amount.

表15 公園綠地

單位：處、平方公尺

年底及區別 End of Year & District		已開闢公園綠地 總計 Grand Total 處數 no.	總計 Grand Total 面積 area	公園 Parks 處數 no.	公園 Parks 面積 area	綠地 Green Fields 處數 no.	綠地 Green Fields 面積 area
民國87年底	End of 1998	660	11 375 178	452	6 398 546	156	497 422
民國88年底	End of 1999	683	11 765 710	463	6 628 170	168	653 065
民國89年底	End of 2000	702	12 201 274	470	6 746 291	174	690 698
民國90年底	End of 2001	726	12 643 384	484	7 144 069	184	729 714
民國91年底	End of 2002	745	12 723 060	496	7 210 701	188	733 779
民國92年底	End of 2003	757	12 773 055	504	7 237 804	191	743 565
民國93年底	End of 2004	765	12 983 800	512	7 362 764	188	712 630
民國94年底	End of 2005	773	13 098 871	518	7 421 787	190	711 236
民國95年底	End of 2006	784	13 246 975	524	7 522 538	192	712 296
民國96年底	End of 2007	794	13 441 988	531	7 682 047	192	712 796
民國97年底	End of 2008	804	13 525 134	536	7 773 009	195	690 415
民國98年底	End of 2009	813	13 508 871	542	7 772 495	198	673 026
民國99年底	End of 2010	821	13 529 929	547	7 782 650	200	683 749
民國100年底	End of 2011	833	13 643 094	551	7 898 079	206	676 185
民國101年底	End of 2012	838	13 667 760	556	7 932 743	206	668 463
民國102年底	End of 2013	843	13 687 731	564	7 955 002	203	666 175
民國103年底	End of 2014	851	13 748 610	569	8 000 077	205	680 430
民國104年底	End of 2015	857	13 805 960	573	8 062 480	206	674 507
民國105年底	End of 2016	861	14 329 914	576	8 582 016	207	678 257
民國106年底	End of 2017	871	14 352 093	581	8 586 192	211	684 639
民國107年底	End of 2018	930	15 440 822	601	9 422 086	212	682 141
民國108年底	End of 2019	961	15 679 559	607	9 579 806	214	677 390
民國109年6月底	**End of June 2020**	**963**	**15 699 376**	**609**	**9 599 623**	**214**	**677 390**
松山區	SongShan	52	1 057 900	46	180 411	3	4 464
信義區	XinYi	86	587 919	56	457 201	20	43 122
大安區	DaAn	69	618 804	62	609 907	7	8 897
中山區	ZhongShan	101	1 710 443	70	764 668	23	39 419
中正區	ZhongZheng	32	890 652	19	567 224	2	20 720
大同區	DaTong	38	265 673	20	126 974	4	4 681
萬華區	WanHua	39	1 399 047	30	304 295	2	2 012
文山區	WenShan	98	2 973 834	78	2 438 371	16	22 610
南港區	NanGang	60	812 965	36	646 086	14	63 011
內湖區	NeiHu	100	1 449 718	82	907 795	11	58 732
士林區	ShiLin	110	1 626 901	43	872 178	44	138 358
北投區	BeiTou	172	2 266 656	67	1 724 513	68	271 364
跨區域	Others	6	38 864	-	-	-	-

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

Table 15 Parks and Green Fields

Unit: number; m^2

Constructed Parks and Green Fields								每人享有公園綠地面積
兒童遊樂場 Sport Spots for Children		廣場 Plaza		河濱公園 Riverside Parks		線形公園 Linear Parks		
處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	Per Capita Area of Parks and Green Fields
11	15 552	19	128 708	22	4 334 950	-	-	4.31
11	15 552	19	128 501	22	4 340 422	-	-	4.45
11	15 552	23	141 777	24	4 606 956	-	-	4.61
11	15 874	23	146 771	24	4 606 956	-	-	4.80
11	15 874	26	155 750	24	4 606 956	-	-	4.82
11	15 874	26	157 156	25	4 618 656	-	-	4.86
11	15 874	29	174 980	25	4 717 552	-	-	4.95
11	16 030	29	152 429	25	4 797 389	-	-	5.01
11	16 030	29	152 382	28	4 843 729	-	-	5.03
11	16 030	32	173 641	28	4 857 474	-	-	5.11
11	16 030	34	188 206	28	4 857 474	-	-	5.16
10	15 080	35	190 796	28	4 857 474	-	-	5.18
10	15 080	36	190 976	28	4 857 474	-	-	5.17
10	15 080	38	196 276	28	4 857 474	-	-	5.15
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	-	-	5.11
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	-	-	5.09
10	15 080	39	195 549	28	4 857 474	-	-	5.09
10	15 080	40	196 419	28	4 857 474	-	-	5.10
10	15 082	40	197 085	28	4 857 474	-	-	5.32
10	15 082	41	208 706	28	4 857 474	-	-	5.35
8	13 612	44	212 828	28	4 857 474	37	252 681	5.79
8	13 612	45	215 345	28	4 857 474	59	335 932	5.93
8	**13 612**	**45**	**215 345**	**28**	**4 857 474**	**59**	**335 932**	**5.98**
-	-	1	864	2	872 161	-	-	5.23
-	-	10	87 596	-	-	-	-	2.70
-	-	-	-	-	-	-	-	2.03
-	-	2	4 529	3	895 533	3	6 294	7.58
-	-	9	66 832	1	233 506	1	2 370	5.68
-	-	8	12 005	1	94 350	5	27 663	2.12
-	-	2	15 060	5	1 077 680	-	-	7.57
-	-	-	-	4	512 853	-	-	11.02
6	11 927	2	3 941	2	88 000	-	-	6.79
-	-	4	5 489	3	477 702	-	-	5.10
1	908	4	10 570	5	523 789	13	81 098	5.79
1	777	3	8 459	2	81 900	31	179 643	9.00
-	-	-	-	-	-	6	38 864	--

Source: Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office.

表16　現有路燈盞數
Table 16　Number of Street Lights

單位：盞　　Unit：set

年(月)底別 End of Year(Month)		總計 Grend Total	複金屬燈（含水銀燈） Metal Halide Light (Include Mercury Vapour Light)	鈉光燈 Sodium Light	日光燈 Fluorescent Light	LED燈 LED Light	其他 Others
民國 91 年底	**End of 2002**	**124 493**	**84 458**	**32 435**	**7 598**	**-**	**2**
民國 92 年底	**End of 2003**	**131 044**	**73 680**	**48 415**	**8 865**	**-**	**84**
民國 93 年底	**End of 2004**	**134 828**	**75 006**	**50 075**	**9 204**	**55**	**488**
民國 94 年底	**End of 2005**	**135 823**	**75 273**	**50 816**	**9 188**	**58**	**488**
民國 95 年底	**End of 2006**	**140 320**	**76 095**	**54 320**	**9 469**	**58**	**378**
民國 96 年底	**End of 2007**	**143 345**	**76 470**	**55 929**	**10 102**	**724**	**120**
民國 97 年底	**End of 2008**	**144 145**	**79 085**	**53 394**	**8 212**	**1 250**	**2 204**
民國 98 年底	**End of 2009**	**145 508**	**79 758**	**54 123**	**8 230**	**1 285**	**2 112**
民國 99 年底	**End of 2010**	**146 791**	**80 198**	**54 966**	**8 230**	**1 285**	**2 112**
民國 100 年底	**End of 2011**	**148 213**	**80 931**	**55 716**	**8 169**	**1 285**	**2 112**
民國 101 年底	**End of 2012**	**149 535**	**76 803**	**56 049**	**8 066**	**1 897**	**6 720**
民國 102 年底	**End of 2013**	**151 248**	**38 647**	**61 997**	**7 196**	**41 452**	**1 956**
民國 103 年底	**End of 2014**	**154 305**	**11 328**	**61 859**	**7 899**	**70 400**	**2 819**
民國 104 年底	**End of 2015**	**155 501**	**10 148**	**61 845**	**7 846**	**73 323**	**2 339**
民國 105 年底	**End of 2016**	**157 696**	**6 836**	**60 898**	**7 587**	**80 036**	**2 339**
民國 106 年底	**End of 2017**	**159 546**	**4 948**	**56 808**	**7 587**	**87 864**	**2 339**
民國 107 年底	**End of 2018**	**162 834**	**5 168**	**32 209**	**7 869**	**114 921**	**2 667**
民國108年	**2019**						
8月底	End of Aug.	163 458	3 172	23 283	7 869	126 467	2 667
9月底	End of Sep.	163 458	3 172	23 283	7 869	126 467	2 667
10月底	End of Oct.	163 688	3 172	19 560	7 355	130 934	2 667
11月底	End of Nov.	164 143	2 749	10 164	5 796	143 143	2 291
12月底	End of Dec.	164 143	2 749	10 164	5 796	143 143	2 291
民國109年	**2020**						
1月底	End of Jan.	165 261	1 222	7 943	2 183	152 612	1 301
2月底	End of Feb.	165 261	1 222	7 943	2 183	152 612	1 301
3月底	End of Mar.	165 261	1 222	7 943	2 183	152 612	1 301
4月底	End of Apr.	165 261	1 222	7 943	2 183	152 612	1 301
5月底	End of May	165 687	896	6 901	2 109	154 792	989
6月底	End of June	165 687	896	6 901	2 109	154 792	989
7月底	End of July	165 687	896	6 901	2 109	154 792	989
8月底	End of Aug.	165 687	896	6 901	2 109	154 792	989
109年8月底較上年同期增減% Annual Change Rate(%)		0.01	- 0.72	- 0.70	- 0.73	0.22	- 0.63

資料來源：公園路燈工程管理處。

說明：1.本表以台灣電力公司供電之盞數計列。

2.97年起路燈種類重新歸類計算，無法銜接。

Explanation: 1.This table is calculated based on lamps powered by Taiwan Power Company.

2.Street lights were reclassified since 2008, figures are not directly comparable to previous years.

表17　登山步道

109年6月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
總計		154 條	117 625
信義區小計		24 條	13 020
(XY-01)	虎山溪步道	慈惠堂→真光禪寺→復興園	950
(XY-02)	虎山山腰步道	復興圓→山神廟叉路	527
(XY-03)	虎山自然步道	慈惠堂→山神廟→南港山稜線叉路口	1 100
(XY-04)	虎山生態步道	虎山400m涼亭→王家土雞城叉路口	480
(XY-05)	虎山復興園步道	復興園→瑤池宮	580
(XY-06)	美的世界社區步道	瑤池宮→松山路673號美的世界社區(增長180m)	500
(XY-07)	虎山120高地步道	福德街221巷→虎山120高地	238
(XY-08)	虎山峰下方步道	福德街221巷→虎山峰下涼亭	157
(XY-09)	虎山峰前方步道	福德街221巷→虎山峰前涼亭	220
(XY-10)	虎山奉天宮步道	奉天宮→松山路679-1號	890
(XY-11)	虎山吉福宮步道	福德街51巷→虎山120高地	509
(XY-12)	吉福宮叉路步道	吉福宮上方右叉路→涼亭右轉下福德街51巷	322
(XY-13)	象山北星寶宮步道	靈雲宮→山頂→北星寶宮叉路	824
(XY-14)	天寶聖道宮步道	北星寶宮→天寶聖道宮	408
(XY-15)	拇指山步道	拇指山登山口→北星寶宮	1 355
(XY-16)	北台慈惠堂步道	北台慈惠堂→南港山親山步道三叉路	150
(XY-17)	永春崗顏子廟步道	永春崗公園→顏子廟	220
(XY-18)	象山永春崗步道	松山路650巷超市旁→象山頂前南港山叉路口(含入口意象範圍)	850
(XY-19)	象山一線天步道	象山990m巨石叉路→一線天→75m叉路口	822
(XY-20)	市立療養院步道	療養院→稜線(象山親山460m)(含入口意象範圍)	233
(XY-21)	象山自然步道	市療羽球場→象山煙火平台	400
(XY-22)	石泉巖步道	石泉巖→中正巖	289
(XY-23)	糶米古道	吳興街600巷→極樂公墓	446
(XY-24)	豹山溪步道	豹山拆遷整治區前往上至第一座橋 (第一座橋至靈隱寺前尚未施作)	550
中山區小計		3 條	3 024
(CS-01)	復興電台線步道	中山北路5段282巷→劍潭山稜線	700
(CS-02)	劍潭山稜線步道	劍潭山打印台經老地方→通北街叉路口→軍營門口(延伸374m至軍營前)	1 574
(CS-02)	文間山步道	臨溪路100巷口→劍南路支線道路→文間山出口	750

Table 17 Hiking Trails (Cont. 1)

End of June 2020

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
文山區小計		**29 條**	**19 029**
(WS-01)	試院支線步道	考試院上方涼亭→仙跡岩足跡步道叉路(含木柵路1段23號旁入口路段)	452
(WS-02)	景興國小支線步道	親山步道915m景興國小叉路口→景興國小	368
(WS-03)	溝子口支線步道	(往光輝路口)樓梯盡頭→親山步道1300m海巡署叉路口→主稜線及景興國小支線轉角	868
(WS-04)	麥田支線步道	麥田山莊→仙跡岩稜線(含福德宮304巷支線)	413
(WS-05)	海巡署支線	興隆路三段304巷25號勞保局倉庫前→溝子口步道上方指向牌	600
(WS-06)	指南宮步道	指南宮33巷牌樓步道口→指南慈惠堂前方指向牌	900
(WS-07)	指南慈惠堂步道	指南路三段→指南慈惠堂再接商店街至獅子亭前方涼亭	750
(WS-08)	大成殿步道	指南路三段→大成殿步道口	605
(WS-09)	猴山岳步道	指南宮後山猴山岳步道口→新光路	602
(WS-10)	茶展中心步道	茶業推廣中心停車場→指南路三段	760
(WS-11)	健康步道	茶業推廣中心步道口→私人工寮旁	414
(WS-12)	壺穴步道	茶壺站對面寒舍入口→壺穴吊橋	550
(WS-13)	小天空步道	茶展中心停車場旁→邀月餐廳門口	200
(WS-14)	飛龍步道	環山二道→樟山寺	960
(WS-15)	救千宮步道	樟山寺→混元宮前高速公路涵洞下步道口	1 029
(WS-16)	指南國小步道	指南國小→樟山寺前叉路口	686
(WS-17)	拖板嶺步道	指南國小→三玄宮	1 320
(WS-18)	貓空越嶺步道	貓空纜車站對面步道口→稜線上十字路口(含入口意象範圍)	800
(WS-19)	樟樹步道	三墩石步道口→大觀園後方停車場(＋談茶支線160m)	1 100
(WS-20)	楓林步道	樟樹步道楓林支線叉路口→指南路談天園對面步道口(含涼亭範圍)	160
(WS-21)	石獅腳步道	高振盛茶農步道道口→樟樹步道德隆茶行叉路口(含入口意象範圍)	350
(WS-22)	老樟樹步道	樟樹步道老樟樹叉路口→繞一圈至前方80m出口	70
(WS-23)	樟湖步道	指南路3段38巷涵鈺軒→指南路3段34巷瓦厝	2 500
(WS-24)	待老坑步道	樟湖步道待老坑叉路→待老坑山至老泉街26巷優人神鼓	522
(WS-25)	登高步道	明德宮對面步道口→望遠亭	100
(WS-26)	中埔山榕樹步道	辛亥路四段21巷步道口→石板鋪面終點	250
(WS-27)	仙跡岩主稜線	溝子口支線及海巡署支線三叉路口→主稜線及景興國小支線轉角	400
(WS-28)	軍功山步道	軍功山世界山莊登山口→中埔山東峰步道交界處	600
(WS-29)	中埔山東峰步道	軍功山步道交界處→中埔山東峰→辛亥路水泥陡坡終點	700

表17　登山步道(續2)

109年6月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
南港區小計		**14 條**	**11 959**
(NG-01)	南港山(一)中華技術學院	中華技術學院→南港山鞍部→分界點	1 970
(NG-02)	南港山(二)北興宮	南港山鞍部→北興宮(含入口意象範圍)	685
(NG-03)	南港山(三)麗山橋口	研究院路四段50巷→南港山鞍部(含入口意象範圍)	1 175
(NG-04)	九五峰	南港山鞍部→姆指山山頂陵線	2 165
(NG-05)	更寮步道	舊莊街二段122巷→土庫岳→大豐產業道路	2 450
(NG-06)	栳寮步道	舊莊街二段232巷→魏靜時故居(含入口意象範圍)	440
(NG-07)	桂花林步道＋2條支線	舊莊街二段添進茶園→南港茶葉製造示範廠第2停車場	495
(NG-08)	桂花吊橋步道＋支線	舊莊街二段寶豐庭茶莊→舊莊路2段328號	305
(NG-09)	桂花吊橋親水步道	舊莊街二段寶樹橋旁→桂花吊橋	170
(NG-10)	桂花亭步道	桂花亭入口意象→舊莊街二段步道口(含入口意象範圍)	200
(NG-11)	明聖步道	無極明聖宮旁至國家生技園區範圍前	76
(NG-12)	余氏古厝步道	余氏古厝後方至桂花亭步道	328
(NG-13)	妙高台步道	拇指山馬蹄形平台-紫雲街75號	1 000
(NG-14)	土地公嶺步道	崇德街→安祿宮	500
內湖區小計		**24 條**	**24 672**
(NH-01)	碧湖步道	內湖路三段碧湖步道口→新福本坑出口(葉氏祖廟前)(含步道兩端的入口意象範圍)	1 300
(NH-02)	大溝溪溪畔步道	大湖山莊街底大溝溪公園涼亭外→鯉魚山50m處相接	680
(NH-03)	圓覺寺步道	鯉魚山叉路→瀑布潭→圓覺寺步道口→峰碧塔門口	1 185
(NH-04)	鯉魚山步道	碧山路→葉氏祖廟(含入口意象範圍)	1 065
(NH-05)	碧山巖步道	碧山路23號→碧山巖	346
(NH-06)	忠勇山步道	慈聖宮→忠勇山頂	800
(NH-07)	忠勇山越嶺步道	碧山巖→忠勇山→林氏墓園→金龍產業道路	1 660
(NH-08)	大崙尾山步道圓明寺支線	大崙尾山打印台→湧泉寺(圓明寺門前)	3 180
(NH-09)	碧山露營場步道	碧山工作站→露營場	86
(NH-10)	碧山露營場下方木棧道	碧山工作站→露營場＋串連道(枕木步道交會)	272
(NH-11)	碧山露營場枕木步道	碧山工作站→自然生態教室→營地側門	1 088
(NH-12)	白鷺鷥山步道	老公祠福佑宮→白鷺鷥山→金湖路268號進入(含入口意象範圍)	1 845

Table 17 Hiking Trails (Cont. 3)

End of June 2020

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
(NH-13)	康樂山步道	成功路5段山海寺牌樓→安泰街水源頭福德宮	1 470
(NH-14)	明舉山步道	安泰街打印台→內溝溪生態展示館前	1 450
(NH-15)	康樂街步道	康樂街236號內溝里民活動中心→六角木造涼亭	383
(NH-16)	龍船岩步道碧山路支線	碧山路62號→龍船岩叉路口(福德宮)	368
(NH-17)	龍船岩步道開眼山支線	開眼山→龍船岩	554
(NH-18)	龍船岩步道五路財神廟支線	龍船岩叉路(福德宮)→五路財神廟	1 330
(NH-19)	金面山步道	內湖步道叉路→金龍里福德宮(剪刀石→小金面)	2 786
(NH-20)	採石場步道	環山路一段136巷底→打印台前叉路(論劍亭上方)(含入口意象範圍)(136巷入口旁新設步道及涼亭)	730
(NH-21)	竹月寺步道	採石場步道40m叉路右經竹月寺→金面山稜線	1 080
(NH-22)	金面山68巷支線步道	環山路二段68巷底→金面山稜線泰安亭	464
(NH-23)	郭氏古厝步道	內湖文德路步道口→郭氏古厝	100
(NH-24)	大湖里步道	大溝溪親水公園入口旁	450
士林區小計		**26 條**	**23 100**
(SL-01)	風櫃嘴步道	溪山里至善路三段336巷51號至風櫃嘴步道口	614
(SL-02)	大崎頭步道	至善路三段370巷步道口至坪頂古圳清風亭	1 030
(SL-03)	坪頂古圳步道	至善路三段370巷29號步道口至平菁街95巷步道口	1 350
(SL-04)	鵝尾山步道礁坑橋支線(平溪步道)	至善路3段181巷5弄→平等國小旁平菁路105巷底	1 345
(SL-05)	鵝尾山步道簡厝支線	至善路三段277巷→至善路3段371巷20弄	303
(SL-06)	平菁步道	至善路三段71巷步道口→平菁街140號	929
(SL-07)	竹林步道	平菁路42巷禾豐餐廳停車場旁至公平橋	525
(SL-08)	永圳步道	永公路350巷反射境後直行到路底至圳溝邊(距公平橋300m)	320
(SL-09)	水管路步道	中山北路七段232巷1弄→愛富三街(含入口意象範圍)	2 600
(SL-10)	下竹林步道	中山北路七段190巷112號→仁民路	1 034
(SL-11)	婆婆橋步道	至善路二段266巷底→劍南路口圓明寺前(舊路200M)	555
(SL-12)	鄭成功廟步道	劍南路鄭成功廟旁→上方九蓮寺叉路	312
(SL-13)	大崙頭山步道	碧山路→山頂	515
(SL-14)	大崙頭森林步道	碧溪產業道路1.7K森林步道口→稜線步道(含入口意象範圍)	833

表17　登山步道(續4)

109年6月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
(SL-15)	大崙頭自然步道	碧溪產業道路2.4K枕木步道口→稜線步道(含入口意象範圍)	620
(SL-16)	大崙頭北面步道	大崙頭山頂→碧山路50號民宅前	960
(SL-17)	望獅步道	藥用植物園旁→碧溪產業道路0+150	420
(SL-18)	瞭望台步道	碧溪產道2.25K下方碎石步道→高架瞭望台(2.45K)(含瞭望台下方休憩平台)	200
(SL-19)	碧溪步道	碧溪產業道路1.5K石頭屋→大崙尾山步道2120m+新增枕木步道390m+舊枕木70m+(靶場支線88m)	1 450
(SL-20)	翠山(靶場)步道	中社路二段路底至碧溪步道交會處	1 145
(SL-21)	大崙尾山中社路支線	中社路二段→山頂	870
(SL-22)	大崙尾山步道碧山路支線	碧山路→大崙尾山頂	740
(SL-23)	翠山街步道	中社路2段公車終點站旁至翠山街口雙福宮	200
(SL-24)	雙溪國小步道	雙溪國小旁步道口至中社路2段明溪街口	330
(SL-25)	雙溪溝古道	萬溪右線產業道路→五指山產業道路	900
(SL-26)	五指山古道	梅花山-大崙頭北面步道叉路口	3 000
北投區		**34 條**	**22 821**
(BT-01)	忠義山步道	忠義廟→親山步道打印台	850
(BT-02)	楓丹白露步道	忠義山打印台→楓丹白露社區前入口意象(含入口意象範圍)	450
(BT-03)	大屯山(一)下青礐步道	貴子坑水保教室前→下青礐(復興三路)	1 727
(BT-04)	大屯山(二)貴子坑步道	親山步道打印台→貴子坑露營場對面步道口	1 330
(BT-05)	中和里上清宮步道	復興三路212號→中清礐	880
(BT-06)	中和里永春寮步道	復興三路300巷底→中正山產業道路中段(增長至上清宮對面水泥橋)(增長322m)	760
(BT-07)	永春寮溪步道	上清宮'旁步道口→復興三路310巷步道口	350
(BT-08)	中和里白宮山莊步道	復興四路105巷10號→復興三路白宮山莊	520
(BT-09)	中正山(一)郵政訓練所步道	登山路61號→郵政訓練中心(含入口意象範圍)	906
(BT-10)	中正山(二)法雨寺步道	泉源產業道路→法雨寺十墓園支線(登山路40號至墓園邊200m)	924
(BT-11)	中正山親山步道	登山路立祥商店步道口→前行180m	180
(BT-12)	中正山嶺頭步道	拓印亭對面步道口→中正山停車場步道口	800
(BT-13)	青楓步道	大梯田旁步道口→竹子湖產業道路2K+650	300
(BT-14)	頂湖海芋步道	名陽匋農場旁步道口→海芋田景觀木橋	160
(BT-15)	猴崁步道	竹子湖路下切左轉→猴崁產業道路	350

Table 17 Hiking Trails (Cont. 5 End)

End of June 2020

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
(BT-16)	水尾巴拉卡步道	竹子湖水尾公車站→巴拉卡公路	518
(BT-17)	猴炭湖田國小步道	竹子湖9號→猴炭產業道路(1K＋100)	650
(BT-18)	水車寮步道	湖田國小停車場旁步道口→大樹下土雞城步道口	550
(BT-19)	軍艦岩步道	陽明醫學院步道口→軍艦岩前叉路	500
(BT-20)	照明寺步道	軍艦岩下泥土步道→照明禪寺	1 230
(BT-21)	丹鳳山步道	照明寺旁丹鳳山入口→中和禪寺	1 300
(BT-22)	半嶺步道	(向前延伸至湖底路)紅檀前方30m步道口→欄杆橋頭福德宮	1 200
(BT-23)	橫嶺古道	湖山路一段步道口→紅檀停車場	800
(BT-24)	湖山國小步道	湖底路48號湖山國小旁→湖山路25之1號	568
(BT-25)	風尾步道	東昇路38號前步道口→東昇路68-15號	291
(BT-26)	泉源紗帽步道	泉源路232號上方路口至紗帽路10號巷口（對面至山谷下步道）	684
(BT-27)	淨水廠步道	泉源路260號淨水廠旁步道口→水圳步道邊	132
(BT-28)	鼎筆橋步道	鼎筆橋→東昇路(頂湖福德宮)	363
(BT-29)	陽峰古道	陽峰古道入口→鼎筆橋旁	1 100
(BT-30)	磺溪溫泉步道	行義路260巷天祥溫泉前步道口→行義路402巷皇池溫泉停車場旁步道口	750
(BT-31)	硫磺谷步道	東昇路往硫磺谷福德宮巷口→東昇路與行義路交會處(過磺港溪)	236
(BT-32)	忠義山步道-坪頂路支線	忠義山步道→坪頂路口(稻香路口)	800
(BT-33)	國華練習場至貴子坑步道	國華練習場至貴子坑步道	300
(BT-34)	湖山秘徑	四O砲陣地樓梯前→涼亭(陽明山第二停車場)	362

資料來源：大地工程處。 Source：Geotechnical Engineering Office

表18 土地人口概況

Table 18 Land and Population

年（月）底別 End of Year(Month)		土地面積 Land (平方公里) (k㎡)	戶籍戶數 No. of Households (戶) (no.)	人口數(人) Population (person) 總計 Grend Total	男 Male	女 Female	人口密度 Population Density (人/平方公里) (person/ k㎡)
民國88年底	**End of 1999**	**271.7997**	**879 156**	**2 641 312**	**1 309 434**	**1 331 878**	**9 718**
民國89年底	**End of 2000**	**271.7997**	**888 560**	**2 646 474**	**1,309,308**	**1,337,166**	**9,737**
民國90年底	**End of 2001**	**271.7997**	**894 763**	**2 633 802**	**1 300 179**	**1 333 623**	**9 690**
民國91年底	**End of 2002**	**271.7997**	**906 988**	**2 641 856**	**1 301 458**	**1 340 398**	**9 720**
民國92年底	**End of 2003**	**271.7997**	**914 716**	**2 627 138**	**1 291 742**	**1 335 396**	**9 666**
民國93年底	**End of 2004**	**271.7997**	**923 325**	**2 622 472**	**1 286 303**	**1 336 169**	**9 649**
民國94年底	**End of 2005**	**271.7997**	**933 110**	**2 616 375**	**1 279 513**	**1 336 862**	**9 626**
民國95年底	**End of 2006**	**271.7997**	**941 317**	**2 632 242**	**1 282 691**	**1 349 551**	**9 684**
民國96年底	**End of 2007**	**271.7997**	**947 745**	**2 629 269**	**1 277 556**	**1 351 713**	**9 674**
民國97年底	**End of 2008**	**271.7997**	**958 433**	**2 622 923**	**1 270 948**	**1 351 975**	**9 650**
民國98年底	**End of 2009**	**271.7997**	**969 418**	**2 607 428**	**1 260 450**	**1 346 978**	**9 593**
民國99年底	**End of 2010**	**271.7997**	**983 237**	**2 618 772**	**1 262 554**	**1 356 218**	**9 635**
民國100年底	**End of 2011**	**271.7997**	**999 879**	**2 650 968**	**1 276 343**	**1 374 625**	**9 753**
民國101年底	**End of 2012**	**271.7997**	**1 017 063**	**2 673 226**	**1 285 361**	**1 387 865**	**9 835**
民國102年底	**End of 2013**	**271.7997**	**1 026 738**	**2 686 516**	**1 289 945**	**1 396 571**	**9 884**
民國103年底	**End of 2014**	**271.7997**	**1 037 402**	**2 702 315**	**1 295 636**	**1 406 679**	**9 942**
民國104年底	**End of 2015**	**271.7997**	**1 043 948**	**2 704 810**	**1 295 462**	**1 409 348**	**9 951**
民國105年底	**End of 2016**	**271.7997**	**1 047 284**	**2 695 704**	**1 289 510**	**1 406 194**	**9 918**
民國106年底	**End of 2017**	**271.7997**	**1 050 755**	**2 683 257**	**1 281 917**	**1 401 340**	**9 872**
民國107年底	**End of 2018**	**271.7997**	**1 056 233**	**2 668 572**	**1 273 375**	**1 395 197**	**9 818**
民國108年	**2019**						
8月底	End of Aug.	271.7997	1 059 212	2 650 154	1 263 106	1 387 048	9 750
9月底	End of Sep.	271.7997	1 061 362	2 647 164	1 261 548	1 385 616	9 739
10月底	End of Oct.	271.7997	1 061 184	2 646 204	1 260 951	1 385 253	9 736
11月底	End of Nov.	271.7997	1 061 088	2 645 293	1 260 292	1 385 001	9 733
12月底	End of Dec.	271.7997	1 060 880	2 645 041	1 260 049	1 384 992	9 732
民國109年	**2020**						
1月底	End of Jan.	271.7997	1 060 206	2 642 877	1 258 801	1 384 076	9 724
2月底	End of Feb.	271.7997	1 059 903	2 639 084	1 256 806	1 382 278	9 710
3月底	End of Mar.	271.7997	1 060 047	2 635 286	1 254 826	1 380 460	9 696
4月底	End of Apr.	271.7997	1 059 749	2 631 083	1 252 726	1 378 357	9 680
5月底	End of May	271.7997	1 059 822	2 626 385	1 250 381	1 376 004	9 663
6月底	End of June	271.7997	1 060 320	2 624 143	1 249 258	1 374 885	9 655
7月底	End of July	271.7997	1 060 529	2 620 037	1 247 311	1 372 726	9 640
8月底	End of Aug.	271.7997	1 060 206	2 642 877	1 258 801	1 384 076	9 724

資料來源：本府地政局、民政局。

Source: Department of Land , Department of Civil Affairs.

表19　臺灣地區營造工程物價指數

公式：採用拉式公式之變式

年(月)別 Year（Month）	總指數 General Index	水泥及其製品類 Cement & Related Products	砂石及級配類 Sand & Crashed Stone	磚瓦瓷類 Bricks & Tiles	金屬製品類 Metal Products	木材及其製品類 Timber & Related Products
項數 No of Items	115	7	3	5	21	5
權數(千分比) Weights	1,000	150.48	21.44	15.87	195.04	30.14
基期：民國105年＝100			定基指數			
民國100年 2011	**102.29**	**92.89**	**84.54**	**90.10**	**134.22**	**100.08**
民國101年 2012	**103.14**	**97.34**	**87.78**	**94.77**	**128.17**	**97.91**
民國102年 2013	**102.79**	**98.99**	**89.07**	**97.65**	**121.07**	**99.74**
民國103年 2014	**104.67**	**105.47**	**100.86**	**100.35**	**118.34**	**104.38**
民國104年 2015	**101.71**	**105.62**	**102.10**	**100.79**	**100.84**	**104.52**
民國105年 2016	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
民國106年 2017	**102.40**	**96.80**	**99.12**	**98.93**	**113.34**	**99.92**
民國107年 2018	**105.84**	**99.81**	**99.56**	**97.82**	**125.36**	**106.12**
民國108年 2019	**108.19**	**113.86**	**103.75**	**97.73**	**122.51**	**107.55**
8月 Aug.	108.58	114.92	103.81	98.08	122.75	107.76
9月 Sep.	108.34	115.36	103.74	98.08	120.84	107.44
10月 Oct.	107.92	115.73	103.97	97.99	118.57	107.34
11月 Nov.	108.12	116.28	104.36	97.85	118.71	107.38
12月 Dec.	108.62	117.48	104.79	97.99	119.22	107.51
民國109年 2020						
1月 Jan.	108.97	118.84	105.10	98.52	119.27	107.48
2月 Feb.	108.85	120.91	105.10	98.55	116.93	107.46
3月 Mar.	109.11	122.84	105.61	98.49	116.69	107.19
4月 Apr.	108.61	123.44	105.07	98.46	114.36	107.48
5月 May	108.69	123.87	104.77	98.47	114.82	107.38
6月 June	109.03	123.98	104.70	98.47	115.83	107.08
7月 July	109.05	124.12	104.66	98.28	114.98	106.85
8月 Aug.	109.48	124.30	104.71	98.37	116.54	106.76
			年增率(%)			
民國100年 2011	**3.33**	**- 0.43**	**- 3.08**	**2.13**	**7.32**	**10.89**
民國101年 2012	**0.83**	**4.79**	**3.83**	**5.18**	**- 4.51**	**- 2.17**
民國102年 2013	**- 0.34**	**1.70**	**1.47**	**3.04**	**- 5.54**	**1.87**
民國103年 2014	**1.83**	**6.55**	**13.24**	**2.76**	**- 2.25**	**4.65**
民國104年 2015	**-2.83**	**0.14**	**1.23**	**0.44**	**-14.79**	**0.13**
民國105年 2016	**- 1.68**	**- 5.32**	**- 2.06**	**- 0.78**	**- 0.83**	**- 4.32**
民國106年 2017	**2.40**	**-3.20**	**-0.88**	**-1.07**	**13.34**	**-0.08**
民國107年 2018	**3.36**	**3.11**	**0.44**	**-1.12**	**10.61**	**6.20**
民國108年 2019	**2.22**	**14.08**	**4.21**	**-0.09**	**-2.27**	**1.35**
8月 Aug.	1.95	14.43	4.27	0.47	-3.70	0.71
9月 Sep.	1.35	13.04	4.45	0.39	-5.79	0.26
10月 Oct.	0.60	11.39	4.68	0.45	-8.11	-0.15
11月 Nov.	1.00	10.65	4.84	0.17	-6.35	-0.21
12月 Dec.	1.70	10.20	4.93	0.29	-3.75	-0.13
民國109年 2020						
1月 Jan.	1.92	9.15	2.37	0.61	-2.41	0.27
2月 Feb.	0.96	9.85	1.71	1.24	-7.00	0.13
3月 Mar.	0.67	9.78	2.14	1.19	-7.84	-0.46
4月 Apr.	0.13	8.70	1.44	1.33	-8.80	-0.08
5月 May	0.41	8.95	0.99	1.22	-7.16	-0.30
6月 June	0.57	8.84	0.79	0.82	-6.36	-0.81
7月 July	0.60	8.34	0.92	0.26	-6.28	-0.80
8月 Aug.	0.83	8.16	0.87	0.30	-5.06	-0.93

資料來源：行政院主計總處《物價統計月報》。

說　　明：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正。

Table 19　Indices of Construction Cost in Taiwan Area

Formula：Laspeyres's Formula

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類 Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
8	4	16	2	15	29
15.54	7.63	86.82	21.48	56.96	398.61
Fixed Index				Base Period：2016=100	
92.35	**92.21**	**107.63**	**100.43**	**93.36**	**94.78**
95.94	**97.39**	**106.97**	**107.13**	**96.24**	**96.09**
100.26	**99.28**	**105.87**	**109.11**	**98.02**	**96.98**
103.03	**100.43**	**105.91**	**109.07**	**99.82**	**98.70**
100.16	**100.23**	**103.04**	**103.73**	**99.79**	**99.96**
100.00	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
104.29	**99.64**	**104.13**	**99.21**	**101.07**	**100.44**
107.31	**100.93**	**107.23**	**99.98**	**102.49**	**101.00**
108.69	**101.57**	**107.02**	**103.20**	**103.89**	**102.28**
108.53	101.57	106.95	103.39	105.33	102.54
109.03	101.57	106.41	103.39	105.44	102.80
108.93	101.57	106.41	103.39	104.01	102.94
108.49	101.57	106.23	103.39	104.34	103.13
108.47	101.57	106.37	103.39	104.36	103.62
109.65	101.57	106.83	103.39	104.43	103.79
110.17	101.57	106.85	103.39	104.40	103.83
110.09	101.66	106.22	103.39	104.40	104.00
108.87	101.66	105.12	103.36	104.43	103.96
107.88	101.66	104.64	99.93	104.39	104.10
108.65	101.66	105.11	99.00	105.94	104.17
110.05	101.66	106.01	99.06	105.94	104.36
110.52	101.66	106.78	99.09	105.98	104.42
Annual Change Rate (%)					
6.31	**9.45**	**5.86**	**3.43**	**3.83**	**1.25**
3.89	**5.62**	**- 0.61**	**6.67**	**3.08**	**1.38**
4.50	**1.94**	**- 1.03**	**1.85**	**1.85**	**0.93**
2.76	**1.16**	**0.04**	**- 0.04**	**1.84**	**1.77**
-2.79	**-0.20**	**-2.71**	**-4.90**	**-0.03**	**1.28**
- 0.16	**- 0.23**	**- 2.95**	**- 3.60**	**0.21**	**0.04**
4.29	**-0.36**	**4.13**	**-0.79**	**1.07**	**0.44**
2.90	**1.29**	**2.98**	**0.78**	**1.40**	**0.56**
1.29	**0.63**	**-0.20**	**3.22**	**1.37**	**1.27**
0.56	0.02	0.00	3.41	1.39	1.35
1.38	0.00	-0.12	1.89	1.56	1.57
1.52	-0.04	-0.11	1.40	1.74	1.65
1.75	0.00	-0.67	1.18	2.05	1.85
1.23	0.00	-0.59	0.99	2.01	2.18
1.21	0.00	-0.07	0.90	2.02	2.26
1.04	0.00	0.04	0.66	2.04	2.27
0.78	0.09	-1.26	0.18	2.00	2.36
0.32	0.09	-2.75	0.16	1.95	2.20
-0.03	0.09	-3.17	-3.26	0.91	2.25
0.14	0.09	-2.06	-4.16	0.73	2.17
0.67	0.09	-1.01	-4.10	0.74	2.09
1.83	0.09	-0.16	-4.16	0.62	1.83

Source: Price Statistics Monthly in Taiwan Area, R.O.C. (Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan.)
Explanation: All data are subject to revision 3 months after original publication due to late reports and corrections by respondents.

表20　臺北市營造工程物價指數

公式：價比基期值加權算術平均式

年(月)別 Year（Month）		總指數 General Index	水泥及其製品類 Cement & Related Products	砂石及級配類 Sand & Crashed Stone	磚瓦瓷類 Bricks & Tiles	金屬製品類 Metal Products	木材及其製品類 Timber & Related Products
項數 No of Items		115	7	3	5	21	5
權數(千分比) Weights		1,000.00	144.70	18.16	16.61	199.11	30.56
基期：民國105年＝100				定基指數			
民國100年	**2011**	**103.27**	**97.58**	**88.01**	**98.70**	**131.73**	**108.65**
民國101年	**2012**	**103.93**	**100.31**	**88.48**	**102.05**	**125.48**	**103.90**
民國102年	**2013**	**103.25**	**101.39**	**91.10**	**103.28**	**117.85**	**103.99**
民國103年	**2014**	**104.69**	**108.46**	**100.47**	**103.49**	**115.89**	**107.64**
民國104年	**2015**	**101.84**	**106.86**	**101.55**	**102.89**	**101.04**	**106.77**
民國105年	**2016**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
民國106年	**2017**	**101.81**	**97.92**	**100.24**	**97.79**	**111.52**	**98.49**
民國107年	**2018**	**105.11**	**104.10**	**100.30**	**95.07**	**122.42**	**101.97**
民國108年	**2019**	**108.07**	**119.33**	**101.46**	**94.18**	**119.70**	**104.09**
8月	Aug.	108.85	120.24	102.43	94.10	119.95	104.57
9月	Sep.	108.67	120.63	102.43	94.10	118.24	104.57
10月	Oct.	108.23	120.83	102.43	94.10	116.21	104.57
11月	Nov.	108.29	120.83	103.29	93.12	116.18	104.57
12月	Dec.	108.78	120.99	105.00	93.12	116.49	104.57
民國109年	**2020**						
1月	Jan.	109.14	122.99	105.00	93.72	116.26	104.57
2月	Feb.	109.08	124.93	105.00	93.72	114.11	104.57
3月	Mar.	109.39	125.68	105.84	92.73	113.92	104.57
4月	Apr.	108.84	125.76	106.25	92.73	111.50	104.90
5月	May	108.63	125.76	106.25	92.73	111.64	104.90
6月	June	109.11	125.76	106.25	92.73	112.86	104.85
7月	July	109.22	125.91	106.25	91.75	112.63	104.85
8月	Aug.	109.74	125.91	106.25	91.75	114.23	104.85
				年增率(%)			
民國100年	**2011**	**6.18**	**- 3.78**	**- 12.44**	**- 0.31**	**41.02**	**14.44**
民國101年	**2012**	**0.64**	**2.80**	**0.53**	**3.39**	**- 4.74**	**- 4.37**
民國102年	**2013**	**- 0.65**	**1.08**	**2.96**	**1.21**	**- 6.08**	**0.09**
民國103年	**2014**	**1.39**	**6.97**	**10.29**	**0.20**	**- 1.66**	**3.51**
民國104年	**2015**	**- 2.72**	**- 1.48**	**1.07**	**- 0.58**	**- 12.81**	**- 0.81**
民國105年	**2016**	**- 1.81**	**- 6.42**	**- 1.53**	**- 2.81**	**- 1.03**	**- 6.34**
民國106年	**2017**	**1.81**	**- 2.08**	**0.24**	**- 2.21**	**11.52**	**- 1.51**
民國107年	**2018**	**3.24**	**6.31**	**0.06**	**- 2.78**	**9.77**	**3.53**
民國108年	**2019**	**2.82**	**14.63**	**1.16**	**- 0.94**	**- 2.22**	**2.08**
8月	Aug.	2.94	14.63	2.61	- 0.98	- 3.02	1.65
9月	Sep.	2.10	11.32	3.19	- 0.98	- 5.30	1.69
10月	Oct.	1.07	8.44	3.19	- 1.36	- 8.19	1.69
11月	Nov.	1.34	7.19	4.06	- 2.39	- 6.55	1.69
12月	Dec.	2.20	6.96	5.08	- 2.39	- 4.45	1.78
民國109年	**2020**						
1月	Jan.	2.58	7.25	5.08	- 2.70	- 3.21	1.78
2月	Feb.	1.80	8.37	5.08	- 0.67	- 7.20	1.78
3月	Mar.	1.55	6.84	5.92	- 1.72	- 7.73	0.97
4月	Apr.	0.51	4.63	6.34	- 1.58	- 8.63	1.28
5月	May	0.61	4.63	6.34	- 1.58	- 7.21	0.44
6月	June	0.85	4.63	6.34	- 1.46	- 6.53	0.27
7月	July	0.88	4.72	3.73	- 2.50	- 5.86	0.27
8月	Aug.	0.82	4.72	3.73	- 2.50	- 4.77	0.27

資料來源：本府主計處《臺北市物價統計月報》。

Table 20　Indices of Construction Cost in Taipei City

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類① Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項材料類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
8	4	16	2	15	29
15.99	8.04	85.29	22.07	56.79	402.68
Fixed Index				Base Period：2016=100	
93.78	**91.79**	**105.62**	**109.56**	**91.40**	**94.81**
96.73	**96.17**	**105.44**	**114.43**	**93.23**	**97.31**
100.34	**100.30**	**104.58**	**115.73**	**94.03**	**98.29**
102.40	**100.46**	**104.08**	**115.06**	**96.14**	**99.07**
98.41	**100.46**	**102.11**	**104.71**	**98.97**	**100.09**
100.00	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
104.76	**97.94**	**102.34**	**98.24**	**98.92**	**100.03**
104.16	**97.93**	**104.58**	**100.01**	**99.77**	**100.24**
108.84	**97.93**	**104.29**	**104.35**	**100.31**	**102.88**
109.36	97.93	104.44	104.71	101.96	104.00
109.83	97.93	103.61	104.71	101.96	104.42
109.83	97.93	103.61	104.71	99.68	104.59
108.96	97.93	103.51	104.71	99.68	104.81
108.96	97.93	103.51	104.71	99.68	105.74
109.96	97.93	103.71	104.71	99.68	105.93
110.59	97.93	103.71	104.71	99.68	106.13
110.59	98.07	103.08	104.71	99.69	106.86
108.31	98.07	102.15	104.51	99.69	106.91
107.13	98.07	100.23	102.05	99.69	106.91
107.84	98.07	101.15	101.56	101.98	107.00
109.02	98.07	102.03	101.55	101.96	107.14
108.03	98.07	103.00	101.55	101.99	107.47
Annual Change Rate (%)					
1.12	**- 2.72**	**9.26**	**12.48**	**- 6.90**	**- 3.63**
3.15	**4.77**	**- 0.17**	**4.45**	**2.00**	**2.64**
3.73	**4.29**	**- 0.82**	**1.14**	**0.86**	**1.01**
2.05	**0.16**	**- 0.48**	**-0.58**	**2.24**	**0.79**
- 3.90	**0.00**	**- 1.89**	**-9.00**	**2.94**	**1.03**
1.62	**- 0.46**	**- 2.07**	**-4.50**	**1.04**	**-0.09**
4.76	**- 2.06**	**2.34**	**-1.76**	**-1.08**	**0.03**
- 0.57	**- 0.01**	**2.19**	**1.80**	**0.86**	**0.21**
4.49	**0.00**	**- 0.28**	**4.34**	**0.54**	**2.63**
4.88	0.00	0.23	2.74	0.43	3.42
5.33	0.00	- 0.24	2.37	0.43	3.84
5.78	0.00	- 0.12	2.37	0.44	4.01
5.83	0.00	- 0.81	2.37	0.44	4.23
4.94	0.00	- 0.77	2.37	0.44	5.17
2.93	0.00	- 0.45	2.37	0.31	5.31
1.51	0.00	- 0.28	1.88	0.31	5.24
1.51	0.14	- 1.62	0.00	0.32	5.96
0.06	0.14	- 3.07	-0.19	0.32	4.83
- 0.58	0.14	- 4.90	-2.54	0.32	4.83
- 0.36	0.14	- 3.31	-3.01	0.02	4.80
- 1.01	0.14	- 2.31	-3.02	0.00	4.34
- 1.22	0.14	- 1.38	-3.02	0.03	3.34

Source: Price Statistics Monthly in Taipei City, R.O.C. (Department of Budget, Accounting and Statistics, Taipei City Government.)

臺北市工務統計月報

出　版　機　關 ： 臺北市政府工務局

地　　　　　址 ： 11008 臺北市信義區市府路1號4樓西南區

電　　　　　話 ： 1999(外縣市02-27208889)轉1404

網　　　　　址 ： https://pwd.gov.taipei

發　　行　　人 ： 林志峯

編　　　　　輯 ： 臺北市政府工務局統計室

出　版　年　月 ： 中華民國 109年9月

創　刊　年　月 ： 中華民國 73年 1月

刊　期　頻　率 ： 月刊

THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN OF PUBLIC WORKS

Published by the Public Works Department, Taipei City Goverment

Address: Southwest Wing, 4F., No.1, City Hall Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11008, Taiwan (R.O.C.)

Telephone No: Please dial the 1999 Citizen Hotline (02-2720-8889 outside Taipei City) ext. 1404

Publisher: Chih-Feng LIN

Edited by the Statistics Office of PWD, TCG

Website: https://pwd.gov.taipei

Publishing Date: September 2020

First Edition: January 1984
