中華民國 114 年 1 月 January 2025

臺北市工務統計月報

THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN OF PUBLIC WORKS

臺北市政府工務局 編製
中華民國 114 年 2 月
Public Works Department, Taipei City Government February 2025

臺北市政府工務局業務職掌

工務局

土木建築科	本市道路橋梁及相關設施等工程規劃業務，綜合企劃及工程相關法規之制（訂）定、修正，道路、橋梁、隧道與公共建築等相關工程之監辦及督導考核。
水利科	辦理本局災害防救綜合業務、水利工程處與衛生下水道工程處之查核金額以上工程之監辦作業及所轄廠站營運督導管理作業、主管下水道及纜線附掛法規修訂與核釋、專案執行及交辦事項等綜合業務及其他有關事項。
公園大地科	公園、路燈與山坡地水土保持等相關工程業務之規劃及督導，本市舉辦公共工程拆遷補償相關法規之制（訂）定、修正等業務。
採購管理科	有關本府採購法規及採購契約、投標須知等招標文件範本之訂定、修訂、疑義釋示、諮詢及契約協助審查與教育訓練，本府採購稽核之事務及廠商檢舉、民意關切及媒體報導等採購案之處理，本府各一級機關查核金額以上採購案之監辦業務，本府各機關採購內部控制之稽查作業，本府公共工程督導會報之採購稽核幕僚業務，本府工程專家諮詢服務團業務。
品管及職安科	辦理本府公共工程施工之查核、本局工程材料試驗及其他有關事項。
道路挖掘管理中心	辦理本市道路挖掘暨路面修復工程之規劃、設計與施工管理、管線機關（構）管線與附屬設施物之施工管理，管線圖資資料庫建置更新管理維護業務及臺北市道路基金統籌運用辦理路面修復相關工程規劃等事項。
聯合採購發包中心	代辦公共工程、勞務、財物採購之招標、決標程序與採購之研議、核准、監辦、督導、諮詢等事項及本府各機關採購人員之採購專業實習訓練。
資訊室	研擬年度資訊推展計畫、資訊管理、電腦設備購置、電腦軟硬體維護、電腦教育訓練、本局所屬處資訊設施維護管理之督導、本局所屬各處資訊業務之督導及其他有關事項。
秘書室	辦理研考、文書、事務、出納及其他有關事項。
會計室	辦理本局及督導所屬工程處預算、會計業務。
統計室	依法辦理統計及其他有關事項。
人事室	辦理人員任免遷調、考核獎懲、差勤管理、員工訓練、待遇福利、退休撫卹及其他有關事項。
政風室	負責政風法令之擬訂、政風法令之宣導、員工貪瀆不法之預防、發掘及處理檢舉事項、政風興革建議、政風考核獎懲建議、公務機密維護及其他有關政風事項。
新建工程處	辦理新建道路及道路養護、橋梁、廣場及市有建築物工程之規劃、勘測、設計、施工及研究規劃設計、改善等工作。
水利工程處	全市河川及雨水下水道、抽水站等公共設施之興建、管理與維護，包括所有河濱高灘地（河濱公園）之管理。
公園路燈工程管理處	掌理臺北市公園、綠地、廣場、行道樹、遊樂設施及路燈等之規劃、設計施工與管理維護，以及花木培植事宜。
衛生下水道工程處	掌理大臺北地區污水下水道之規劃、設計、施工、維護、營運管理及污水處理廠設施之操作、管理、水質檢驗、分析等事項。
大地工程處	本市山坡地安全管理及災害復舊，產業道路與登山步道闢建維護，森林與保安林調查開發利用，山坡地野溪、山溝、土石流潛勢溪流治理規劃，農村新風貌調查規劃，山坡地開發利用與違法之取締。

Duties of the Public Works Department, Taipei City Government

Public Woks Department

Civil Engineering Division	Combining the formulation and writing of planning- and engineering-related codes; the initiation, supervision and quality review of construction of roads, bridges, tunnels, and public buildings.
Hydraulicus Division	Supervising construction and disaster relief/emergency repair of: river engineering, river management, rainwater drainage and sewage drainage.
Parks and Geotechnical Division	Supervision of engineering related to parks and streetlights, management affairs of slopeland; demolition, relocation and resettlement of legally registered buildings and related compensation evaluation affairs.
Procurement Administration Division	The formation, supervision and verification of laws regarding City Government purchasing.
Quality Control and Labor Safety Division	Handles the testing, analysis, assessment of construction materials and project quality control affairs; the administration and implementation of occupational safety and health.
Road Excavation Administration Center	In charge of the planning, design and construction management of the City's road excavation and road rehabilitation projects, construction management of pipelines and ancillary facilities of pipeline agencies (authorities), pipelines and ancillary facilities, setup, update, management and maintenance of the pipeline drawing database, and overall planning of road rehabilitation projects under the Taipei City Road Fund.
Unified Bidding Center	In charge of the agency services for public works, labor services, tender for property procurement, contract awarding procedure, and research, approval, supervision, guidance and consultation about procurement, and professional practice training of procurement personnel of the Government's agencies in procurement affairs.
Systems Administration Office	Handles the overall planning, development, coordination, promotion, management, maintenance, training, and supervision of the public works information system.
Administrative Services Office	Handles the documentation, archiving, cashier, general affairs, and research and evaluation affairs, as well as affairs that do not belong to other divisions or offices.
Accounting Office	Handles annual bookkeeping and accounting affairs.
Statistics Office	Handles statistical affairs.
Personnel Office	Handles human resource affairs.
Government Ethics Office	Handles ethics related affairs.
New Construction Office	Manage planning, surveying, designing, engineering, and improving of new roads, bridges, plazas and city buildings, as well as maintaining existing roads.
Hydraulic Engineering Office	Construction, management and maintenance of all rivers, rainwater drainage, water pumps, and other water-related public structures, including all river flood banks (riverside parks).
Parks and Street Lights Office	Handles the planning, design, construction, management and maintenance of Taipei City parks, grassy areas, plazas, sidewalks trees, playgrounds, street lamps and plantings.
Sewerage Systems Office	Handles the planning, design, construction, maintenance and management of wastewater drainage in the greater Taipei area.
Geotechnical Engineering Office	The City's hillside safety management and disaster reaction, industrial path and hiking path construction and maintenance, forest and protection forest investigation development and use, Hill land valley, gully, mudslides potential, and valley administration and planning. Countryside new style investigation planning, hillside development and banning illegal development.

目　次

CONTENTS

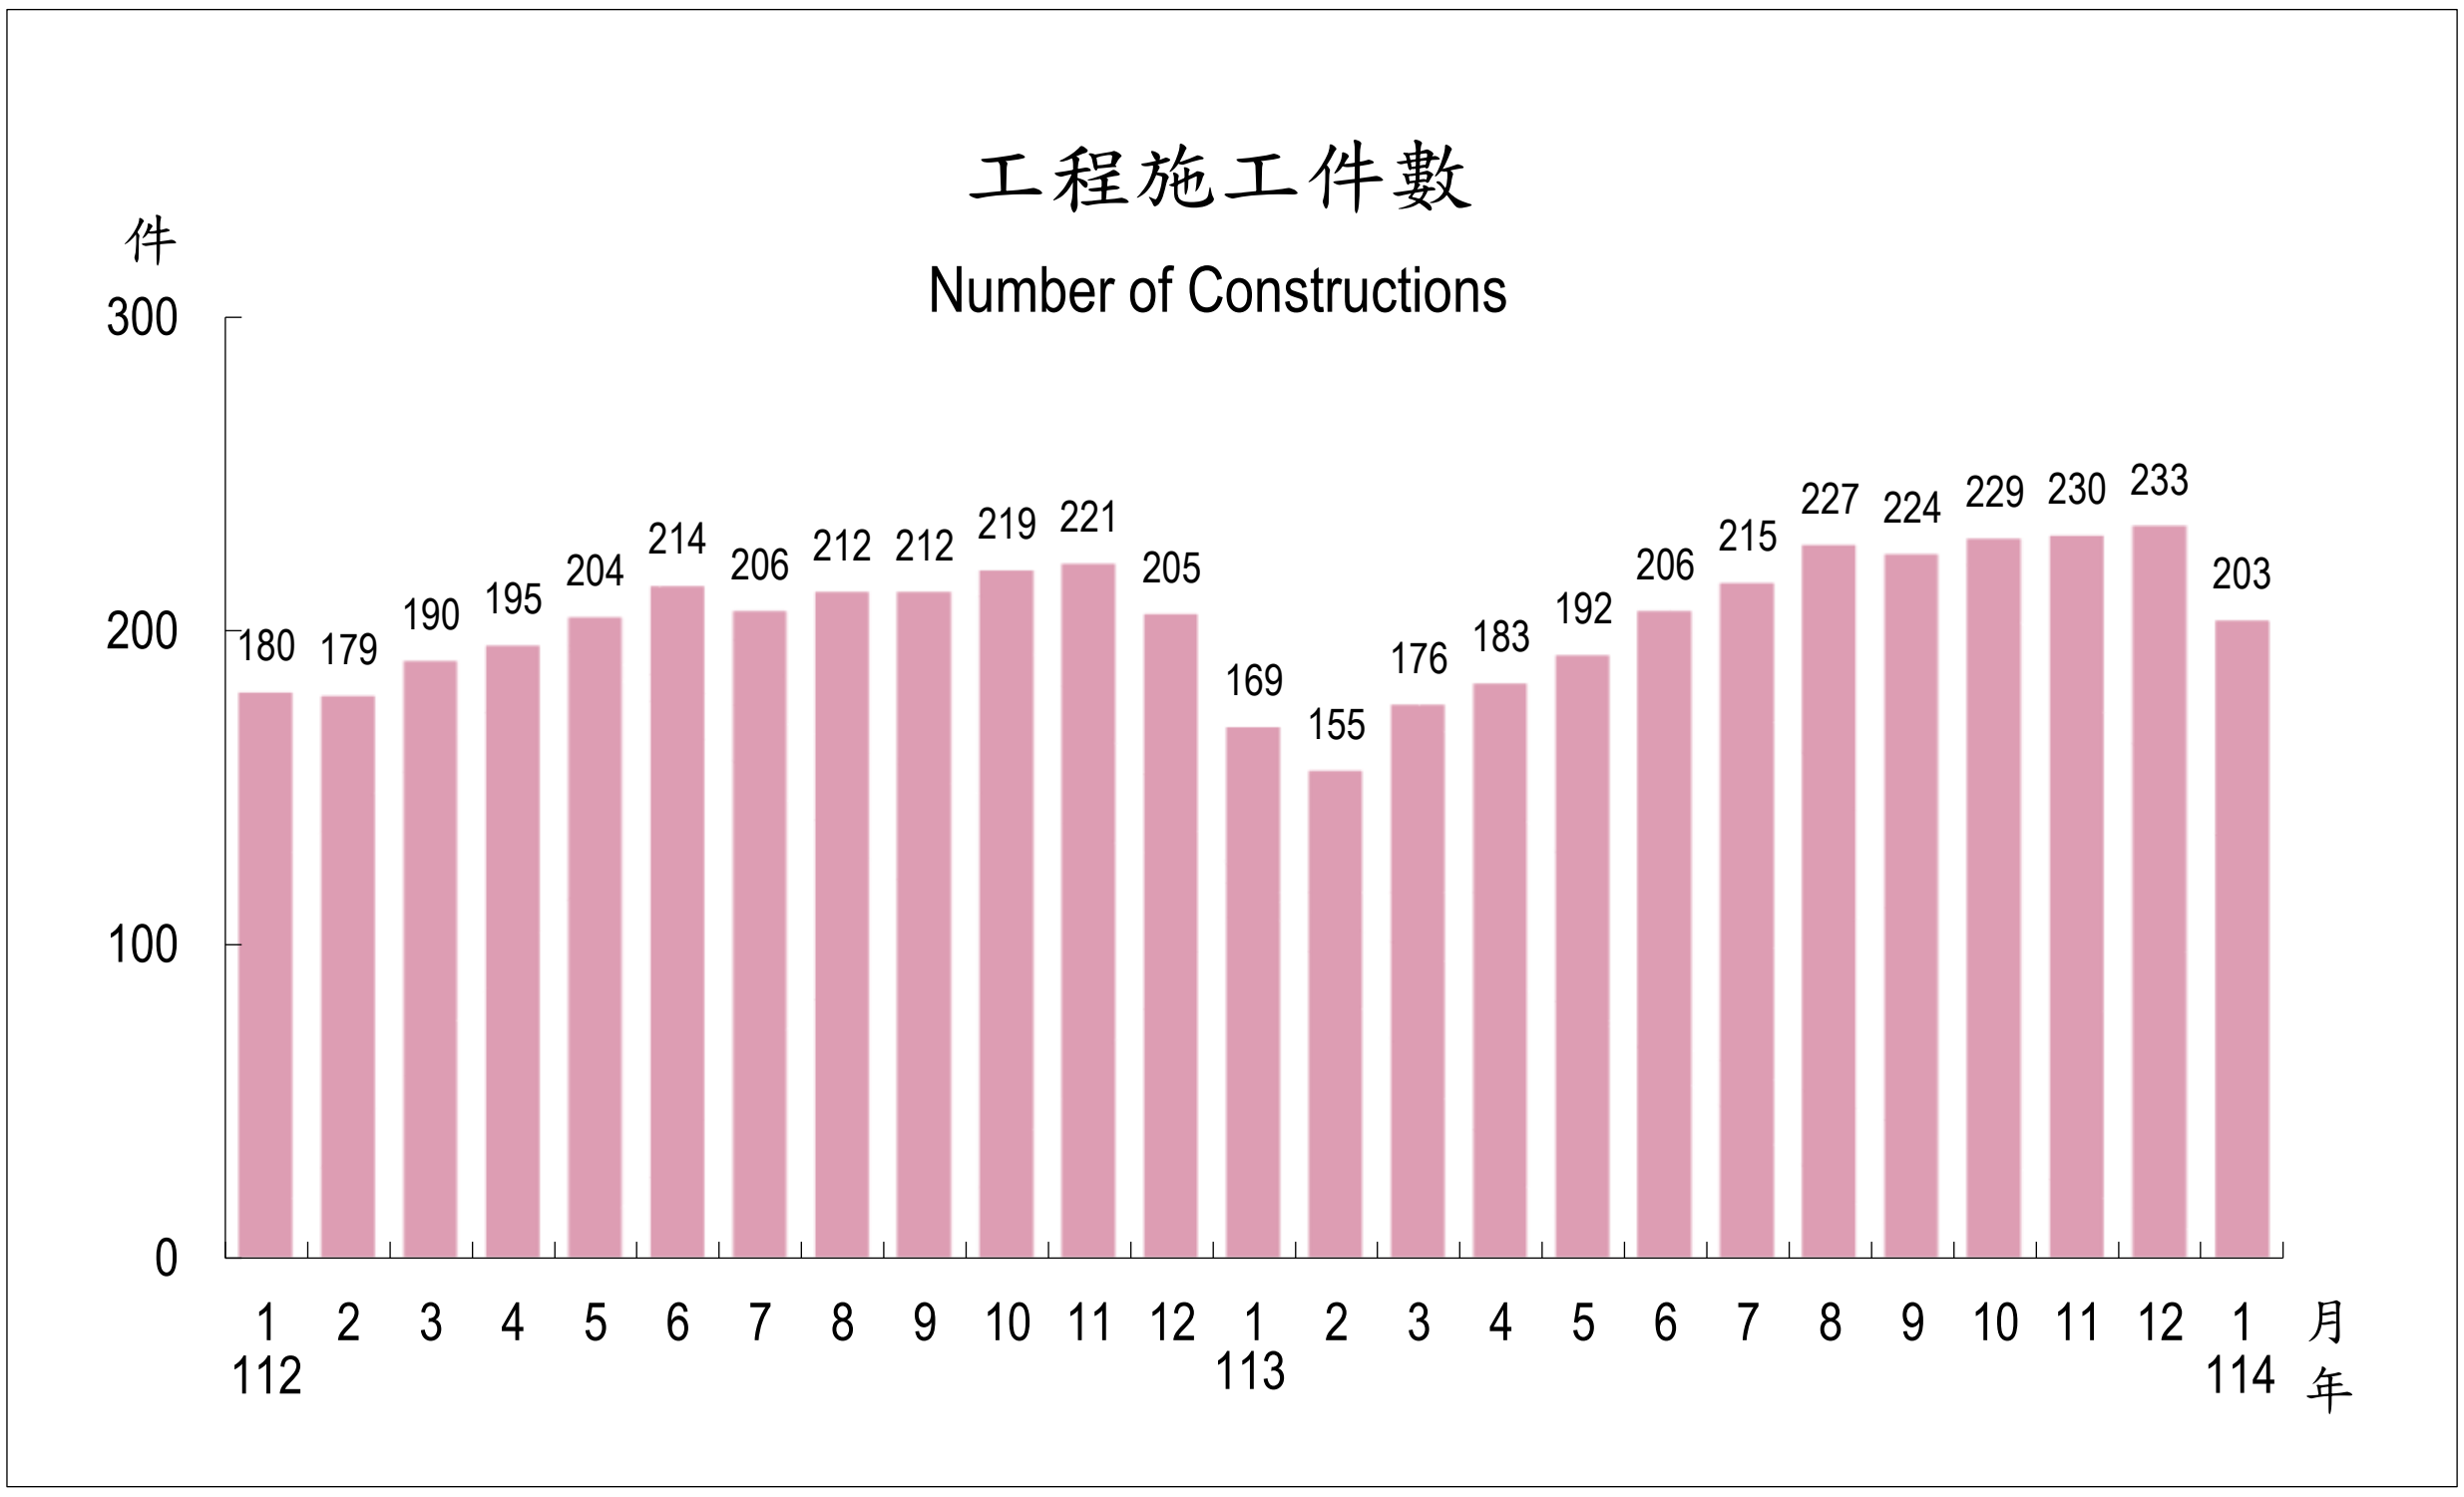
工程施工件數
Number of Constructions
件
300
200
100
0
180
179
190
195
204
214
206
212
212
219
221
205
169
155
176
183
192
206
215
227
224
229
230
233
203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
112
113
114
月
年

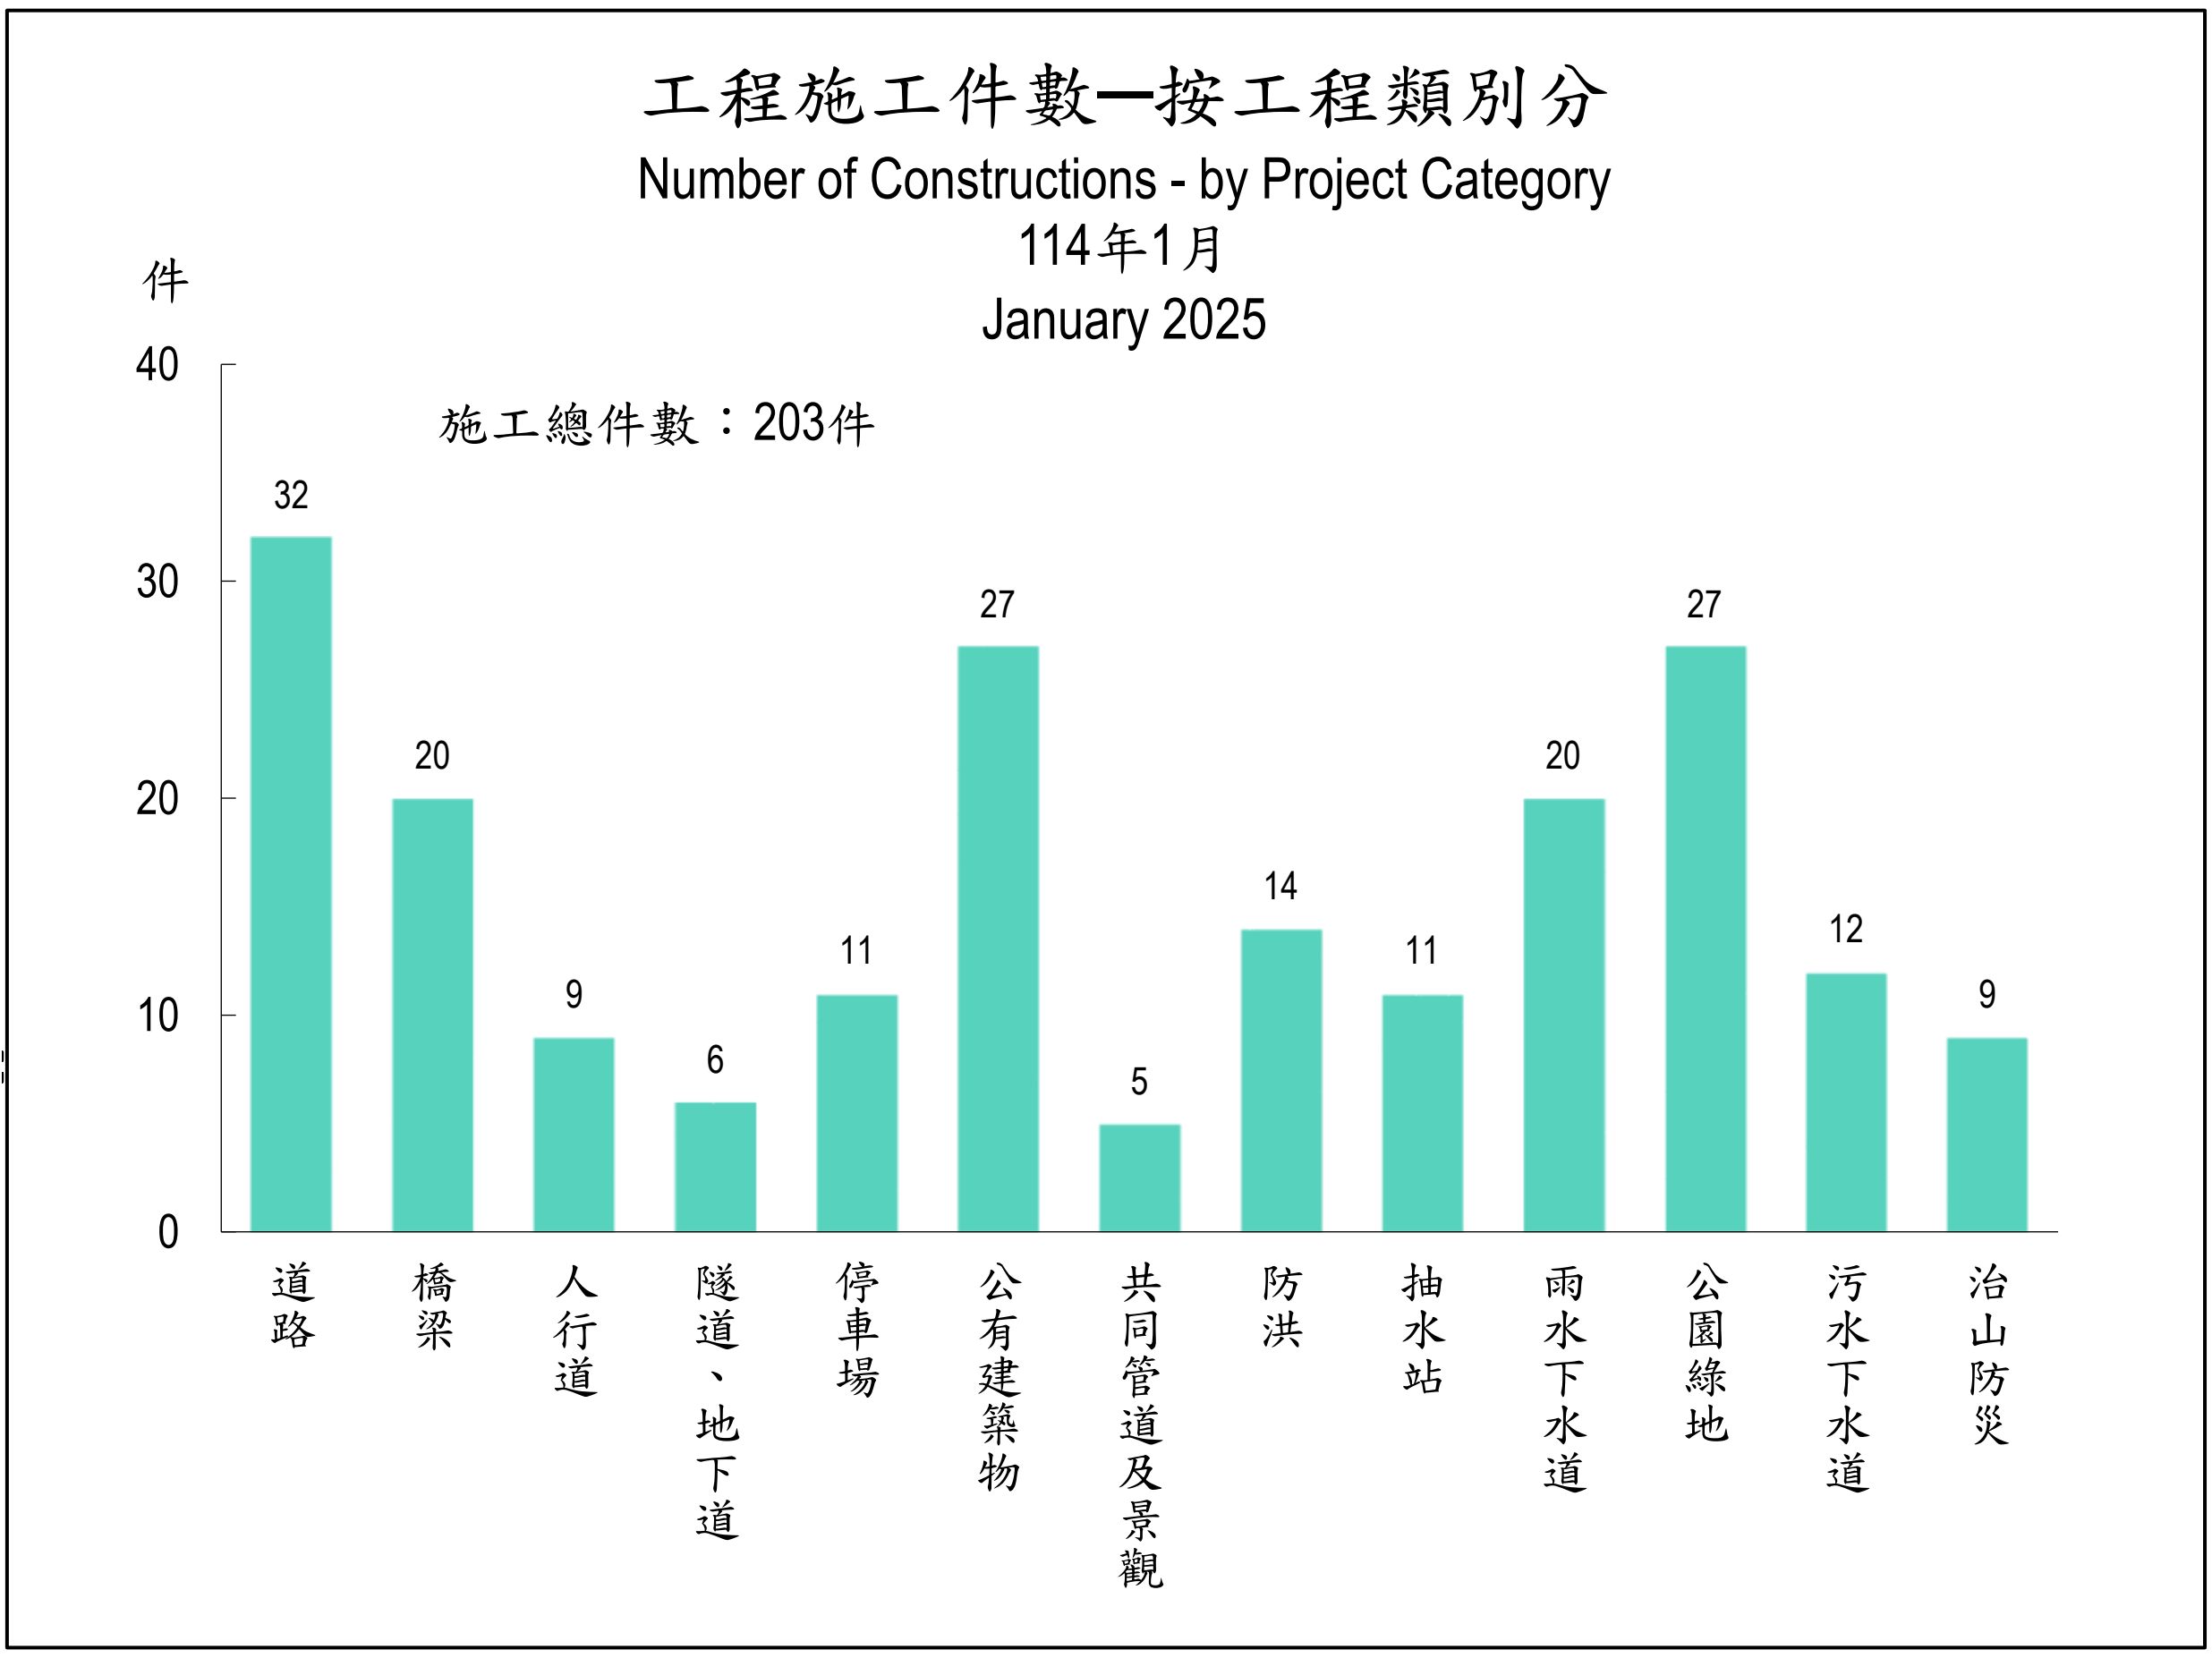
工程施工件數—按工程類別分
Number of Constructions - by Project Category
114年1月
January 2025
件
40
30
20
10
0
施工總件數：203件
32
20
9
6
11
27
5
14
11
20
27
12
9
道路
橋梁
人行道
隧道、地下道
停車場
公有建築物
共同管道及景觀
防洪
抽水站
雨水下水道
公園綠地
污水下水道
治山防災

工程施工件數—按工程處分

Number of Constructions - by Office

114年1月

January 2025

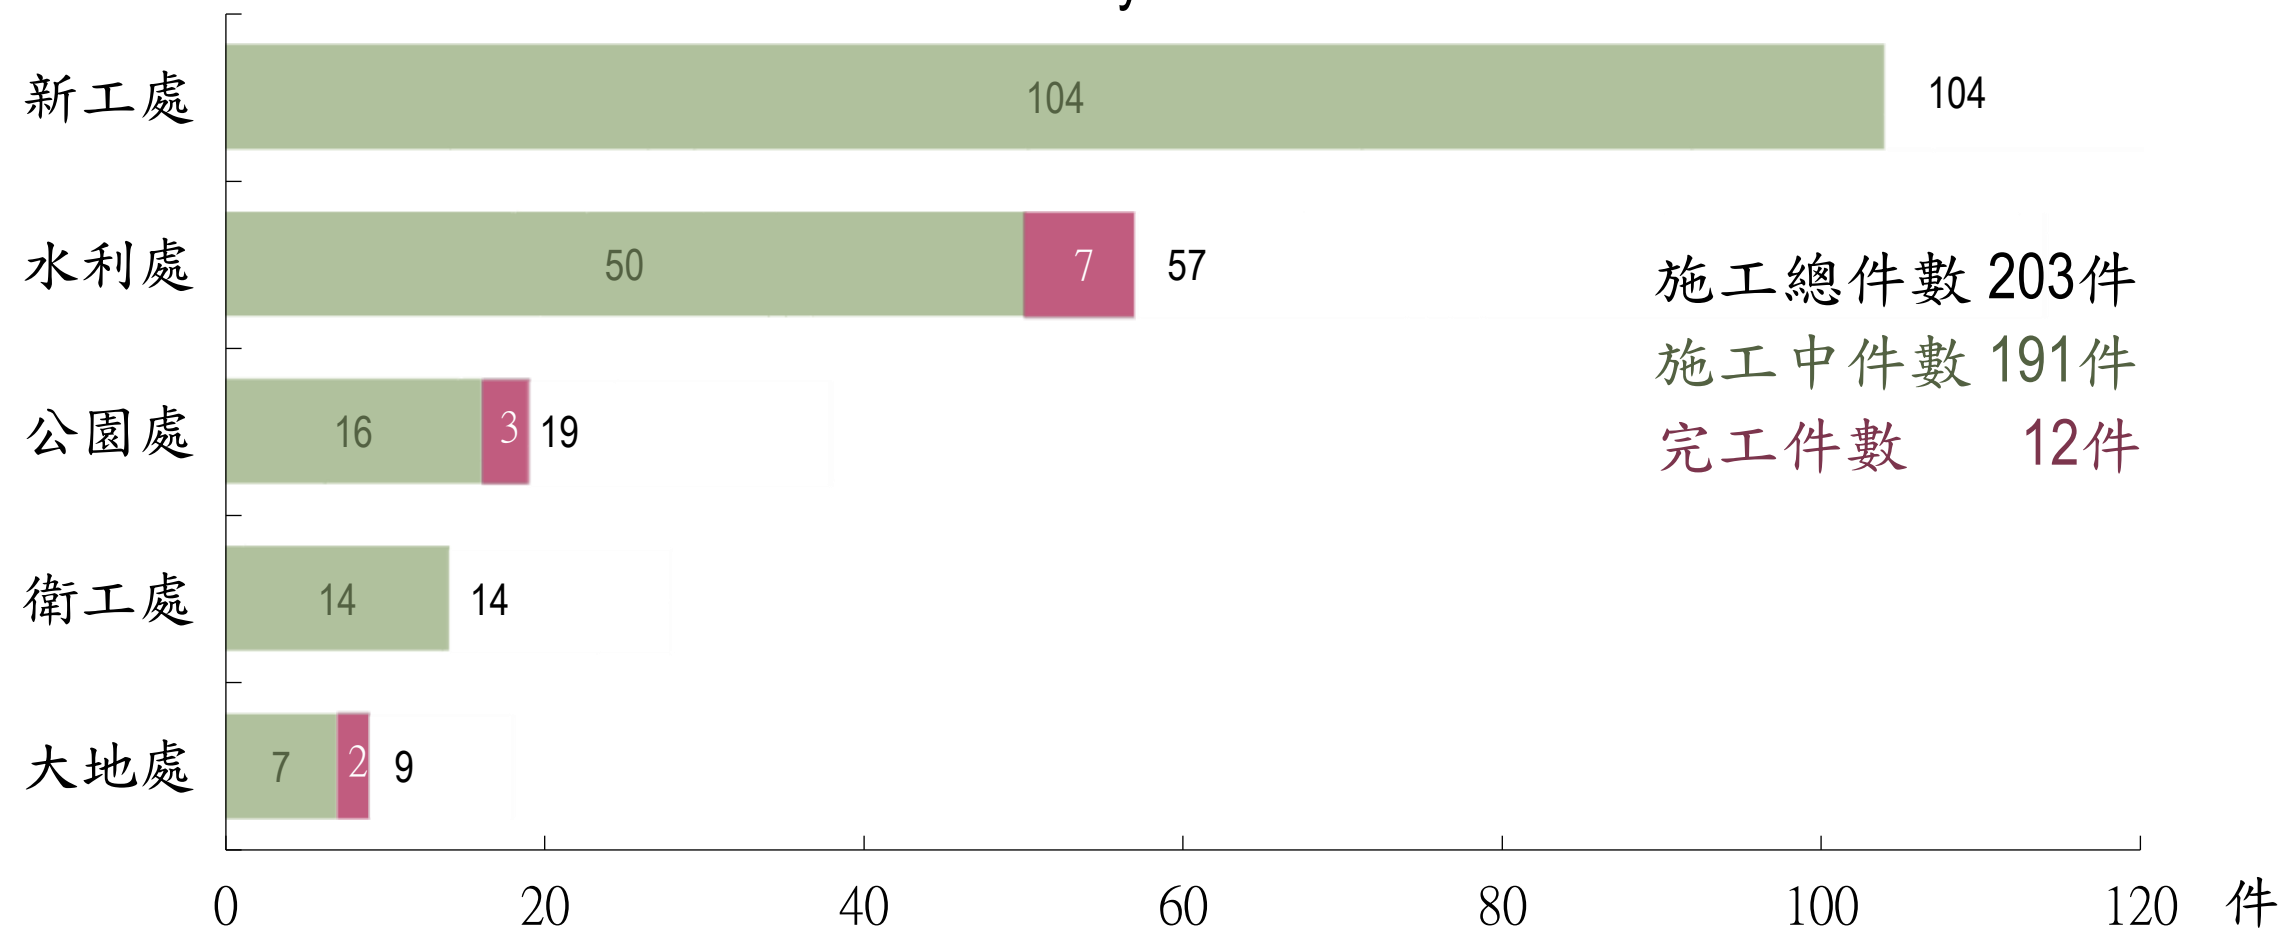

路燈數量

Number of Street Lights

114年1月底

End of January 2025

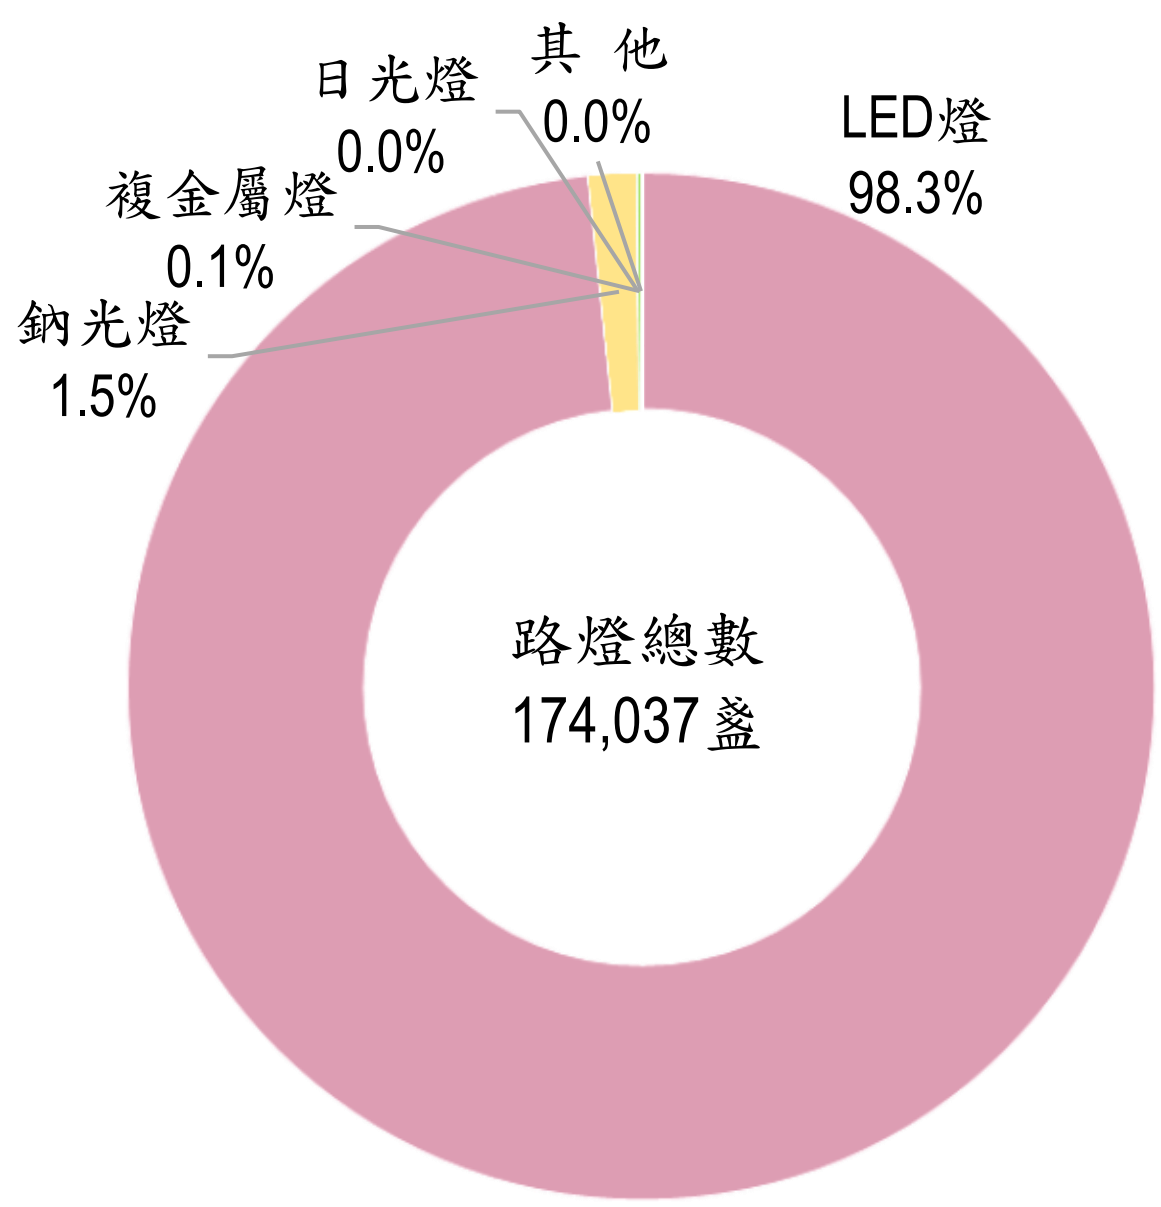

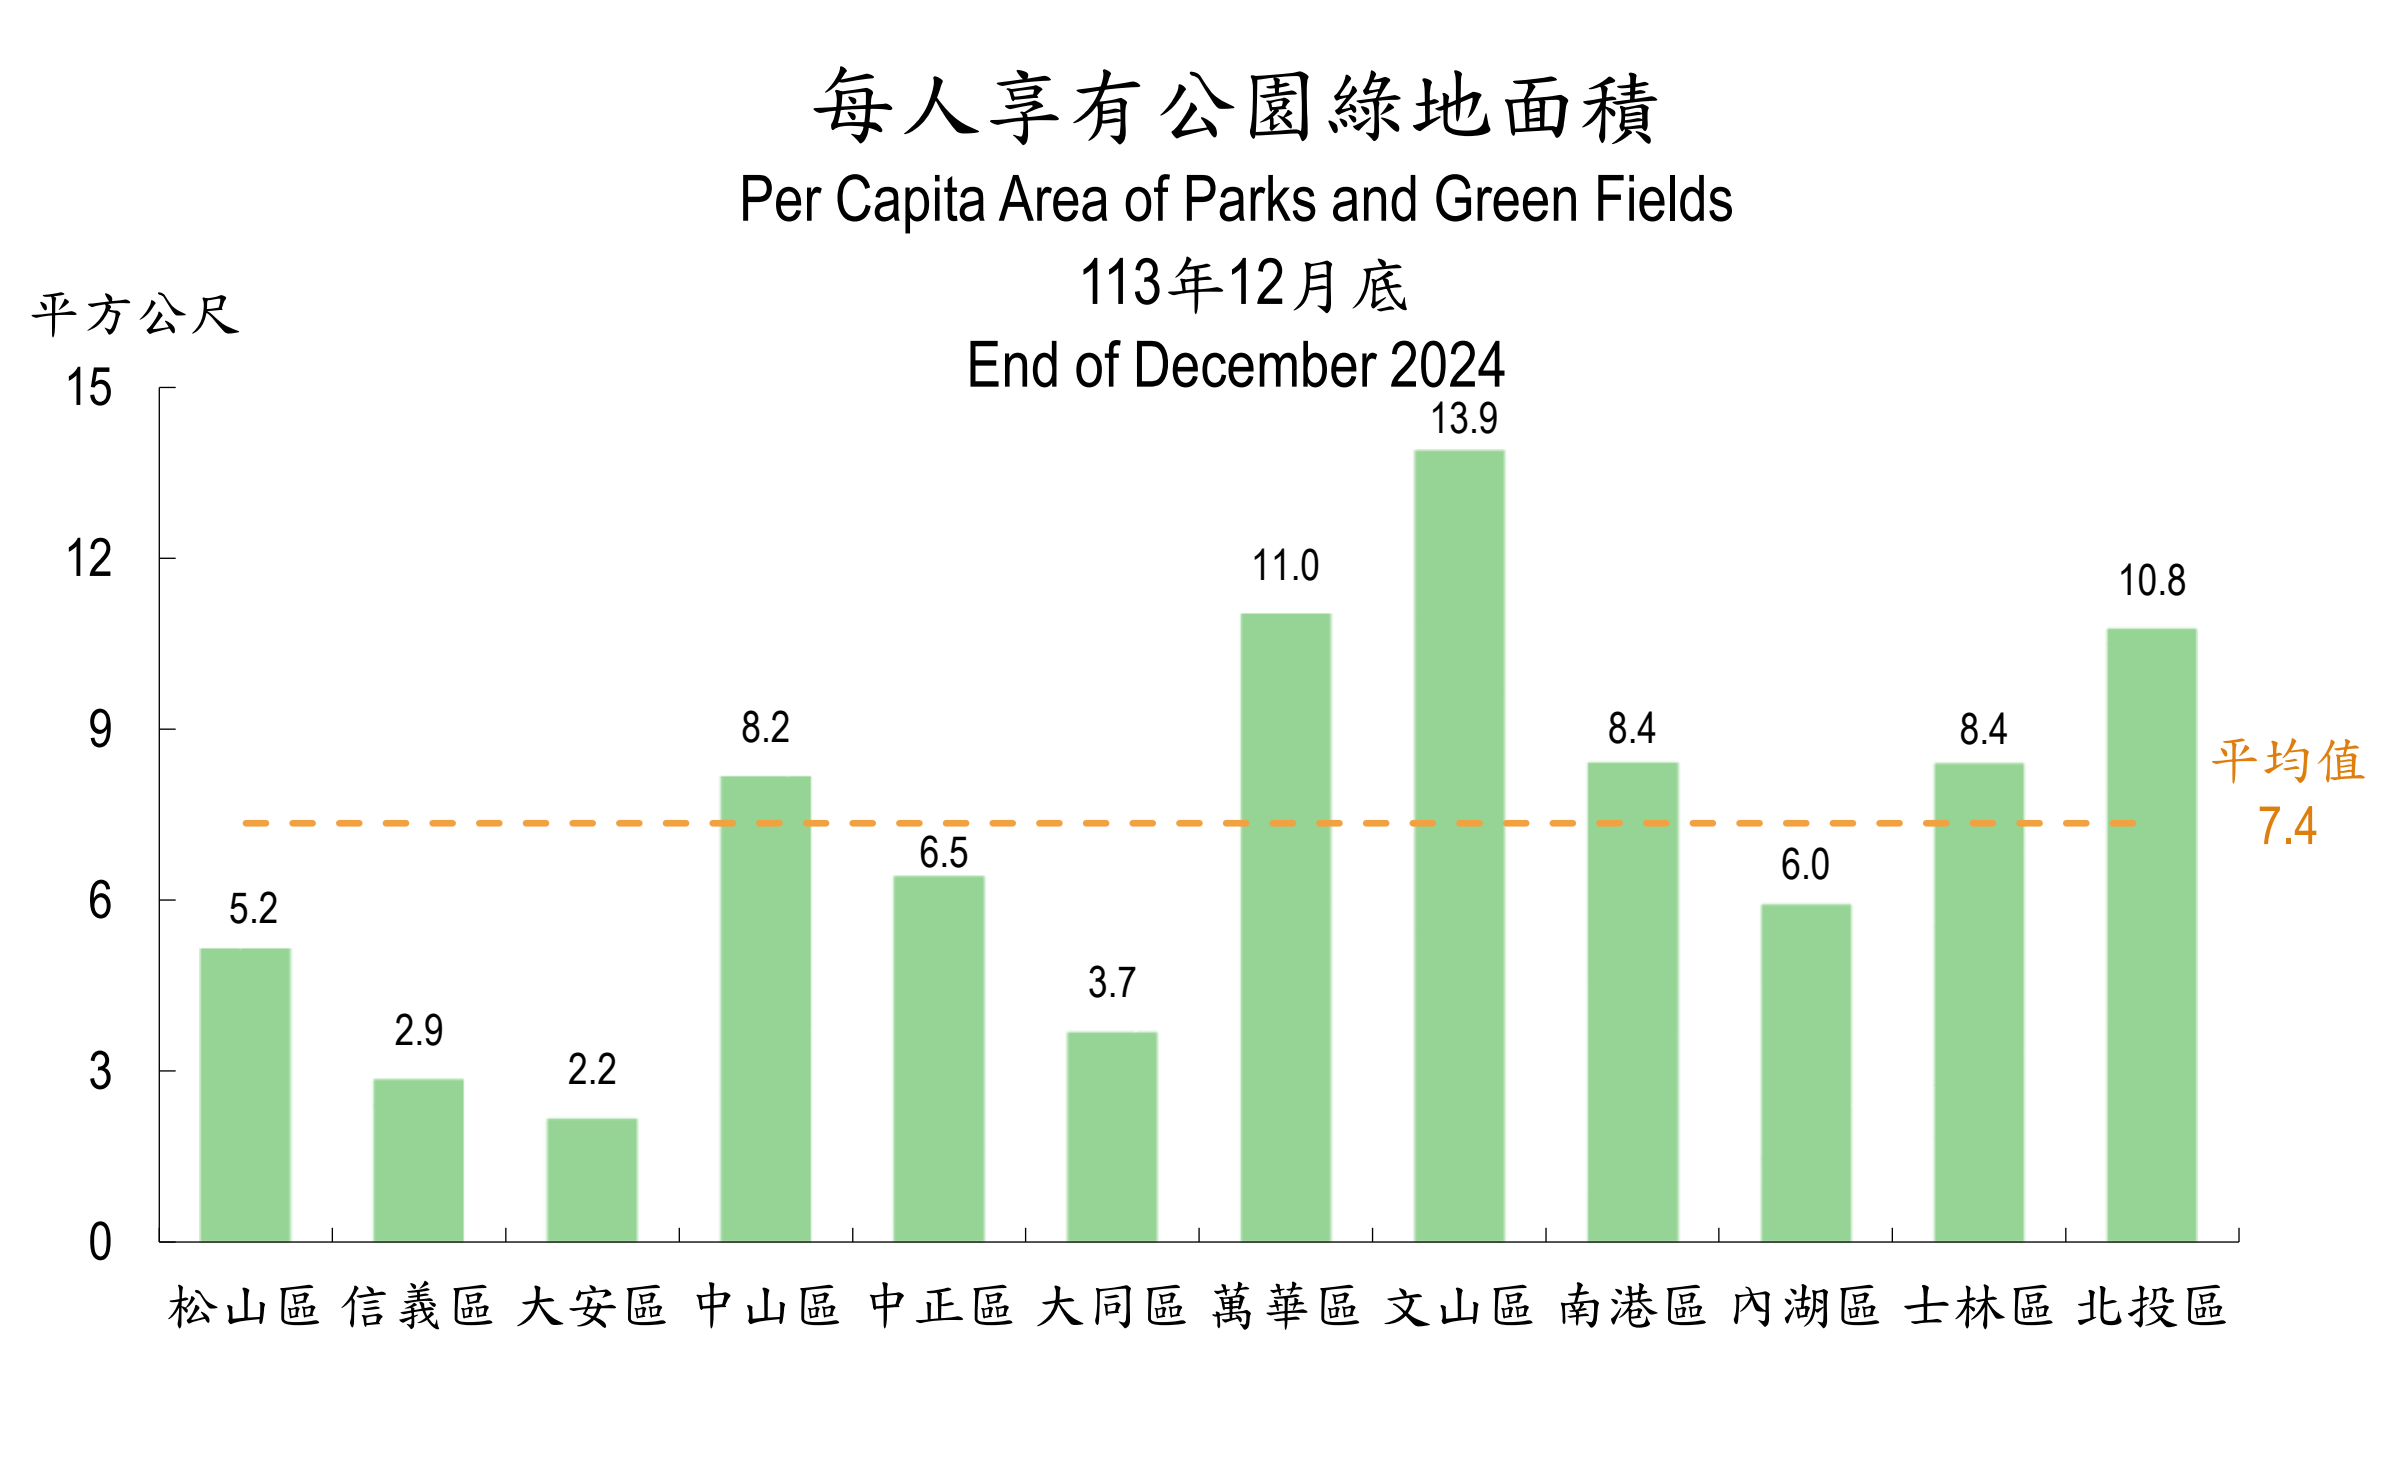
每人享有公園綠地面積
Per Capita Area of Parks and Green Fields
113年12月底
End of December 2024
平方公尺
15
12
9
6
3
0
5.2
2.9
2.2
8.2
6.5
3.7
11.0
13.9
8.4
6.0
8.4
10.8
平均值
7.4
松山區 信義區 大安區 中山區 中正區 大同區 萬華區 文山區 南港區 內湖區 士林區 北投區

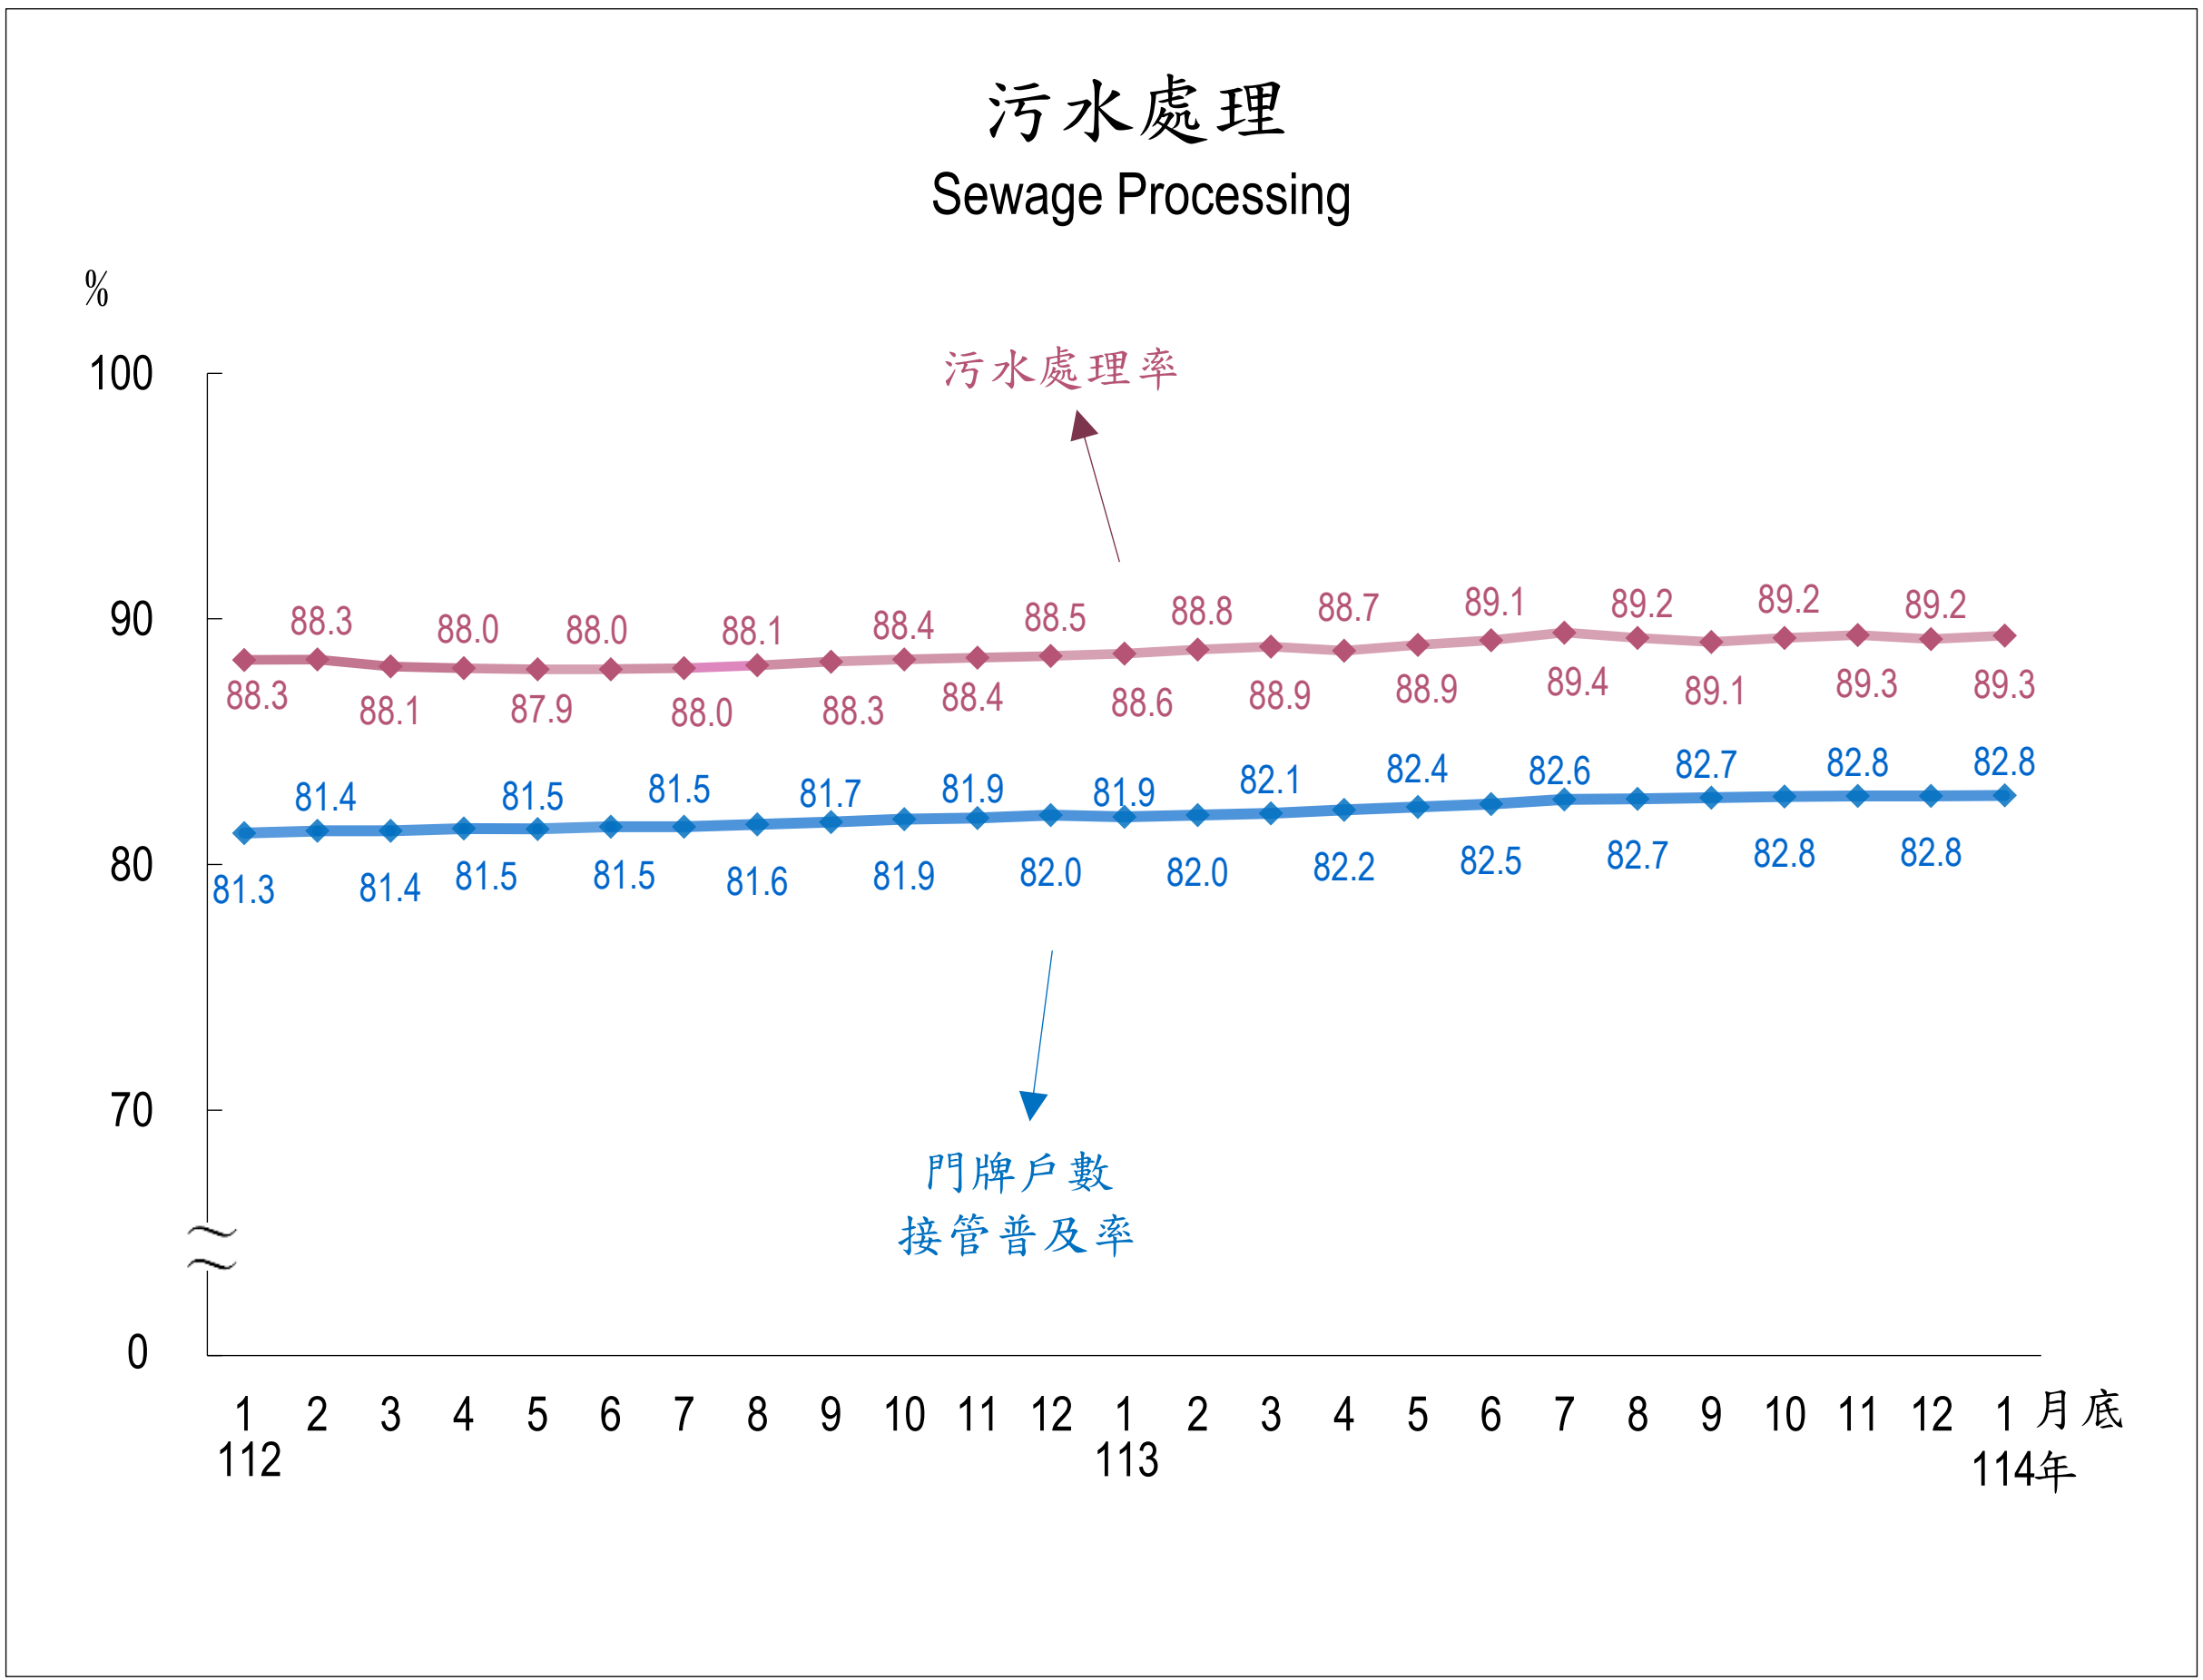
污水處理
Sewage Processing
%
100
90
80
70
0
污水處理率
88.3 88.3 88.1 88.0 87.9 88.0 88.0 88.1 88.3 88.4 88.4 88.5 88.6 88.8 88.9 88.7 88.9 89.1 89.4 89.2 89.1 89.2 89.3 89.2 89.3
81.3 81.4 81.4 81.5 81.5 81.5 81.5 81.6 81.7 81.9 81.9 82.0 81.9 82.0 82.1 82.2 82.4 82.5 82.6 82.7 82.7 82.8 82.8 82.8 82.8
門牌戶數
接管普及率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 月底
112
113
114年

施工工程摘要

114年1月

Summary in January 2025

單位：件 unit: case

工程類別 Construction Category	總計 Total	完工 Completed 合計 Sub-total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	施工中 Under Construction 合計 Sub-total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	停工 Work Suspension	備註 Note
總計 Total	**203**	**12**	**1**	**10**	**1**	**191**	**60**	**87**	**44**	**-**	
百分比 %	**100.0**	**5.9**	**0.5**	**4.9**	**0.5**	**94.1**	**29.6**	**42.9**	**21.7**	**-**	
1. 道路新建、拓寬、改善 Road New Construction, Expansion and Improvement Works	**32**	-	-	-	-	32	1	24	7	-	詳表1
2. 橋梁新建、拓建、改善 Bridge New Construction, Expansion and Improvement Works	**20**	-	-	-	-	20	3	14	3	-	詳表2
3. 人行道改善工程 Sidewalk Improvement Work	**9**	-	-	-	-	9	-	9	-	-	詳表3
4. 隧道、地下道工程 Tunnel Constructions	**6**	-	-	-	-	6	1	2	3	-	詳表4
5. 停車場工程 Parking Lots Constructions	**11**	-	-	-	-	11	7	2	2	-	詳表5
6. 公有建築物工程 Public Building Constructions	**27**	-	-	-	-	27	12	5	10	-	詳表6
7. 共同管道及景觀工程 Communal Pipeline and Landscape Constructions	**5**	-	-	-	-	5	2	2	1	-	詳表7
8. 防洪工程 Flood Protection	**14**	3	-	2	1	11	2	4	5	-	詳表8
9. 抽水站新建、擴建 Rainwater Pump Station New Constructions and Expansion Works	**11**	-	-	-	-	11	5	5	1	-	詳表9
10. 雨水下水道新建、改善 Rainwater Drainage System New Construction and Improvement Works	**20**	4	-	4	-	16	5	7	4	-	詳表10
11. 公園綠地新建、改善 Park New Construction and Improvement Works	**27**	3	-	3	-	24	14	6	4	-	詳表11
12. 污水下水道新建、改善 Sewerage System New Construction and Improvement Works	**12**	-	-	-	-	12	1	7	4	-	詳表12
13. 治山防災整體治理工程 Watershed Management and Disaster Prevention	**9**	2	1	1	-	7	7	-	-	-	詳表13

資料來源：工務局。

Source: Public Works Department.

施工中工程

單位：件 Under Construction unit: case

年(月)別／機關別 Year (Month)／Sponsor		總計 Total	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay	停工 Work Suspension
民國113年	**2024**					
1月	Jan.	150	64	54	32	-
2月	Feb.	148	69	52	27	-
3月	Mar.	166	72	64	30	-
4月	Apr.	178	73	82	23	-
5月	May	187	73	88	26	-
6月	June	199	74	102	23	-
7月	July	213	91	99	23	-
8月	Agu.	219	84	110	25	-
9月	Sep.	222	92	105	25	-
10月	Oct.	224	89	104	31	-
11月	Nov.	228	79	118	31	-
12月	Dec.	201	64	85	52	-
民國114年	**2025**					
1月	**Jan.**	**191**	**60**	**87**	**44**	**-**
新建工程處 New Construction Office		104	24	57	23	-
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		50	15	21	14	-
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office		16	12	2	2	-
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		14	2	7	5	-
大地工程處 Geotechnical Engineering Office		7	7	-	-	-

資料來源：工務局。

Source: Public Works Department.

表1　道路新建、拓寬、改善工程

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**553,965**
新建工程處 New Construction Office	112-113	1. 112年度一般道路更新工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	21,045
	112-113	2. 112年度一般道路更新工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	21,884
	112-113	3. 112年度一般道路更新工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	34,744
	112-113	4. 112年度一般道路更新工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	25,922
	112-113	5. 112年度一般道路更新工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	44,508
	112-113	6. 112年度一般道路更新工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	32,870
	112-113	7. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第1標)(中山、大同區)	7,455
	112-113	8. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)	7,099
	112-113	9. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)	7,695
	112-113	10. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)	6,460
	112-113	11. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)	6,841
	112-113	12. 112年度道路附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安、文山區)	5,953
	112-113	13. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第2標)(松山、信義區)(113年後續擴充)	14,000
	112-113	14. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第3標)(中正、萬華區)(113年後續擴充)	11,135

Table 1 Road New Construction, Expansion and Improvement Works

January 2025

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
1,587	**1-23**	**21,174**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1**	**24**	**7**
預約維護			112.03	114.03		98.31	98.31		∨	
預約維護			112.03	114.03		66.36	66.36		∨	
預約維護			112.03	114.03		92.32	92.32		∨	
預約維護			112.03	114.03		98.90	98.90		∨	
預約維護			112.03	114.03		86.00	86.00		∨	
預約維護			112.03	114.03		96.50	96.50		∨	
預約維護			112.03	114.03		90.50	90.50		∨	
預約維護			112.03	114.03		91.00	91.00		∨	
預約維護			112.04	114.03		75.88	75.88		∨	
預約維護			112.04	114.03		98.50	98.50		∨	
預約維護			112.04	114.03		71.19	71.19		∨	
預約維護			112.03	114.03		90.00	90.00		∨	
預約維護			112.03	114.03		98.76	98.76		∨	
預約維護			112.03	114.03		99.95	99.58			∨

表1　道路新建、拓寬、改善工程（續）

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
新建工程處 New Construction Office	112-113	15. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第4標)(內湖、南港區)(113年後續擴充)	12,318
	112-113	16. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第5標)(士林、北投區)(113年後續擴充)	9,485
	112-113	17. 112年度寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程開口契約(第6標)(大安區)(113年後續擴充)	9,550
	112-113	18. 112年度災害搶修暨災防工程開口契約(第1標)(士林、北投、中山、大同)	4,524
	112-113	19. 112年度災害搶修暨災防工程開口契約(第2標)(大安、文山、中正、萬華)	4,524
	112-113	20. 112年度災害搶修暨災防工程開口契約(第3標)(內湖、南港、松山、信義)	1,930
	113	21. 113年度專案路面及附屬設施更新工程(第1標)(中山、大同區)	8,568
	113	22. 113年度專案路面及附屬設施更新工程(第2標)(松山、信義區)	9,775
	113	23. 113年度專案路面及附屬設施更新工程(第4標)(內湖、南港區)	6,719
	113	24. 113年度專案路面及附屬設施更新工程(第5標)(士林、北投區)	9,309
	113	25. 113年度專案路面及附屬設施更新工程(第6標)(大安、文山區)	8,164
	110-113	26. 國家生技研究園區聯外道路工程	165,015
	112-113	27. 洲美街人行道拓寬工程	7,423
	112-113	28. 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第1標)	13,640
	112-113	29. 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)	13,640
	113	30. 113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第1標)	7,257
	113	31. 113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)	7,257
	113	32. 113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第3標)	7,257
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處。

Table 1 Road New Construction, Expansion and Improvement Works (Cont.)

January 2025

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
預約維護			112.03	114.03		97.18	97.18		V	
預約維護			112.03	114.03		99.98	99.98		V	
預約維護			112.03	114.03		98.38	98.38		V	
預約維護			112.04	114.03		95.60	95.60		V	
預約維護			112.06	114.03		60.00	60.00		V	
預約維護			112.04	114.03		83.17	83.17		V	
預約維護			113.05	113.12		100.00	55.20			V
預約維護			113.04	114.01		100.00	40.51			V
預約維護			113.05	113.11		100.00	94.31			V
預約維護			113.05	113.10		100.00	56.43			V
預約維護			113.05	114.01		100.00	46.00			V
1,260	5-23	18,925	111.02	114.09		36.20	47.90	V		
預約維護			112.02	114.01		100.00	80.00			V
196	2-8	1,476	112.05	114.08		39.50	39.50		V	
131	1-9	773	112.04	114.02		20.77	20.77		V	
預約維護			113.10	114.03		0.00	0.00		V	
預約維護			113.11	114.12		0.00	0.00		V	
預約維護			113.09	114.03		15.00	15.00		V	

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

表2　橋梁新建、拓建、改善工程

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　　計	**470,556**
新建工程處 New Construction Office	105-111	1. 中正橋改建工程及代辦管線附掛工程	259,473
	110-112	2. 民權大橋跨河段上部結構改建統包工程	142,728
	111-113	3. 跨越大坑溪自行車道新建工程	10,404
	112	4. 112年臺北市道路橋梁隔音牆預約增設及改善工程	2,533
	112	5. 112年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第1標)(士林、北投、中山、大同)	8,000
	112	6. 112年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第2標)(內湖、南港、松山、信義)	8,000
	112	7. 112年度全市橋涵美化及鋼構油漆維護工程開口契約(第3標)(中正、萬華、大安、文山)	8,000
	112-113	8. 112年度全市橋涵維護工程開口契約(第1標)(士林、北投、中山、大同區)	4,950
	112	9. 112年度全市橋涵維護工程開口契約(第3標)(中正、萬華、大安、文山區)	4,500
	112-113	10. 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第1標)	①-
	112-113	11. 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)	①-
	113	12. 113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第1標)	①-
	113	13. 113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第2標)	①-
	113	14. 113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程開口契約(第3標)	①-
	112	15. 辛亥高架橋耐震補強改善工程	2,648
	113	16. 舊環南高架(河濱一商場)耐震補強改善工程(修正後)	7,722
	113	17. 福國路連接洲美快速道路匝道增設隔音牆工程	6,868
	113	18. 113年度全市隧道油漆美化及橋涵維護工程開口契約(南區)	②-
	113	19. 113年度全市隧道油漆美化及橋涵維護工程開口契約(東區)	②-
	109	20. 建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬工程	4,731
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

　　　②本項工程工程費包含於隧道工程內。

Table 2 Bridge New Construction, Expansion and Improvement Works

January 2025

工程內容 Construction Project						工期 Project Period			施工進度 Progress				
主橋 Main Span			引道 Lead Road			開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled	實際 Actual	超前 Lead	符合 Accord	落後 Delay
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (㎡)	長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	面積 Area (平方公尺) (㎡)				(%)	(%)	(件) (case)	(件) (case)	(件) (case)
705	**5-35**	**17,601**	**543**	**4-35**	**10,842**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3**	**14**	**3**
190	35	6,726	398	6-35	10,197	108.05	114.11		90.80	92.57	∨		
460	23	10,626	-	-	-	110.11	114.07		61.42	61.44	∨		
55	5	249	87	5	399	112.10	114.04		77.40	80.24	∨		
-	-	-	-	-	-	112.04	113.12		100.00	84.03			∨
-	-	-	-	-	-	112.04	114.12		67.50	67.50		∨	
-	-	-	-	-	-	112.05	114.03		44.40	44.40		∨	
-	-	-	-	-	-	112.04	114.03		95.45	95.45		∨	
-	-	-	-	-	-	112.04	114.03		82.00	82.00		∨	
-	-	-	-	-	-	112.04	114.03		93.00	93.00		∨	
-	-	-	-	-	-	112.05	114.08		39.50	39.50		∨	
-	-	-	-	-	-	112.04	113.12		100.00	20.77			∨
-	-	-	-	-	-	113.10	114.03		0.00	0.00		∨	
-	-	-	-	-	-	113.11	114.12		0.00	0.00		∨	
-	-	-	-	-	-	113.09	114.03		15.00	15.00		∨	
-	-	-	-	-	-	112.11	113.08		100.00	66.00			∨
-	-	-	-	-	-	113.02	114.12		27.56	27.56		∨	
-	-	-	-	-	-	113.05	114.03		29.50	29.50		∨	
-	-	-	-	-	-	113.05	114.03		2.00	2.00		∨	
-	-	-	-	-	-	113.06	114.03		28.00	28.00		∨	
-	-	-	58	4	247	113.08	114.05		7.10	7.10		∨	

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the road project expenditure.

②The Construction Expense is included in the tunnel project expenditure.

表3　人行道改善工程

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**94,244**
新建工程處 New Construction Office	112-113	1. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第一標)	9,870
	112-113	2. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第二標)	12,893
	112-113	3. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第三標)	14,370
	112-113	4. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第四標)	14,876
	112-113	5. 112年度臺北市人行道改善工程開口契約(第五標)	13,919
	113	6. 113年度臺北市人行道改善工程開口契約(第六標)	8,000
	113	7. 113年度臺北市人行道改善工程開口契約(第七標)	7,500
	113	8. 大安區師大路(自羅斯福路三段至和平東路一段)人行環境改善工程	3,653
	113	9. 臺北市信義區松隆路人行環境改善工程	9,163
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處。

Table 3 Sidewalk Improvement Work

January 2025

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**-**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-**	**9**	**-**
預約維護			112.03	114.03		74.20	74.20		∨	
預約維護			112.03	114.03		88.00	88.00		∨	
預約維護			112.04	114.03		68.56	68.56		∨	
預約維護			112.03	114.03		88.50	88.50		∨	
預約維護			112.04	114.03		72.00	72.00		∨	
預約維護			113.06	114.03		6.00	6.00		∨	
預約維護			113.09	114.08		23.50	23.50		∨	
預約維護			113.09	114.04		26.54	26.54		∨	
預約維護			113.12	114.10		0.00	0.00		∨	

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

表4　隧道、地下道工程

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**11,561**
新建工程處 New Construction Office	110-113	1. 國家生技研究園區聯外道路工程	①-
	113	2. 113年度全市隧道油漆美化及橋涵維護工程開口契約(南區)	2,400
	113	3. 113年度全市隧道油漆美化及橋涵維護工程開口契約(東區)	3,660
	113	4. 113年度臺北市車人行地下道及隧道既有機電設備老化修繕、更新工程	1,991
	112	5. 「忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程」零星標工程	1,724
	108-111	6. 常德街人行地下道連通工程美化改善零星工程	1,786

資料來源：新建工程處。

表5　停車場工程

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**-**
新建工程處 New Construction Office	107-112	1. 臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	①-
	104-110	2. 成功市場改建工程(地下停車場)	①-
	106-113	3. 第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程(停車場)	①-
	109-112	4. 臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程	①-
	107-112	5. 臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程	①-
	111-115	6. 臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程	①-
	111-114	7. 臺北市立和平高級中學教學大樓新建工程	①-
	112-114	8. 臺北市立大安高級工業職業學校新建綜合教學大樓工程	①-
	109-114	9. 臺北市立南港高級中學綜合教學大樓新建工程	①-
	113	10. 臺北市文山區力行國民小學活動中心新建工程	①-
	112-115	11. 臺北市松山區西松國民小學學生活動中心新建工程	①-

資料來源：新建工程處。

附註：①本項工程工程費包含於公有建築或道路工程內。

Table 4 Tunnel Constructions

January 2025

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
長度 Length (公尺) (m)	寬度 Width (公尺) (m)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
716	**15**	**10,740**	--	--	--	--	--	**1**	**2**	**3**
716	15	10,740	111.02	114.03		36.20	47.90	∨		
-	-	-	113.05	114.03		2.00	2.00		∨	
-	-	-	113.06	114.03		28.00	28.00		∨	
-	-	-	113.05	113.10		100.00	1.60			∨
-	-	-	113.06	114.01		100.00	62.30			∨
-	-	-	113.10	114.01		100.00	30.00			∨

Source: New Construction Office.

Table 5 Parking Lots Constructions

January 2025

工程內容 Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
總面積 Area (平方公尺) (㎡)	大型車停車位 (格位) (sites)	小型車停車位 (格位) (sites)	機車停車位 (格位) (sites)	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
263,579	**168**	**4,402**	**5,187**	--	--	--	--	--	**7**	**2**	**2**
22,435	-	267	140	108.07	113.08		100.00	98.96			∨
16,138	-	369	140	108.07	114.03		64.29	65.64	∨		
113,030	64	2,480	3,910	109.02	120.01		43.05	43.05		∨	
9,623	-	223	52	110.03	114.04		95.96	95.96		∨	
5,702	97	8	20	110.04	113.10		100.00	99.05			∨
17,084	7	406	301	111.09	116.05		19.00	20.47	∨		
28,558	-	270	101	112.03	115.10		46.17	48.04	∨		
7,846	-	33	62	112.06	114.10		50.67	50.85	∨		
10,326	-	45	149	112.08	115.03		41.78	41.80	∨		
9,093	-	32	32	113.04	115.10		9.17	9.36	∨		
23,744	-	269	280	113.05	116.09		6.28	11.01	∨		

Source: New Construction Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the Public Building or road project expenditure.

表6　公有建築物工程

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱① Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　　計	**4,907,780**
新建工程處 New Construction Office		**新工處主辦工程合計**	**3,629,794**
	103-112	1. 臺北市立景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程	101,625
	104-110	2. 成功市場改建工程	85,048
	104-110	3. 成功市場改建工程-水電空調工程	23,860
	106-112	4. 臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程	228,476
	106-113	5. 第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程	1,339,934
	109-112	6. 臺北市立大安國中綜合教學大樓新建工程	127,349
	107-112	7. 臺北市立南港區經貿段社會住宅新建工程	79,802
	107-112	8. 臺北市立內湖國民中學綜合大樓新建工程	58,266
	111-115	9. 臺北藝術園區-臺北市立美術館擴建統包工程	507,633
	111-114	10. 臺北市立和平高級中學教學大樓新建工程	190,068
	112-114	11. 臺北市立大安高級工業職業學校新建綜合教學大樓工程	57,755
	111-115	12. 臺北市職能發展學院原機工大樓及學員宿舍用地改建工程	292,401
	111-113	13. 臺北市政府社會局兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆統包工程	19,998
	109-114	14. 臺北市立南港高級中學綜合教學大樓新建工程	79,649
	112-114	15. 臺北市政府消防局興隆分隊新建工程	34,700
	113	16. 舊環南高架(河濱一商場)耐震補強改善工程(修正後)	②-
	113	17. 臺北市文山區力行國民小學活動中心新建工程	76,771
	107-115	18. 臺北市政府消防局關渡分隊與警察局北投分局關渡派出所新建工程	79,000
	112-113	19. 臺北市立陽明教養院永福之家拆除工程	2,488
	112-115	20. 臺北市松山區西松國民小學學生活動中心新建工程	206,298
	112-115	21. 臺北市政府消防局大湖分隊新建工程	38,674

Table 6 Public Building Constructions

January 2025

工程內容 Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
棟數	層數 Storeies		總面積	開工年月	預定完工	實際完工	預定	實際	超前	符合	落後
No. of Buildings (棟) (building)	地上 Ground (層) (storey)	地下 Under-ground (層) (storey)	Area (平方公尺) (㎡)	Starting Month	Scheduled Completion Month	Actual Completed Month	Scheduled (%)	Actual (%)	Lead (件) (case)	Accord (件) (case)	Delay (件) (case)
35	--	--	**966,719**	--	--	--	--	--	**12**	**5**	**10**
26	--	--	**681,224**	--	--	--	--	--	**11**	**4**	**6**
2	2-4	0-2	25,624	108.07	113.08		100.00	98.96			∨
1	1	5	24,494	108.07	114.03		64.29	65.64	∨		
-	-	-	-	113.10	114.06		0.43	0.45	∨		
2	20	4	45,766	109.02	114.07		61.38	61.18			∨
3	2-8	1	353,130	109.02	120.01		43.05	43.05		∨	
1	6	2	24,836	110.03	114.04		95.96	95.96		∨	
1	12	3	16,534	109.11	113.12		100.00	98.91			∨
1	3	2	9,878	110.04	113.10		100.00	99.05			∨
1	1	2	48,672	111.09	116.05		19.00	20.47	∨		
3	5	2	28,558	112.03	115.10		46.17	48.04	∨		
1	5	1	7,846	112.06	114.10		50.67	50.85	∨		
3	5-9	1	37,145	112.07	115.12		30.31	38.77	∨		
-	-	-	-	112.06	114.02		89.00	90.00	∨		
1	5	2	10,326	112.08	115.03		41.78	41.80	∨		
1	6	2	4,680	112.12	114.11		32.71	33.23	∨		
-	-	-	-	113.02	114.12		27.56	27.56		∨	
2	5	1	9,093	113.04	115.10		9.17	9.36	∨		
1	9	4	9,949	113.04	116.01		0.00	0.00		∨	
-	-	-	-	113.03	113.07		100.00	41.98			∨
1	6	2	23,744	113.05	116.09		6.28	11.01	∨		
1	5	1	949	113.08	115.10		3.21	1.79			∨

表6　公有建築物工程(續)

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱① Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		**水利處主辦工程合計**	**682,443**
	88下半年-105	22. 代辦臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程	550,800
	109	23. 臺北市中山區培英公共住宅新建工程	82,274
	109	24. 臺北市文山區景豐一區社會住宅新建工程	49,369
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office		**公園處主辦工程合計**	**121,204**
	109	25. 臺北市士林區百齡水岸社會住宅新建工程	121,204
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		**衛工處主辦工程合計**	**474,340**
	109-114	26. 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程	211,100
	105-115	27. 臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程	263,240
大地工程處 Geotechnical Engineering Office		**大地處主辦工程合計**	**-**
		本月無相關工程施工	

資料來源：新建工程處、水利工程處、公園路燈工程管理處、衛生下水道工程處、大地工程處。

附註：①工程名稱加註(建築工程)或(水電工程)者，係為利表達該工程之細部工期及施工進度，惟工程費仍為各細項工程經費之加總。

②本項工程工程費包含於橋梁工程內。

Table 6 Public Building Constructions (Cont.)

January 2025

工程內容 Construction Project				工期 Project Period			施工進度 Progress				
棟數 No. of Buildings (棟) (building)	層數 Storeies 地上 Ground (層) (storey)	地下 Under-ground (層) (storey)	總面積 Area (平方公尺) (㎡)	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
4	**--**	**--**	**182,870**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-**	**1**	**2**
2	6	2	155,346	105.11	114.03		96.95	96.95		v	
1	14	3	17,435	109.02	114.03		88.24	75.77			v
1	14	2	10,089	109.12	114.02		96.83	91.84			v
1	**--**	**--**	**25,091**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-**	**-**	**1**
1	21	4	25,091	109.08	114.05		59.77	57.73			v
4	**--**	**--**	**77,534**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1**	**-**	**1**
1	7	1	12,904	110.04	114.01		100.00	90.94			v
3	9-19	3	64,630	108.12	114.04		71.69	74.23	v		
-	**--**	**--**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-**	**-**	**-**

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office, Parks and Street Lights Office, Sewerage Systems Office, Geotechnical Engineering Office.

Note: ①The construction name with (construction work) or (plumbing/electrical wiring work) is used to express the project's detailed construction period and progress, but the project expense is still the total cost of each detailed project.

②The Construction Expense is included in the bridge project expenditure.

表7　共同管道及景觀工程

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**62,929**
新建工程處 New Construction Office	112-113	1. 112年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程開口契約	4,676
	113	2. 大安區師大路(自羅斯福路三段至和平東路一段)人行環境改善工程	①-
	113	3. 臺北市信義區松隆路人行環境改善工程	①-

Table 7 Communal Pipeline and Landscape Constructions

January 2025

工程內容 Construction Project	工期 Project Period 開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	施工進度 Progress 預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
--	--	--	--	--	--	**2**	**2**	**1**
改善本市建築基地內騎樓及沿街面人行空間高低不平	112.05	113.12		100.00	93.64			V
師大路(自羅斯福路三段至和平東路一段)人行環境改善工程	113.09	114.04		26.54	26.54		V	
臺北市信義區松隆路人行環境改善工程	113.12	114.10		0.00	0.00		V	

表7　共同管道及景觀工程(續)

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	111	4. 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站)	25,761
	111	5. 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)	32,491

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於人行道工程內。

Table 7　Communal Pipeline and Landscape Constructions (Cont.)

January 2025

工程內容 Construction Project	工期 Project Period			施工進度 Progress				
	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
三合橋至奇岩抽水站河道與公園整合整建，以及磺港路雙向整併	112.09	114.10		54.53	68.56	V		
延壽橋至三合橋河道與公園整合整建，以及磺港路雙向整併	112.09	114.10		52.44	61.75	V		

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the sidewalk project expenditure.

表8　防洪工程

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總　計	**56,920**
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	111	1. 高灘地北區管理站站房新建工程	6,716
	112	2. 112年度全市堤防美化(第八期)統包工程	1,405
	113	3. 113年度沉砂池及溝渠用地周邊清疏及維護工程	771
	113	4. 113年度北區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程	1,423
	113	5. 113年度南區水利建造物檢修改善及災後復原(新店溪永福橋至萬板大橋段)預約維護工程	900

Table 8 Flood Protection Constructions

January 2025

工程內容 Construction Project					工期 Project Period			施工進度 Progress				
堤防 Embank-ment (公尺) (m)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	閘門 Gate (座) (set)	其他 Others	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2**	**6**	**6**
高灘地北區管理站站房新建工程：新建建築物1座					111.12	114.01	114.01	100.00	100.00		V	
全市堤防美化工程(第8期)油漆彩繪					113.02	114.02		86.68	93.10	V		
辦理全市公私有沉砂池及溝渠用地清疏及維護					113.03	114.03		99.87	99.87		V	
河濱公園路面暨災後復原預約維護工程					113.03	114.01	114.01	100.00	100.00		V	
水利建造物檢修改善及災後復原預約維護工程					113.03	113.12		100.00	92.15			V

表8　防洪工程(續)

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	112	6. 士林官邸北側滯洪池新建工程	31,321
	113	7. 113年度南區河濱公園土木(含颱風豪雨設施撤離)暨災後復原預約維護工程	1,658
	113	8. 113年度北區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程	1,422
	113	9. 113年度東區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程	1,422
	112	10. 基隆河關渡紅樹林清疏及社子島堤防基礎培厚工程	3,326
	113	11. 113年度全市河川溪溝護岸及河道內植栽清除及修剪工程	921
	113	12. 113年度全市水利建造物檢修改善預約維護工程	900
	113	13. 磺港溪壓力箱涵防淤改善工程	3,069
	113	14. 113年度全市堤防美化(第九期)統包工程	1,666

資料來源：水利工程處。

Table 8 Flood Protection Constructions (Cont.)

January 2025

工程內容 Construction Project					工期 Project Period			施工進度 Progress				
堤防 Embank-ment (公尺) (m)	護岸 Riverbank Protection (公尺) (m)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	閘門 Gate (座) (set)	其他 Others	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
滯洪池新建工程					113.03	114.09		50.65	40.96			V
河濱公園土木(含颱風豪雨設施撤離)暨災後復原預約維護工程					113.04	113.12		100.00	87.00			V
河濱公園土木暨災後復原預約維護工程					113.04	113.12		100.00	86.93			V
河濱公園土木暨災後復原預約維護工程					113.04	114.03		85.67	85.67		V	
基隆河關渡紅樹林清疏及社子島堤防基礎培厚工程					113.04	114.05		74.89	87.32	V		
全市河川溪溝護岸及河道內植栽清除及修剪工程					113.04	113.12	114.01	100.00	100.00			V
本市轄河段水利建造物檢修改善					113.08	113.12		100.00	50.06			V
磺港溪壓力箱涵防淤改善工程					113.10	114.04		44.00	44.00		V	
堤防美化設計及施工					113.10	114.10		36.68	36.68		V	

Source: Hydraulic Engineering Office

表9　抽水站新建、擴建工程

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	工程內容 抽水機 Pump Set 數量 Number (座) (set)	口徑 caliber (吋) -	抽水量 Pumping Capacity (立方公尺/秒) (m³/sec)
		總　計	**153,564**	**-**	**-**	**-**
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	112	1. 濱江及大直抽水站機組更新暨陽光等抽水站周邊設備更新工程	47,161	-	-	-
	112	2. 成功、忠孝及福德抽水站機組更新暨社臨九等抽水站周邊設備更新工程	47,268	-	-	-
	113	3. 113年度續約-112年度全市沉水泵吊視檢修工程	528	-	-	-
	113	4. 113年度續約-112年度全市4.5CMS以下沉水泵吊視檢修工程	400	-	-	-
	113	5. 113年度全市抽水站附屬設備維護更新工程(第1標)	3,603	-	-	-
	113	6. 113年度全市抽水站建物及鋼鐵件預約維護檢修工程	935	-	-	-
	113	7. 113年度抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程	1,494	-	-	-
	113	8. 113年度全市抽水站附屬設備維護更新工程(第2標)	4,024	-	-	-
	113	9. 大龍抽水站擴建站新建工程	44,639	-	-	-
	113	10. 113年度抽水站建物及設施檢修工程	2,845	-	-	-
	113	11. 113年度抽水站建物噪音改善工程	667	-	-	-

資料來源：水利工程處。

Table 9　Rainwater Pump Station New Constructions and Expansion Works

January 2025

Construction Project				工期 Project Period			施工進度　Progress				
發電機 Electric Generator		抽水機房 Pump Set Room		開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled	實際 Actual	超前 Lead (件)	符合 Accord (件)	落後 Delay (件)
數量 Number (座) (set)	馬力 Horse-power (匹) (hp)	數量 Number (座) (set)	面積 Area (平方公尺) (㎡)				(%)	(%)	(case)	(case)	(case)
-	-	-	-	--	--	--	--	--	5	5	1
辦理濱江及大直抽水站機組更新暨陽光等抽水站周邊設備更新工程				112.07	114.10		16.21	16.34	v		
辦理成功、忠孝及福德抽水站機組更新暨社臨九等抽水站周邊設備更新工程				112.08	115.08		5.76	40.04	v		
全市沉水泵吊視檢修工程				113.04	114.04		94.21	94.21		v	
全市4.5CMS以下沉水泵拆卸、吊視、檢修				113.04	114.03		83.27	83.27		v	
第1及第2分區抽水站機電設備局部更新及檢修站房設施修繕				113.03	114.04		44.59	60.00	v		
辦理本市各抽水站機房整修及設施修復、更新或增設				113.04	114.05		94.42	94.42		v	
辦理抽水站前池及閘閥門周邊清疏工程				113.04	114.05		87.78	87.78		v	
第1至6分區抽水站機電設備局部更新及檢修站房設施修繕				113.05	114.04		45.68	53.22	v		
於現有重力出口閘門東側，擴增4部4cms機組(含相關附屬設施)，共計16cms				113.05	115.05		24.38	25.40	v		
屋頂防水及衛浴更新、磁磚剝落修繕、雨遮修繕等				113.07	114.02		88.90	88.90		v	
辦公室及備勤室隔音棉、氣密窗及氣密門施作				113.08	114.03		51.00	48.71			v

Source: Hydraulic Engineering Office.

表10 雨水下水道新建、改善工程

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
		總 計	**49,103**
新建工程處 New Construction Office		**新工處主辦工程合計**	**-**
	110-113	1. 國家生技研究園區聯外道路工程	①-
	112-113	2. 洲美街人行道拓寬工程	①-
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		**水利處主辦工程合計**	**49,103**
	113	3. 113年度雨水下水道緊急搶修預約維護工程(南區)	2,700
	113	4. 113年度雨水下水道預約維護工程(南港、內湖區)	1,656
	113	5. 113年度雨水下水道預約維護工程(信義區)	1,656
	113	6. 113年度雨水下水道預約維護工程(大安、中正區)	1,656
	113	7. 113年度雨水下水道預約維護工程(中山、松山區)	1,379
	113	8. 113年度雨水下水道預約維護工程(文山、萬華區)	1,379

Table 10 Rainwater Drainage System New Construction and Improvement Works

January 2025

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
側溝 Side Ditch (公尺) (m)	箱涵 Box Culvet (公尺) (m)	管涵 Pipe Culvet (公尺) (m)	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
2,576	**60**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5**	**11**	**4**
2,266	**-**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1**	**-**	**1**
2,152	-	-	111.02	114.09		36.20	47.90	V		
114	-	-	112.02	114.01		100.00	80.00			V
309	**60**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4**	**11**	**3**
緊急搶修預約維護工程			113.03	114.03		97.00	97.00		V	
預約維護工程			113.03	114.01	114.01	100.00	100.00		V	
預約維護工程			113.03	113.12		100.00	85.02			V
預約維護工程			113.03	114.02		91.00	91.00		V	
預約維護工程			113.03	113.12		100.00	86.91			V
預約維護工程			113.03	114.03		88.00	88.00		V	

表10　雨水下水道新建、改善工程（續）

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
水利工程處 Hydraulic Engineering Office	113	9. 113年度雨水下水道預約維護工程(士林、大同區)	1,656
	113	10. 113年度雨水下水道預約維護工程(北投區)	1,379
	113	11. (113)雨水下水道人孔調升降工程(南區)	1,440
	113	12. (113)雨水下水道人孔調升降工程(北區)	1,440
	112	13. 113年度全市雨水下水道結構修補預約維護工程	2,811
	113	14. 大安區民族實中周邊排水及校園環境營造工程	10,937
	113	15. 四分溪支流暨九如綠地排水環境營造改善工程	3,169
	113	16. 雨水下水道結構修補工程(興隆集水區)	6,278
	113	17. 北投區光明路及泉源路口排水改善工程(光明路至中山路口)	898
	113	18. 雨水下水道結構修補工程(關渡集水區)	4,712
	113	19. 士林區通河東街1段排水改善工程(通河東街1段325巷口至劍潭抽水站)	782
	113	20. 米粉坑溪周邊排水改善工程(大湖山莊街調洪沉砂池B池)	3,176

資料來源：新建工程處、水利工程處。

附註：①本項工程工程費包含於道路工程內。

Table 10 Rainwater Drainage System New Construction and Improvement Works (Cont.)

January 2025

工程內容 Construction Project			工期 Project Period			施工進度 Progress				
側溝 Side Ditch (公尺) (m)	箱涵 Box Culvet (公尺) (m)	管涵 Pipe Culvet (公尺) (m)	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
預約維護工程			113.03	114.01	114.01	100.00	100.00		V	
預約維護工程			113.03	114.01	114.01	100.00	100.00		V	
辦理雨水下水道人孔調升降及維護工程			113.04	114.04		99.00	99.00		V	
辦理雨水下水道人孔調升降及維護工程			113.04	114.01	114.01	100.00	100.00		V	
全市雨水下水道結構修補預約維護工程			113.06	114.05		83.56	83.56		V	
258	-	-	113.07	114.05		47.39	47.39		V	
14	-	-	113.07	114.03		67.11	68.29	V		
雨水下水道結構修補工程			113.08	114.12		25.06	35.02	V		
37	60	-	113.09	114.04		20.00	20.00		V	
雨水下水道結構修補工程			113.09	114.09		26.76	27.18	V		
既有箱涵更新、新設集水井1座、既有箱涵封閉段(B02)以CLSM回填			113.10	114.01		100.00	45.00			V
沉砂池1座、環境綠美化設施			113.11	114.08		4.84	15.87	V		

Source: New Construction Office, Hydraulic Engineering Office.

Note: ①The Construction Expense is included in the road project expenditure.

表11　公園綠地新建、改善工程

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	總面積 Total Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Side-walk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (no.)	涼亭 Arbor (座) (no.)	花架 Flower Shelf (處) (no.)	欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
		總　計	**91,275**	**10,964**	**6,833**	**3,040**	**6,127**	**137**	**1**	**11**	**1,503**
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office		**公園處主辦工程合計**	**77,160**	**10,964**	**6,833**	**3,040**	**6,127**	**137**	**1**	**11**	**1,503**
	113	1. 景興公園新建工程(G-113-09-113080)	4,145	10,964	251	-	142	8	-	-	230
	113	2. 愛國西路中央分隔島鋪面更新工程(G-113-09-113140)	2,695		2,150	150	-	22	-	-	-
	113	3. 113年度黎忠、三興公園整建工程(G-113-09-113146)	1,399		-	386	497	3	1	-	-
	113	4. 113年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區、信義區、文山區公園整建工程(G-113-09-113137)	1,558		1,182	365	500	1	-	-	344
	113	5. 113年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程(G-113-09-113136)	1,089		-	-	-	-	-	9	-
	113	6. 113年兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程（A項）(G-113-09-113059)	1,600		-	828	-	2	-	-	-
	113	7. 石潭公園遊戲場改善工程(G-113-09-113142)	1,289		-	454	70	13	-	-	103
	113	8. 113年度仙岩、興福公園整建工程(G-113-09-113145)	2,620		250	630	886	23	-	2	76
	113	9. 113年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程(G-113-09-113148)	1,380		265	-	252	10	-	-	110
	113	10. 113年度景觀公廁新建工程（B項）(G-113-09-113149)	2,550		-	-	172	-	-	-	-
	113-115	11. 臺北市原住民族文化創生基地整體修繕工程(G-113-09-113147)	45,600		-	-	-	-	-	-	-

Table 11 Park New Construction and Improvement Works

January 2025

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facility (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Barrier-free Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m²)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定進度 Scheduled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
1,770	**-**	**124**	**43**	**50**	**1**	**4**	**340**	**51,739**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14**	**9**	**4**
1,770	**-**	**124**	**43**	**50**	**1**	**4**	**340**	**51,739**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12**	**5**	**1**
405	-	58	-	-	-	3	179	38	113.03	114.02		74.69	79.50	v		
363	-	24	11	14	-	-	-	17,557	113.06	114.01	114.01	100.00	100.00		v	
-	-	-	2	5	-	-	37	1,125	113.07	114.01	114.01	100.00	100.00		v	
176	-	-	1	9	-	-	-	-	113.06	114.01	114.01	100.00	100.00		v	
171	-	-	-	-	-	-	-	-	113.06	114.03		90.26	92.00	v		
-	-	-	22	-	-	-	-	-	113.07	114.02		89.55	90.38	v		
-	-	-	2	-	-	1	-	-	113.07	114.02		92.85	93.86	v		
73	-	38	3	4	-	-	124	13,870	113.07	114.03		90.11	90.36	v		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.06	114.03		68.72	71.62	v		
-	-	-	-	-	-	-			113.07	114.02		90.00	90.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.08	115.10		5.88	7.34	v		

表11　公園綠地新建、改善工程（續1）

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	總面積 Total Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Side-walk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (no.)	涼亭 Arbor (座) (no.)	花架 Flower Shelf (處) (no.)	欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
公園路燈工程管理處 Parks and Street Lights Office	113	12. 113年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程(G-113-09-113150)	1,276		1,704	-	-	13	-	-	91
	113-114	13. 113年度圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區、松山區、大同區公園整建工程(G-113-09-113151)	1,328		-	192	2,407	-	-	-	-
	113-114	14. 113年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-陽明山區公園整建工程(G-113-09-113152)	1,176		-	-	-	-	-	-	-
	113-114	15. 113年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區、萬華區及大安區公園整建工程(G-113-09-113153)	939		1,031	35	-	20	-	-	-
	113-114	16. 內湖117號綠地景觀改造工程(G-113-09-113155)	2,109		-	-	1,202	22	-	-	549
	113-115	17. 113年度公園公廁改善工程（A項）(G-113-09-113157)	1,400		-	-	-	-	-	-	-
	113-116	18. 113年度公園公廁改善工程（B項）(G-113-09-113158)	3,007		-	-	-	-	-	-	-

Table 11　Park New Construction and Improvement Works (Cont. 1)

January 2025

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swim-ming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facility (公尺) (m)	球場(運動場) Sta-dium (處) (lot)	無障礙坡道 Barrier-free Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m^2)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	開工年月 Start-ing Month	預定完工 Scheduled Complet-ion Month	實際完工 Actual Complet-ed Month	預定進度 Sche-duled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
58	-	4	-	9	-	-			113.08	114.02		72.20	89.77	V		
64	-	-	2	1	1	-	-	-	113.08	114.02		89.95	89.95		V	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.08	114.03		90.46	80.29			V
89	-	-	-	8	-	-	-	-	113.09	114.05		56.17	75.79	V		
370	-	-	-	-	-	-	-	19,149	113.09	114.03		55.53	55.55	V		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.10	114.03		58.41	68.47	V		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.10	114.03		48.02	48.03	V		

表11 公園綠地新建、改善工程（續2完）

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	總面積 Total Area (平方公尺) (㎡)	土木工程 廣場 Plaza (平方公尺) (㎡)	遊戲地坪 Game Area (平方公尺) (㎡)	園路人行道 Side-walk (平方公尺) (㎡)	座椅 Chair (座) (no.)	涼亭 Arbor (座) (no.)	花架 Flower Shelf (處) (no.)	欄杆阻車 Baluster Arrest-ment Car (公尺) (m)
水利工程處 Hydraulic Engineering Office		**水利處主辦工程合計**	**14,115**	**--**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	113	19. 113年度續約-111年度全市河濱公園綠化預約維護工程	1,000		-	-	-	-	-	-	-
	113	20. 113年度全市河濱公園樹木及景觀預約維護工程	700		-	-	-	-	-	-	-
	113	21. 113年度全市河濱公園花海工程	2,215		-	-	-	-	-	-	-
	113	22. 113年度全市河濱公園褐根病防治及其他病蟲害防治工程	94		-	-	-	-	-	-	-
	113	23. 全市河濱公園景觀廁所設置預約維護工程	1,392		-	-	-	-	-	-	-
	113	24. 雙溪河濱公園左岸自行車道暨周邊環境改善工程	2,365		-	-	-	-	-	-	-
	113	25. 成美左岸河濱公園錫口碼頭周邊整體環境改善工程	2,512		-	-	-	-	-	-	-
	113	26. 成美右岸河濱公園景觀改善工程	2,610		-	-	-	-	-	-	-
	113	27. 觀山河濱公園道路動線改善工程	1,228		-	-	-	-	-	-	-

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

Table 11　Park New Construction and Improvement Works (Cont. 2 End)

January 2025

Civil Engineering							園藝工程 Gardening Engineering		工期 Project Period			施工進度 Progress				
排水溝 Gutter (公尺) (m)	游泳池 Swimming Pool (處) (lot)	園燈 Park Light (座) (set)	兒童遊具 Child's Game Tool (座) (set)	體健設施 Physically Healthy Facility (公尺) (m)	球場(運動場) Stadium (處) (lot)	無障礙坡道 Barrier-free Ramp (座) (set)	鋪植草皮 Turfing (平方公尺) (m^2)	栽植樹花木 Planting Trees and Flowers (株) (no.)	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定進度 Scheduled (%)	實際進度 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	--	--	--	--	--	**2**	**4**	**3**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.04	113.12		100.00	93.90			v
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.07	114.03		75.37	93.25	v		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.08	114.02		93.90	93.90		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.08	113.12		100.00	44.64			v
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.09	114.06		95.00	95.00		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.10	114.04		19.15	19.15		v	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.12	114.05		5.86	15.05	v		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.12	114.05		5.39	2.87			v
-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.12	114.05		10.30	10.30		v	

Source: Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office.

表12　污水下水道新建、改善工程

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000
衛生下水道工程處 Sewerage Systems Office		**總　計**	**69,796**
	113-114	1. 113年東區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	3,200
	113-114	2. 113年南區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	3,200
	113-114	3. 113年北區污水管渠配合拆遷及後巷美化預約式工程	3,200
	112-114	4. 提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水接管統包工程	8,494
	113	5. 113年分管網暨支管及用戶排水設備統包工程	3,357
	113-115	6. 113-115年臺北市污水下水道用戶補接管統包工程	3,727
	113	7. 112年東區污水管渠設施檢視及維護預約式工程(後續擴充113年)	4,800
	113	8. 113年西區污水管渠設施檢視及維護預約式工程	3,600
	112-114	9. 112-114年東區分支管污水管渠設施檢視修繕及延壽統包工程	13,883
	112-114	10. 112-114年西區分支管污水管渠設施檢視修繕及延壽統包工程	13,883
	111-113	11. 臺北市第2期污水下水道主、次幹管管渠延壽統包工程(第2標)	4,553
	113-114	12. 113-114年人孔框蓋更新預約式工程	3,900

資料來源：衛生下水道工程處。

Table 12　Sewerage System New Construction and Improvement Works

January 2025

工程內容　Construction Project							工期 Project Period			施工進度　Progress				
主幹管 Trunk (m)	次幹管 Sub-Trunk (m)	分支管 Branch Pipeline (m)	抽揚水站 Pump-ing Station (座) (no.)	人孔 Man-hole (座) (no.)	清除孔 Clean-out (座) (no.)	截流設施 Intercep-tion Facilities (個) (no.)	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Sche-duled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Ac-cord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**-**	**3,094**	**-**	**102**	**1**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1**	**7**	**4**
-	-	-	-	-	-	-	113.03	114.03		97.26	97.26		V	
-	-	-	-	-	-	-	113.03	114.03		99.80	99.80		V	
-	-	-	-	-	-	-	113.03	114.03		99.05	99.05		V	
-	-	-	-	-	-	-	112.05	114.06		88.92	88.92		V	
-	-	-	-	-	-	-	113.04	114.03		86.83	86.83		V	
-	-	-	-	-	-	-	113.04	115.12		37.66	37.66		V	
-	-	-	-	21	-	-	113.02	113.12		100.00	99.99			V
-	-	11	-	-	1	-	113.04	113.12		100.00	77.00			V
-	-	-	-	-	-	-	112.06	114.12		48.00	49.95	V		
-	-	3,083	-	-	-	-	112.06	114.12		70.00	67.39			V
-	-	-	-	-	-	-	111.10	113.12		100.00	76.40			V
-	-	-	-	81	-	-	113.04	114.12		66.53	66.53		V	

Source: Sewerage Systems Office.

表13　治山防災整體治理工程

114年1月

主辦工程機關 Sponsor	預算年度 Budget Year	工程名稱 Construction Name	工程費 Construction Expense (萬元) NT$10 000	工程內容 防砂壩 Against Granulated Substance Dam (座) (set)	潛壩 Sub-merged Dam (座) (set)	丁壩 Spur Dam (座) (set)	堤防 Embank-ment (公尺) (m)
大地工程處 Geotechnical Engineering Office		**總　計**	**19,079**	**-**	**-**	**-**	**-**
	113	1. 113年度臺北市山坡地邊坡(北區)維護預約式工程	3,600	-	-	-	-
	113	2. 113年度山區道路改善及維護工程(文山區)	2,845	-	-	-	-
	113	3. 113年度山區道路改善及維護工程(內寮)	1,405	-	-	-	-
	113	4. 113年度山區道路改善及維護工程(鹿角坑)	2,622	-	-	-	-
	113	5. 114年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)維護預約式工程	696	-	-	-	-
	113	6. 113年度臺北市登山步道改善及維護工程	2,940	-	-	-	-
	113	7. 113年度坡地休閒遊憩場域整建工程	2,432	-	-	-	-
	114	8. 114年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)維護預約式工程	1,939	-	-	-	-
	114	9. 113年度臺北市風景區整體營造改善預約式工程(114年續約)	600	-	-	-	-

資料來源：大地工程處。

Table 13 Watershed Management and Disaster Prevention

January 2025

Construction Project							工期 Project Period			施工進度 Progress				
整流 Rectification (公尺) (m)	固床工 Ground-sill Works (座) (set)	護岸 River-bank Protection (公尺) (m)	魚道 Fish Way (座) (set)	蝕溝控制 Gully Control (公尺) (m)	崩塌地處理 Protection for collapse (公頃) (hectare)	植生綠美化 Greening Beautification (平方公尺) (㎡)	開工年月 Starting Month	預定完工 Scheduled Completion Month	實際完工 Actual Completed Month	預定 Scheduled (%)	實際 Actual (%)	超前 Lead (件) (case)	符合 Accord (件) (case)	落後 Delay (件) (case)
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8**	**1**	**-**
-	-	-	-	-	0	-	113.02	114.02	114.01	99.33	100.00	V		
已報竣工							113.06	114.01	114.01	100.00	100.00		V	
抿石子施作、模板組立及RC							113.08.	114.03		69.29	69.50	V		
擋土矮墩基礎施工、側溝模板組立灌漿、造型護欄連續基礎模板組立							113.08	114.03		80.15	96.76	V		
中山區山區邊坡平時維護及改善修復，包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、路燈修繕、木棧道上警示黃漆、廢棄物移除、設置緊急標誌等							114.01	114.12		0.18	0.72	V		
猴崁步道鋪面修整、新設平台及吊橋；樟樹步道楓樹亭修繕、附屬設施修繕							113.06	114.02		97.32	98.52	V		
圓山風景區遊憩設施與意象營造，包含樂活體健設施、眺望臺、森林方舟場域及植栽配置等							113.08	114.06		43.52	64.50	V		
中山區山區邊坡平時維護及改善修復，包含水溝清淤、修枝、邊坡清理、路燈修繕、木棧道上警示黃漆、廢棄物移除、設置緊急標誌等							114.01	114.12		0.18	0.72	V		
1.風景區內林木疏伐 2.風景區內閒置場域拆除及綠美化							114.01	114.12		1.42	3.38	V		

Source: Geotechnical Engineering Office.

表14　污水下水道用戶接管概況

年（月）別 Year (Month)	當年(月)污水處理戶數 (戶) No. of Households Served by Wastewater Collection in Each Year (Month) (no.)			
	總計 Grend Total	公共污水下水道門牌用戶接管戶數 Public Sanitary Sewers	建築物自設專用污水下水道設置戶數 Specific Sanitary Sewers	建築物自設污水處理設施設置戶數 Households with Building Sewage Processing Facilities
民國 91 年 2002	41 852	37 885	1 478	2 489
民國 92 年 2003	34 718	31 928	1 684	1 106
民國 93 年 2004	39 930	37 991	1 081	858
民國 94 年 2005	47 585	44 936	1 251	1 398
民國 95 年 2006	29 132	25 798	1 224	2 110
民國 96 年 2007	34 430	32 513	-960	2 877
民國 97 年 2008	42 775	40 010	1 172	1 593
民國 98 年 2009	34 635	33 300	216	1 119
民國 99 年 2010	41 663	40 902	163	598
民國 100 年 2011	31 993	31 237	3	753
民國 101 年 2012	31 442	30 822	1	619
民國 102 年 2013	24 543	24 145	2	396
民國 103 年 2014	21 825	21 638	-	187
民國 104 年 2015	12 391	12 265	-	126
民國 105 年 2016	10 584	10 475	-	109
民國 106 年 2017	10 468	10 357	-	111
民國 107 年 2018	12 564	12 528	-	36
民國 108 年 2019	27 687	63 367	-25 232	-10 448
民國 109 年 2020	7 972	8 103	-1	-130
民國 110 年 2021	10 588	10 570	-	18
民國 111 年 2022	10 744	10 724	-	20
民國 112 年 2023	11 383	13 647	-2,277	13
民國 113 年 2024	15,569	15 928	-368	9
1月 Jan.	944	944	-	-
2月 Feb.	1,378	1 378	-	-
3月 Mar.	932	932	-	-
4月 Apr.	2,071	2 071	-	-
5月 May	1,880	1 879	-	1
6月 June	1,656	1 654	-	2
7月 July	2,702	2 700	-	2
8月 Aug.	701	700	-	1
9月 Sep.	750	1 117	-368	1
10月 Oct.	601	601	-	-
11月 Nov.	667	667	-	-
12月 Dec.	1,287	1 285	-	2
民國 114 年 2025				
1月 Jan.	653	1 227	-	-574

資料來源：衛生下水道工程處。

說明：(1)污水處理率=累計污水處理戶數(a)×戶量/人口數×100，103年以前戶量以4計算。自99年起比率超過100%者，以100%表示。

(2)門牌戶數接管普及率 g=b/d×100，108年4月以前 g=(b+c)/d×100。

(3)96年、108年、109年清查資料，扣除重複列計者，致用戶數為負值或減少。

Table 14 Overview of Household Sewerage System Connections

期底累計污水處理戶數 (戶) Accumulated No. of Households Served by Wastewater Collection (no.)				門牌總戶數 (戶)	污水處理率	門牌戶數接管普及率
總計 Grend Total a	公共污水下水道門牌用戶接管戶數 Public Sanitary Sewers b	建築物自設專用污水下水道設置戶數 Special Sanitary Sewers c	建築物自設污水處理設施設置戶數 Households with Building Sewage Processing Facilities	No. of Doorplates (no.) d	Percentage of Population Served by Wastewater Collection	Doorplate Sewer Connection Rate (%) g
412 745	**383 828**	**22 869**	**6 048**	**943 876**	**62.49**	**43.09**
447 463	**415 756**	**24 553**	**7 154**	**981 847**	**68.13**	**44.84**
487 393	**453 747**	**25 634**	**8 012**	**988 693**	**74.34**	**48.49**
534 978	**498 683**	**26 885**	**9 410**	**987 274**	**81.79**	**53.23**
564 110	**524 481**	**28 109**	**11 520**	**987 274**	**85.72**	**55.97**
598 540	**556 994**	**27 149**	**14 397**	**1 033 315**	**91.06**	**56.53**
641 315	**597 004**	**28 321**	**15 990**	**1 035 299**	**97.80**	**60.40**
675 950	**630 304**	**28 537**	**17 109**	**1 062 320**	**103.70**	**62.02**
717 613	**671 206**	**28 700**	**17 707**	**1 068 561**	**100.00**	**65.50**
749 606	**702 443**	**28 703**	**18 460**	**1 076 178**	**100.00**	**67.94**
781 048	**733 265**	**28 704**	**19 079**	**1 082 773**	**100.00**	**70.37**
805 591	**757 410**	**28 706**	**19 475**	**1 087 747**	**100.00**	**72.27**
827 416	**779 048**	**28 706**	**19 662**	**1 094 032**	**100.00**	**73.83**
839 807	**791 313**	**28 706**	**19 788**	**1 099 882**	**80.42**	**74.56**
850 391	**801 788**	**28 706**	**19 897**	**1 104 774**	**81.07**	**75.17**
860 859	**812 145**	**28 706**	**20 008**	**1 111 127**	**81.81**	**75.68**
873 423	**824 673**	**28 706**	**20 044**	**1 114 906**	**82.81**	**76.54**
901 110	**888 040**	**3 474**	**9 596**	**1 117 782**	**84.83**	**79.45**
909 082	**896 143**	**3 473**	**9 466**	**1 120 148**	**85.58**	**80.00**
919 670	**906 713**	**3 473**	**9 484**	**1 125 327**	**87.44**	**80.57**
930 414	**917 437**	**3 473**	**9 504**	**1 129 668**	**88.52**	**81.21**
941 797	**931 084**	**1 196**	**9 517**	**1 135 392**	**88.48**	**82.01**
957 366	**947 012**	**828**	**9 526**	**1 143 803**	**89.17**	**82.80**
942 741	932 028	1 196	9 517	1 137 445	88.59	81.94
944 119	933 406	1 196	9 517	1 138 250	88.75	82.00
945 051	934 338	1 196	9 517	1 138 530	88.87	82.07
947 122	936 409	1 196	9 517	1 138 878	88.71	82.22
949 002	938 288	1 196	9 518	1 139 333	88.93	82.35
950 658	939 942	1 196	9 520	1 139 742	89.12	82.47
953 360	942 642	1 196	9 522	1 140 691	89.45	82.64
954 061	943 342	1 196	9 523	1 140 962	89.23	82.68
954 811	944 459	828	9 524	1 141 691	89.05	82.72
955 412	945 060	828	9 524	1 141 849	89.22	82.77
956 079	945 727	828	9 524	1 142 279	89.35	82.79
957 366	947 012	828	9 526	1 143 803	89.17	82.80
958 019	948 239	828	8 952	1 145 146	89.31	82.81

Source: Sewerage Systems Office.

Explanation: 1.Percentage of Population Served by Wastewater Collection = Accumulated No. of Households Served by Wastewater Collection(a) × Household Mean Size / Population × 100. Before 2014, Household Mean Size was 4. From 2010 onward, the figures exceeding 100% were showed 100%.

2.Doorplate Sewer Connection Rate g= b/d×100. Before April 2019, g=(b+c)/d×100.

3.In 2007, 2019 and 2020, repeated calculated numbers of households were deducted, which results a negative number or a decrease in the amount.

表15　公園綠地

單位：處、平方公尺

年底及區別 End of Year & District		已開闢公園綠地					
		總計 Grand Total		公　園 Parks		綠　地 Green Fields	
		處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area
民國87年底	End of 1998	660	11 375 178	452	6 398 546	156	497 422
民國88年底	End of 1999	683	11 765 710	463	6 628 170	168	653 065
民國89年底	End of 2000	702	12 201 274	470	6 746 291	174	690 698
民國90年底	End of 2001	726	12 643 384	484	7 144 069	184	729 714
民國91年底	End of 2002	745	12 723 060	496	7 210 701	188	733 779
民國92年底	End of 2003	757	12 773 055	504	7 237 804	191	743 565
民國93年底	End of 2004	765	12 983 800	512	7 362 764	188	712 630
民國94年底	End of 2005	773	13 098 871	518	7 421 787	190	711 236
民國95年底	End of 2006	784	13 246 975	524	7 522 538	192	712 296
民國96年底	End of 2007	794	13 441 988	531	7 682 047	192	712 796
民國97年底	End of 2008	804	13 525 134	536	7 773 009	195	690 415
民國98年底	End of 2009	813	13 508 871	542	7 772 495	198	673 026
民國99年底	End of 2010	821	13 529 929	547	7 782 650	200	683 749
民國100年底	End of 2011	833	13 643 094	551	7 898 079	206	676 185
民國101年底	End of 2012	838	13 667 760	556	7 932 743	206	668 463
民國102年底	End of 2013	843	13 687 731	564	7 955 002	203	666 175
民國103年底	End of 2014	851	13 748 610	569	8 000 077	205	680 430
民國104年底	End of 2015	857	13 805 960	573	8 062 480	206	674 507
民國105年底	End of 2016	861	14 329 914	576	8 582 016	207	678 257
民國106年底	End of 2017	871	14 352 093	581	8 586 192	211	684 639
民國107年底	End of 2018	930	15 440 822	601	9 422 086	212	682 141
民國108年底	End of 2019	961	15 679 559	607	9 579 806	214	677 390
民國109年底	End of 2020	976	16 078 307	623	9 978 903	213	674 861
民國110年底	End of 2021	994	18 072 802	635	10 183 670	218	624 051
民國111年底	End of 2022	1 007	18 190 174	656	10 345 827	210	579 266
民國112年底	End of 2023	1 017	18 225 567	663	10 355 442	211	578 956
民國113年12月底	**End of 2024**	**1 023**	**18 309 995**	**666**	**10 431 147**	**214**	**582 740**
松山區	SongShan	53	993 844	48	188 050	2	3 344
信義區	XinYi	88	589 470	56	458 042	22	43 832
大安區	DaAn	71	633 713	64	624 816	7	8 897
中山區	ZhongShan	101	1 763 849	70	771 505	23	39 419
中正區	ZhongZheng	35	957 293	22	553 787	2	20 720
大同區	DaTong	40	441 991	20	126 974	4	4 681
萬華區	WanHua	39	1 899 451	31	584 456	1	478
文山區	WenShan	116	3 588 932	96	2 626 627	16	18 760
南港區	NanGang	62	950 812	37	682 133	15	63 252
內湖區	NeiHu	104	1 632 395	87	969 953	10	46 607
士林區	ShiLin	122	2 226 905	56	1 021 257	42	77 394
北投區	BeiTou	186	2 592 476	79	1 823 547	70	255 356
跨區域	Others	6	38 864	-	-	-	-

資料來源：公園路燈工程管理處、水利工程處。

附　　註：110年重新丈量河濱公園面積。

Table 15 Parks and Green Fields

Unit: number; m²

Constructed Parks and Green Fields								每人享有公園綠地面積
兒童遊樂場 Sport Spots for Children		廣場 Plaza		河濱公園 Riverside Parks		線形公園 Linear Parks		
處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	處數 no.	面積 area	Per Capita Area of Parks and Green Fields
11	15 552	19	128 708	22	4 334 950	-	-	4.31
11	15 552	19	128 501	22	4 340 422	-	-	4.45
11	15 552	23	141 777	24	4 606 956	-	-	4.61
11	15 874	23	146 771	24	4 606 956	-	-	4.80
11	15 874	26	155 750	24	4 606 956	-	-	4.82
11	15 874	26	157 156	25	4 618 656	-	-	4.86
11	15 874	29	174 980	25	4 717 552	-	-	4.95
11	16 030	29	152 429	25	4 797 389	-	-	5.01
11	16 030	29	152 382	28	4 843 729	-	-	5.03
11	16 030	32	173 641	28	4 857 474	-	-	5.11
11	16 030	34	188 206	28	4 857 474	-	-	5.16
10	15 080	35	190 796	28	4 857 474	-	-	5.18
10	15 080	36	190 976	28	4 857 474	-	-	5.17
10	15 080	38	196 276	28	4 857 474	-	-	5.15
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	-	-	5.11
10	15 080	38	194 000	28	4 857 474	-	-	5.09
10	15 080	39	195 549	28	4 857 474	-	-	5.09
10	15 080	40	196 419	28	4 857 474	-	-	5.10
10	15 082	40	197 085	28	4 857 474	-	-	5.32
10	15 082	41	208 706	28	4 857 474	-	-	5.35
8	13 612	44	212 828	28	4 857 474	37	252 681	5.79
8	13 612	45	215 345	28	4 857 474	59	335 932	5.93
8	13 612	45	217 525	28	4 857 474	59	335 932	6.18
8	13 612	46	232 398	28	6 683 139	59	335 932	7.16
8	13 612	46	232 398	28	6 683 139	59	335 932	7.33
8	13 612	48	258 486	28	6 683 139	59	335 932	7.26
8	**13 612**	**48**	**263 425**	**28**	**6 683 139**	**59**	**335 932**	**7.35**
-	-	1	864	2	801 586	-	-	5.18
-	-	10	87 596	-	-	-	-	2.87
-	-	-	-	-	-	-	-	2.19
-	-	2	4 529	3	942 102	3	6 294	8.19
-	-	9	107 096	1	273 320	1	2 370	6.45
-	-	10	16 680	1	265 993	5	27 663	3.71
-	-	2	15 060	5	1 299 457	-	-	11.05
-	-	-	-	4	943 545	-	-	13.89
6	11 927	2	3 941	2	189 559	-	-	8.44
-	-	4	5 489	3	610 346	-	-	5.96
1	908	5	13 711	5	1 032 537	13	81 098	8.43
1	777	3	8 459	2	324 694	31	179 643	10.77
-	-	-	-	-	-	6	38 864	-

Source: Parks and Street Lights Office, Hydraulic Engineering Office.
Note: In 2021, the areas of Riverside Parks were remeasured.

表16 現有路燈盞數

Table 16 Number of Street Lights

單位：盞 Unit: set

年(月)底別 End of Year(Month)		總計 Grend Total	複金屬燈 Metal Halide Light	鈉光燈 Sodium Light	日光燈 Fluorescent Light	LED燈 LED Light	其他 Others
民國91年底	**End of 2002**	**124 493**	**84 458**	**32 435**	**7 598**	**-**	**2**
民國92年底	**End of 2003**	**131 044**	**73 680**	**48 415**	**8 865**	**-**	**84**
民國93年底	**End of 2004**	**134 828**	**75 006**	**50 075**	**9 204**	**55**	**488**
民國94年底	**End of 2005**	**135 823**	**75 273**	**50 816**	**9 188**	**58**	**488**
民國95年底	**End of 2006**	**140 320**	**76 095**	**54 320**	**9 469**	**58**	**378**
民國96年底	**End of 2007**	**143 345**	**76 470**	**55 929**	**10 102**	**724**	**120**
民國97年底	**End of 2008**	**144 145**	**79 085**	**53 394**	**8 212**	**1 250**	**2 204**
民國98年底	**End of 2009**	**145 508**	**79 758**	**54 123**	**8 230**	**1 285**	**2 112**
民國99年底	**End of 2010**	**146 791**	**80 198**	**54 966**	**8 230**	**1 285**	**2 112**
民國100年底	**End of 2011**	**148 213**	**80 931**	**55 716**	**8 169**	**1 285**	**2 112**
民國101年底	**End of 2012**	**149 535**	**76 803**	**56 049**	**8 066**	**1 897**	**6 720**
民國102年底	**End of 2013**	**151 248**	**38 647**	**61 997**	**7 196**	**41 452**	**1 956**
民國103年底	**End of 2014**	**154 305**	**11 328**	**61 859**	**7 899**	**70 400**	**2 819**
民國104年底	**End of 2015**	**155 501**	**10 148**	**61 845**	**7 846**	**73 323**	**2 339**
民國105年底	**End of 2016**	**157 696**	**6 836**	**60 898**	**7 587**	**80 036**	**2 339**
民國106年底	**End of 2017**	**159 546**	**4 948**	**56 808**	**7 587**	**87 864**	**2 339**
民國107年底	**End of 2018**	**162 834**	**5 168**	**32 209**	**7 869**	**114 921**	**2 667**
民國108年底	**End of 2019**	**164 143**	**2 749**	**10 164**	**5 796**	**143 143**	**2 291**
民國109年底	**End of 2020**	**168 233**	**441**	**4 043**	**435**	**163 088**	**226**
民國110年底	**End of 2021**	**170 328**	**387**	**3 816**	**294**	**165 655**	**176**
民國111年底	**End of 2022**	**171 938**	**360**	**3 553**	**66**	**167 750**	**209**
民國112年底	**End of 2023**	**172 848**	**202**	**2 786**	**66**	**169 586**	**208**
民國113年底	**End of 2024**	**173 582**	**200**	**2 660**	**224**	**170 498**	**-**
1月底	End of Jan.	173 176	205	2 792	224	169 955	-
2月底	End of Feb.	173 176	205	2 792	224	169 955	-
3月底	End of Mar.	173 176	205	2 792	224	169 955	-
4月底	End of Apr.	173 176	205	2 792	224	169 955	-
5月底	End of May	173 250	201	2 660	224	170 165	-
6月底	End of June	173 250	201	2 660	224	170 165	-
7月底	End of July	173 250	201	2 660	224	170 165	-
8月底	End of Aug.	173 250	201	2 660	224	170 165	-
9月底	End of Sep.	173 582	200	2 660	224	170 498	-
10月底	End of Oct.	173 582	200	2 660	224	170 498	-
11月底	End of Nov.	173 582	200	2 660	224	170 498	-
12月底	End of Dec.	173 582	200	2 660	224	170 498	-
民國114年底	**End of 2025**						
1月底	End of Jan.	174 037	198	2 655	-	171 149	35
114年1月底較上年同期增減% Annual Change Rate(%)		0.50	- 3.41	- 4.91	- 100.00	0.70	--

資料來源：公園路燈工程管理處。

說明：1.本表以台灣電力公司供電之盞數計列。

2.97年起路燈種類重新歸類計算，無法銜接。

Explanation: 1.This table is calculated based on lamps powered by Taiwan Power Company.

2.Street lights were reclassified since 2008, figures are not directly comparable to previous years.

表17　登山步道

113年12月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
總計		**154 條**	**117 625**
信義區小計		**24 條**	**13 020**
(XY-01)	虎山溪步道	慈惠堂→真光禪寺→復興園	950
(XY-02)	虎山山腰步道	復興園→山神廟叉路	527
(XY-03)	虎山自然步道	慈惠堂→山神廟→南港山稜線叉路口	1 100
(XY-04)	虎山生態步道	虎山400m涼亭→王家土雞城叉路口	480
(XY-05)	虎山復興園步道	復興園→瑤池宮	580
(XY-06)	美的世界社區步道	瑤池宮→松山路673號美的世界社區(增長180m)	500
(XY-07)	虎山120高地步道	福德街221巷→虎山120高地	238
(XY-08)	虎山峰下方步道	福德街221巷→虎山峰下涼亭	157
(XY-09)	虎山峰前方步道	福德街221巷→虎山峰前涼亭	220
(XY-10)	虎山奉天宮步道	奉天宮→松山路679-1號	890
(XY-11)	虎山吉福宮步道	福德街51巷→虎山120高地	509
(XY-12)	吉福宮叉路步道	吉福宮上方右叉路→涼亭右轉下福德街51巷	322
(XY-13)	象山北星寶宮步道	靈雲宮→山頂→北星寶宮叉路	824
(XY-14)	天寶聖道宮步道	北星寶宮→天寶聖道宮	408
(XY-15)	拇指山步道	拇指山登山口→北星寶宮	1 355
(XY-16)	北臺慈惠堂步道	北臺慈惠堂→南港山親山步道三叉路	150
(XY-17)	永春崗顏子廟步道	永春崗公園→顏子廟	220
(XY-18)	象山永春崗步道	松山路650巷超市旁→象山頂前南港山叉路口(含入口意象範圍)	850
(XY-19)	象山一線天步道	象山990m巨石叉路→一線天→75m叉路口	822
(XY-20)	市立療養院步道	療養院→稜線(象山親山460m)(含入口意象範圍)	233
(XY-21)	象山自然步道	市療羽球場→象山煙火平臺	400
(XY-22)	石泉巖步道	石泉巖→中正巖	289
(XY-23)	糶米古道	吳興街600巷→極樂公墓	446
(XY-24)	豹山溪步道	豹山拆遷整治區前往上至第一座橋 (第一座橋至靈隱寺前尚未施作)	550
中山區小計		**3 條**	**3 024**
(CS-01)	復興電臺線步道	中山北路5段282巷→劍潭山稜線	700
(CS-02)	劍潭山稜線步道	劍潭山打印臺經老地方→通北街叉路口→軍營門口(延伸374m至軍營前)	1 574
(CS-03)	文間山步道	臨溪路100巷口→劍南路支線道路→文間山出口	750

Table 17　Hiking Trails (Cont. 1)

End of December 2024

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
文山區小計		**30 條**	**19 529**
(WS-A1)	試院支線步道	考試院上方涼亭→仙跡岩足跡步道叉路(含木柵路1段23號旁入口路段)	452
(WS-A2)	景興國小支線步道	親山步道915m景興國小叉路口→景興國小	368
(WS-A3)	溝子口支線步道	(往光輝路口)樓梯盡頭→親山步道1300m海巡署叉路口→主稜線及景興國小支線轉角	868
(WS-A4)	麥田支線步道	麥田山莊→仙跡岩稜線(含福德宮304巷支線)	413
(WS-A5)	海巡署支線	興隆路三段304巷25號勞保局倉庫前→溝子口步道上方指向牌	600
(WS-A6)	指南宮步道	指南宮33巷牌樓步道口→指南慈惠堂前方指向牌	900
(WS-A7)	仙跡岩主稜線	溝子口支線及海巡署支線三叉路口→主稜線及景興國小支線轉角	400
(WS-A8)	指南慈惠堂步道	指南路三段→指南慈惠堂再接商店街至獅子亭前方涼亭	750
(WS-01)	大成殿步道	指南路三段步道口→指南路三段157巷步道口	605
(WS-02)	猴山岳步道	指南宮後山猴山岳步道口→新光路	602
(WS-03)	茶推廣中心步道	茶業推廣中心停車場→指南路三段	760
(WS-04)	健康步道	茶業推廣中心步道口→私人工寮旁	414
(WS-05)	壺穴步道	茶壺站對面寒舍入口→壺穴吊橋	550
(WS-06)	小天空步道	茶展中心停車場旁→邀月餐廳門口	200
(WS-07)	飛龍步道	政治大學環山二道→樟山寺	960
(WS-08)	救千宮步道	樟山寺→混元宮前高速公路涵洞下步道口	1 029
(WS-09)	指南國小步道	指南國小→樟山寺前叉路口	686
(WS-10)	拖板嶺步道	指南國小→纜車貓空站	1 320
(WS-11)	貓空越嶺步道	纜車貓空站對面步道口→稜線上十字路口	800
(WS-12)	樟樹步道	指南路三段34巷步道口→大觀園後方停車場(┼談茶支線160m)	1 100
(WS-13)	楓林步道	樟樹步道楓林支線叉路口→指南路談天園對面步道口(含涼亭範圍)	160
(WS-14)	石獅腳步道	德興茶園旁步道口→指南路三段34巷27號旁步道口	350
(WS-15)	老樟樹步道	樟樹步道老樟樹叉路口→繞一圈至前方80m出口	70
(WS-16)	樟湖步道	指南路3段38巷涵鈺軒→指南路3段34巷步道口(公車樟山寺站旁)	2 500
(WS-17)	待老坑步道	樟湖步道待老坑叉路→待老坑山至老泉街26巷優人神鼓	522
(WS-18)	登高步道	明德宮對面步道口→望遠亭	100
(WS-19)	中埔山榕樹步道	辛亥路四段21巷步道口→石板鋪面終點	250
(WS-20)	軍功山步道	軍功山世界山莊登山口→中埔山東峰步道交界處	600
(WS-21)	中埔山東峰步道	軍功山步道交界處→中埔山東峰→辛亥路水泥陡坡終點	700
(WS-22)	土地公嶺步道	崇德街→安祿宮	500

表17　登山步道(續2)

113年12月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
南港區小計		**13 條**	**11 459**
(NG-01)	南港山(一)中華技術學院	中華技術學院→南港山鞍部→分界點	1 970
(NG-02)	南港山(二)北興宮	南港山鞍部→北興宮(含入口意象範圍)	685
(NG-03)	南港山(三)麗山橋口	研究院路四段50巷→南港山鞍部(含入口意象範圍)	1 175
(NG-04)	九五峰	南港山鞍部→姆指山山頂陵線	2 165
(NG-05)	更寮步道	舊莊街二段122巷→土庫岳→大豐產業道路	2 450
(NG-06)	栳寮步道	舊莊街二段232巷→魏靜時故居(含入口意象範圍)	440
(NG-07)	桂花林步道＋2條支線	舊莊街二段添進茶園→南港茶葉製造示範廠第2停車場	495
(NG-08)	桂花吊橋步道＋支線	舊莊街二段寶豐庭茶莊→舊莊路2段328號	305
(NG-09)	桂花吊橋親水步道	舊莊街二段寶樹橋旁→桂花吊橋	170
(NG-10)	桂花亭步道	桂花亭入口意象→舊莊街二段步道口(含入口意象範圍)	200
(NG-11)	明聖步道	無極明聖宮旁至國家生技園區範圍前	76
(NG-12)	余氏古厝步道	余氏古厝後方至桂花亭步道	328
(NG-13)	妙高臺步道	拇指山馬蹄形平臺-紫雲街75號	1 000
內湖區小計		**24 條**	**24 672**
(NH-01)	碧湖步道	內湖路三段碧湖步道口→新福本坑出口(葉氏祖廟前)(含步道兩端的入口意象範圍)	1 300
(NH-02)	大溝溪溪畔步道	大湖山莊街底大溝溪公園涼亭外→鯉魚山50m處相接	680
(NH-03)	圓覺寺步道	鯉魚山叉路→瀑布潭→圓覺寺步道口→峰碧塔門口	1 185
(NH-04)	鯉魚山步道	碧山路→葉氏祖廟(含入口意象範圍)	1 065
(NH-05)	碧山巖步道	碧山路23號→碧山巖	346
(NH-06)	忠勇山步道	慈聖宮→忠勇山頂	800
(NH-07)	忠勇山越嶺步道	碧山巖→忠勇山→林氏墓園→金龍產業道路	1 660
(NH-08)	大崙尾山步道圓明寺支線	大崙尾山打印臺→湧泉寺(圓明寺門前)	3 180
(NH-A1)	碧山露營場步道	碧山工作站→露營場	86
(NH-A2)	碧山露營場下方木棧道	碧山工作站→露營場＋串連道(枕木步道交會)	272
(NH-A3)	碧山露營場枕木步道	碧山工作站→自然生態教室→營地側門	1 088
(NH-09)	白鷺鷥山步道	老公祠福佑宮→白鷺鷥山→金湖路268號進入(含入口意象範圍)	1 845

Table 17　Hiking Trails (Cont. 3)

End of December 2024

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
(NH-10)	康樂山步道	成功路5段山海寺牌樓→安泰街水源頭福德宮	1 470
(NH-11)	明舉山步道	安泰街打印臺→內溝溪生態展示館前	1 450
(NH-12)	康樂街步道	康樂街236號內溝里民活動中心→六角木造涼亭	383
(NH-13)	龍船岩步道碧山路支線	碧山路62號→龍船岩叉路口(福德宮)	368
(NH-14)	龍船岩步道開眼山支線	開眼山→龍船岩	554
(NH-15)	龍船岩步道五路財神廟支線	龍船岩叉路(福德宮)→五路財神廟	1 330
(NH-16)	金面山步道	內湖步道叉路→金龍里福德宮(剪刀石→小金面)	2 786
(NH-17)	採石場步道	環山路一段136巷底→打印臺前叉路(論劍亭上方)(含入口意象範圍)(136巷入口旁新設步道及涼亭)	730
(NH-18)	竹月寺步道	採石場步道40m叉路右經竹月寺→金面山稜線	1 080
(NH-19)	金面山68巷支線步道	環山路二段68巷底→金面山稜線泰安亭	464
(NH-20)	郭氏古厝步道	內湖文德路步道口→郭氏古厝	100
(NH-21)	大湖里步道	大溝溪親水公園入口旁	450
士林區小計		**26 條**	**23 100**
(SL-01)	風櫃嘴步道	溪山里至善路三段336巷51號至風櫃嘴步道口	614
(SL-02)	大崎頭步道	至善路三段370巷步道口至坪頂古圳清風亭	1 030
(SL-03)	坪頂古圳步道	至善路三段370巷29號步道口至平菁街95巷步道口	1 350
(SL-04)	鵝尾山步道礁坑橋支線(平溪步道)	至善路3段181巷5弄→平等國小旁平菁路105巷底	1 345
(SL-05)	鵝尾山步道簡厝支線	至善路三段277巷→至善路3段371巷20弄	303
(SL-06)	平菁步道	至善路三段71巷步道口→平菁街140號	929
(SL-07)	竹林步道	平菁路42巷禾豐餐廳停車場旁至公平橋	525
(SL-08)	永圳步道	永公路350巷反射境後直行到路底至圳溝邊(距公平橋300m)	320
(SL-09)	水管路步道	中山北路七段232巷1弄→愛富三街(含入口意象範圍)	2 600
(SL-10)	下竹林步道	中山北路七段190巷112號→仁民路	1 034
(SL-11)	婆婆橋步道	至善路二段266巷底→劍南路口圓明寺前(舊路200M)	555
(SL-12)	鄭成功廟步道	劍南路鄭成功廟旁→上方九蓮寺叉路	312
(SL-13)	大崙頭山步道	碧山路(含大崙湖周邊步道)→山頂	515
(SL-14)	大崙頭森林步道	碧溪產業道路1.7K森林步道口→稜線步道(含入口意象範圍)	833

表17　登山步道(續4)

113年12月底

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
(SL-15)	大崙頭自然步道	碧溪產業道路2.4K枕木步道口→稜線步道(含入口意象範圍)	620
(SL-16)	大崙頭北面步道	大崙頭山頂→碧山路50號民宅前	960
(SL-17)	望獅步道	藥用植物園旁→碧溪產業道路0+150	420
(SL-18)	瞭望臺步道	碧溪產道2.25K下方碎石步道→高架瞭望臺(2.45K)(含瞭望臺下方休憩平臺)	200
(SL-19)	碧溪步道	碧溪產業道路1.5K石頭屋→大崙尾山步道2120m+新增枕木步道390m+舊枕木70m+(靶場支線88m)	1 450
(SL-20)	翠山(靶場)步道	中社路二段路底至碧溪步道交會處	1 145
(SL-21)	大崙尾山中社路支線	中社路二段→山頂	870
(SL-22)	大崙尾山步道碧山路支線	碧山路→大崙尾山頂	740
(SL-23)	翠山街步道	中社路2段公車終點站旁至翠山街口雙福宮	200
(SL-24)	雙溪國小步道	雙溪國小旁步道口至中社路2段明溪街口	330
(SL-25)	雙溪溝古道	萬溪右線產業道路→五指山產業道路	900
(SL-26)	五指山古道	梅花山-大崙頭北面步道叉路口	3 000
北投區		**34 條**	**22 821**
(BT-01)	忠義山步道	忠義廟→親山步道打印臺	850
(BT-02)	楓丹白露步道	忠義山打印臺→楓丹白露社區前入口意象(含入口意象範圍)	450
(BT-03)	下青礐步道	貴子坑水保教室前→下青礐(復興三路)	1 727
(BT-04)	貴子坑步道	親山步道打印臺→貴子坑露營場對面步道口	1 330
(BT-05)	上清宮步道	復興三路212號→中清礐	880
(BT-06)	永春寮步道	復興三路300巷底→中正山產業道路中段(增長至上清宮對面水泥橋)(增長322m)	760
(BT-07)	永春寮溪步道	上清宮'旁步道口→復興三路310巷步道口	350
(BT-08)	白宮山莊步道	復興四路105巷10號→復興三路白宮山莊	520
(BT-09)	郵政訓練所步道	登山路61號→郵政訓練中心(含入口意象範圍)	906
(BT-10)	法雨寺步道	泉源產業道路→法雨寺+墓園支線(登山路40號至墓園邊200m)	924
(BT-11)	中正山親山步道	登山路立祥商店步道口→前行180m	180
(BT-12)	中正山嶺頭步道	拓印亭對面步道口→中正山停車場步道口	800
(BT-13)	青楓步道	大梯田旁步道口→竹子湖產業道路2K+650	300
(BT-14)	頂湖海芋步道	名陽匐農場旁步道口→海芋田景觀木橋	160
(BT-15)	猴崁步道	竹子湖路下切左轉→猴崁產業道路	350

Table 17　Hiking Trails (Cont. 5 End)

End of December 2024

區別(編號) District (No.)	登山步道路線 Hiking Trail	起迄點 Start Point/End Point	總長(公尺) Length (m)
(BT-16)	水尾巴拉卡步道	竹子湖水尾公車站→巴拉卡公路	518
(BT-17)	湖田國小步道	竹子湖9號→猴炭產業道路(1K＋100)	650
(BT-18)	水車寮步道	湖田國小停車場旁步道口→大樹下土雞城步道口	550
(BT-19)	軍艦岩步道	陽明醫學院步道口→軍艦岩前叉路	500
(BT-20)	照明寺步道	軍艦岩下泥土步道→照明禪寺	1 230
(BT-21)	丹鳳山步道	照明寺旁丹鳳山入口→中和禪寺	1 300
(BT-22)	半嶺步道	(向前延伸至湖底路)紅檀前方30m步道口→欄杆橋頭福德宮	1 200
(BT-23)	橫嶺古道	湖山路一段步道口→紅檀停車場	800
(BT-24)	湖山國小步道	湖底路48號湖山國小旁→湖山路25之1號	568
(BT-25)	風尾步道	東昇路38號前步道口→東昇路68-15號	291
(BT-26)	泉源紗帽步道	泉源路232號上方路口至紗帽路10號巷口（對面至山谷下步道）	684
(BT-27)	淨水廠步道	泉源路260號淨水廠旁步道口→水圳步道邊	132
(BT-28)	鼎筆橋步道	鼎筆橋→東昇路(頂湖福德宮)	363
(BT-29)	陽峰古道	陽峰古道入口→鼎筆橋旁	1 100
(BT-30)	磺溪溫泉步道	行義路260巷天祥溫泉前步道口→行義路402巷皇池溫泉停車場旁步道口	750
(BT-31)	硫磺谷步道	東昇路往硫磺谷福德宮巷口→東昇路與行義路交會處(過磺港溪)	236
(BT-32)	忠義山步道-坪頂路支線	忠義山步道→坪頂路口(稻香路口)	800
(BT-33)	國華練習場至貴子坑步道	國華練習場至貴子坑步道	300
(BT-34)	湖山秘徑	四O砲陣地樓梯前→涼亭(陽明山第二停車場)	362

資料來源：大地工程處。　　Source: Geotechnical Engineering Office

表18　土地人口概況

Table 18　Land and Population

年（月）底別 End of Year(Month)		土地面積 Land (平方公里) (k㎡)	戶籍戶數 No. of Households (戶) (no.)	人口數(人) Population (person) 總計 Grend Total	男 Male	女 Female	人口密度 Population Density (人/平方公里) (person/ k㎡)
民國 88 年底	**End of 1999**	**271.7997**	**879 156**	**2 641 312**	**1 309 434**	**1 331 878**	**9 718**
民國 89 年底	**End of 2000**	**271.7997**	**888 560**	**2 646 474**	**1,309,308**	**1,337,166**	**9,737**
民國 90 年底	**End of 2001**	**271.7997**	**894 763**	**2 633 802**	**1 300 179**	**1 333 623**	**9 690**
民國 91 年底	**End of 2002**	**271.7997**	**906 988**	**2 641 856**	**1 301 458**	**1 340 398**	**9 720**
民國 92 年底	**End of 2003**	**271.7997**	**914 716**	**2 627 138**	**1 291 742**	**1 335 396**	**9 666**
民國 93 年底	**End of 2004**	**271.7997**	**923 325**	**2 622 472**	**1 286 303**	**1 336 169**	**9 649**
民國 94 年底	**End of 2005**	**271.7997**	**933 110**	**2 616 375**	**1 279 513**	**1 336 862**	**9 626**
民國 95 年底	**End of 2006**	**271.7997**	**941 317**	**2 632 242**	**1 282 691**	**1 349 551**	**9 684**
民國 96 年底	**End of 2007**	**271.7997**	**947 745**	**2 629 269**	**1 277 556**	**1 351 713**	**9 674**
民國 97 年底	**End of 2008**	**271.7997**	**958 433**	**2 622 923**	**1 270 948**	**1 351 975**	**9 650**
民國 98 年底	**End of 2009**	**271.7997**	**969 418**	**2 607 428**	**1 260 450**	**1 346 978**	**9 593**
民國 99 年底	**End of 2010**	**271.7997**	**983 237**	**2 618 772**	**1 262 554**	**1 356 218**	**9 635**
民國 100 年底	**End of 2011**	**271.7997**	**999 879**	**2 650 968**	**1 276 343**	**1 374 625**	**9 753**
民國 101 年底	**End of 2012**	**271.7997**	**1 017 063**	**2 673 226**	**1 285 361**	**1 387 865**	**9 835**
民國 102 年底	**End of 2013**	**271.7997**	**1 026 738**	**2 686 516**	**1 289 945**	**1 396 571**	**9 884**
民國 103 年底	**End of 2014**	**271.7997**	**1 037 402**	**2 702 315**	**1 295 636**	**1 406 679**	**9 942**
民國 104 年底	**End of 2015**	**271.7997**	**1 043 948**	**2 704 810**	**1 295 462**	**1 409 348**	**9 951**
民國 105 年底	**End of 2016**	**271.7997**	**1 047 284**	**2 695 704**	**1 289 510**	**1 406 194**	**9 918**
民國 106 年底	**End of 2017**	**271.7997**	**1 050 755**	**2 683 257**	**1 281 917**	**1 401 340**	**9 872**
民國 107 年底	**End of 2018**	**271.7997**	**1 056 233**	**2 668 572**	**1 273 375**	**1 395 197**	**9 818**
民國 108 年底	**End of 2019**	**271.7997**	**1 060 880**	**2 645 041**	**1 260 049**	**1 384 992**	**9 732**
民國 109 年底	**End of 2020**	**271.7997**	**1 061 000**	**2 602 418**	**1 238 618**	**1 363 800**	**9 575**
民國 110 年底	**End of 2021**	**271.7997**	**1 052 596**	**2 524 393**	**1 201 966**	**1 322 427**	**9 288**
民國 111 年底	**End of 2022**	**271.7997**	**1 050 981**	**2 480 681**	**1 177 022**	**1 303 659**	**9 127**
民國 112 年底	**End of 2023**	**271.7997**	**1 065 032**	**2 511 886**	**1 187 064**	**1 324 822**	**9 242**
民國 113 年底	**End of 2024**	**271.7997**	**1 071 493**	**2 490 869**	**1 174 537**	**1 316 332**	**9 164**
1月底	End of Jan.	271.7997	1 064 869	2 511 291	1 186 485	1 324 806	9 239
2月底	End of Feb.	271.7997	1 065 028	2 510 477	1 185 840	1 324 637	9 236
3月底	End of Mar.	271.7997	1 065 525	2 509 740	1 185 249	1 324 491	9 234
4月底	End of Apr.	271.7997	1 065 922	2 509 112	1 184 681	1 324 431	9 231
5月底	End of May	271.7997	1 066 580	2 507 673	1 183 803	1 323 870	9 226
6月底	End of June	271.7997	1 067 481	2 506 767	1 183 068	1 323 699	9 223
7月底	End of July	271.7997	1 067 895	2 504 731	1 181 917	1 322 814	9 215
8月底	End of Aug.	271.7997	1 068 859	2 502 093	1 180 471	1 321 622	9 206
9月底	End of Sep.	271.7997	1 070 627	2 498 210	1 178 485	1 319 725	9 191
10月底	End of Oct.	271.7997	1 070 762	2 495 096	1 176 891	1 318 205	9 180
11月底	End of Nov.	271.7997	1 071 024	2 493 210	1 175 842	1 317 368	9 173
12月底	End of Dec.	271.7997	1 071 493	2 490 869	1 174 537	1 316 332	9 164
民國 114 年底	**End of 2025**						
1月底	End of Jan.	271.7997	1 072 189	2 488 680	1 173 374	1 315 306	9 156

資料來源：本府地政局、民政局。

Source: Department of Land , Department of Civil Affairs.

表19　臺灣地區營造工程物價指數

公式：採用拉式公式之變式

年(月)別 Year（Month）		總指數 General Index	水泥及其製品類 Cement & Related Products	砂石及級配類 Sand & Crashed Stone	磚瓦瓷類 Bricks & Tiles	金屬製品類 Metal Products	木材及其製品類 Timber & Related Products
項數 No of Items		115	7	3	5	21	5
權數(千分比) Weights(‰)		1,000	141.07	21.14	13.91	233.42	24.00
基期：民國110年＝100		定基指數					
民國100年	**2011**	**84.03**	**72.26**	**81.52**	**90.12**	**88.45**	**84.17**
民國101年	**2012**	**84.73**	**75.71**	**84.64**	**94.79**	**84.46**	**82.34**
民國102年	**2013**	**84.44**	**77.01**	**85.88**	**97.67**	**79.78**	**83.88**
民國103年	**2014**	**85.99**	**82.05**	**97.25**	**100.37**	**77.98**	**87.78**
民國104年	**2015**	**83.56**	**82.16**	**98.45**	**100.81**	**66.45**	**87.90**
民國105年	**2016**	**82.15**	**77.79**	**96.43**	**100.02**	**65.90**	**84.10**
民國106年	**2017**	**84.13**	**75.30**	**95.58**	**98.95**	**74.69**	**84.03**
民國107年	**2018**	**86.95**	**77.64**	**96.00**	**97.84**	**82.61**	**89.24**
民國108年	**2019**	**88.88**	**88.57**	**100.04**	**97.75**	**80.73**	**90.44**
民國109年	**2020**	**90.14**	**95.97**	**101.19**	**98.53**	**77.63**	**89.86**
民國110年	**2021**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
民國111年	**2022**	**107.36**	**112.91**	**103.32**	**105.43**	**105.69**	**110.46**
民國112年	**2023**	**109.23**	**120.58**	**105.53**	**109.21**	**101.31**	**108.46**
民國113年	**2024**	**111.40**	**124.16**	**107.89**	**109.88**	**99.37**	**105.47**
1月	Jan.	110.26	123.19	107.68	110.48	100.90	105.80
2月	Feb.	110.48	123.63	107.76	110.50	101.08	105.74
3月	Mar.	110.50	123.80	107.33	110.52	100.17	105.77
4月	Apr.	111.07	123.89	107.95	110.54	100.67	105.75
5月	May	111.60	124.13	107.95	109.83	100.56	105.80
6月	June	111.91	124.34	107.95	109.55	99.77	105.56
7月	July	112.02	124.50	107.95	109.35	99.78	105.40
8月	Aug.	111.82	124.62	107.97	109.36	98.72	105.43
9月	Sep.	111.56	124.51	107.99	109.60	97.78	105.41
10月	Oct.	111.75	124.55	108.05	109.60	97.68	105.36
11月	Nov.	112.04	124.39	108.03	109.58	98.12	104.89
12月	Dec.	111.84	124.36	108.02	109.63	97.17	104.74
民國114年	**2025**						
1月	Jan.	111.81	124.57	108.20	109.63	96.44	104.78
		年增率(%)					
民國100年	**2011**	**3.32**	**- 0.43**	**- 3.08**	**2.13**	**7.33**	**10.91**
民國101年	**2012**	**0.83**	**4.77**	**3.83**	**5.18**	**- 4.51**	**- 2.17**
民國102年	**2013**	**- 0.34**	**1.72**	**1.47**	**3.04**	**- 5.54**	**1.87**
民國103年	**2014**	**1.84**	**6.54**	**13.24**	**2.76**	**- 2.26**	**4.65**
民國104年	**2015**	**-2.83**	**0.13**	**1.23**	**0.44**	**-14.79**	**0.14**
民國105年	**2016**	**- 1.69**	**- 5.32**	**- 2.05**	**- 0.78**	**- 0.83**	**- 4.32**
民國106年	**2017**	**2.41**	**-3.20**	**-0.88**	**-1.07**	**13.34**	**-0.08**
民國107年	**2018**	**3.35**	**3.11**	**0.44**	**-1.12**	**10.60**	**6.20**
民國108年	**2019**	**2.22**	**14.08**	**4.21**	**-0.09**	**-2.28**	**1.34**
民國109年	**2020**	**1.42**	**8.35**	**1.15**	**0.80**	**-3.84**	**-0.64**
民國110年	**2021**	**10.94**	**4.20**	**-1.18**	**1.49**	**28.82**	**11.28**
民國111年	**2022**	**7.36**	**12.91**	**3.32**	**5.43**	**5.69**	**10.46**
民國112年	**2023**	**1.74**	**6.79**	**2.14**	**3.59**	**-4.14**	**-1.81**
民國113年	**2024**	**1.99**	**2.97**	**2.24**	**0.61**	**-1.91**	**-2.76**
1月	Jan.	1.44	3.04	2.75	2.43	-1.73	-5.10
2月	Feb.	1.16	3.04	2.67	2.25	-2.37	-4.47
3月	Mar.	0.92	3.11	2.19	2.26	-3.98	-4.25
4月	Apr.	1.34	3.10	2.77	2.12	-3.10	-4.12
5月	May	2.39	3.30	2.75	1.33	-0.58	-3.63
6月	June	2.90	3.38	2.75	0.96	0.01	-2.72
7月	July	2.81	3.20	2.34	-0.46	-0.13	-1.98
8月	Aug.	2.55	3.11	2.37	-0.52	-1.21	-1.69
9月	Sep.	2.11	2.84	2.43	-0.72	-2.58	-1.11
10月	Oct.	2.07	2.67	1.83	-0.72	-2.31	-1.05
11月	Nov.	2.43	2.51	1.37	-0.73	-1.38	-1.45
12月	Dec.	1.78	2.29	0.62	-0.70	-3.45	-1.24
民國114年	**2025**						
1月	Jan.	1.41	1.12	0.48	-0.77	-4.42	-0.96

資料來源：行政院主計總處《物價統計月報》。

說　　明：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正。

Table 19 Indices of Construction Cost in Taiwan Area

Formula: Laspeyres's Formula

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類 Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
8	4	16	2	15	29
19.55	9.30	120.19	19.07	57.58	340.76
Fixed Index				Base Period：2021=100	
72.57	**89.06**	**89.97**	**97.58**	**86.31**	**85.01**
75.39	**94.07**	**89.42**	**104.09**	**88.97**	**86.18**
78.78	**95.89**	**88.50**	**106.01**	**90.62**	**86.98**
80.97	**97.01**	**88.53**	**105.98**	**92.29**	**88.52**
78.71	**96.81**	**86.14**	**100.79**	**92.26**	**89.65**
78.58	**96.59**	**83.60**	**97.17**	**92.45**	**89.69**
81.95	**96.25**	**87.05**	**96.40**	**93.44**	**90.08**
84.33	**97.49**	**89.64**	**97.15**	**94.75**	**90.59**
85.41	**98.10**	**89.46**	**100.28**	**96.05**	**91.73**
87.23	**98.19**	**89.10**	**97.74**	**97.01**	**94.02**
100.00	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
102.49	**104.48**	**110.22**	**113.19**	**107.81**	**105.36**
100.61	**106.09**	**113.18**	**118.53**	**112.54**	**108.35**
101.42	**106.47**	**117.58**	**118.20**	**116.02**	**112.44**
99.06	106.47	113.76	117.82	113.44	110.33
99.65	106.47	113.75	117.82	113.57	110.61
100.21	106.47	113.98	117.75	113.78	111.10
100.37	106.47	115.33	117.67	115.03	111.69
101.03	106.47	118.26	117.67	115.45	112.10
101.56	106.47	119.92	118.29	116.82	112.62
102.29	106.47	119.45	118.17	116.97	112.98
102.46	106.47	119.34	117.95	117.01	113.09
102.37	106.47	118.50	117.95	117.44	113.25
102.41	106.49	119.31	117.95	117.20	113.59
102.83	106.50	119.93	118.59	117.64	113.91
102.80	106.47	119.44	120.79	117.87	114.01
102.81	106.47	119.76	121.64	118.69	114.02
Annual Change Rate (%)					
6.30	**9.44**	**5.86**	**3.42**	**3.83**	**1.26**
3.89	**5.63**	**- 0.61**	**6.67**	**3.08**	**1.38**
4.50	**1.93**	**- 1.03**	**1.84**	**1.85**	**0.93**
2.78	**1.17**	**0.03**	**- 0.03**	**1.84**	**1.77**
-2.79	**-0.21**	**-2.70**	**-4.90**	**-0.03**	**1.28**
- 0.17	**- 0.23**	**- 2.95**	**- 3.59**	**0.21**	**0.04**
4.29	**-0.35**	**4.13**	**-0.79**	**1.07**	**0.43**
2.90	**1.29**	**2.98**	**0.78**	**1.40**	**0.57**
1.28	**0.63**	**-0.20**	**3.22**	**1.37**	**1.26**
2.13	**0.09**	**-0.40**	**-2.53**	**1.00**	**2.50**
14.64	**1.84**	**12.23**	**2.31**	**3.08**	**6.36**
2.49	**4.48**	**10.22**	**13.19**	**7.81**	**5.36**
-1.83	**1.54**	**2.69**	**4.72**	**4.39**	**2.84**
0.81	**0.36**	**3.89**	**-0.28**	**3.09**	**3.77**
-1.18	0.38	1.63	-1.60	2.64	3.24
-1.37	0.38	0.72	-1.60	2.63	3.12
-1.75	0.38	0.89	-1.66	2.93	3.38
-0.78	0.38	1.76	-1.59	2.88	3.63
0.65	0.38	4.17	-0.88	2.81	3.95
1.25	0.44	6.04	-0.35	2.85	4.20
2.06	0.44	5.71	0.56	2.88	4.16
1.86	0.43	5.32	0.37	2.74	4.25
0.66	0.43	4.45	0.21	3.04	4.27
1.26	0.40	4.87	0.11	3.49	3.80
3.77	0.16	5.90	0.65	4.00	3.79
3.35	0.13	5.18	2.52	4.14	3.48
3.79	0.00	5.27	3.24	4.63	3.34

Source: Price Statistics Monthly in Taiwan Area, R.O.C. (Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan.)

Explanation: All data are subject to revision 3 months after original publication due to late reports and corrections by respondents.

表20　臺北市營造工程物價指數

公式：價比基期值加權算術平均式

年(月)別 Year（Month）		總指數 General Index	水泥及其製品類 Cement & Related Products	砂石及級配類 Sand & Crashed Stone	磚瓦瓷類 Bricks & Tiles	金屬製品類 Metal Products	木材及其製品類 Timber & Related Products
項數 No of Items		115	7	3	5	21	5
權數(千分比) Weights(‰)		1,000.00	132.62	15.42	16.46	238.27	25.36
基期：民國110年＝100		定　基　指　數					
民國100年	**2011**	**84.71**	**75.40**	**90.05**	**107.14**	**89.90**	**90.31**
民國101年	**2012**	**85.25**	**77.51**	**90.53**	**110.78**	**85.63**	**86.36**
民國102年	**2013**	**84.69**	**78.34**	**93.21**	**112.11**	**80.43**	**86.44**
民國103年	**2014**	**85.87**	**83.80**	**102.79**	**112.34**	**79.09**	**89.47**
民國104年	**2015**	**83.54**	**82.57**	**103.90**	**111.69**	**68.96**	**88.75**
民國105年	**2016**	**82.03**	**77.27**	**102.31**	**108.55**	**68.25**	**83.12**
民國106年	**2017**	**83.51**	**75.66**	**102.56**	**106.16**	**76.11**	**81.86**
民國107年	**2018**	**86.22**	**80.44**	**102.62**	**103.20**	**83.55**	**84.76**
民國108年	**2019**	**88.65**	**92.20**	**103.81**	**102.24**	**81.69**	**86.52**
民國109年	**2020**	**90.21**	**96.99**	**108.46**	**100.13**	**78.51**	**87.15**
民國110年	**2021**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
民國111年	**2022**	**107.51**	**114.96**	**104.81**	**104.77**	**106.26**	**108.20**
民國112年	**2023**	**109.62**	**123.20**	**109.15**	**109.96**	**101.80**	**106.54**
民國113年	**2024**	**110.72**	**125.37**	**110.21**	**111.05**	**100.30**	**104.61**
1月	Jan.	110.42	124.82	110.21	110.98	101.77	104.57
2月	Feb.	110.53	125.13	110.21	110.98	102.02	104.57
3月	Mar.	110.25	125.29	110.21	110.98	101.11	104.57
4月	Apr.	110.54	125.33	110.21	110.98	101.68	104.57
5月	May	110.99	125.39	110.21	111.09	101.64	104.57
6月	June	111.00	125.43	110.21	111.09	100.66	104.63
7月	July	111.01	125.47	110.21	111.09	100.81	104.63
8月	Aug.	110.71	125.47	110.21	111.09	99.59	104.63
9月	Sep.	110.49	125.47	110.21	111.09	98.77	104.63
10月	Oct.	110.66	125.51	110.21	111.09	98.59	104.63
11月	Nov.	111.19	125.56	110.21	111.09	99.00	104.63
12月	Dec.	110.87	125.62	110.21	111.09	97.91	104.63
民國114年	**2025**						
1月	Jan.	110.77	125.67	110.21	111.09	97.15	104.77
		年　增　率　(%)					
民國100年	**2011**	**2.82**	**- 1.38**	**- 0.51**	**1.01**	**7.05**	**5.33**
民國101年	**2012**	**0.64**	**2.80**	**0.53**	**3.39**	**- 4.74**	**- 4.37**
民國102年	**2013**	**- 0.65**	**1.08**	**2.96**	**1.21**	**- 6.08**	**0.09**
民國103年	**2014**	**1.39**	**6.97**	**10.29**	**0.20**	**- 1.66**	**3.51**
民國104年	**2015**	**- 2.72**	**- 1.48**	**1.07**	**- 0.58**	**- 12.81**	**- 0.81**
民國105年	**2016**	**- 1.81**	**- 6.42**	**- 1.53**	**- 2.81**	**- 1.03**	**- 6.34**
民國106年	**2017**	**1.81**	**- 2.08**	**0.24**	**- 2.21**	**11.52**	**- 1.51**
民國107年	**2018**	**3.24**	**6.31**	**0.06**	**- 2.78**	**9.77**	**3.53**
民國108年	**2019**	**2.82**	**14.63**	**1.16**	**- 0.94**	**- 2.22**	**2.08**
民國109年	**2020**	**1.77**	**5.20**	**4.48**	**- 2.06**	**- 3.89**	**0.73**
民國110年	**2021**	**10.85**	**3.10**	**- 7.80**	**- 0.13**	**27.37**	**14.74**
民國111年	**2022**	**7.51**	**14.96**	**4.81**	**4.77**	**6.26**	**8.20**
民國112年	**2023**	**1.96**	**7.17**	**4.14**	**4.94**	**- 4.21**	**- 1.53**
民國113年	**2024**	**1.00**	**1.76**	**0.97**	**0.99**	**- 1.47**	**- 1.81**
1月	Jan.	1.40	1.54	1.96	2.14	- 1.27	- 3.86
2月	Feb.	0.89	1.79	1.96	1.71	- 1.62	- 3.86
3月	Mar.	0.31	1.92	1.96	1.71	- 3.43	- 3.86
4月	Apr.	0.61	1.95	1.96	1.71	- 2.32	- 3.86
5月	May	1.67	2.00	1.96	1.81	0.39	- 3.86
6月	June	1.59	1.80	1.96	- 0.40	0.28	- 1.71
7月	July	1.39	1.66	-	1.45	0.24	- 0.30
8月	Aug.	1.09	1.66	-	1.45	- 0.99	- 0.30
9月	Sep.	0.52	1.66	-	0.10	- 2.29	0.06
10月	Oct.	0.57	1.69	-	0.10	- 2.11	0.06
11月	Nov.	1.36	1.73	-	0.10	- 1.01	0.06
12月	Dec.	0.72	1.78	-	0.10	- 3.41	0.06
民國114年	**2025**						
1月	Jan.	0.32	0.68	-	0.10	- 4.54	0.19

資料來源：本府主計處《臺北市物價統計月報》。

Table 20 Indices of Construction Cost in Taipei City

塑膠製品類 Plastic Products	油漆塗裝類 Paints	機電設備類 Electrical Equipment & Apparatus	瀝青及其製品類 Asphalt & Related Products	雜項材料類 Miscellaneous Products	勞務類 Services
8	4	16	2	15	29
19.47	9.91	114.97	18.44	56.98	352.09
Fixed Index					Base Period：2021=100
71.97	**93.60**	**93.31**	**107.26**	**87.71**	**81.49**
74.23	**98.06**	**93.15**	**112.03**	**89.46**	**83.64**
77.00	**102.27**	**92.39**	**113.31**	**90.23**	**84.49**
78.58	**102.44**	**91.95**	**112.65**	**92.26**	**85.16**
75.52	**102.44**	**90.21**	**102.52**	**94.97**	**86.03**
76.74	**101.97**	**88.35**	**97.90**	**95.96**	**85.95**
80.39	**99.87**	**90.41**	**96.18**	**94.92**	**85.98**
79.93	**99.86**	**92.39**	**97.91**	**95.74**	**86.16**
83.52	**99.86**	**92.14**	**102.16**	**96.26**	**88.43**
85.41	**99.98**	**90.79**	**100.48**	**96.40**	**92.71**
100.00	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
101.84	**100.55**	**108.29**	**105.95**	**109.56**	**105.49**
97.47	**100.74**	**110.48**	**107.50**	**113.98**	**109.41**
96.36	**100.79**	**113.92**	**106.40**	**117.88**	**111.16**
93.88	100.77	110.59	106.81	115.29	111.12
94.50	100.77	110.57	106.81	115.36	111.12
95.47	100.77	110.56	106.20	115.66	110.82
95.47	100.77	111.36	105.90	116.80	110.82
95.47	100.77	114.71	105.90	117.06	110.95
96.40	100.77	116.00	105.90	118.28	110.95
97.25	100.77	115.48	105.90	118.52	110.95
97.30	100.77	115.34	105.90	118.67	110.95
97.30	100.77	114.69	105.90	119.61	110.95
97.30	100.83	115.70	105.90	119.46	111.24
97.97	100.83	116.33	107.47	119.88	112.03
97.97	100.83	115.66	108.26	119.93	112.03
97.97	100.83	115.78	110.24	121.12	111.90
Annual Change Rate (%)					
7.84	**5.98**	**3.44**	**2.67**	**1.86**	**1.65**
3.15	**4.77**	**- 0.17**	**4.45**	**2.00**	**2.64**
3.73	**4.29**	**- 0.82**	**1.14**	**0.86**	**1.01**
2.05	**0.16**	**- 0.48**	**-0.58**	**2.24**	**0.79**
- 3.90	**0.00**	**- 1.89**	**-9.00**	**2.94**	**1.03**
1.62	**- 0.46**	**- 2.07**	**-4.50**	**1.04**	**-0.09**
4.76	**- 2.06**	**2.34**	**-1.76**	**-1.08**	**0.03**
- 0.57	**- 0.01**	**2.19**	**1.80**	**0.86**	**0.21**
4.49	**0.00**	**- 0.28**	**4.34**	**0.54**	**2.63**
2.26	**0.12**	**- 1.47**	**-1.65**	**0.15**	**4.84**
17.08	**0.02**	**10.15**	**-0.48**	**3.73**	**7.86**
1.84	**0.55**	**8.29**	**5.95**	**9.56**	**5.49**
- 4.29	**0.19**	**2.03**	**1.47**	**4.04**	**3.72**
- 1.14	**0.05**	**3.11**	**-1.02**	**3.42**	**1.60**
- 3.80	0.07	1.20	-1.76	2.74	3.69
- 4.44	0.07	0.44	-1.76	2.76	2.69
- 4.05	0.07	0.53	-2.32	3.07	2.06
- 3.24	0.07	0.60	-2.59	3.00	2.15
- 1.97	0.07	3.62	-0.85	2.91	2.22
- 0.57	-	4.56	-0.85	2.68	1.73
0.31	-	4.44	-0.85	2.86	1.11
- 0.22	-	4.18	-0.85	2.99	1.11
- 2.29	-	3.53	-1.42	3.81	0.59
- 1.68	0.06	4.25	-0.85	4.37	0.23
4.88	0.06	5.35	0.62	4.89	0.87
3.94	0.06	4.61	1.36	4.93	0.83
4.36	0.06	4.69	3.21	5.06	0.70

Source: Price Statistics Monthly in Taipei City, R.O.C. (Department of Budget, Accounting and Statistics, Taipei City Government.)

臺北市工務統計月報

出　版　機　關：臺北市政府工務局

地　　　　　址：11008 臺北市信義區市府路1號4樓西南區

電　　　　　話：1999(外縣市02-27208889)轉1404

網　　　　　址：https://pwd.gov.taipei

發　　行　　人：黃一平

編　　　　　輯：臺北市政府工務局統計室

出　版　年　月：中華民國 114年2月

創　刊　年　月：中華民國 73年 1月

刊　期　頻　率：月刊

THE TAIPEI CITY STATISTICAL MONTHLY BULLETIN OF PUBLIC WORKS

Published by the Public Works Department, Taipei City Goverment

Address: Southwest Wing, 4F., No.1, City Hall Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11008, Taiwan (R.O.C.)

Telephone No: Please dial the 1999 Citizen Hotline (02-2720-8889 outside Taipei City) ext. 1404

Publisher: I-Ping Huang

Edited by the Statistics Office of PWD, TCG

Website: https://pwd.gov.taipei

Publishing Date: February 2025

First Edition: January 1984

1999網頁版

台北通APP
