富民生態公園整建工程

樹 木 移 植 計 畫 書

主辦機關：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

設計單位：[redacted]

115年07月

目錄

1　工程概述----------1
2　基地環境概述----------1
3　申請移植樹木之理由----------5
4　欲移植樹木之樹籍基本資料----------6
5　非屬受保護樹木之證明文件----------14
6　斷根及移植預定期程----------14
7　樹木移植計畫----------15
8　經費預算----------23
附件1 移植樹木識別牌----------23
附件2 喬木移植媒合資料----------24

1　工程概述

1.1工程名稱：富民生態公園整建工程

1.2主辦機關：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

1.3承攬廠商：[redacted]

1.4監造單位：

1.5工程地點：富民生態公園

1.6契約金額：新臺幣 47,634,690 元整。

1.7工程期限：預計 115 年 7 月~ 116 年 5 月

1.8工程內容：

本工程包含施作本市富民生態公園之樹木移植。地點於松山區新東街41-7號，樹木有賊仔樹、山櫻花、九芎、福木、酪梨、阿勃勒等6種，共7株。

2　基地環境概述

2.1基地交通位置

圖2-1 基地位置圖

2.2全區平面配置及施工範圍圖

本案樹木移植地點位於松山區新東街41-7號、富民生態公園，共計移植樹木7株。

圖2-2 平面配置及樹木點位圖

2.3定植平面配置及施工範圍圖

本案樹木 C071、C074由機關供盆，上盆至指定位置，C079、C080為區外移植，C059、C159、C183為區內移植。定植地點基地圖示如下：

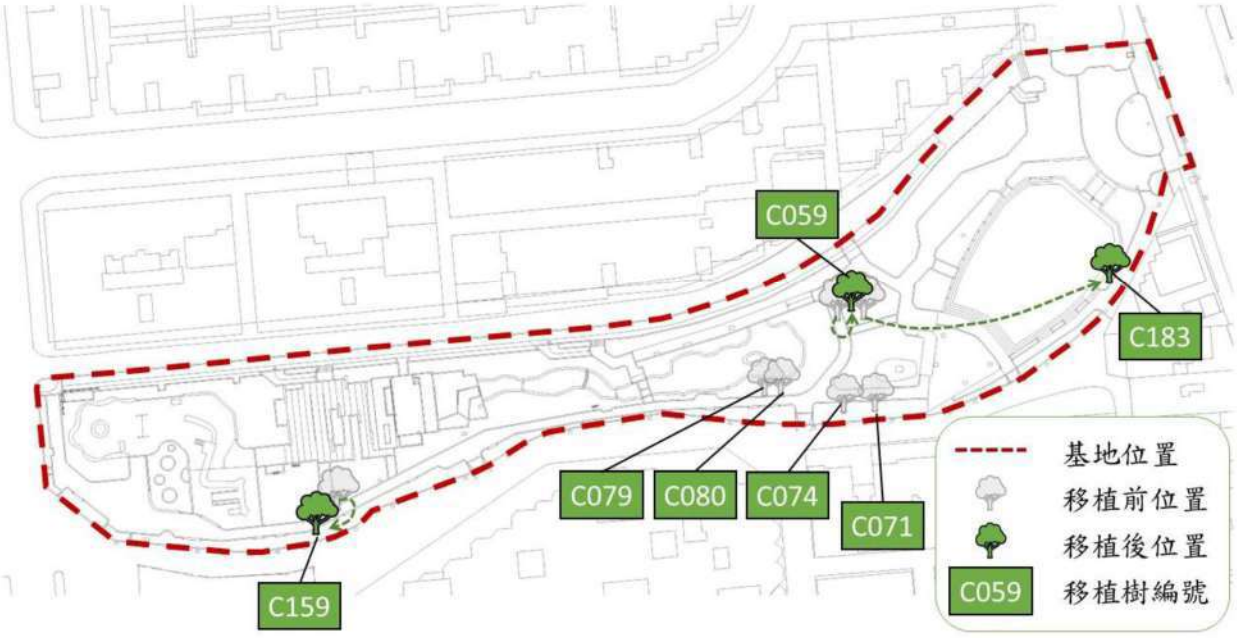

圖2-3 平面配置及樹木點位圖

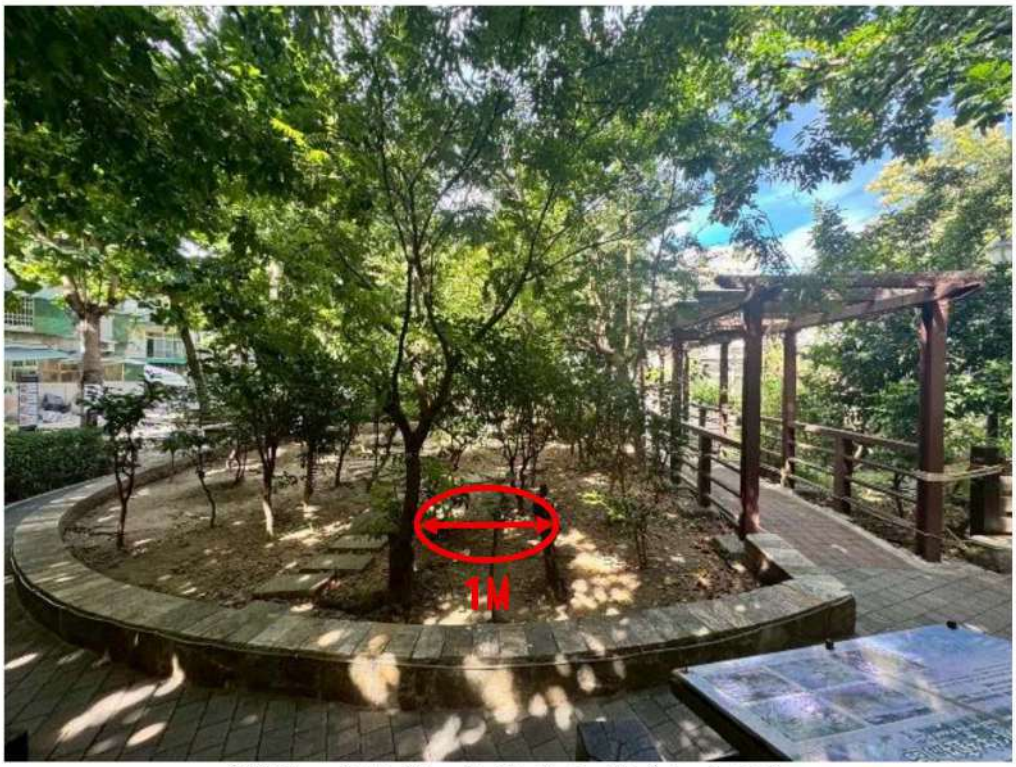

C059 賊仔樹 移植後位置(本公園)

陽光尚充足，土質尚可，無積水，無目視病蟲害

C159 山櫻花 移植後位置(本公園)

陽光充足，土質尚可，無積水，無目視病蟲害

C183 九芎 移植後位置(本公園)

陽光充足，土質尚可，無積水，無目視病蟲害

C079、080 阿勃勒 移植後位置(明水公園)

陽光充足，土質尚可，無積水，無目視病蟲害

3　申請移植樹木之理由

與設計後之人行動線衝突、周邊樹冠過於密集導致生長不良。

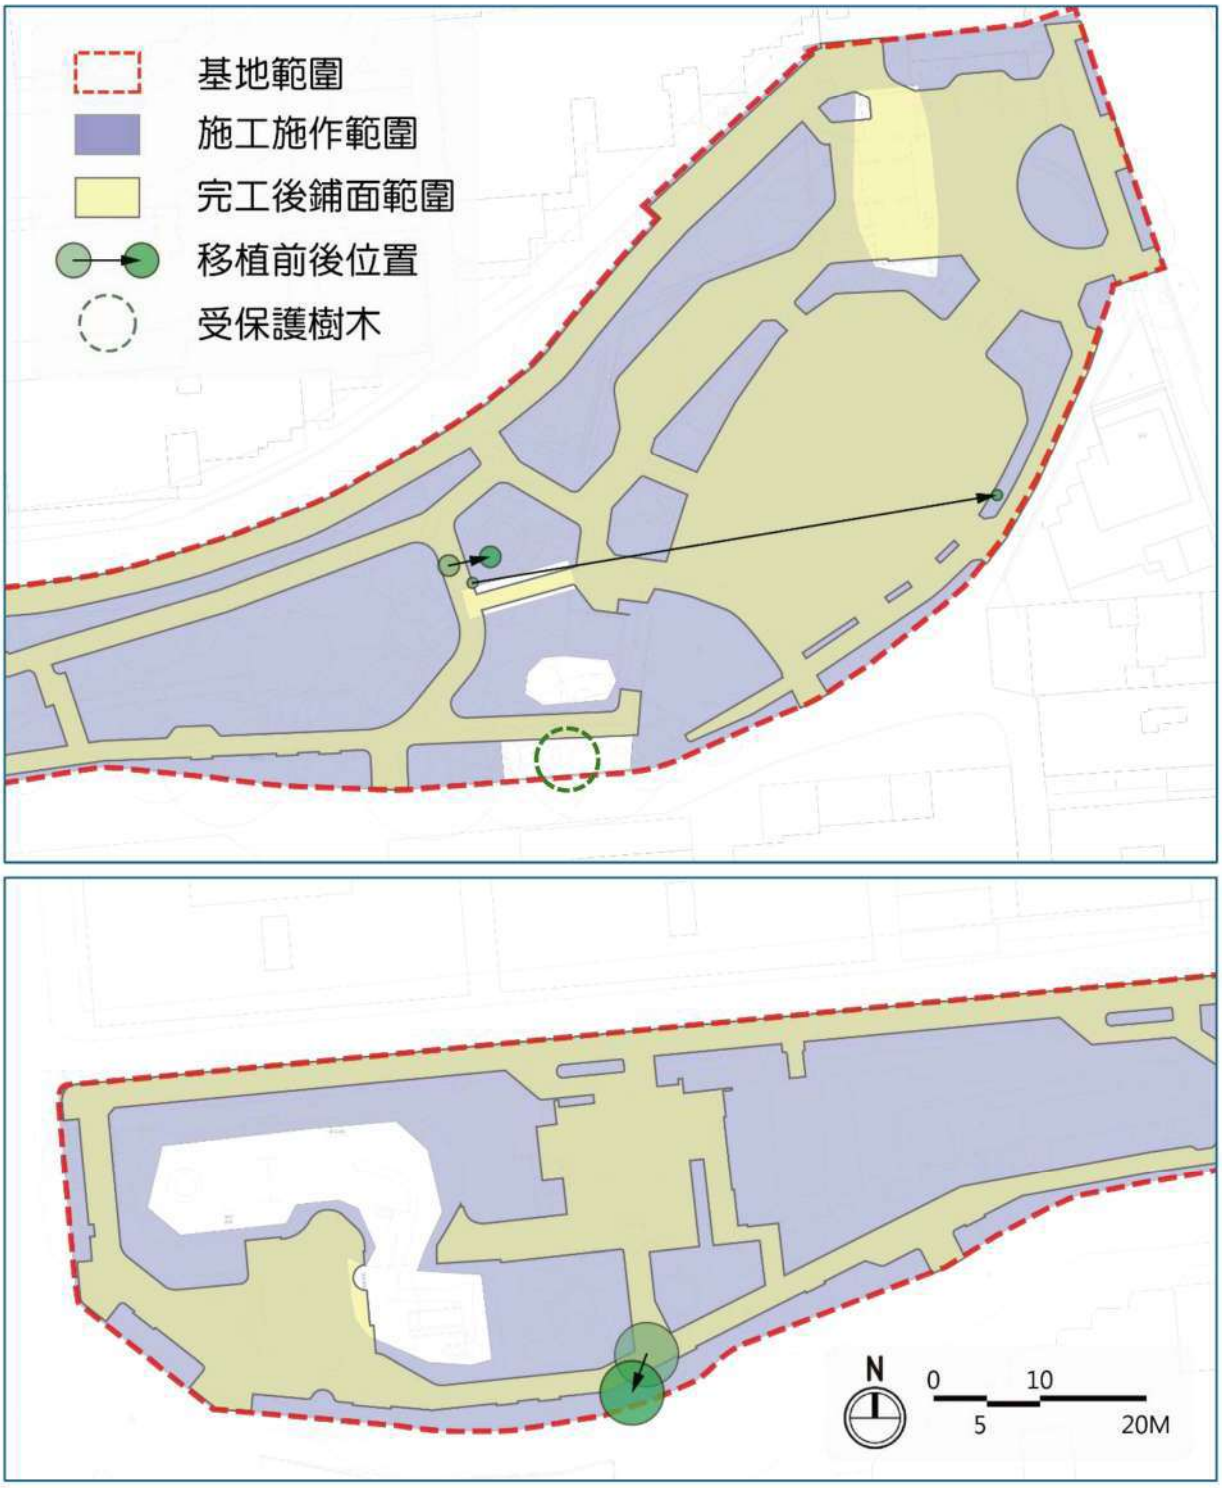

4　欲移植樹木之樹籍基本資料

4.1樹木樹籍資料總表：

項次	編號	樹種	樹籍編號	米高直徑	樹圍	胸高直徑	胸圍	樹高	是否為受保護樹木	預計定植地點
1.	C059	賊仔樹	SS0195001056	11CM	36CM	14CM	44CM	4M	否	新東街41-7號
2.	C159	山櫻花	SS0195003070	21CM	65CM	12CM	50CM	5M	否	新東街41-7號
3.	C183	九芎	SS0195001061	4CM	14CM	4CM	13CM	4M	否	新東街41-7號
4.	C071	福木		9CM	29CM	9CM	28CM	4M	否	機關供盆，上盆至指定位置
5.	C074	酪梨	SS0195003053	14CM	44CM	15CM	47CM	6M	否	機關供盆，上盆至指定位置
6.	C079	阿勃勒	SS0195001078	14CM	43CM	13CM	40CM	5M	否	明水公園
7.	C080	阿勃勒	SS0195001077	17CM	53CM	16CM	50CM	6M	否	明水公園

4.2樹木基本資料表：

<table>
<tr><td>樹木編號</td><td colspan="2">C059</td><td rowspan="5">基地位置</td><td colspan="2" rowspan="5"> 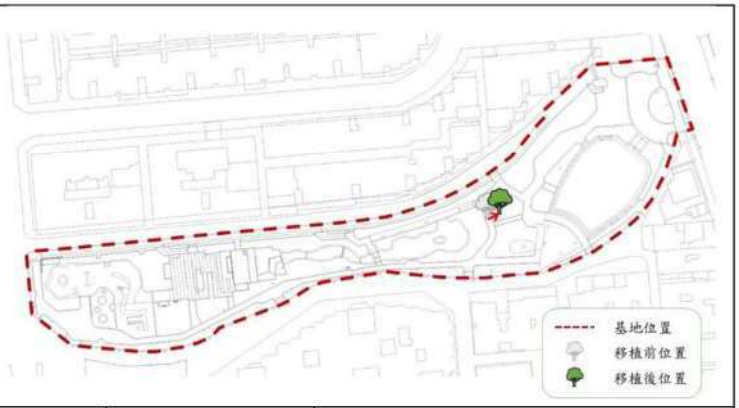
</td></tr>
<tr><td>樹種</td><td colspan="2">賊仔樹</td></tr>
<tr><td>學名</td><td colspan="2">Tetradium glabrifolium</td></tr>
<tr><td>樹籍編號</td><td colspan="2">SS0195001056</td></tr>
<tr><td>樹木位置</td><td colspan="2">新東街41-7號</td></tr>
<tr><td>樹高</td><td>4M</td><td>米高直徑</td><td>11CM</td><td>米高樹圍</td><td>36CM</td></tr>
<tr><td>樹冠幅</td><td>2M</td><td>樹齡</td><td></td><td>種植年分</td><td></td></tr>
<tr><td>權屬</td><td colspan="5">■公有：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 □私有：</td></tr>
<tr><td>位置屬性</td><td colspan="5">□1.道路、人行道 ■2.公園、綠地 □3.學校 □4.郊山 □5.私有住宅□6.公共場所 □7.其他：</td></tr>
<tr><td>樹形</td><td colspan="5">□1.尖錐形 □2.寬錐形 ■3.寬展開形 □4.窄柱形 □5.寬柱形 □6.獨特型</td></tr>
<tr><td>生長地點概述</td><td colspan="5">□1.水泥、柏油鋪面 ■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：</td></tr>
<tr><td>生長狀況描述</td><td colspan="5">生長良好，無病蟲害</td></tr>
<tr><td>其他備註</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>填表日期</td><td>1141231</td><td>填表人</td><td colspan="3">[redacted]</td></tr>
<tr><td colspan="3"> </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td>預計移植地點概述</td><td colspan="5">□1.水泥、柏油鋪面■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：</td></tr>
<tr><td>種植地點改善說明</td><td colspan="5">移植至芸香科區內，距離步道1M，下方為台灣誘蝶原生種混植區，增加公園內生態多樣景觀。</td></tr>
</table>

樹木編號	C159	基地位置	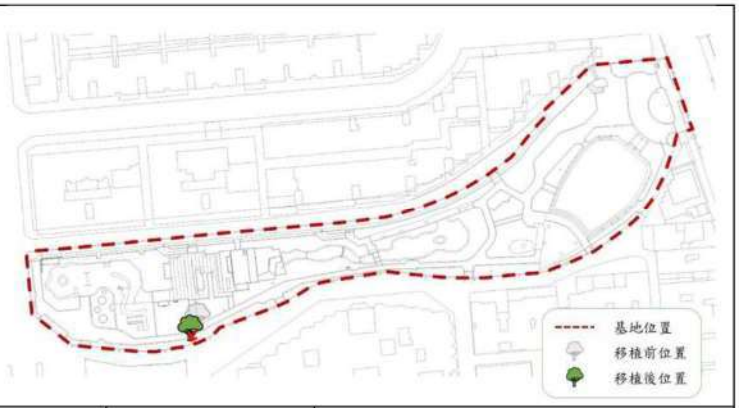		
樹種	山櫻花				
學名	*Prunus campanulata*				
樹籍編號	SS0195003070				
樹木位置	新東街41-7號				
樹高	5M	米高直徑	21CM	米高樹圍	65CM
樹冠幅	6M	樹齡		種植年分	
權屬	■公有：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 □私有：				
位置屬性	□1.道路、人行道 ■2.公園、綠地 □3.學校 □4.郊山 □5.私有住宅□6.公共場所 □7.其他：				
樹形	□1.尖錐形 □2.寬錐形 ■3.寬展開形 □4.窄柱形 □5.寬柱形 □6.獨特型				
生長地點概述	□1.水泥、柏油鋪面 ■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：				
生長狀況描述	生長良好，				
其他備註					
填表日期	1141231	填表人	[redacted]		
預計移植地點概述	□1.水泥、柏油鋪面■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：				
種植地點改善說明	移植後距離步道及車道1.1M，下方種植地毯草。				

樹木編號	C183	基地位置	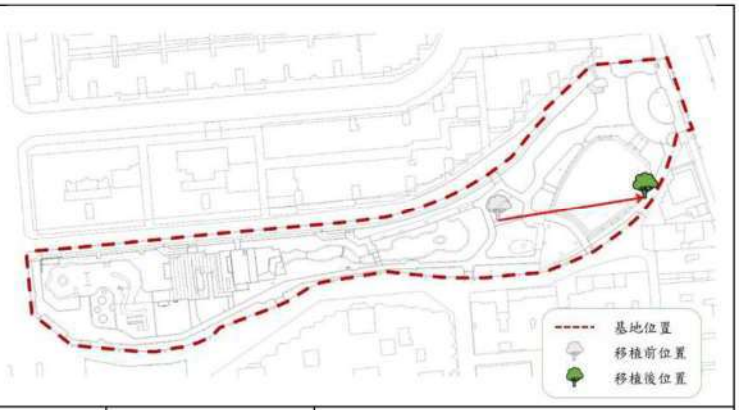		
樹種	九芎				
學名	*Lagerstroemia subcostata*				
樹籍編號	SS0195001061				
樹木位置	新東街41-7號				
樹高	4M	米高直徑	4CM	米高樹圍	14CM
樹冠幅	2M	樹齡		種植年分	
權屬	■公有：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 □私有：				
位置屬性	□1.道路、人行道 ■2.公園、綠地 □3.學校 □4.郊山 □5.私有住宅□6.公共場所 □7.其他：				
樹形	□1.尖錐形 □2.寬錐形 ■3.寬展開形 □4.窄柱形 □5.寬柱形 □6.獨特型				
生長地點概述	□1.水泥、柏油鋪面 ■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：				
生長狀況描述	生長不良，周邊樹冠密集，樹型細長向上生長				
其他備註					
填表日期	1141231	填表人	[redacted]		

預計移植地點概述	□1.水泥、柏油鋪面■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：
種植地點改善說明	移植後綠地距離步道及車道0.7M，周邊無其他喬木，增加喬木吸收陽光空間，同時增加遮陰效果；下方種植紅花繼木。

樹木編號	C071	基地位置	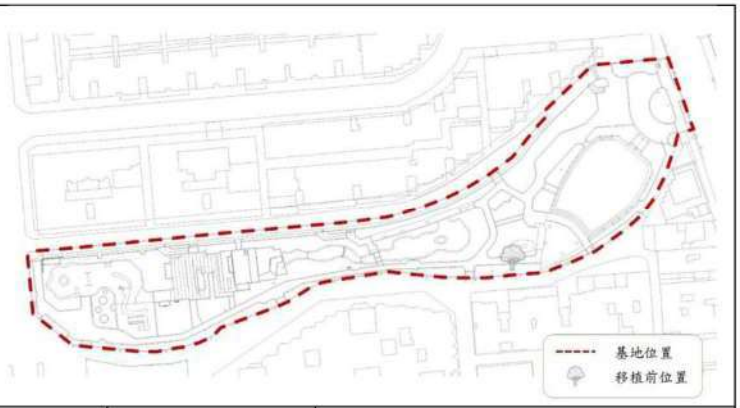		
樹種	福木				
學名	*Garcinia subelliptica*				
樹籍編號					
樹木位置	新東街41-7號				
樹高	4M	米高直徑	9CM	米高樹圍	29CM
樹冠幅	4M	樹齡		種植年分	
權屬	■公有：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 □私有：				
位置屬性	□1.道路、人行道 ■2.公園、綠地 □3.學校 □4.郊山 □5.私有住宅□6.公共場所 □7.其他：				
樹形	□1.尖錐形 ■2.寬錐形 □3.寬展開形 □4.窄柱形 □5.寬柱形 □6.獨特型				
生長地點概述	□1.水泥、柏油鋪面 ■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：				
生長狀況描述	生長良好				
其他備註					
填表日期	1141231	填表人	[redacted]		
預計移植地點概述	□1.水泥、柏油鋪面□2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 ■5.其他：上盆，移置機關指定地點				
種植地點改善說明					

樹木編號	C074	基地位置	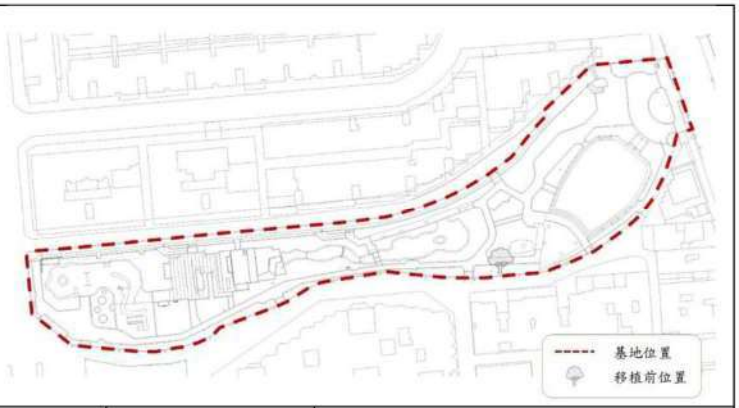		
樹種	酪梨				
學名	*Persea americana*				
樹籍編號	SS0195003053				
樹木位置	新東街41-7號				
樹高	6M	米高直徑	14CM	米高樹圍	44CM
樹冠幅	2M	樹齡		種植年分	
權屬	■公有：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 □私有：				
位置屬性	□1.道路、人行道 ■2.公園、綠地 □3.學校 □4.郊山 □5.私有住宅□6.公共場所 □7.其他：				
樹形	□1.尖錐形 □2.寬錐形 ■3.寬展開形 □4.窄柱形 □5.寬柱形 □6.獨特型				
生長地點概述	□1.水泥、柏油鋪面 ■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：				
生長狀況描述	生長良好				
其他備註					
填表日期	1141231	填表人	[redacted]		
預計移植地點概述	□1.水泥、柏油鋪面□2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 ■5.其他：上盆，移置機關指定地點				
種植地點改善說明					

樹木編號	C079	基地位置	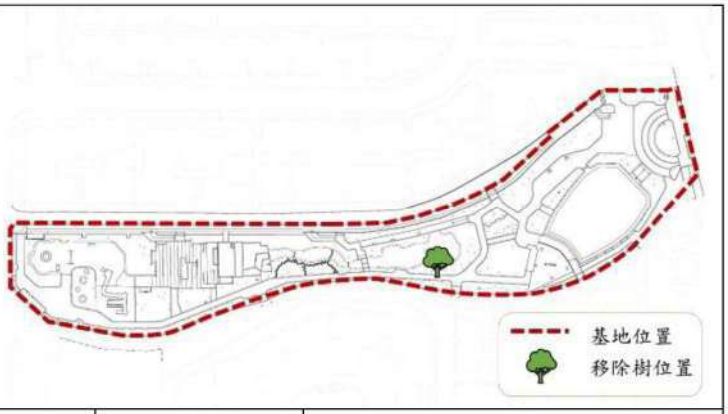		
樹種	阿勃勒				
學名	Cassia fistula				
樹籍編號	SS0195001078				
樹木位置	新東街41-7號				
樹高	5M	米高直徑	14CM	米高樹圍	43CM
樹冠幅	4M	樹齡		種植年分	
權屬	■公有：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 □私有：				
位置屬性	□1.道路、人行道 ■2.公園、綠地 □3.學校 □4.郊山 □5.私有住宅□6.公共場所 □7.其他：				
樹形	□1.尖錐形 □2.寬錐形 ■3.寬展開形 □4.窄柱形 □5.寬柱形 □6.獨特型				
生長地點概述	□1.水泥、柏油鋪面 ■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：				
生長狀況描述	枝葉生長不均勻、枝條不健康、樹皮損傷、位於高度活動空間周邊。				
其他備註					
填表日期	1141022	填表人	[redacted]		

預計移植地點概述	□1.水泥、柏油鋪面■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：

樹木編號	C080	基地位置	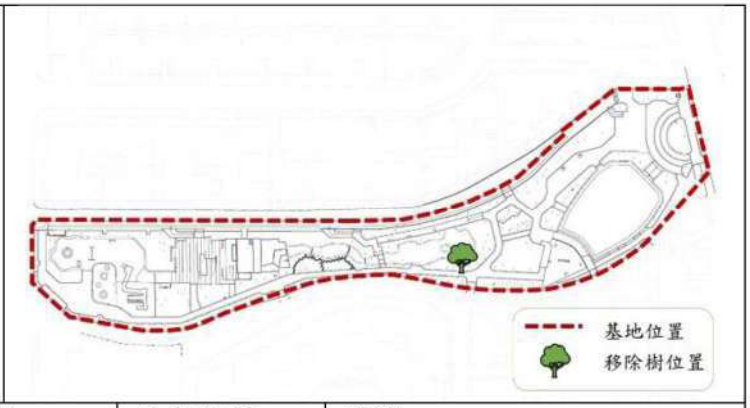		
樹種	阿勃勒				
學名	Cassia fistula				
樹籍編號	SS0195001077				
樹木位置	新東街41-7號				
樹高	6M	米高直徑	17CM	米高樹圍	53CM
樹冠幅	4M	樹齡		種植年分	
權屬	■公有：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 □私有：				
位置屬性	□1.道路、人行道 ■2.公園、綠地 □3.學校 □4.郊山 □5.私有住宅□6.公共場所 □7.其他：				
樹形	□1.尖錐形 □2.寬錐形 ■3.寬展開形 □4.窄柱形 □5.寬柱形 □6.獨特型				
生長地點概述	□1.水泥、柏油鋪面 ■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：				
生長狀況描述	枝葉生長不均勻、樹皮損傷、傷口無法癒合產生腐朽、位於高度活動空間周邊。				
其他備註					
填表日期	1141022	填表人	[redacted]		

預計移植地點概述	□1.水泥、柏油鋪面■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育 □4.垃圾雜物堆積 □5.其他：

5　非屬受保護樹木之證明文件

本案移植喬木規格未達臺北市樹木保護自治條例所訂之受保護樹木，相關規格資訊詳4.1樹木樹籍資料總表。

6　斷根及移植預定期程

6.1熱帶常綠性樹種：

項次	樹種	規格 cm	株數	移植適期	預定修剪、斷根及移植時間												備註(幾月幾日修剪、斷根、移植)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	福木	9	1	5-9月				■			●						4/15修剪 7/15移植

■=修剪 ▲=斷根 ●＝移植

6.2溫帶及亞熱帶落葉性樹種：

項次	樹種	規格 cm	株數	移植適期	預定修剪、斷根及移植時間												備註(幾月幾日修剪、斷根、移植)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	賊仔樹	11	1	11-3月			●									▲ ■	12/15修剪、斷根 3/15移植
2.	山櫻花	21	1	11-3月			●									▲ ■	12/15修剪、斷根 3/15移植
3.	九芎	4	1	11-3月			●									▲ ■	12/15修剪、斷根 3/15移植

■=修剪 ▲=斷根 ●＝移植

6.3溫帶及亞熱帶常綠性樹種：

項次	樹種	規格 cm	株數	移植適期	預定修剪、斷根及移植時間												備註(幾月幾日修剪、斷根、移植)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	酪梨	14	1	1-4月		●									■		11/15修剪 2/15移植
2.	阿勃勒	14	1	1-4月		●									■		11/15修剪 2/15移植
3.	阿勃勒	17	1	1-4月		●									■		11/15修剪 2/15移植

■=修剪 ▲=斷根 ●＝移植

本案共移植7株，有賊仔樹1株，山櫻花1株，九芎1株，酪梨1株，福木1株，阿勃勒2株。

米高直徑10cm 以下 2 株，斷根 1 次，時間 3 日

米高直徑10cm~30cm 5 株，斷根 1 次，時間 2 日

7　樹木移植計畫

7.1事前公告：

樹木移植前3日將樹木移植公告張貼於民生東路五段177巷、民生東路五段177巷8弄，並將與通知富錦里，公告內容包含施工內容、時間、範圍、施作單位及聯絡方式等。

7.2修剪作業：

7.2.1　修剪 7日 前通知監造單位到場監督。

7.2.2　修剪作業依「臺北市樹木修剪作業規範」辦理。

依樹種分別製作修剪示意圖，並註明修剪方式及幅度如下：

熱帶常綠性樹種

原樹型照片：

□原樹高 4 公尺，樹幅 4 公尺，修剪後樹高樹高 4 公尺，樹幅 4 公尺

計畫後樹型示意圖：

計畫修剪葉量：5 %，將枯乾枝、病蟲害枝等不良枝條修除，主幹主枝原則不修剪(注意:每年最多僅能修全葉量之25%，惟生長快速的樹種一年內不超過35%)

側枝修剪部位說明圖說：（依所需修剪方式來說明）

溫帶及亞熱帶落葉性樹種

原樹型照片：

□原樹高 4 公尺，樹幅 2 公尺，修剪後樹高樹高 4 公尺，樹幅 1.5 公尺

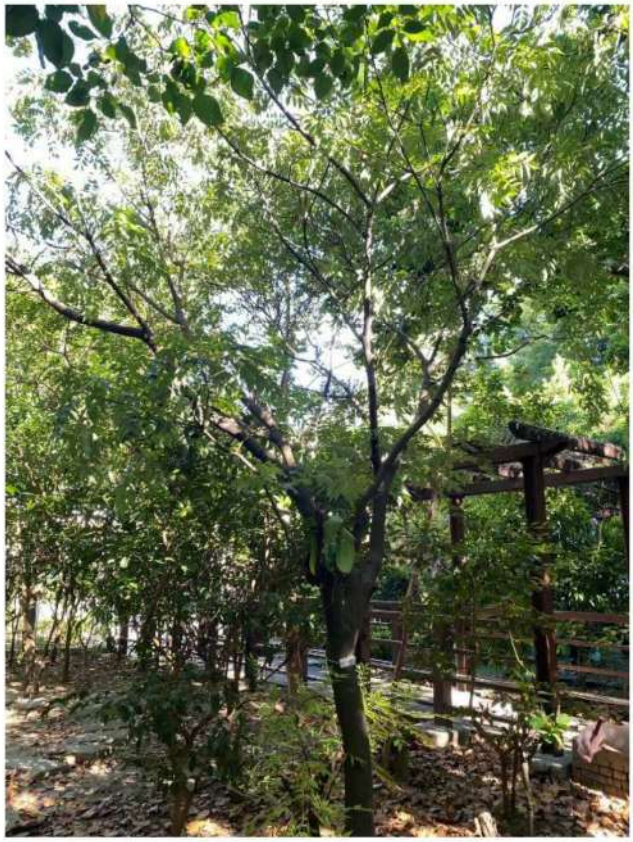

計畫後樹型示意圖：

計畫修剪葉量： 5 %，將枯乾枝、病蟲害枝等不良枝條修除，主幹主枝原則不修剪(注意:每年最多僅能修全葉量之25%，惟生長快速的樹種一年內不超過35%)

側枝修剪部位說明圖說：（依所需修剪方式來說明）

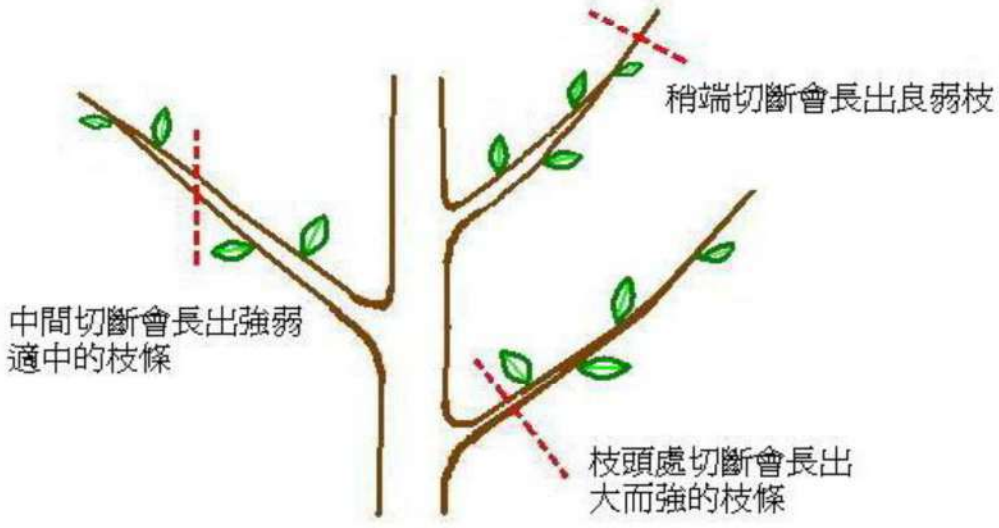

溫帶及亞熱帶常綠性樹種

原樹型照片： □原樹高 6 公尺，樹幅 4 公尺，修剪後樹高樹高 6 公尺，樹幅 4 公尺 	計畫後樹型示意圖： 計畫修剪葉量： 5 %，將枯乾枝、病蟲害枝等不良枝條修除，主幹主枝原則不修剪(注意:每年最多僅能修全葉量之25%，惟生長快速的樹種一年內不超過35%)

側枝修剪部位說明圖說：（依所需修剪方式來說明）

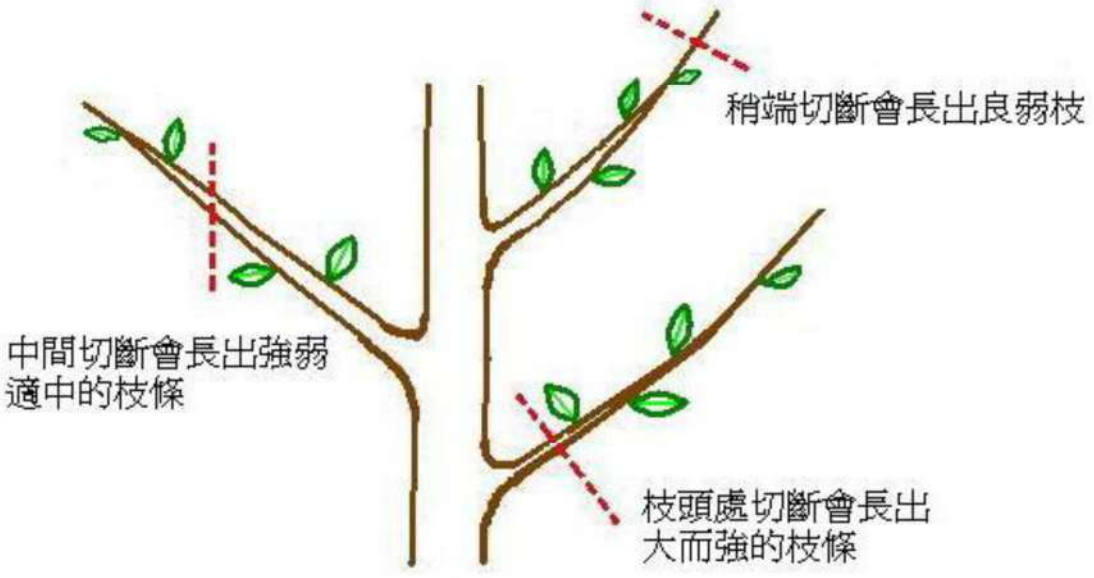

7.3根系挖除作業：

7.3.1　本次移植作業共有7株，依樹種、分類、移植適期、預定移植作業期、株數等，填列斷根及移植作業預定期程表。

7.3.2　斷根過程中挖掘規定大小之根球無需破壞既有人行道鋪面。斷根期間需保持開挖路面之平整，移植後將所破壞之鋪面復原，並依規定填平樹穴。

7.3.3　斷根7日前通知監造單位到場監督。

7.3.4　斷根前已先勘查現地環境先立竹支架，以免作業中有發生傾倒之虞。

7.3.5　斷根後，為避免強風使樹木倒伏及傷害剛長出之新根，將立　竹支架加強支撐。

7.3.6　斷根前應先挖掘環狀作業溝，以挖土機協助進行挖掘環狀作業溝，應順根系生長方向依放射狀向外挖掘土壤，並由人力進行根部斷根及修整根球作業，使其傷口平整。

7.3.7　根斷根位置須盡量保留足夠大小的根球範圍，但如果原生長植穴過小且樹中心偏向單邊生長，須以根球補償方式保留橢圓形根球。

7.3.8　進行斷根作業後，該環狀溝內以基地內既有開挖壤土回填。

7.3.9　使用促進發根藥劑，於斷根部位進行灌注、噴佈或塗佈處理，移植期間加強保濕措施。

7.4根球挖掘：

7.4.1　根球挖掘作業7日前通知監造單位到場監督。

7.4.2　挖掘根球將小心謹慎，不得使之破裂，以免損傷根部組織。

項次	編號	樹種	米高直徑	幹基部直徑	樹高	根球挖掘大小	估計樹木整體吊搬總重量（公噸）
1.	C059	賊仔樹	11 cm	11 cm	4 m	50 cm	0.06公噸
2.	C159	山櫻花	21 cm	21 cm	5 m	100 cm	0.15公噸
3.	C183	九芎	4 cm	4 cm	4 m	50 cm	0.03公噸
4.	C071	福木	9 cm	9 cm	4 m	50 cm	0.07公噸
5.	C074	酪梨	14 cm	14 cm	6 m	60 cm	0.12公噸
6.	C079	阿勃勒	14 cm	14 cm	5 m	70 cm	0.12公噸
7.	C080	阿勃勒	17 cm	17 cm	6 m	85 cm	0.15公噸

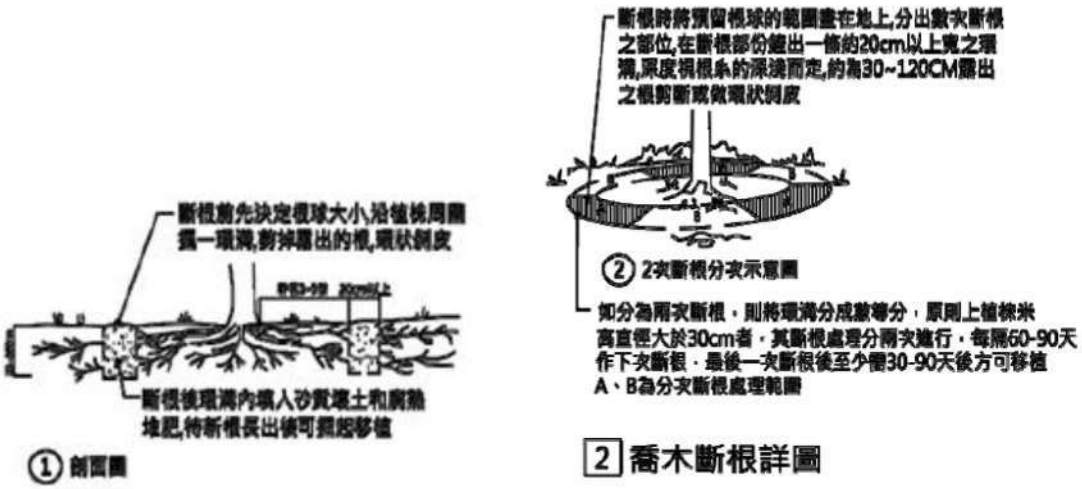

2 喬木斷根詳圖

7.5包裹保護處置：

7.5.1　本案擬採用厚纖麻布毯3mm，包裹樹身、莖幹，避免施工時發生傷及樹木。

7.6吊搬運送作業：

7.6.1　本案無直徑大於30公分樹木，最大吊搬重量為0.15噸，皆為區內移植。

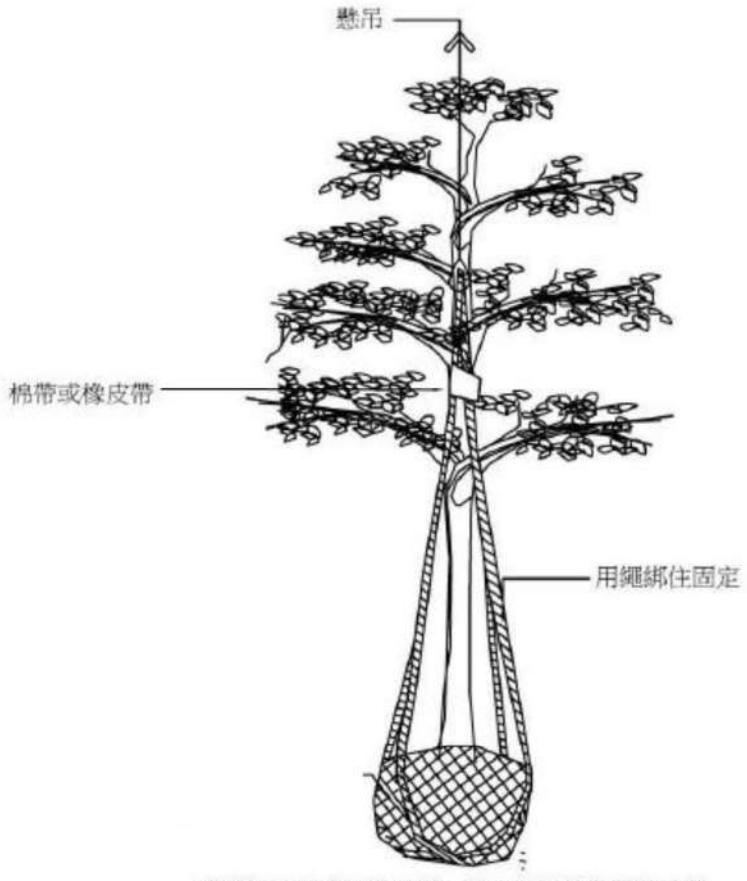

3 喬木類植栽移植搬運處理示意圖

7.6.2　樹身之保護：吊運繩索綑綁處，以厚纖麻布毯包裹、保護，以免搬運中受損。凡吊運前未包紮妥當以致植栽受損者，其損失由承包商負責。

7.6.3　移植樹木於挖掘根球部完成後當日內種植完成，以免影響樹木存活。

7.7定植作業：

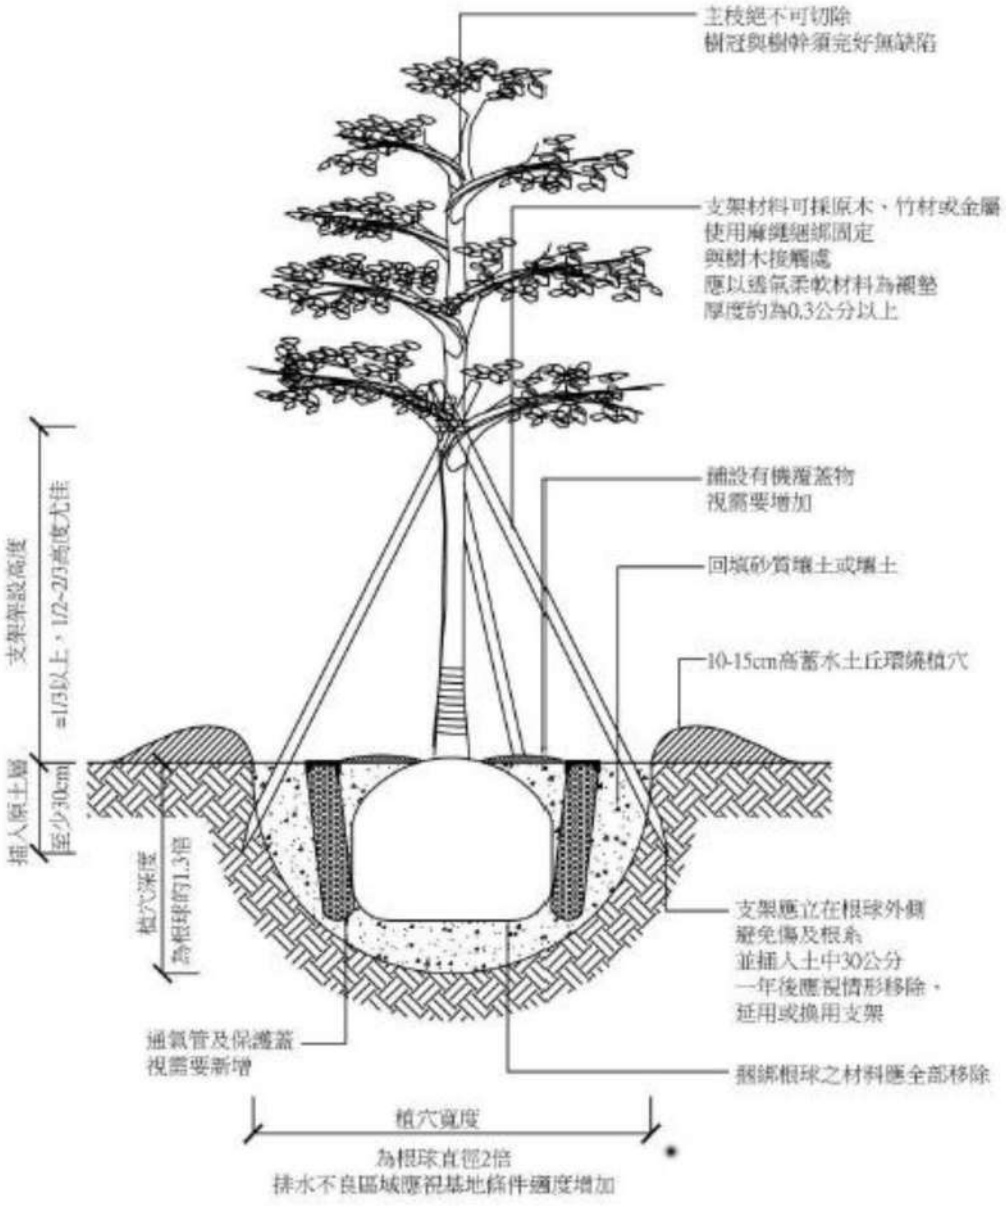

圖7-1 喬木移植施工剖面圖

7.7.1　定植作業 7 日 前應通知監造單位到場監督。

7.7.2　定植前需先完成定植地準備，包括：

7.7.2.1 基地內之大型土石塊雜物等，應先進行挖除運棄清理。

7.7.2.2 排水管理：定植地點土壤為壤土、基地排水尚可，故基地不需另設排水系統。

7.7.3　樹木放入植穴後，根球上部略高於地面，進行客土時，將客土適度壓實，以免填土灌水後樹木下陷。

7.7.4　回填土壤時將石塊及其他雜物撿除清理，以免妨礙根系生長。

7.7.5　本案樹木移植後將於在植穴週邊築集水坑，以利澆水及截留雨水。

7.7.6　考量樹木的規格及環境的特性，選用原木柱高度1.8公尺直徑 5~8公分之支架，以3支柱架設。

7.7.7　支架與樹木接觸處，將以麻布袋或棉布作襯墊，並應將支架綑綁固定但不宜過緊，以免樹木受傷。

7.8養護期維護管理計畫

養護項目	項目說明
人力編制	2人委外維護
養護頻率	原則每天
澆灌水作業頻率	原則每天一次，視氣候而定
植穴排水管理	每次澆水後注意排水狀況，下雨過後再行檢視
除草作業期程	每 30 天一次，並注意不傷及根基部
施肥作業期程	3 個月施追肥一次
病蟲害防治之方式	如發現感染病蟲害，將邀請專家協助檢視，並通知管理單位。

7.8.1　澆水作業：定植完成之後，配合樹種特性、環境及氣候，予以適時、適量澆水灌溉，以保持土壤介質濕潤。

7.8.2　植穴基盤管理：維護管理期間內，將適時於植穴進行補土及鬆土、集水坑之復原(並於萌芽成葉後整平)以及日常清除雜草等作業，如遇天災或豪雨時應加強注意排水情形。

7.8.3　施肥作業：維護管理期間，將針對樹木現況、需肥特性及營養狀態予以評估後再進行追肥。施追肥應注意肥料種類、施肥方法、施肥用量及施肥時期，以達成最佳效益。選用與施給肥料時，須依照肥料產品說明內容，並遵守相關肥料使用安全須知規定辦理。

7.8.4　樹木健康管理：樹木健康管理主要為樹木健康、維持適宜的生長基盤及環境、並適時作好修剪、病蟲障害防治等管理工作。樹木於維護管理期間，　每兩週進行檢查，如有病蟲害或生理障害時，將即時改善，必要時得諮詢專業單位或人員，以提供相關解決對策或技術意見，經診斷原因確認後，再進行防治處理措施。

7.8.5　維護工作將於施作完成後即日開始。保活期為自移植完成

並驗收合格日起計12個月。

7.8.6　樹木移植工程廠商將負責施作範圍之環境清潔及工地安全衛生管理，廢棄物將自行運棄處理，不得堆置於現場，若有傷及周邊植栽或設施，將負責復舊。施作完成後，將負責維護管理，包括澆水、雜草清除、修剪、草坪修整、支架調整、補植、病蟲害防治、施追肥、天災損害後搶修、廢棄物清運等項目。

8　經費預算

項次	項　目　及　說　明	單位	數量	單　價	複　價
1.	移植，喬木類移植(養根)，米高直徑＜5cm	株	1.00	5,246.64	5,246.64
2.	移植，喬木類移植(養根)，10cm≦米高直徑＜15cm	株	2.00	9,505.41	19,010.82
3.	移植，喬木類移植(養根)，15cm≦米高直徑＜20cm	株	1.00	13,157.88	13,157.88
4.	移植，喬木類移植(養根)，20cm≦米高直徑＜25cm	株	1.00	16,716.36	16,716.36
5.	移植，喬木類移植，5≦米高直徑＜10cm（上盆繳庫至管理所）	株	1.00	3,499.65	3,499.65
6.	移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm（上盆繳庫至管理所）	株	1.00	6,999.30	6,999.30

附件1 移植樹木識別牌

編號	
樹種	
規格	米高直徑：　　公分；高度：　　公尺
申請單位	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
工程名稱 （或移植原因）	富民生態公園整建工程
移植時間	年　　月　　日

附件2 喬木移植媒合資料

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
樹木資源媒介平台

樹木媒合證明

列印日期:2026-01-05

工程名稱:	三民公園及富民生態公園整建工程委託設計及監造技術服務		
案號:	SG11412017	年度:	115
機關單位:	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處/園藝科	連絡人:	
公告起日:	2026-03-01	公告訖日:	2026-08-31
移植起日:	2026-03-16	移植訖日:	2026-10-31
媒合成功樹種及數量:	九芎 1 株(DG11412016) 山櫻花 1 株(DG11412016) 賊仔樹 1 株(DG11412016) 金桔 1 株(DG11412016)		
未媒合成功樹種及數量:			

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
樹木資源媒介平台

樹木媒合證明

列印日期:2025-11-13

工程名稱:	三民公園及富民生態公園整建工程委託設計及監造技術服務		
案號:	SG11411002	年度:	114
機關單位:	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處/園藝科	連絡人:	
公告起日:	2026-03-01	公告訖日:	2026-08-31
移植起日:	2026-03-16	移植訖日:	2026-10-31
媒合成功樹種及數量:	福木 1 株(DG11411007) 酪梨 1 株(DG11411007)		
未媒合成功樹種及數量:			

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
樹木資源媒介平台

樹木媒合證明

列印日期:2026-07-15

工程名稱:	三民公園及富民生態公園整建工程委託設計及監造技術服務		
案號:	SG11507002	年度:	115
機關單位:	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處/園藝科	連絡人:	
公告起日:	2026-08-01	公告訖日:	2026-08-31
移植起日:	2026-08-16	移植訖日:	2026-10-31
媒合成功樹種及數量:	阿勃勒　　2 株(DG11507006)		
未媒合成功樹種及數量:			
