台北文化體育園區 - 大型室內體育館新建工程施工進度表(第2次修正後，合計展延181天) - 2014年12月

棟別	項次	工程項目	金額 (萬)	權重比例%
巨蛋結構體	1	鋼骨生產工程	114,398.0	9.9
	2	連續壁導溝工程	2,897.6	0.3
	3	連續壁工程	66,761.2	5.8
	4	逆打鋼柱及基樁工程	191,590.6	16.5
	5	假設構台工程	18,776.6	1.6
	6	1F(臨時)樓版工程	58,068.3	5.0
	7	土方工程	68,615.6	5.9
	8	地下逆打結構體工程及機電管線工程	136,999.5	11.8
	9	外部地下鋼骨安裝工程	151,603.5	13.1
	10	張力環鋼構安裝工程	38,248.6	3.3
	11	屋頂桁架鋼構安裝工程	96,201.0	8.3
	12	巨蛋屋頂外裝工程	25,615.0	2.2
	13	停車場裝修工程及機電設備工程	47,289.2	4.1
	14	觀眾席位看台工程及機電設備工程	27,121.7	2.3
	15	人工草皮、內裝工程及機電設備工程	79,163.0	6.8
	16	景觀工程	35,698.7	3.1
其他結構體	17	商業棟	619,738.0	23.83
	18	影城棟	161,055.0	6.19
	19	旅館及辦公室	660,835.0	25.41
		巨蛋小計	#########	
		商,影,旅辦小計	1,441,628.0	
		整體合計	2,600,676.1	

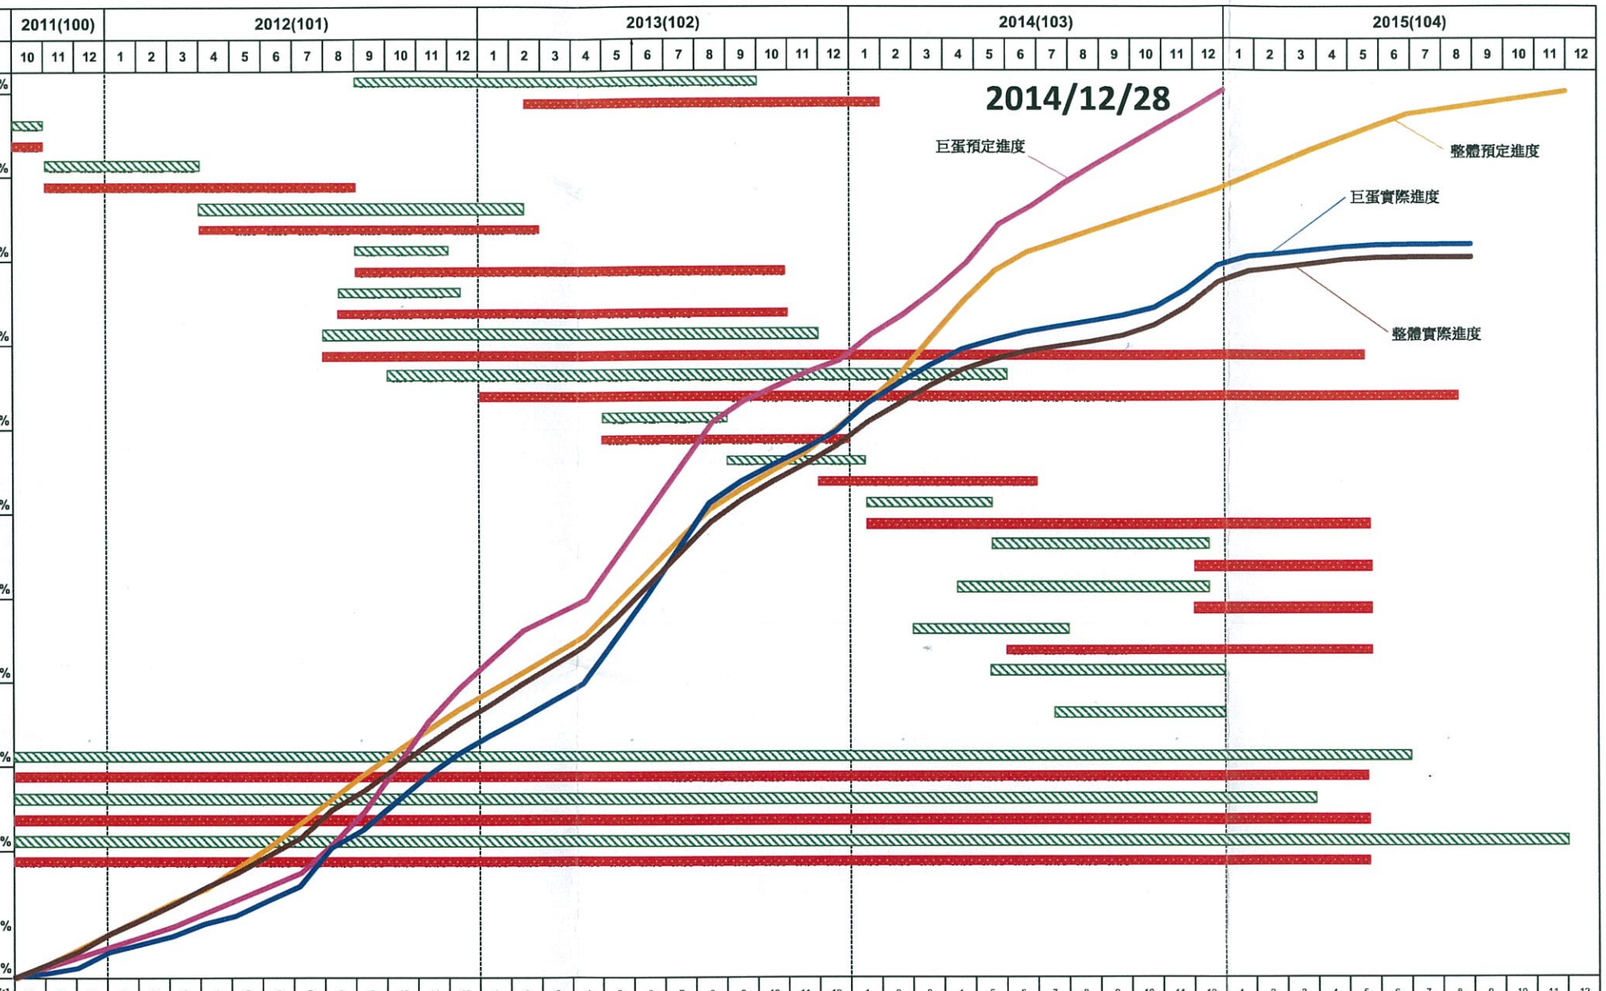

施工月份	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
巨蛋棟當月預定進度百分比 %	0.25	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.50	1.50	1.50	1.50	3.25	3.67	5.02	5.02	3.85	3.22	3.22	1.72	1.72	4.99	4.99	4.99	4.99	2.38	1.62	1.62	1.25	2.91	2.25	2.72	3.17	4.30	2.05	2.56	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
巨蛋棟累計預定進度百分比 %	0.25	1.40	2.55	3.71	4.86	6.01	7.51	9.02	10.52	12.02	15.27	18.94	23.96	28.98	32.82	36.05	39.27	40.99	42.71	47.70	52.69	57.68	62.67	65.05	66.67	68.29	69.55	72.46	74.71	77.43	80.60	84.90	86.95	89.52	91.61	93.71	95.81	97.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
巨蛋棟當月實際進度百分比 %	0.25	0.38	0.61	1.77	0.87	0.92	1.35	0.91	1.65	1.63	4.27	2.02	2.95	2.97	2.48	2.03	1.87	2.03	1.96	4.86	4.83	5.25	5.18	2.39	1.85	1.68	2.03	3.10	2.30	2.05	1.76	1.06	0.87	0.63	0.58	0.63	0.86	2.04	2.65	1.04	0.34	0.36	0.35	0.19	0.05	0.03	0.02				
巨蛋棟累計實際進度百分比 %	0.25	0.63	1.24	3.01	3.88	4.80	6.15	7.06	8.71	10.34	14.61	16.63	19.58	22.55	25.03	27.06	28.93	30.96	32.92	37.78	42.61	47.86	53.04	55.43	57.28	58.96	60.99	64.09	66.39	68.44	70.20	71.26	72.13	72.76	73.34	73.97	74.83	76.87	79.52	80.56	80.90	81.26	81.61	81.80	81.85	81.88	81.90				
整體當月預定進度百分比 %	1.30	1.52	1.75	1.75	1.72	1.75	1.42	2.34	2.29	2.68	2.74	2.71	2.45	2.45	2.28	2.08	1.99	2.08	2.05	3.58	3.51	3.58	3.44	2.24	2.00	1.98	2.64	2.94	3.13	4.11	4.01	3.44	2.03	1.18	1.19	1.18	1.19	1.18	1.19	1.49	1.48	1.49	1.33	1.34	1.24	0.51	0.51	0.50	0.51	0.51	
整體累計預定進度百分比 %	1.30	2.82	4.57	6.32	8.04	9.79	11.21	13.55	15.84	18.52	21.26	23.97	26.42	28.87	31.15	33.23	35.22	37.30	39.35	42.93	46.44	50.02	53.46	55.70	57.70	59.68	62.32	65.26	68.39	72.50	76.51	79.95	81.98	83.16	84.35	85.53	86.72	87.90	89.09	90.58	92.06	93.55	94.88	96.22	97.46	97.97	98.48	98.98	99.49	100.00	
整體當月實際進度百分比 %	1.30	1.36	1.46	1.97	1.57	1.60	1.85	1.59	1.92	1.91	3.09	2.08	2.50	2.51	2.29	2.09	2.26	2.09	2.08	3.06	3.48	3.52	3.48	2.47	2.01	1.85	2.02	2.63	2.02	2.03	1.72	1.13	0.84	0.57	0.50	0.67	1.13	1.98	2.70	1.24	0.41	0.42	0.40	0.21	0.04	0.02	0.01				
整體累計實際進度百分比 %	1.30	2.66	4.12	6.09	7.66	9.26	11.11	12.70	14.62	16.53	19.62	21.70	24.20	26.71	29.00	31.09	33.35	35.44	37.52	40.58	44.06	47.58	51.06	53.53	55.54	57.39	59.41	62.04	64.06	66.09	67.81	68.94	69.78	70.35	70.85	71.52	72.65	74.63	77.33	78.57	78.98	79.40	79.80	80.01	80.05	80.07	80.08				

圖 例：整體預定進度　巨蛋預定進度　整體實際進度　巨蛋實際進度　預定施工時程　實際施工時程
