


# 臺北市政府工務局新建工程處 流標廢標後續處理標準作業流程圖

110.12.02 簽准實施

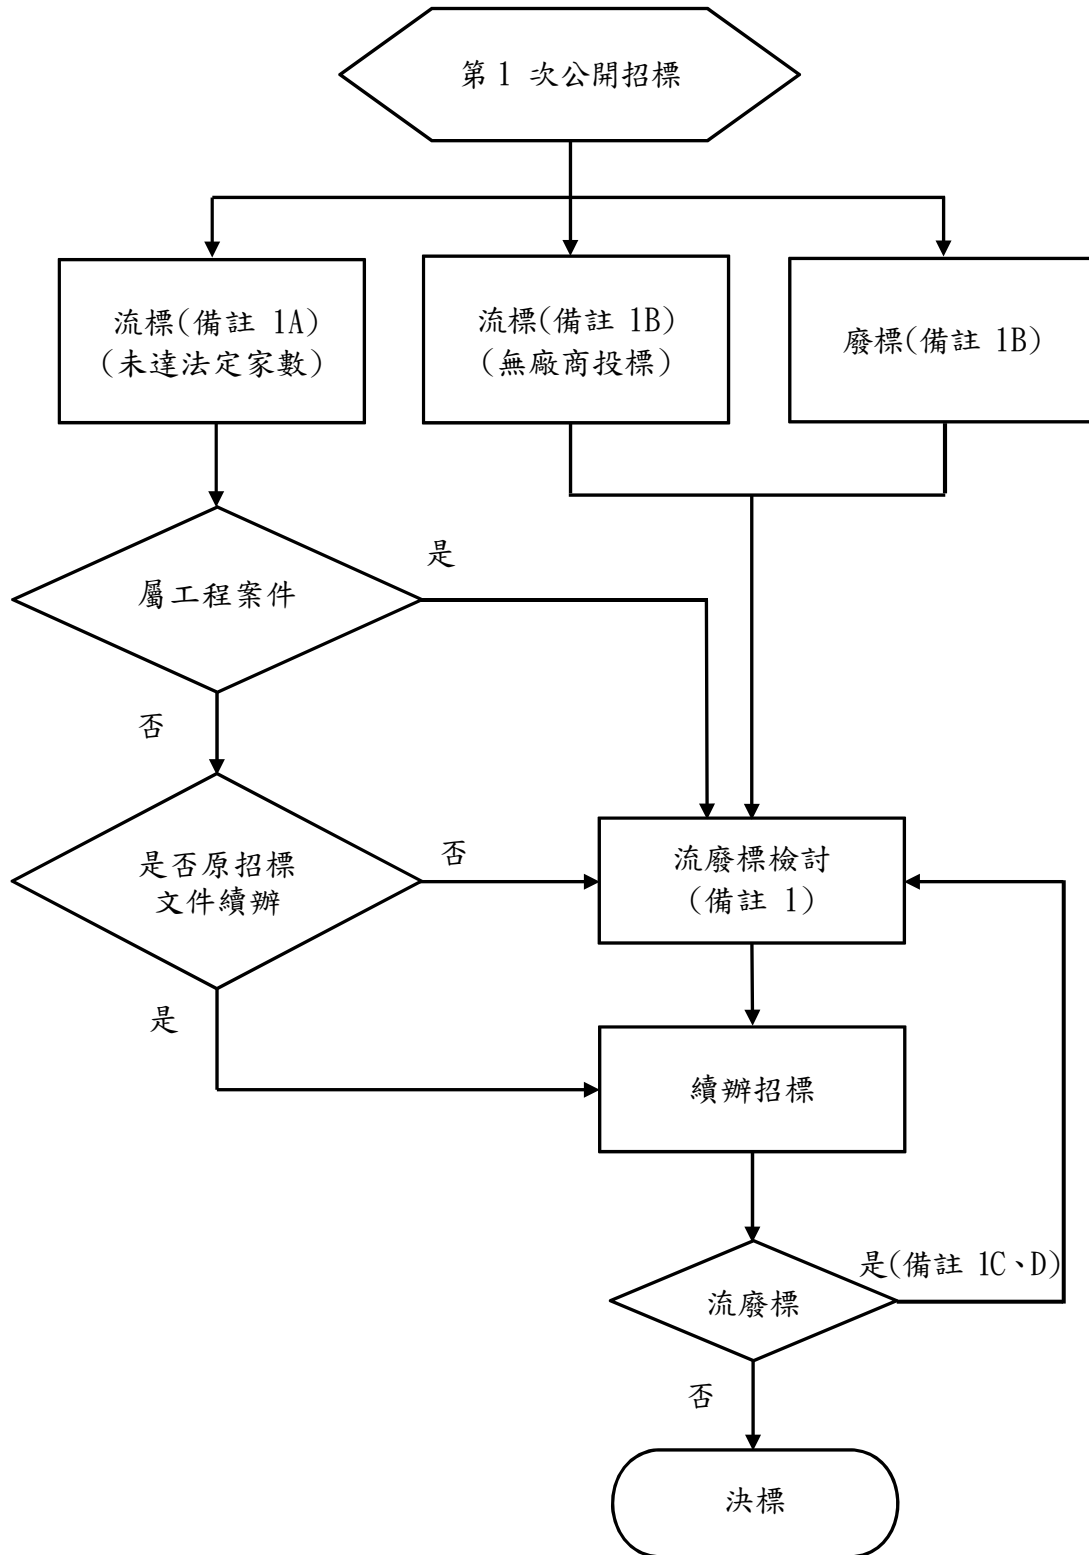

備註：

1. 流標廢標應依「臺北市政府加速工程採購流標廢標後續處理原則」(如附件1)進行檢討，並依下列程序辦理，工程採購應另檢附本處「工程採購流標廢標檢討程序自我檢核表」(如附件2)：

代碼	流廢標情形		檢討程序
A	流廢標達 1 次	有廠商投標，惟未達法定家數	<b>財物/勞務採購</b> ：核准招標簽文敘明標辦 2 次者，依原招標文件續辦。
			<b>工程採購</b> ：專簽處長主持檢討會議後，依會議結論續辦。
B	流廢標達 1 次	無廠商投標、領標或無合格廠商	<b>財物/勞務採購</b> ：核准招標簽文敘明標辦 2 次者，且經業務科室主管便箋同意依原招標文件續辦。
			<b>工程採購</b> ：依政府採購法第11條之1規定成立採購工作及審查小組，或應邀集相關機關(含上級機關)及專家學者參與檢討會議，依會議結論續辦。(詳註2)
C	流廢標達 2 次		<b>財物/勞務採購</b> ：退回業務科室檢討，檢討結果簽報九職等督導副總(專委)同意後續辦。
			<b>工程採購</b> ：除符合註3所述情形者外，餘依政府採購法第11條之1規定成立採購工作及審查小組，或應邀集相關機關(含上級機關)及專家學者參與檢討會議，依會議結論續辦。(詳註2、3)
D	流廢標達 3 次(含)以上		<b>財物/勞務採購</b> ：退回業務科室檢討，召開流廢標檢討會議，並經處長同意後續辦。
			<b>工程採購</b> ：通知本府工程採購流廢標專案督導小組依該小組，並通知製作檢討報告及指派決策層級人員參與專案督導會議。

2. 依108年5月28日市長室會議決議第二點(三)，工程採購案件一旦流(廢)標，應由工程主辦機關首長主持會議檢討原由，並修正招標文件，始得再行公告招標。另依本府110年10月21日府授工採字第1100142269號函釋，檢討會議係依政府採購法第11條之1規定由機關首長授權成立之採購工作及審查小組召開亦可。

3. 依本府110年10月21日府授工採字第1100142269號函釋，公告金額以上之工程採購，於第1次流標後已成立採購工作及審查小組或邀請相關機關人員及專家學者協助檢討因應策略，後續因招標文件經重大改變致不適用政府採購法第48條第2項規定，而有第2次流標情形者，得依原招標文件續辦第3次招標。
4. 本流程圖已納入「臺北市政府工程採購流廢標專案督導小組執行作業程序」相關規定，爰有關工程採購之檢討程序僅適用於公告金額以上之案件，未達公告金額之工程採購案件得準用。

## 臺北市政府加速工程採購流標廢標後續處理原則

中華民國 105 年 5 月 26 日臺北市府授工採  
字第 10530006500 號函修正


- 一、臺北市政府為加速所屬各機關、學校及公營事業（以下稱機關）辦理工程採購流標、廢標案件後續處理作業，參考政府採購法（以下稱採購法）、採購法施行細則及相關規定，訂定本處理原則。
- 二、本處理原則適用公告金額以上採公開招標方式辦理之工程採購。
- 三、採購案流標時，機關應適時檢討流標原因，處理原則說明如下：
  - （一）辦理第一次公開招標未達法定家數而流標時，應先瞭解係無廠商投標，抑或為未達三家合格廠商投標
  - （二）第一次公開招標結果無廠商投標者，機關應分別就下列項目逐一檢視招標文件之合理性：
    1. 廠商資格  
依採購法第六條、第三十六條、第三十七條及「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」規定，檢討投標廠商資格有無不當限制競爭、或無正當理由之差別待遇。
    2. 材料設備規格  
依採購法第二十六條及「政府採購法第二十六條執行注意事項」規定檢討有無下列之一不當情形：
      - （1）材料設備規格限制競爭或採用特殊材料，有以小綁大之情形。
      - （2）各項材料設備量體小，惟要求抽樣試驗種類項目繁多，且試驗費用未合理編列。
      - （3）要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。
      - （4）無法以精確之方式說明招標要求，而未於招標文件內註明「或同等品」字樣。
      - （5）技術規範門檻過高致限制競爭。
    3. 預算金額及底價  
參考採購法第十一條、第四十六條規定，檢討研析近期市場行情及物價漲跌幅、公共工程價格資料庫、營建物價期刊及臺北市議會審定單價編列情形，並考量地域性、特殊性或施工困難度等因素。
    4. 招標文件（含公告）  
機關應檢討招標文件及招標公告，有無下列情形：
      - （1）等標期未依個案需求合理訂定。
      - （2）材料設備及工項漏列、數量不足或其他設計不完整之情事。

- (3)履約期限不足、計價請款條件嚴苛或各期請領金額不符比例原則。
  - (4)契約需求內容不明確或特殊材料，致增加廠商之潛在風險。
  - (5)契約未依個案特性需求，訂定物價指數調整規定。
  - (6)契約罰則或其他條款對廠商有不公平合理之規定。
  - (7)其他涉及違反採購法令或招標文件訂定不當，致影響廠商投標意願之情形。
5. 廠商或第三人之反應  
機關應檢視招標期間有無廠商提出疑義、異議或申訴，及第三人（如媒體、分包廠商）之建議等，納入檢討修正招標文件之參考。
6. 加強宣導  
機關得視需要召開說明會或通知相關公會知悉。
- (三) 第一次公開招標結果有廠商投標者，得依原招標文件續辦第二次招標，或視需要按前款各目檢討招標文件之妥適性後辦理後續採購作業。
- 四、採購案廢標時，機關應按廠商投標文件不符合招標文件之階段（資格、規格、價格及評選等階段），檢討廢標原因，檢討原則除準用第三點第二款規定外，涉及廠商因報（減）價或受評選結果不符合招標文件而廢標者，應另依個案情形，併同考量下列處理原則：
- (一) 投標廠商價格高於底價而廢標者：
- 1. 有效標廠商平均報價均高於底價且低於公告之預算金額者，機關應考量匯率、物價波動及履約條件等因素重新檢討底價之合理性。
  - 2. 投標廠商平均報價高於公告之預算金額者，機關應考量前日因素，分析投標廠商與預算之差異及未能決標之原因，重行檢討預算金額及底價之合理性。
- (二) 投標廠商受評選結果不符合招標文件而廢標者，機關應檢討評選項目、評審標準及評定方式之合理性。
- 五、採購案流標、廢標後，機關除依前二點規定檢討結果外，得依下列規定辦理後續採購作業：
- (一) 招標文件合理或未經重大改變者，續辦第二次公開招標，並依第二次招標規定之等標期辦理。但符合本點第五款規定者，得採限制性招標。
- (二) 招標文件不合理經重大改變者，應依第一次公開招標之規定辦理，不適用政府採購法第四十八條第二項之規定（即等標期不得予縮短，且本次招標仍受三家廠商之限制），並按機關之採購內部控制作業規定，召集相關單位，於議會審定之預算額度內，研議變更或補充招標文件，必要時並得依個案特性需求，參採下列方式調整採購策略：
- 1. 押標金、履約保證金及保固（保活）保證金之金額得予調降，或

- 調整發還方式。
  2. 估驗計價保留款之金額得予調降。
  3. 得予支付預付款或調增其額度（上限為契約金額之百分之三十）。
  4. 預算未完成立法程序前，得先保留決標，並敘明預算經立法機關通過之後續處理方式。
  5. 善用統包或複數決標方式。
  6. 善用開口契約（定期預約式契約）
  7. 得依不同標的分別辦理招標，或類同性質之採購得以併案方式辦理招標。
  8. 得採工料分離之方式採購。
  9. 建築工程需申請使用執照或室內裝修許可者，其期間不納入履約期限。
  10. 善用採購法第五十五條及第五十七條之協商機制，於最低標無法決標，或最有利標無法評定最有利標時，得採行協商措施。
- (三) 採購案流標、廢標後，依前款變更或補充招標文件結果，超出議會審定之預算額度時，其處置原則如下：
1. 先考量符合原標的功能之條件下，使用較經濟性材料。
  2. 使用較經濟性材料後預算仍不足，得考量調整工程內容或項目，在不影響功能需求原則下減項目（減體減量）。
  3. 所減項目（減體減量）另籌預算並以採購法第二十二條第一項第七款後續擴充方式辦理或另案發包。
- (四) 查核金額以上採購案流標、廢標後，重新招標時，報請上級機關派員監辦之期限得予縮短，其規定應檢送之文件，得免重複檢送。
- (五) 如無廠商投標或無合格標，且以原訂招標內容及條件未經重大改變者，因時程急迫或其它重要因素，得依採購法第二十二條第一項第一款規定，經簽報機關首長或其授權人員同意，辦理限制性招標，並得優先邀請本府投標須知所稱優良廠商或全球化廠商比價或議價。但情形特殊者，不在此限。
- 六、為加速流標、廢標後續之採購效率，除機關採購內部控制作業另有規範者外，機關業務單位得依採購案之採購金額、規模等特性，於第一次公開招標前，簽報機關首長或其授權人員核准授權下列事項：
- (一) 第一次公開招標結果，採購案有廠商投標而有流標、廢標情形者，授權採購單位得逕行續辦第二次招標，且不受三家法定家數之限制，並依第二次招標之等標期規定辦理。
  - (二) 第一次公開招標結果，採購案無廠商投標者，授權採購單位會同設計單位（或業務單位）自行檢討，經檢討結果，仍以原招標文件辦理第二次公開招標者，由採購單位依前款規定辦理。
- 七、第二次及後續公開招標仍有流標、廢標情形者，處理原則亦同。
- 八、選擇性招標案件、勞務採購及財物採購得準用本處理原則之規定。

臺北市政府加速工程採購流標廢標後續處理原則流程圖-流標  
(勞務採購及財物採購準用)


105.05.26

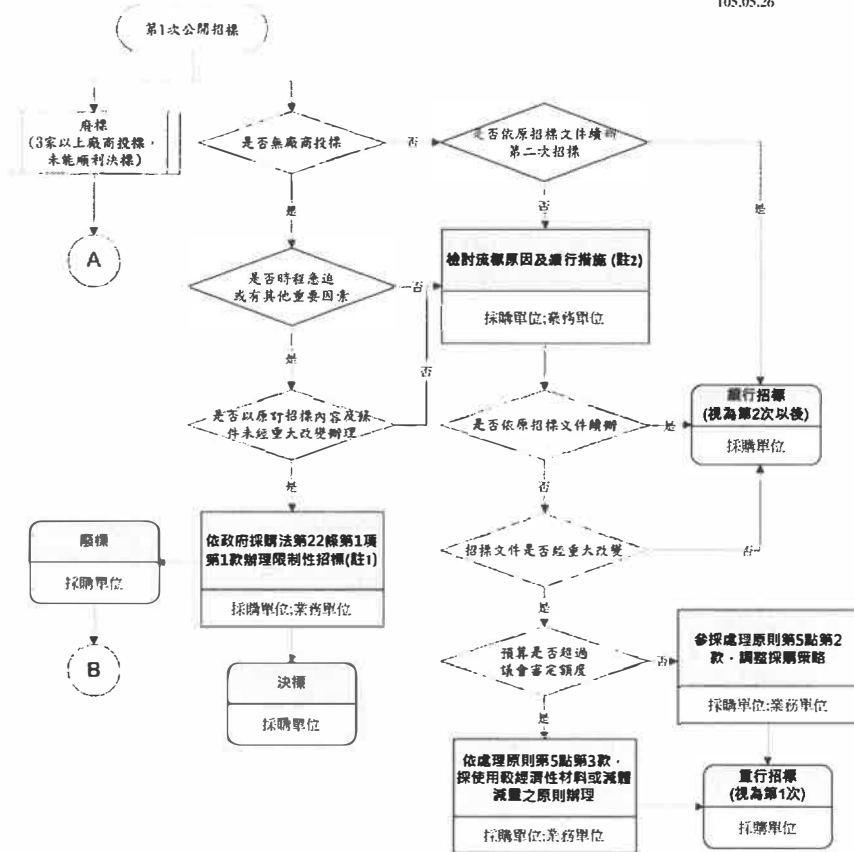

註1:  
依臺北市政府加速工程採購流標廢標後續處理原則(下稱處理原則)第5點第5款, 得優先邀請優良廠商或全球化廠商(協議)  
註2:  
依處理原則第3點第2款, 逐一檢視招標文件之合理性:  
1.廠商資格:  
若經檢討投標廠商資格有不當限制競爭, 或無正當理由之差別待遇者, 修正廠商資格。  
2.材料設備規格:  
若經檢討有不當情形者, 修正材料設備規格。  
3.預算金額及底價:  
若經檢討預算金額及底價未符市場行情等因素者, 調整預算金額或底價。  
4.招標文件(含公告):  
若經檢討招標文件(公告)有不合理情形者, 變更或補充招標文件(公告)。  
5.廠商或第三人之反應:  
若經檢視廠商提出疑義、異議或申訴, 及第三人之建議等尚屬合理者, 納入檢討變更或補充招標文件之參考。  
6.將視需要加強宣導。

臺北市政府加速工程採購流標廢標後續處理原則流程圖-廢標  
(勞務採購及財物採購準用)

105.05.26

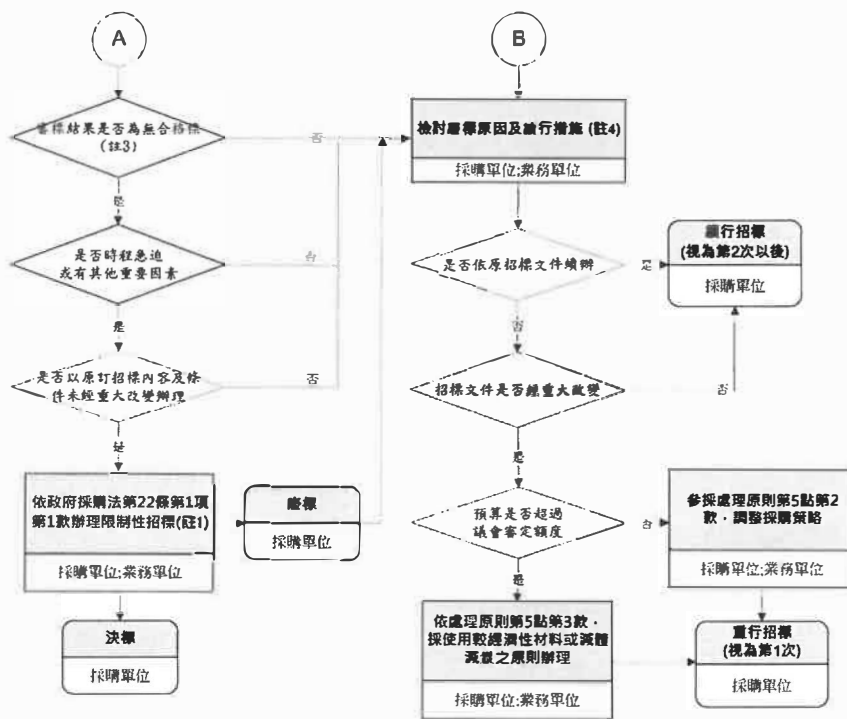

註3:  
所稱無合格標,指審標結果無廠商合於招標文件規定。但有廠商異議或申訴再處理中者,均不在此限。  
註4:  
依處理原則第4點規定辦理。



臺北市政府工務局新建工程處  
工程採購流廢標檢討程序自主檢核表

工程名稱						
採購金額		預算金額				
設計單位		履約期限				
工程內容(基本內容及個案特性)						
歷次流廢標說明						
招標次別	等標期(天)	領標家數	投標家數	流廢標情形	流廢標檢討情形	
第一次	(範例) 14	(範例) 3	(範例) 0	(範例) 110年11月2日 第1次開標因無 廠商投標而宣布 流標	(如當次檢討為第一次招標可不填) (範例) 本工程第一次流標後經邀集相關單位(含上級)及專家學者開會研商， 檢討情形如下：本年度鋼筋、混凝土等營建物料實際市場價格均持續上漲中，設計單位與結構技師檢討在不影響設計強度及工程安全性下，建議調整擋土設施部分項目， 包含地中壁、扶壁及壁樁減量。	
第二次	(範例) 14	(範例) 4	(範例) 1	(範例) 110年12月1日 第2次開標因有 重大改變，投標 廠商未達法定家 數(僅1家投標) 宣布流標		
第三次						
檢核項目				檢核結果	說明	備註
等標期間有無廠商請求釋疑?				<input type="checkbox"/> 無		
				<input type="checkbox"/> 有		
招標文件(如單價、工期等)是否符合市場行情?				<input type="checkbox"/> 是		
				<input type="checkbox"/> 否		
是否有遭遇其他困難或待解決事項?				<input type="checkbox"/> 是		
				<input type="checkbox"/> 否		

業務單位自主檢核結果	
<input type="checkbox"/> 流廢標 達 1 次 (備註 1A)	<input type="checkbox"/> 有廠商投標，惟未達法定家數 後續擬專簽處長主持檢討會議後，依會議結論續辦。
	<input type="checkbox"/> 無廠商投標、領標或無合格廠商 (備註 1B) <input type="checkbox"/> 招標文件合理或無須重大改變，擬由本處採購工作及審查小組召開檢討會議。 <input type="checkbox"/> 招標文件不合理或須重大改變，擬邀集相關單位(含上級)及專家學者召開檢討會議。
<input type="checkbox"/> 流廢標 達 2 次 (備註 1C)	<input type="checkbox"/> 招標文件合理或無須重大改變，擬由本處採購工作及審查小組召開檢討會議。 <input type="checkbox"/> 招標文件不合理或須重大改變，擬邀集相關單位(含上級)及專家學者召開檢討會議。 <input type="checkbox"/> 本案於第 1 次流標後已成立採購工作及審查小組或邀請相關機關人員及專家學者協助檢討因應策略，後續因招標文件經重大改變致不適用政府採購法第 48 條第 2 項規定，而有第 2 次流標情形者，得依原招標文件續辦第 3 次招標。
<input type="checkbox"/> 流廢標 達 3 次 (含)以上 (備註 1D)	通知本府工程採購流廢標專案督導小組，依該小組規定製作檢討報告、指派決策層級人員參與專案督導會議，並請上級機關與會說明督導情形。
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>承辦人員核章</span> <span>單位主管簽章</span> </div>	
